394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 4, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога от жилого дома по ул. Первомайская, д.1 до жилого дома по ул. Первомайская, д. 64	6
5.	Автодорога от жилого дома по ул. Первооткрывателей, д. 2 до жилого дома по ул. Первооткрывателей, д. 10	12
6.	Автодорога от жилого дома по ул. Сосновая, д. 8 до земельного участка по ул. Новая, участок 15	19
7.	Автодорога по ул. Софьи Перовской от д. №37 по ул. Набережная до д. №114 по ул. Советская	23
8.	Автодорога от жилого дома по ул. Спартака, д. 1 до жилого дома по ул. Чапаева, д 43	27
9.	Автодорога по пер. Спортивный от жилого дома по ул. Речников, д.4а до жилого дома по ул. Пролетарская, д. 4	31
10.	Автодорога от жилого дома по ул. Олимпийская, д. 1а до жилого дома по ул. Олимпийская, д. 13	36
11.	Автодорога от жилого дома по ул. Осипенко, д. 3 до жилого дома по ул. Осипенко, д. 18	39
12.	Автодорога от жилого дома по пер. Путейский, д. 1 до жилого дома по пер. Путейский, д. 4а	44
13.	Автодорога по пер. Рабочий от жилого дома по ул. Нефтяников д. 6а до ж д пути станции Якурим 730км	48
14.	Автодорога по пер. Связи от жилого дома по ул. Космодемьянской, д. 34 до жилого дома по ул. Хабарова, д.12	55
15.	Автодорога от жилого дома по ул. Северная, д. 3 до жилого дома по ул. Северная, д. 15	63
16.	Автодорога от жилого дома по ул. Мичурина, д. 3 до жилого дома по ул. Мичурина, д. 17	67
17.	Автодорога от автодороги ул. Черноморская до земельного участка по ул. Молодежная, 1А	70
18.	Автодорога от земельного участка по ул. Первопроходцев, д. 2 до земельного участка ул. Первопроходцев, д. 8	73
19.	Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до д.№4а по ул. Подгорная	76
20.	Автодорога по ул. Портовая от жилого дома по ул. Зыряновка, д.4 до примыкания с ул. Поконечный ручей	86
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Почтовая, д.2 до жилого дома по ул. Зверева, д.92	91
22.	Автодорога от жилого дома по ул. Малая, д.1 до жилого дома по ул. Малая, д.7	98
23.	Автодорога от земельного участка по ул. Матросова, уч. № 16 до жилого дома по ул. Матросова, д. 65	102
24.	Автодорога по ул. Майская от жилого дома по ул. Майская, д.9 до земельного участка по ул. Майская, д. 17	107
25.	Автодорога от жилого дома по ул. Островского, д. 2 до жилого дома по ул. Островского, д.26	110
26.	Автодорога от пересечения ул. Корчагина с автодорогой по ул. Черноморская до жилого дома по ул. Корчагина, д. 8	114
27.	Автодорога от жилого дома по пер. Павлова, д.1 до жилого дома по пер. Павлова, д. 7	117
28.	Автодорога от жилого дома по ул. Панихинская, д. 1а, до жилого дома по ул. Панихинская, д. 27	120
29.	Автодорога общего пользования от жилого дома по ул. Лазо, д. 56 до жилого дома по ул. Лазо, д. 2а	123
30.	Автодорога по ул. Ленина от примыкания с автодорогой ул. Дачная до жилого дома по ул. Звёздинская д. 22	130
31.	Автодорога по ул. 2-я Молодежная от автодороги ул. Волжская до территории МОУ СОШ № 7 ул. 2-я Набережная, 13	134
32.	Автодорога по ул. Монтажная от автодороги по ул. Энтузиастов (северная сторона) до ул. Ангарстроевская (южная сторона)	138
33.	Автодорога от жилого дома по ул. Нагорная, д. 7 до жилого дома по ул. Нагорная, д. 25	143
34.	Автодорога по ул. Обнорского от жилого дома по ул. Некрасова, д. 20, до жилого дома по ул. Васильевского, д. 9	147
35.	Обосновывающая часть ПОДД	150

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги

Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд


Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Первомайская, д.1 до жилого дома по ул. Первомайская, д. 64

1-й участок: км 0+000 - км 1+548


2-й участок: км 0+000 - км 0+090

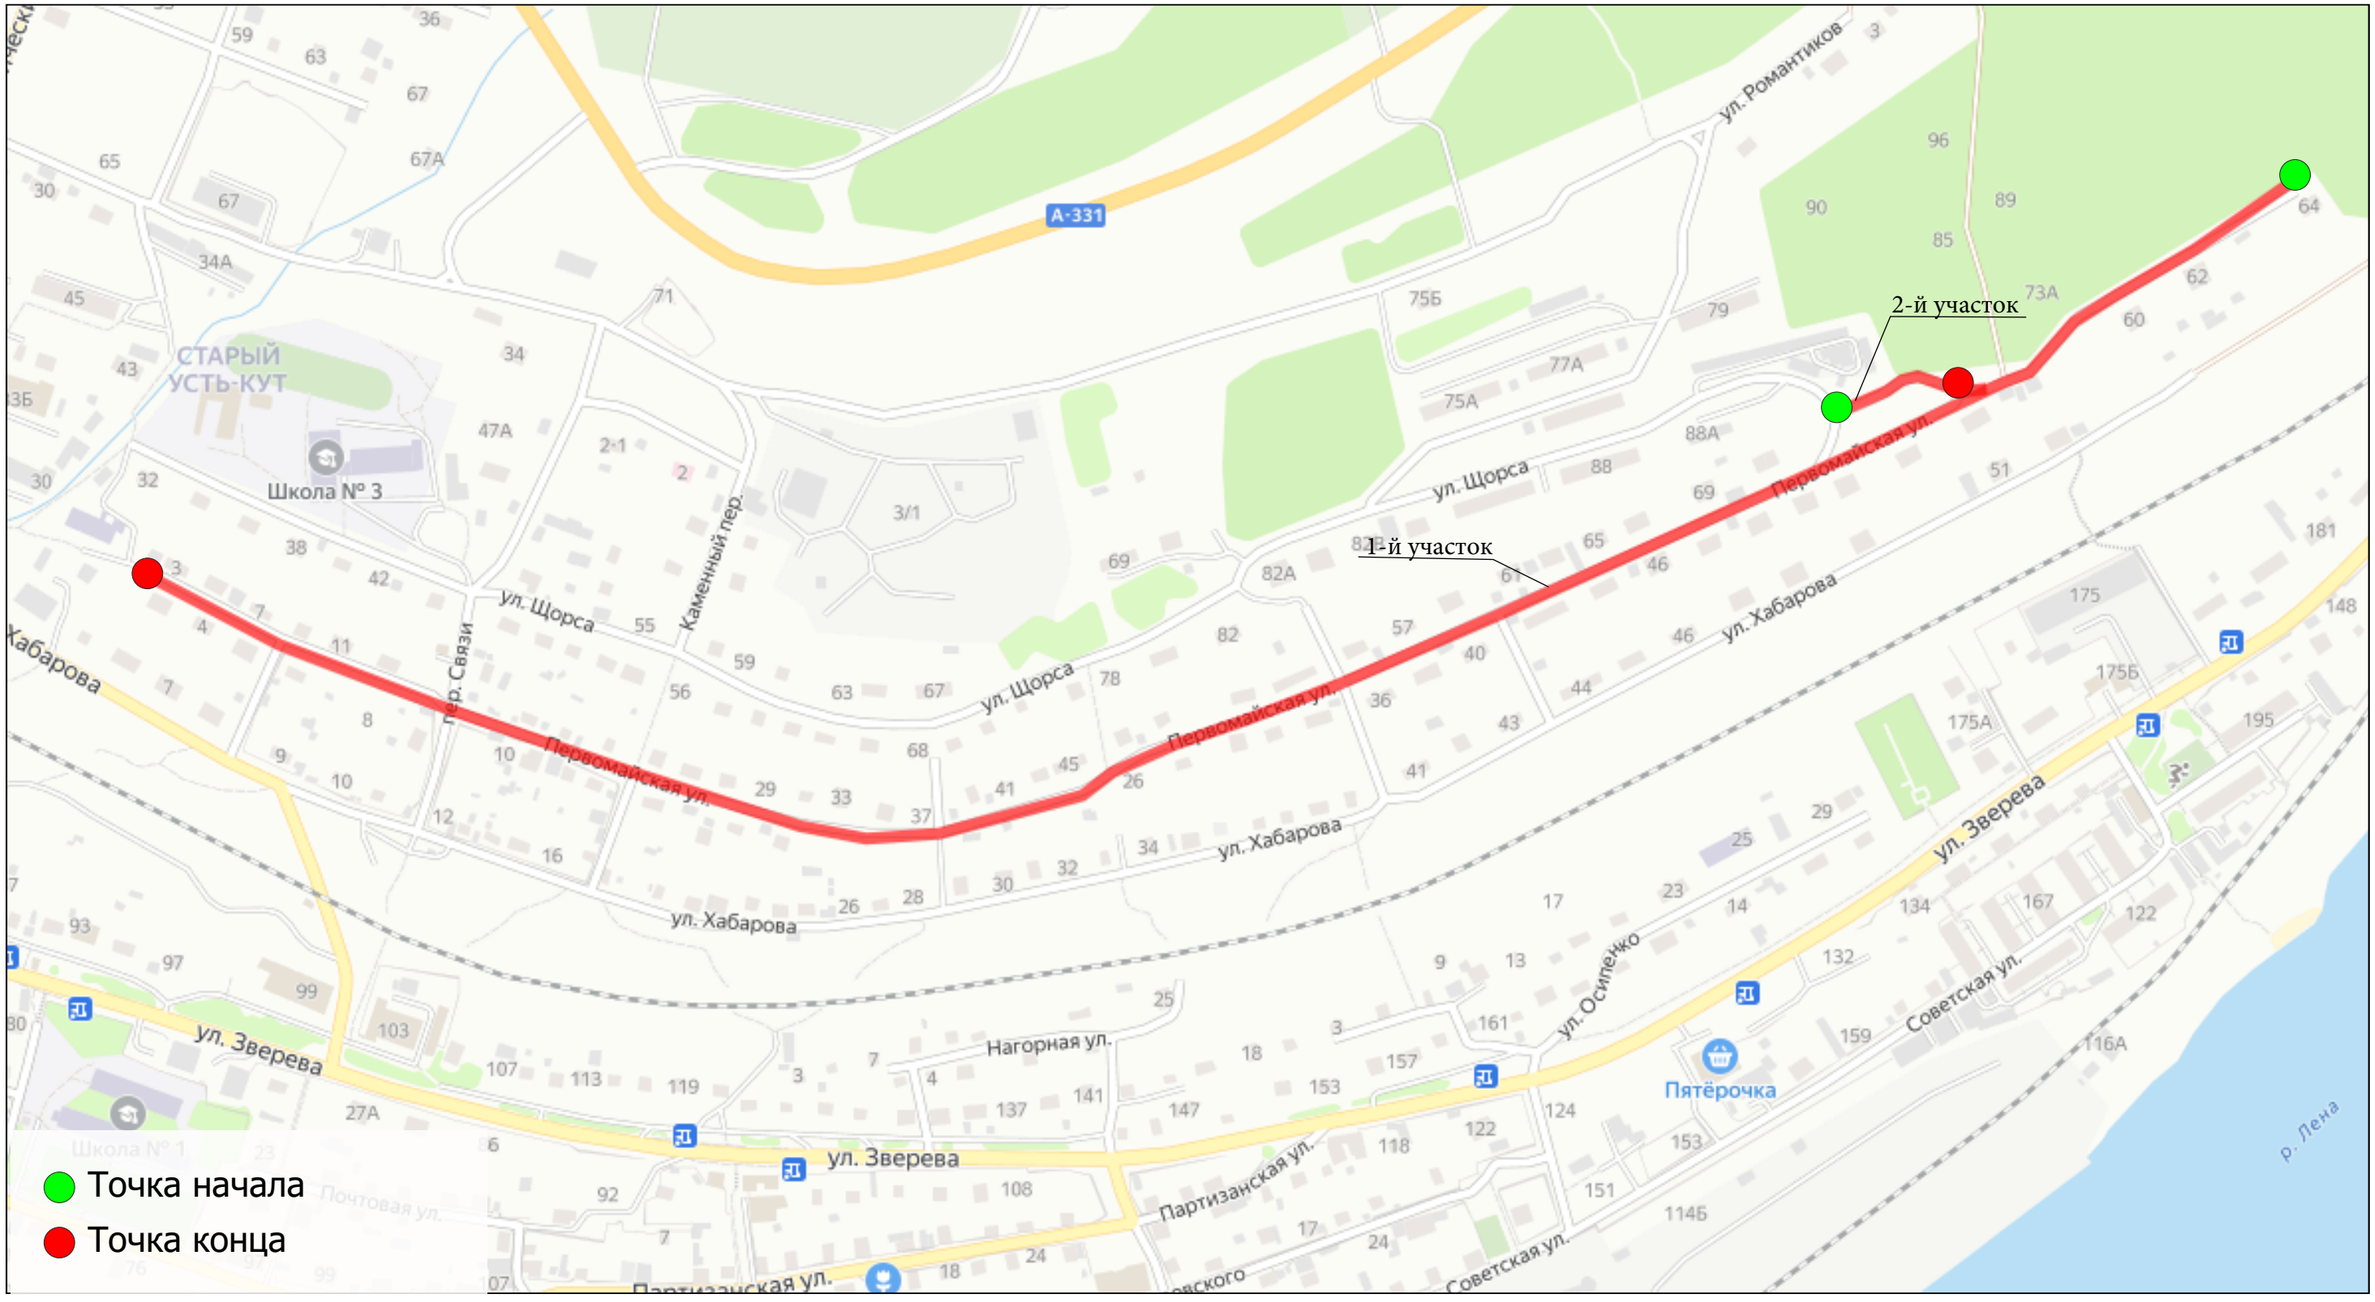

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Первомайская, д.1 до жилого дома по ул. Первомайская, д. 64, 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	32 — 99 — 25 — R=4096м — 172 — 7 — 376 — 3 — R=2627м — 460 — 35 — 517 — 33 — R=3318м — 694 — 21 — 909 — 15 — R=4715м
Кривые в плане	459 — R=319м P=16; a=11° — 559
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 5,00 — 105 — 3,20 — 220 — 4,50

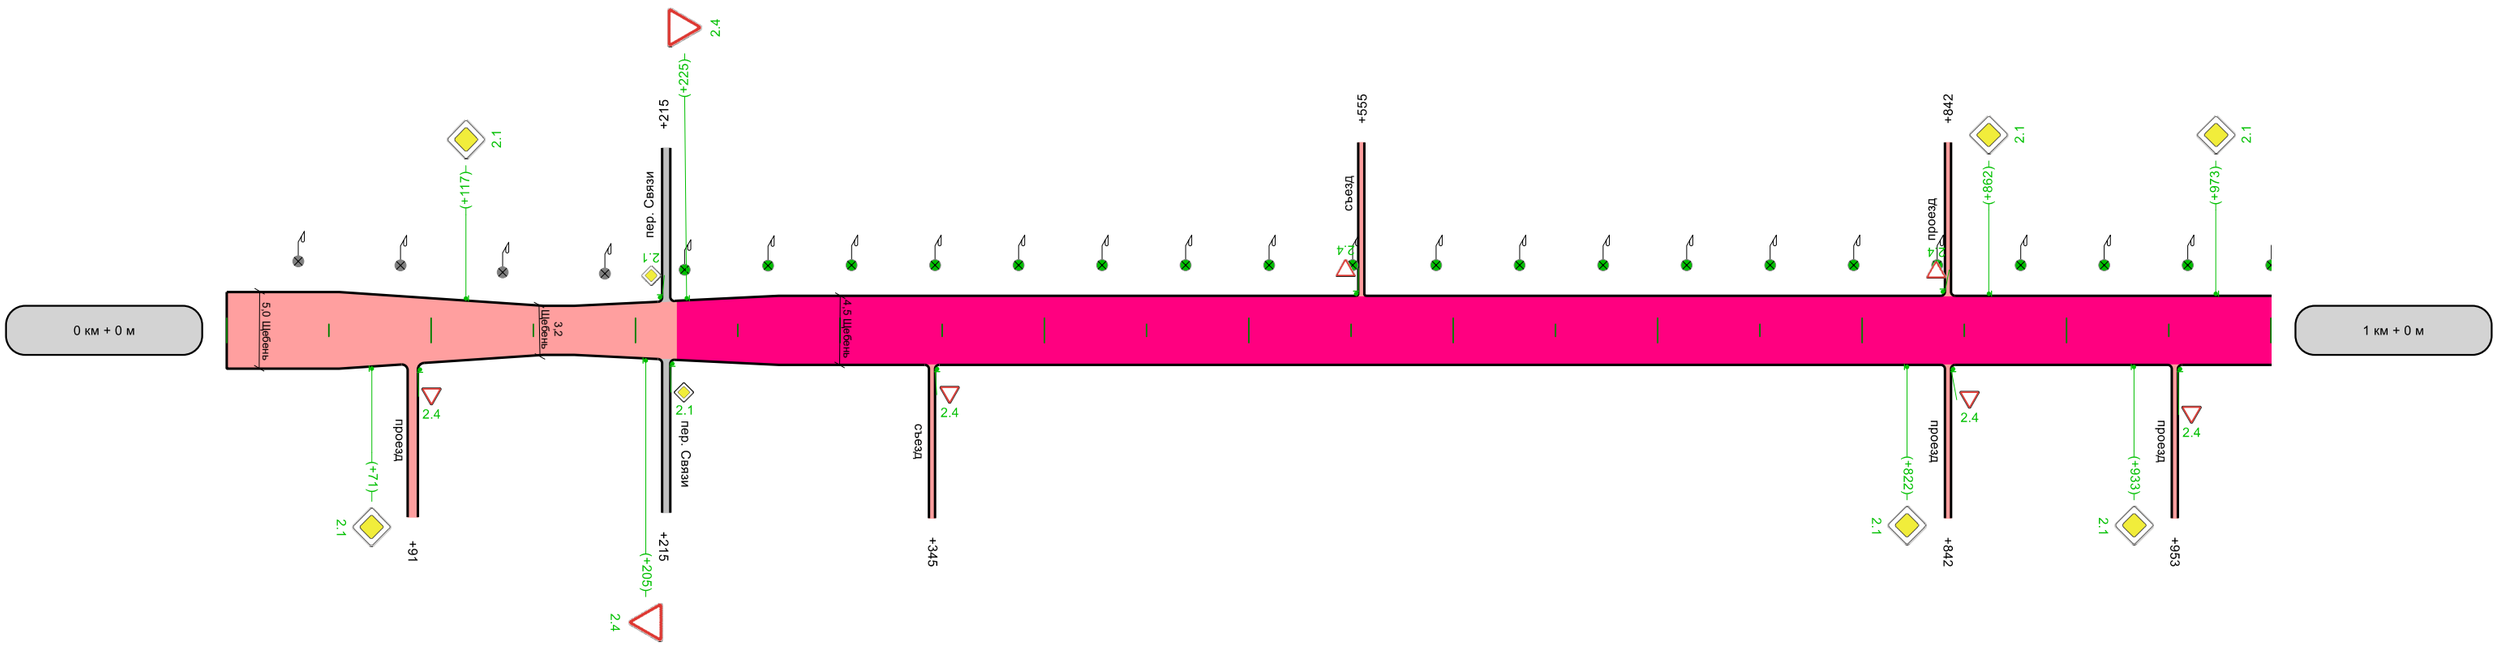

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле	15 R=4715м 20 73	268	40 293 32 319 R=2087м	28 443	
Кривые в плане					
Тротуары слева					
Характеристики проезжей части	4,50	3,00	6,00	468	3,00

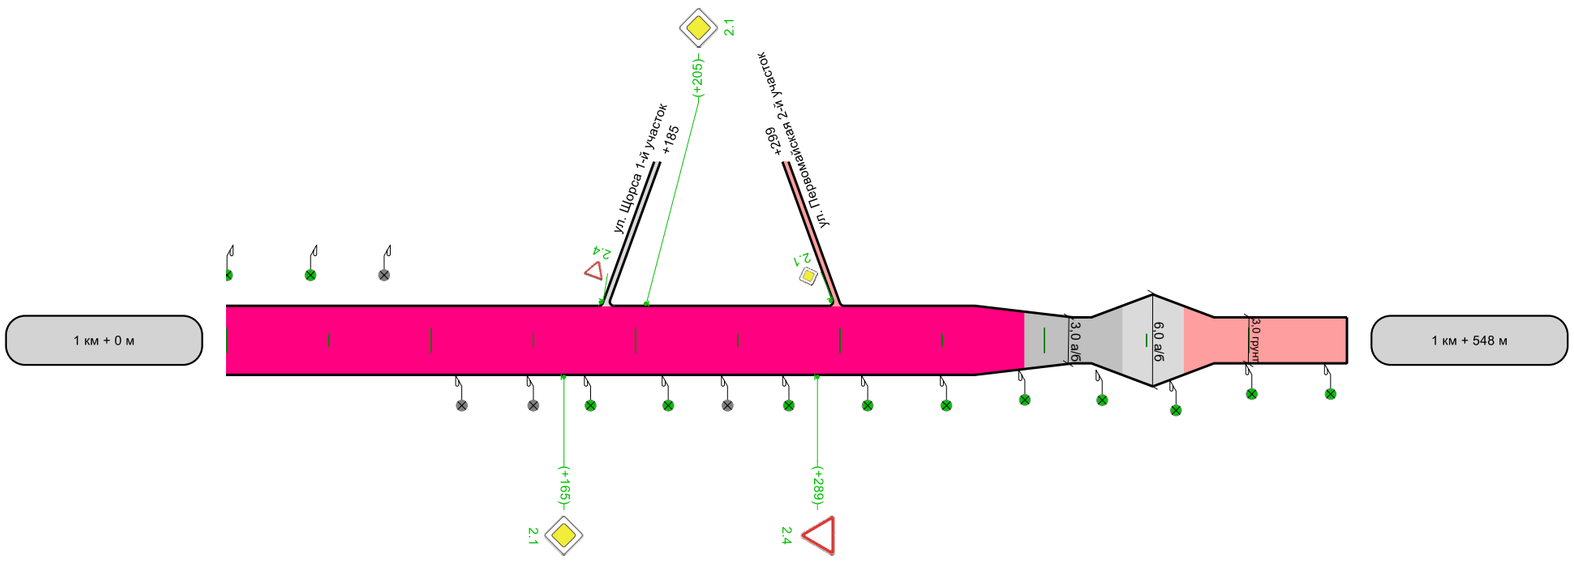

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+071	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+117	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+822	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+862	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+933	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+973	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			1+165	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			1+205	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+205	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+225	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			1+289	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+185	Населенный пункт	4/4	0	150	Слева
2	0+224	1+041	Населенный пункт	21/21	817	0	Слева
3	1+077	1+077	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	1+115	1+150	Населенный пункт	2/4	0	35	Справа
5	1+178	1+216	Населенный пункт	2/2	38	0	Справа
6	1+245	1+245	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
7	1+275	1+540	Населенный пункт	8/8	265	0	Справа
Итого:				**39/41**	**1120**	**185**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 108 2 R=990м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,30

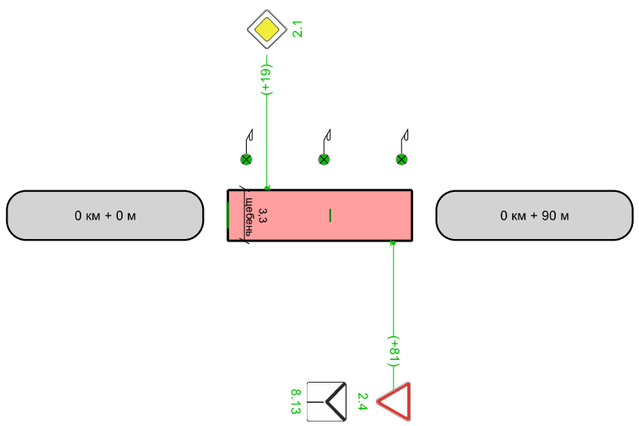

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+019	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+081	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+081	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+090	Населенный пункт	3/3	80	0	Слева
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Первооткрывателей, д. 2 до жилого дома по ул. Первооткрывателей, д. 10

1-й участок: км 0+000 - км 0+439
2-й участок: км 0+000 - км 0+056

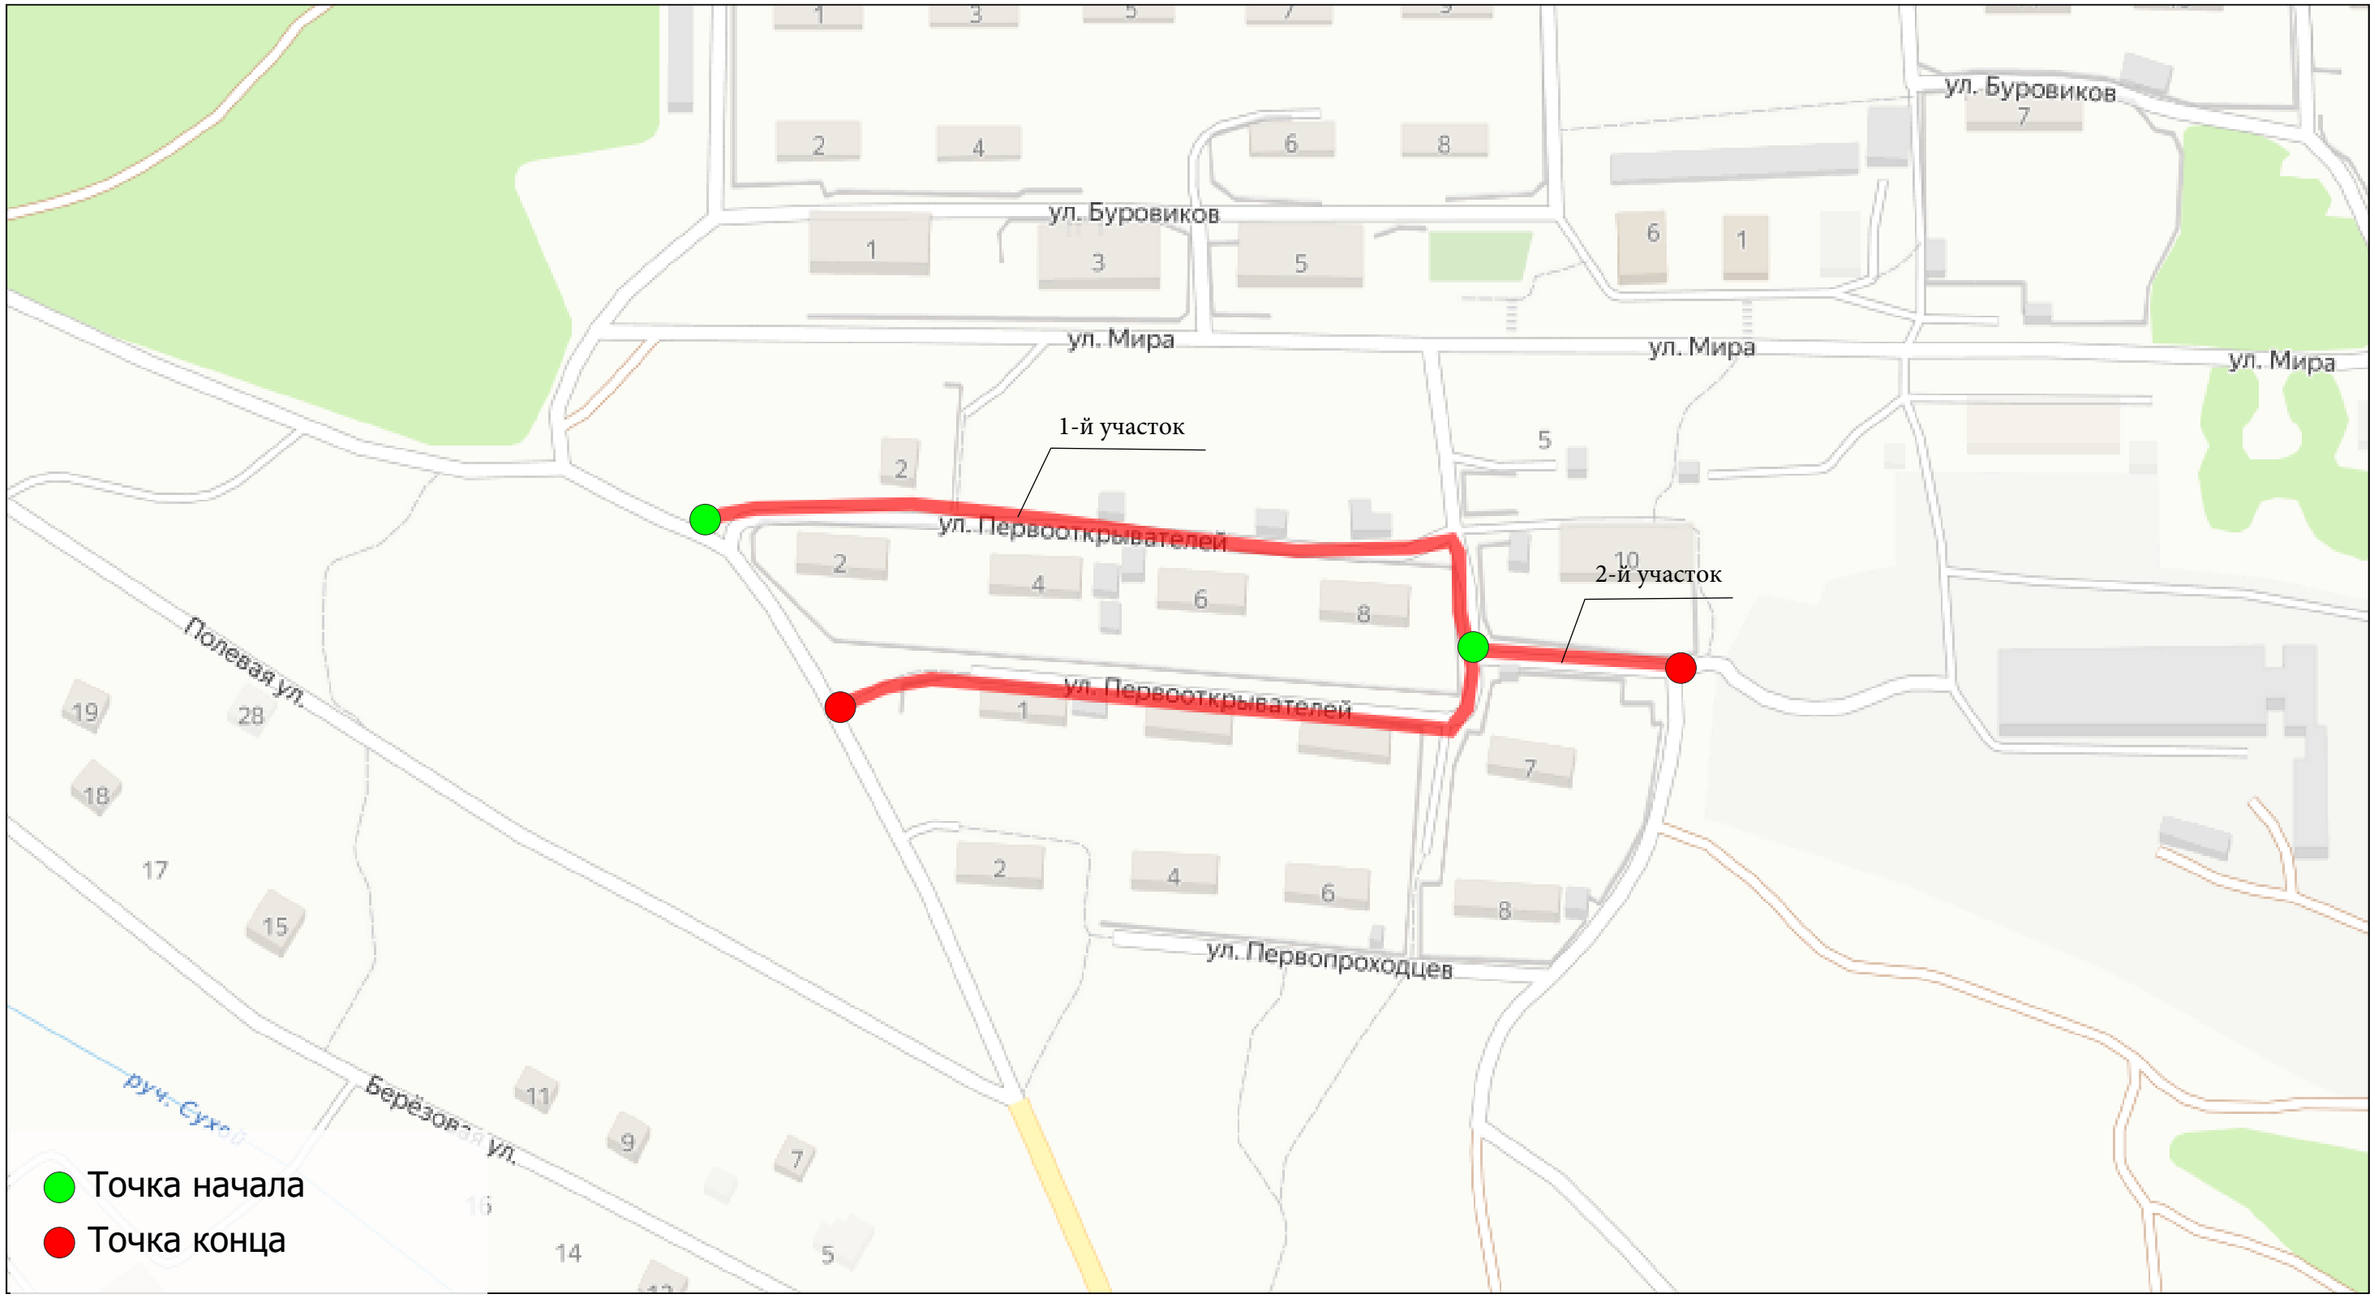

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 64 2 R=3166м 213 3
Кривые в плане	203 R=10м P=0; a=90° 219 241 R=10м P=0; a=90° 265
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50 300 3,50

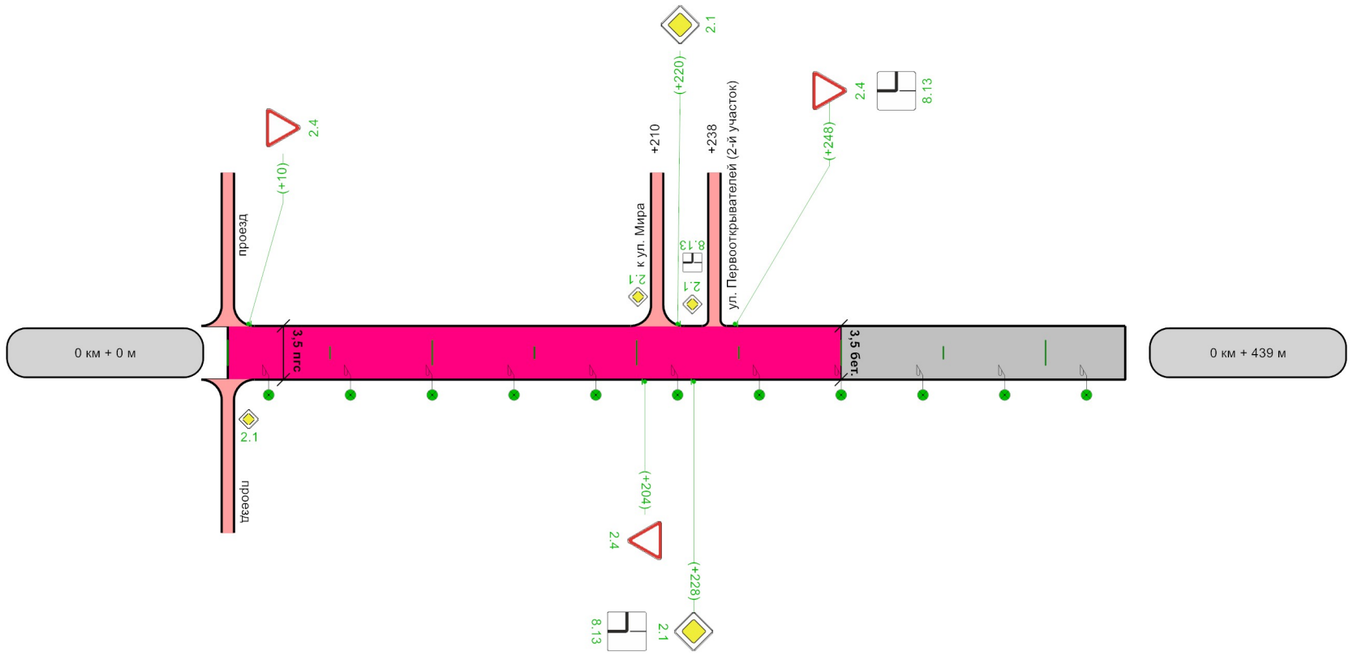

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+220	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+228	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+204	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+248	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.13	Направление главной дороги			0+228	Требуется установить	1	справа
7	8.13	Направление главной дороги			0+248	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					7	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+420	Населенный пункт	11/11	400	0	Справа
Итого:				11/11	400	0	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

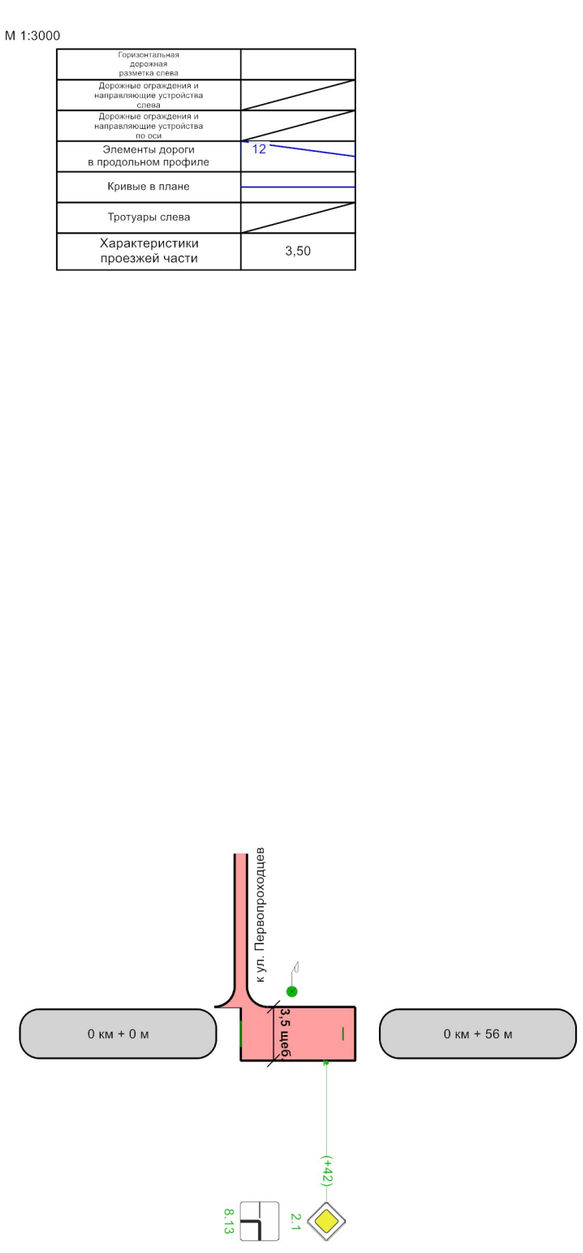

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+042	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
2	8.13	Направление главной дороги			0+042	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+025	0+025	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**1/1**	**0**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Сосновая, д. 8 до земельного участка по ул. Новая, участок 15
км 0+000 - км 0+392

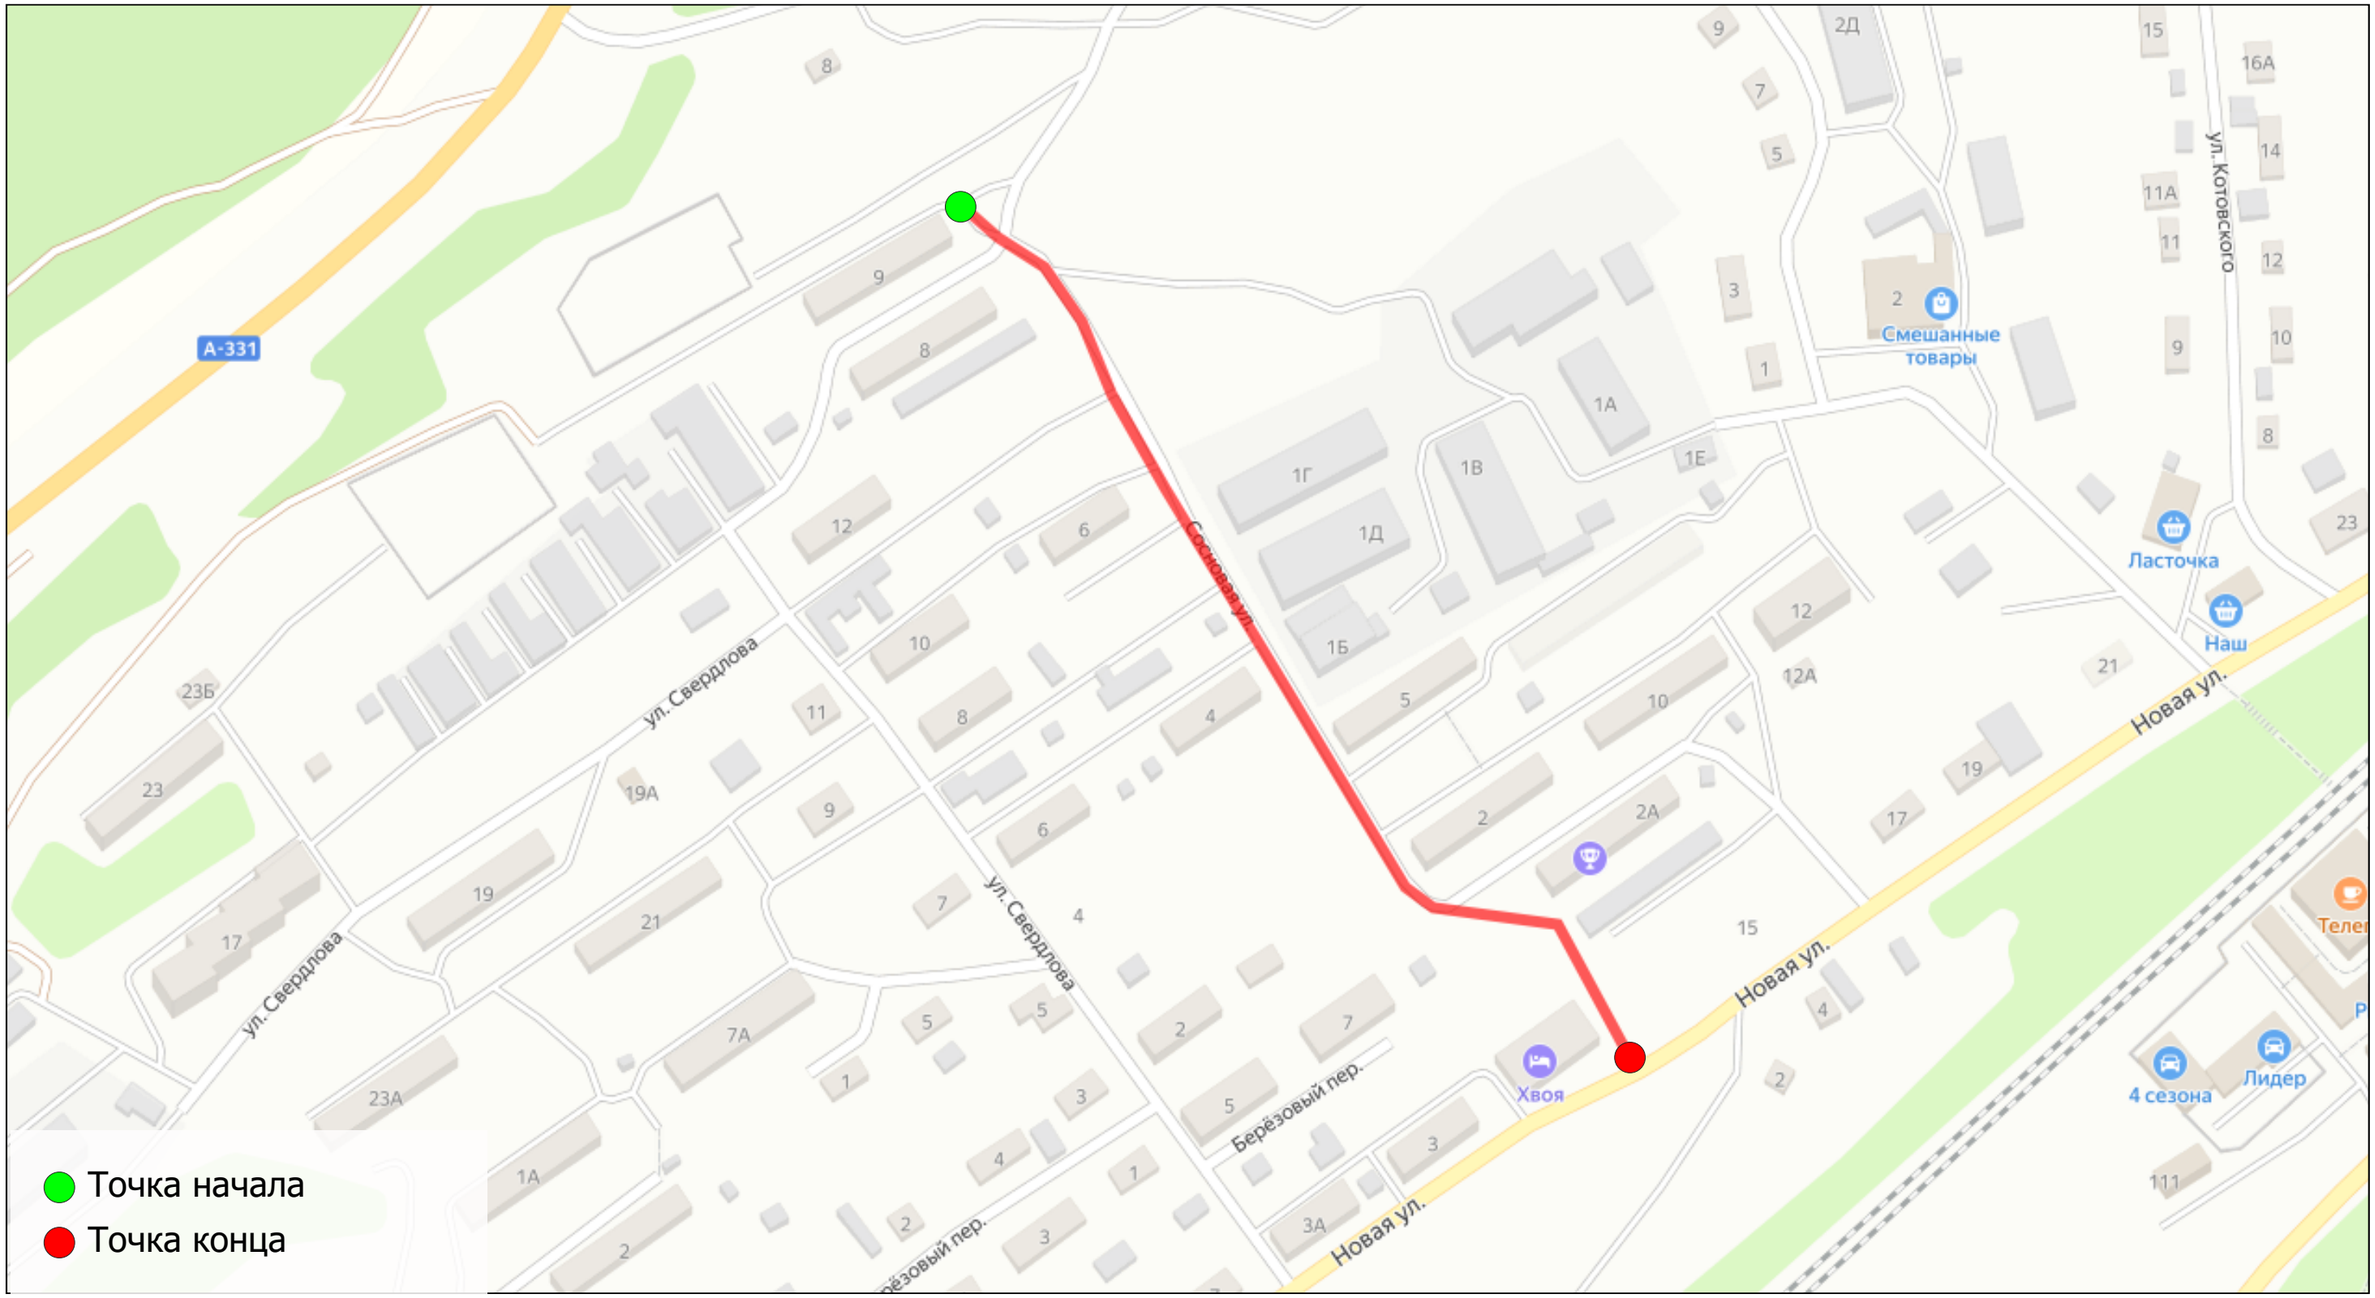

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 174 R=2206м 114 132 120 212 R=1883м 76 294
Кривые в плане	287 R=48м 317 P=1; д=40° 335 353
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

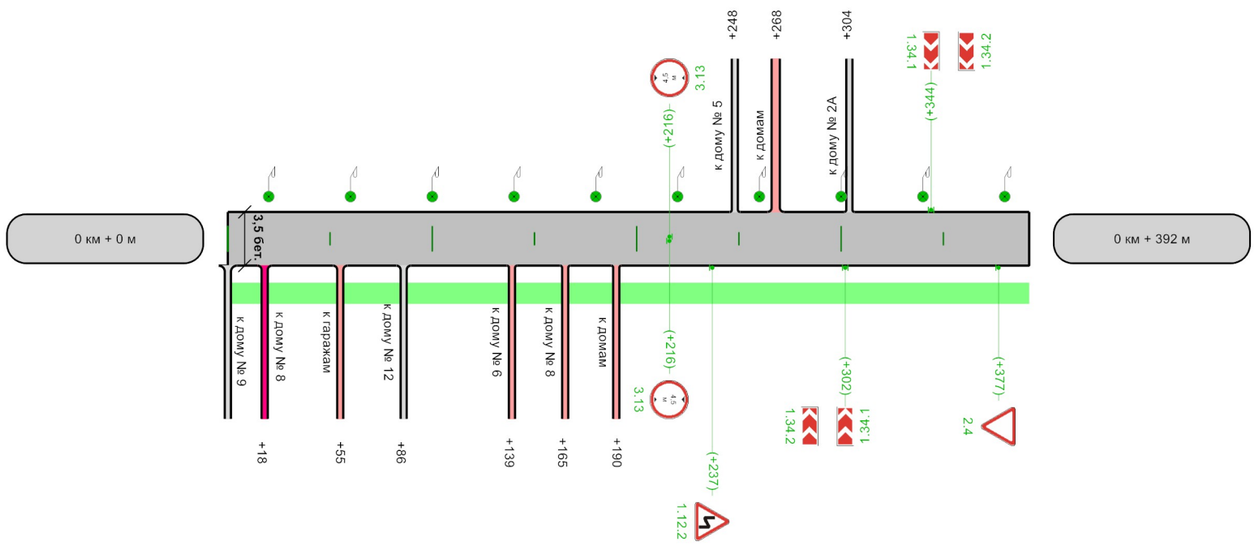

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 392

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+237	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+302	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+344	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+302	Требуется установить	1	справа
5	1.34.2	Направление поворота			0+344	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки приоритета						
7	2.4	Уступите дорогу			0+377	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
8	3.13	Ограничение высоты			0+216	Требуется установить	1	по центру в обратном направлении
9	3.13	Ограничение высоты			0+216	Требуется установить	1	по центру в прямом направлении
		Итого установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+380	Населенный пункт	10/10	360	0	Слева
Итого:				**10/10**	**360**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+392	Жилая застройка	Справа	405	
Итого:					**405**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Софьи Перовской от д. №37 по ул. Набережная до д. №114 по ул. Советская
км 0+000 - км 0+161

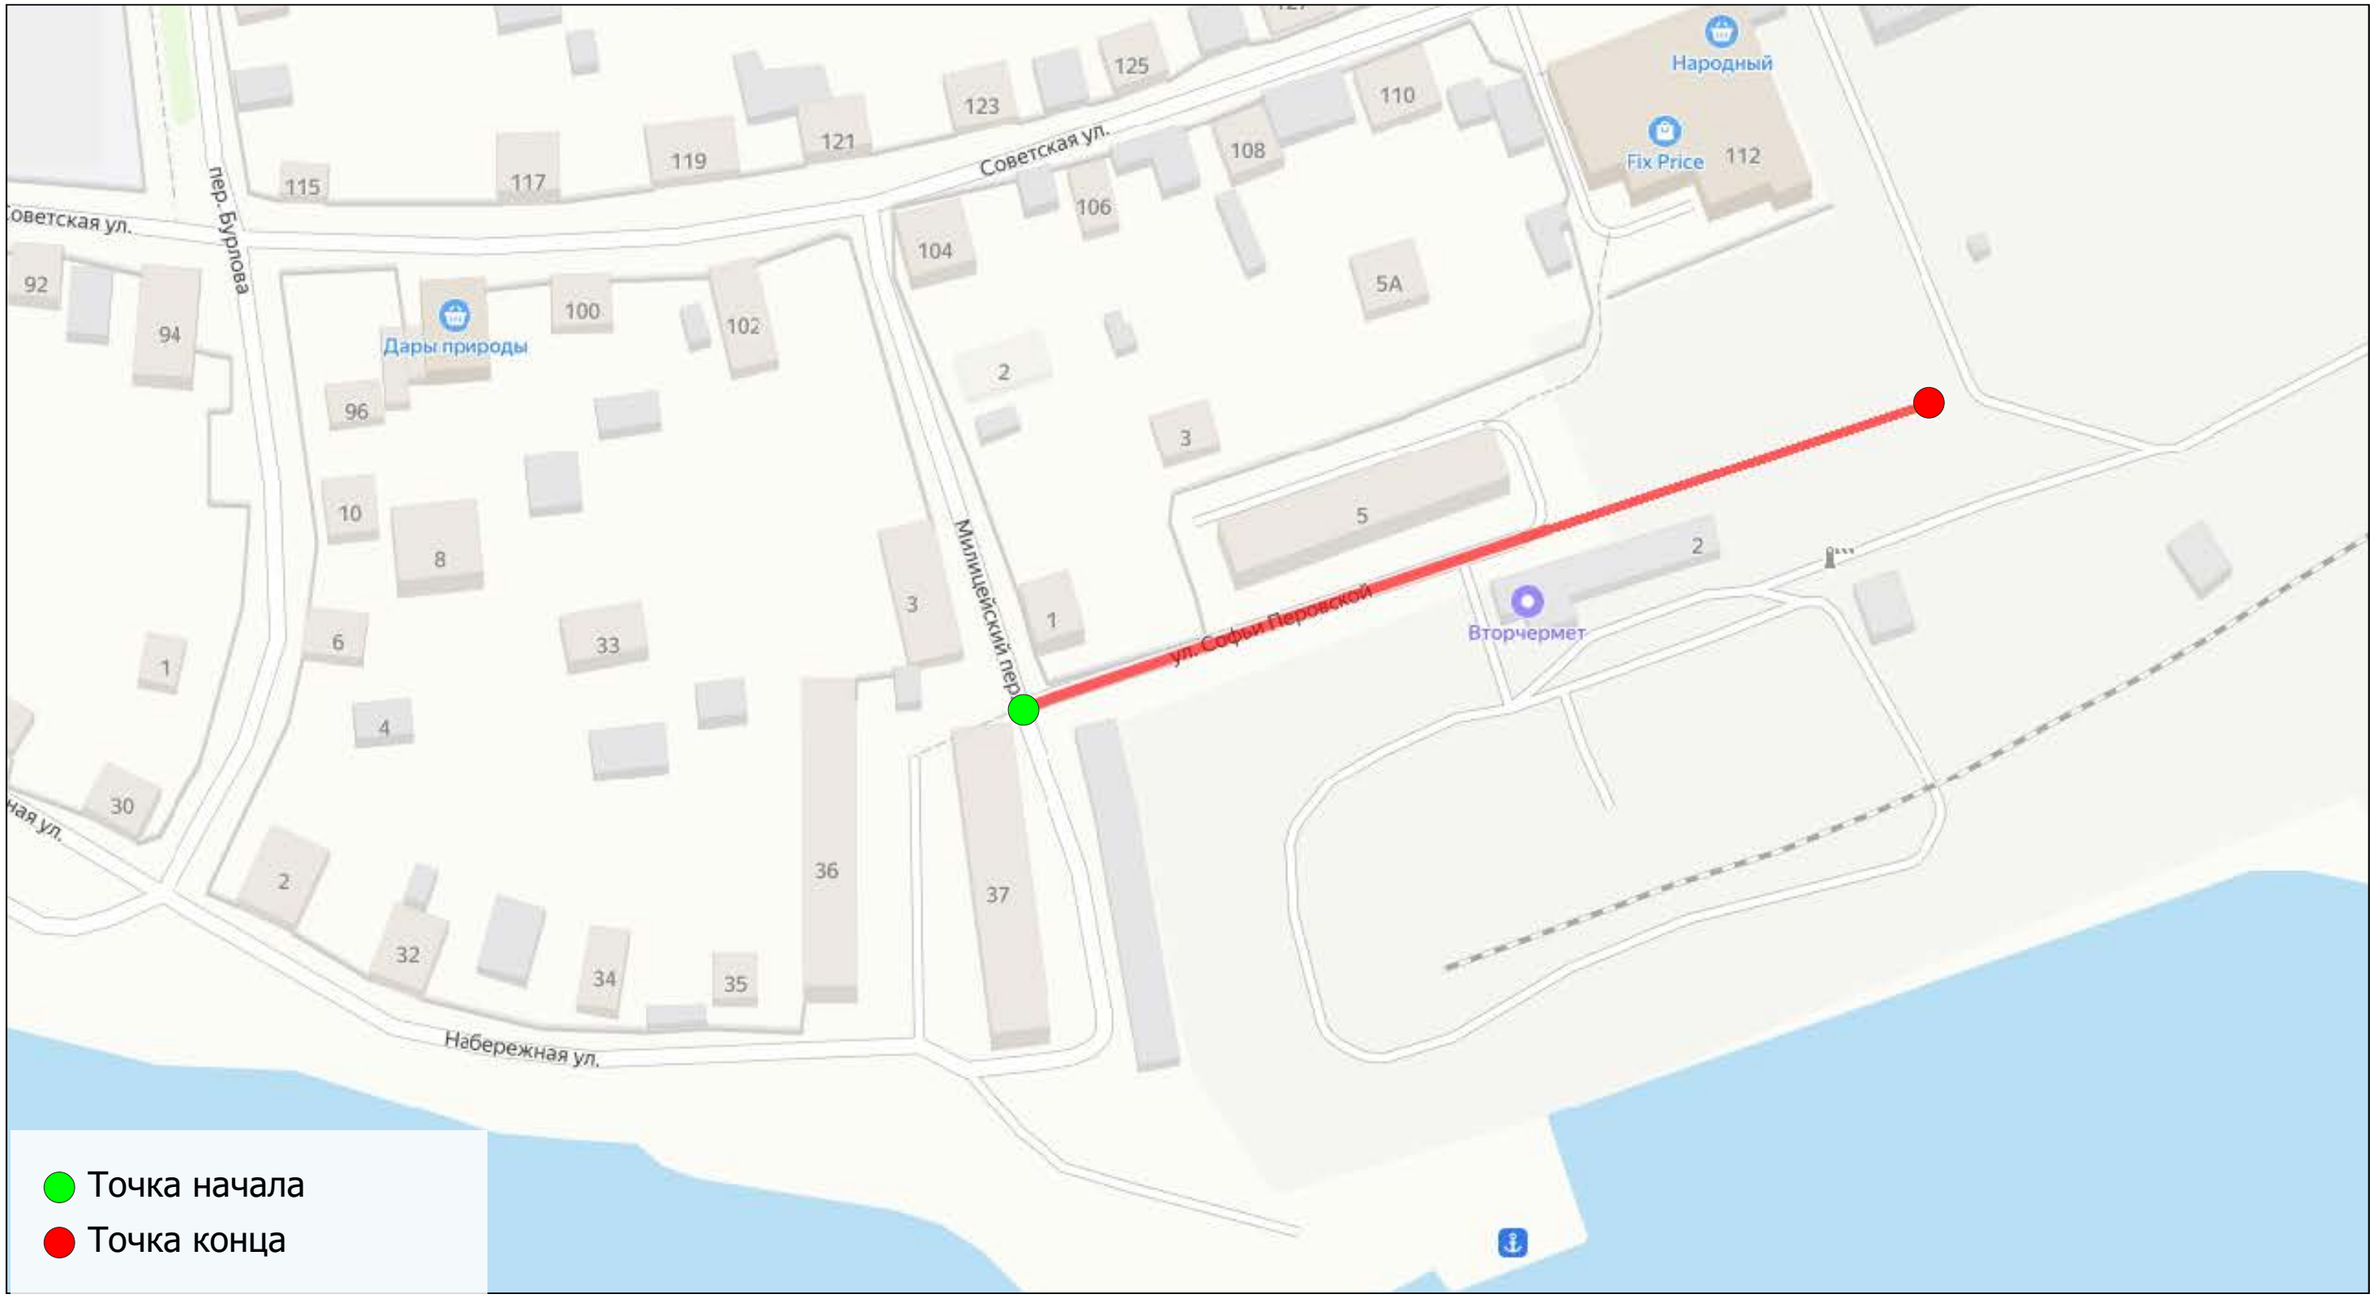

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	37
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,70

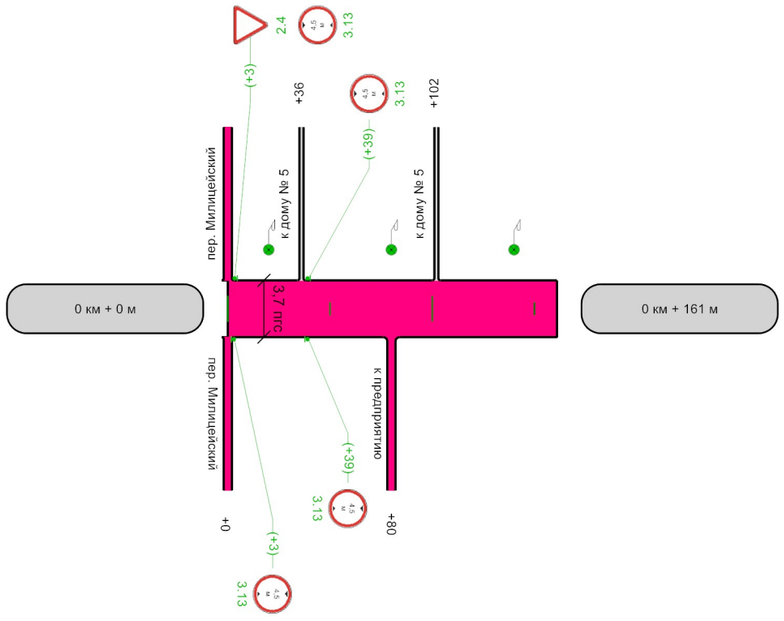

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+003	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+003	Требуется установить	1	слева
3	3.13	Ограничение высоты			0+003	Требуется установить	1	справа
4	3.13	Ограничение высоты			0+039	Требуется установить	1	слева
5	3.13	Ограничение высоты			0+039	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+140	Населенный пункт	3/3	120	0	Слева
Итого:				**3/3**	**120**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Спартака, д. 1 до жилого дома по ул. Чапаева, д 43


км 0+000 - км 0+877

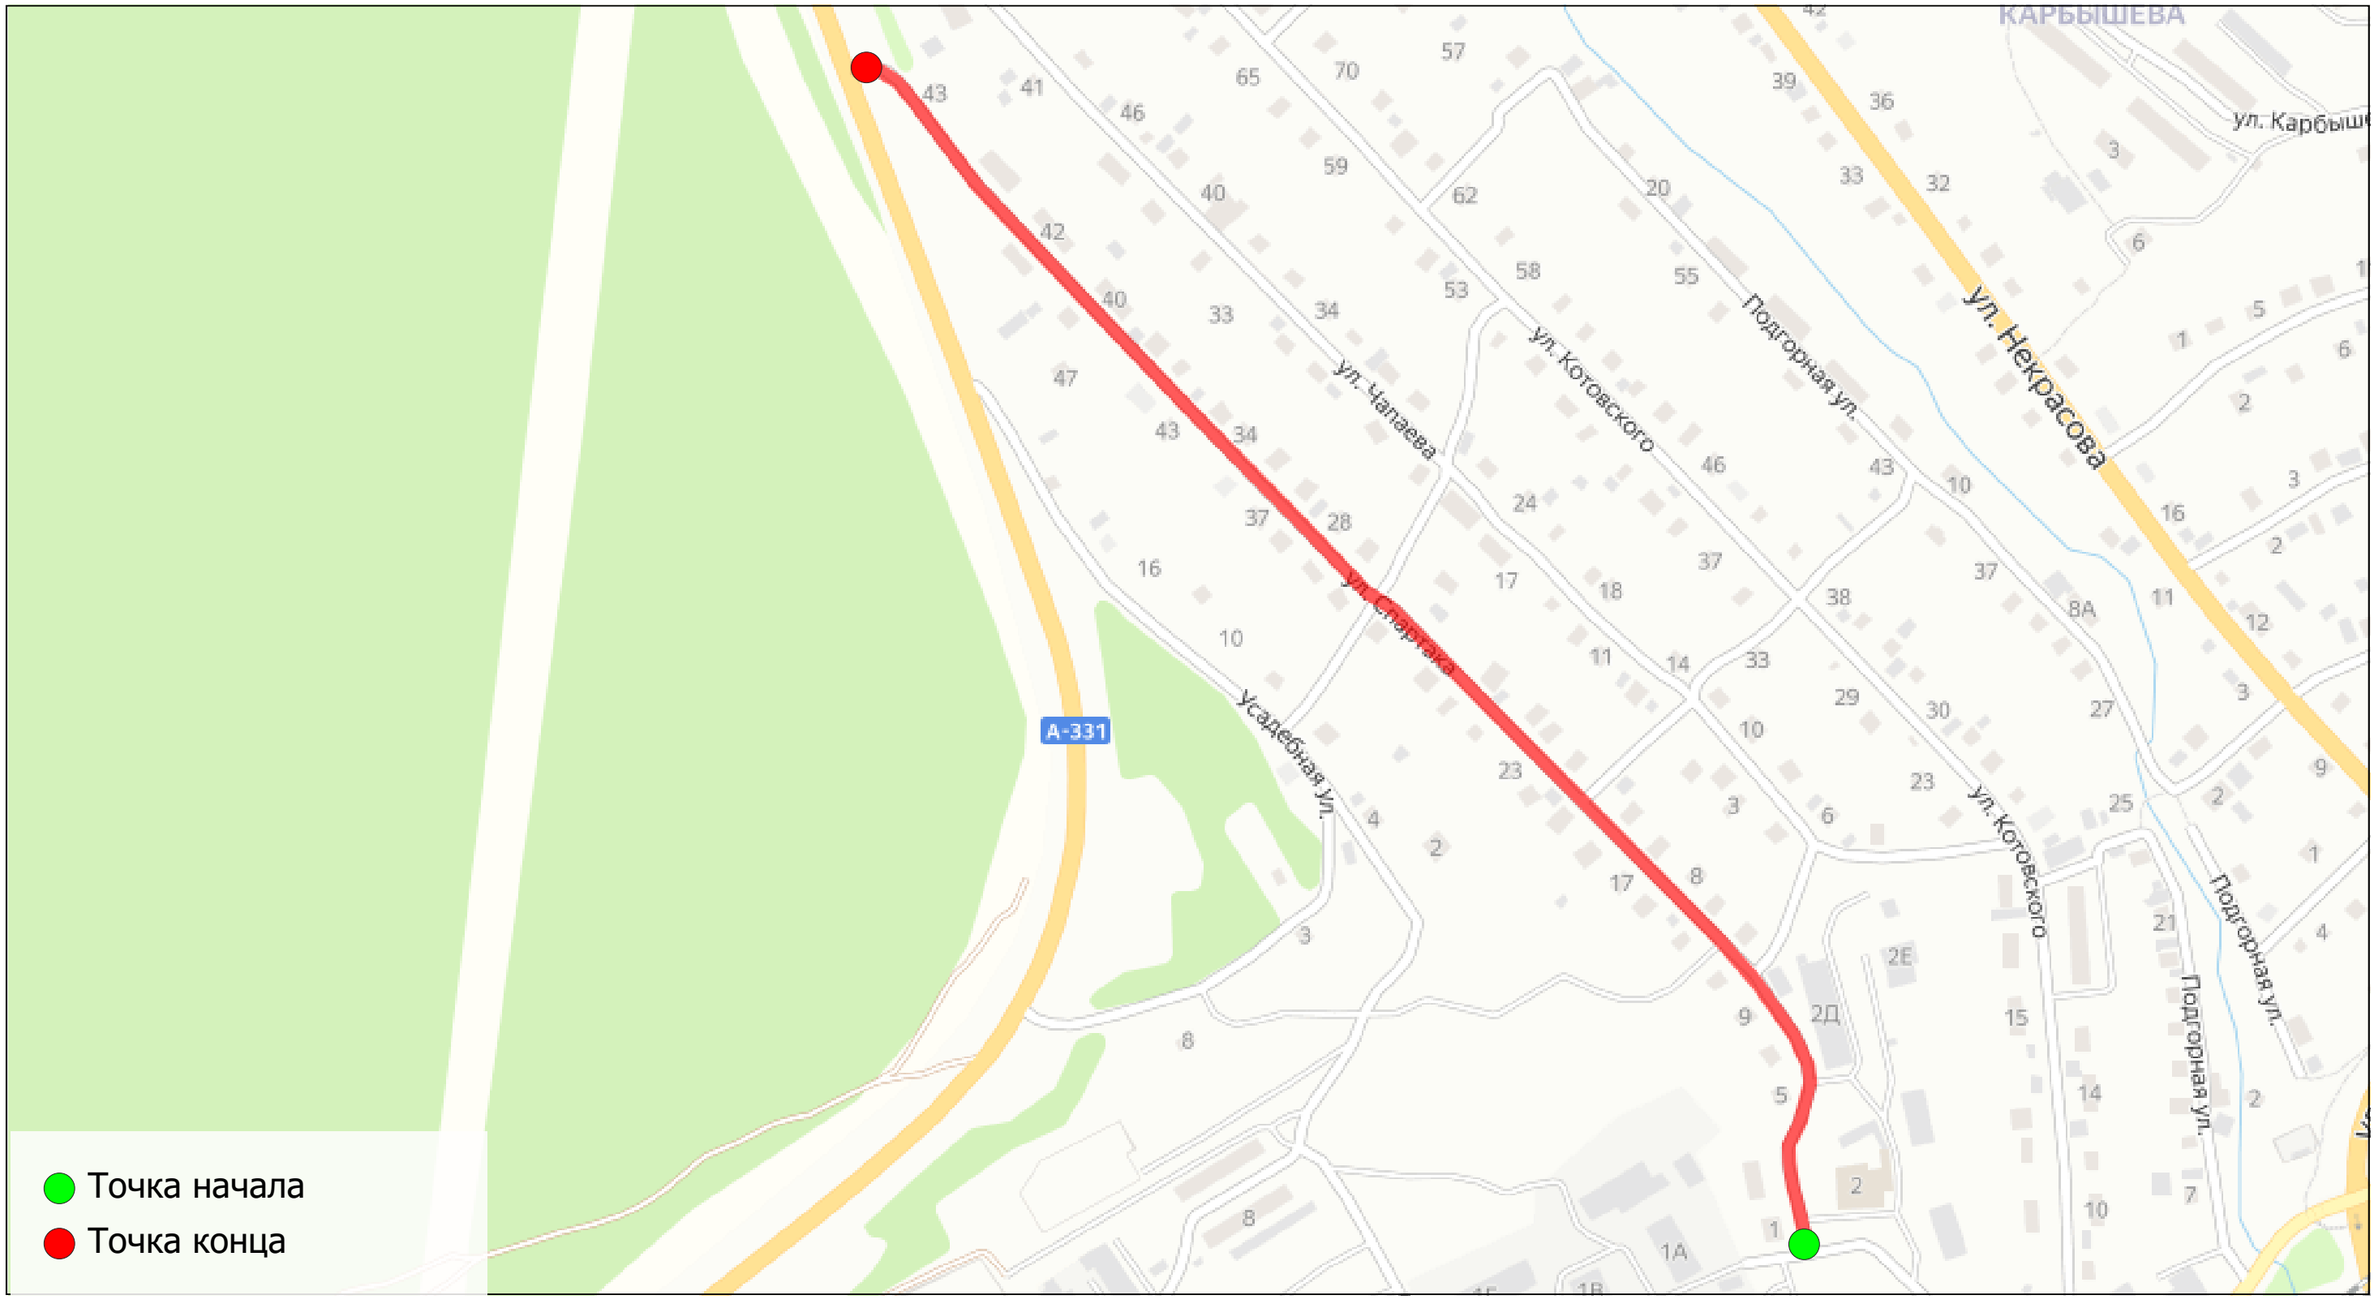

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Спартака, д. 1 до жилого дома по ул. Чапаева, д 43

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 3 66 R=3616м 81 44 112 45 R=4466м 185 62 228 61 R=4632м 387 96 630 94 R=2616м 680 74 729 77 R=2447м 797 49
Кривые в плане	714 R=183м P=5; a=21° 780
Тротуары слева	н/д: ширина 2м, а/б, 731 - 848
Характеристики проезжей части	0 4,40 731 4,70

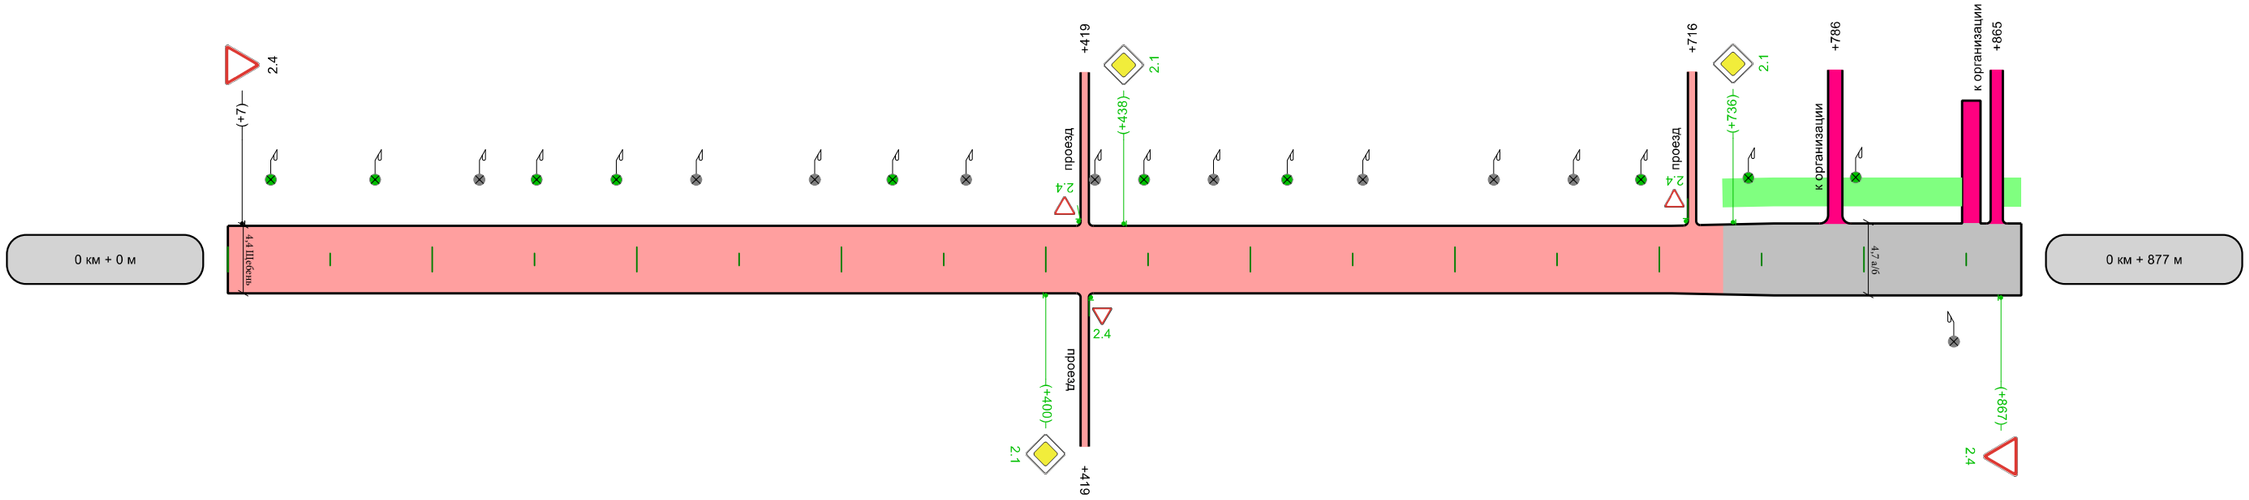

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+438	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+736	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+007	Установлено	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+867	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021	0+072	Населенный пункт	2/2	51	0	Слева
2	0+123	0+123	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+151	0+190	Населенный пункт	2/2	39	0	Слева
4	0+229	0+229	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+287	0+287	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
6	0+325	0+325	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+361	0+424	Населенный пункт	2/2	0	63	Слева
8	0+448	0+448	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
9	0+482	0+482	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
10	0+518	0+518	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
11	0+555	0+555	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
12	0+619	0+658	Населенный пункт	2/2	0	39	Слева
13	0+691	0+796	Населенный пункт	3/3	105	0	Слева
14	0+844	0+844	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**20/20**	**195**	**102**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+731	0+848	Населенный пункт	Слева	117	
2	0+867	0+877	Населенный пункт	Слева	10	
Итого:					**127**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по пер. Спортивный от жилого дома по ул. Речников, д.4а до жилого дома по ул. Пролетарская, д. 4


км 0+000 - км 0+176

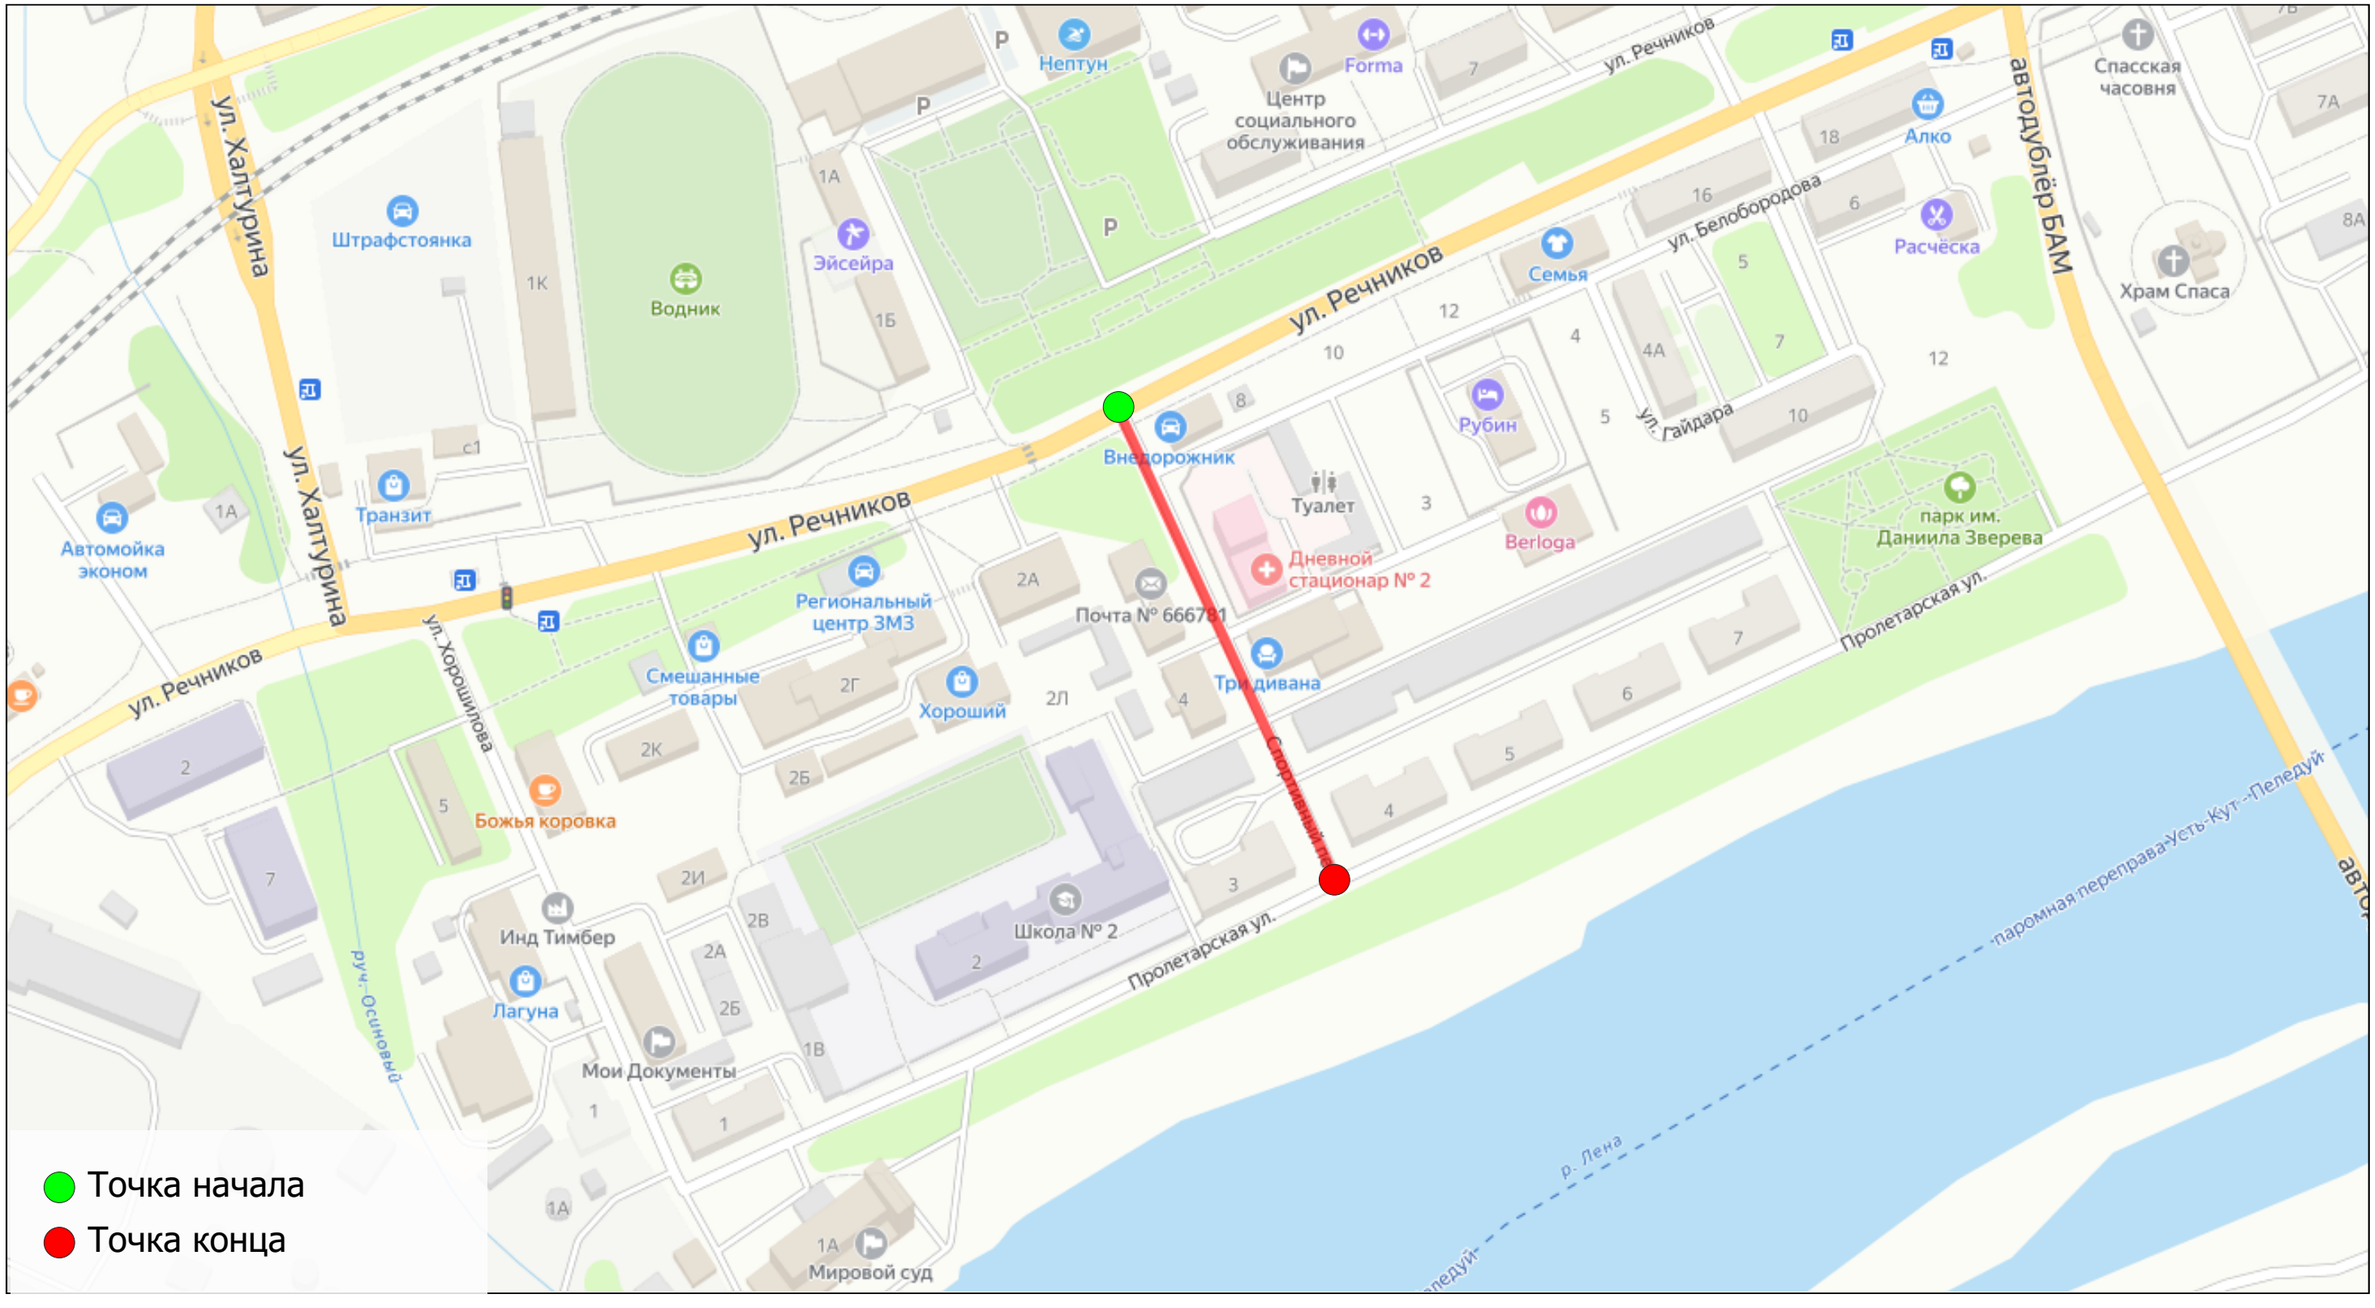

Автодорога по пер. Спортивный от д. №4а по ул. Речников до д. №4 по ул. Пролетарская

М 1:3000

1-ая от осевой	1.1 0 - 19 · 1.7 19 - 28 · 1.1 28 - 37 · 1.7 37 - 46 · 1.1 46 - 57 · 1.7 57 - 65 · 1.1 65 - 75 · 1.7 75 - 93 · 1.1 93 - 109 · 1.7 109 - 122 · 1.1 122 - 134 · 1.7 134 - 143
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 · 71 · 9 · R=4186м · 139 · 9
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 · 6,70

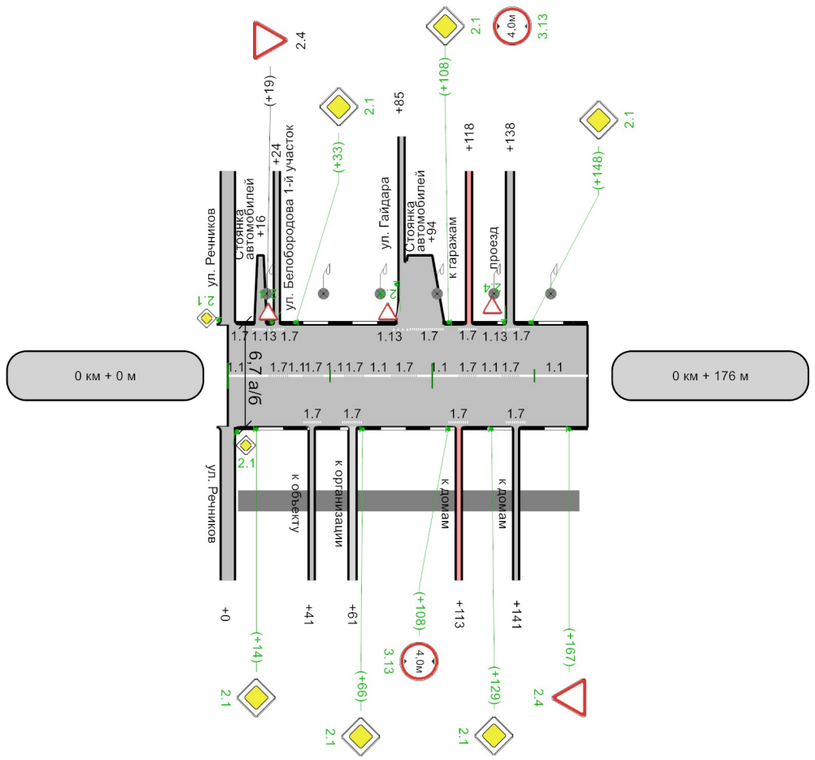

осевая	1.1 0 - 19 · 1.7 19 - 28 · 1.1 28 - 37 · 1.7 37 - 46 · 1.1 46 - 57 · 1.7 57 - 65 · 1.1 65 - 75 · 1.7 75 - 93 · 1.1 93 - 109 · 1.7 109 - 122 · 1.1 122 - 134 · 1.7 134 - 143
1-ая от осевой	1.7 37 - 46 · 1.7 66 · 1.7 108 - 118 · 1.7 136 - 146 · 1.1 156 - 176
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 1,5м, а/б, 5 - 172

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	186,000	36,000	172,000	30,800
ИТОГО	186,000	36,000	172,000	30,800
ЛИН.КМ	0,186	0,036	0,172	
ПРИВЕД.КМ	0,186	0,036	0,086	
ПЛОЩАДЬ	18,600	3,600	8,600	30,800

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+035	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+070	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+137	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+157	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+020	Установлено	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+177	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
9	3.13	Ограничение высоты			0+115	Требуется установить	1	слева
10	3.13	Ограничение высоты			0+115	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+019	0+158	Населенный пункт	6/6	0	139	Слева
Итого:				**6/6**	**0**	**139**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+005	0+172	Жилая застройка	Справа		167
Итого:						**167**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Олимпийская, д. 1а до жилого дома по ул. Олимпийская, д. 13

км 0+000 - км 0+478

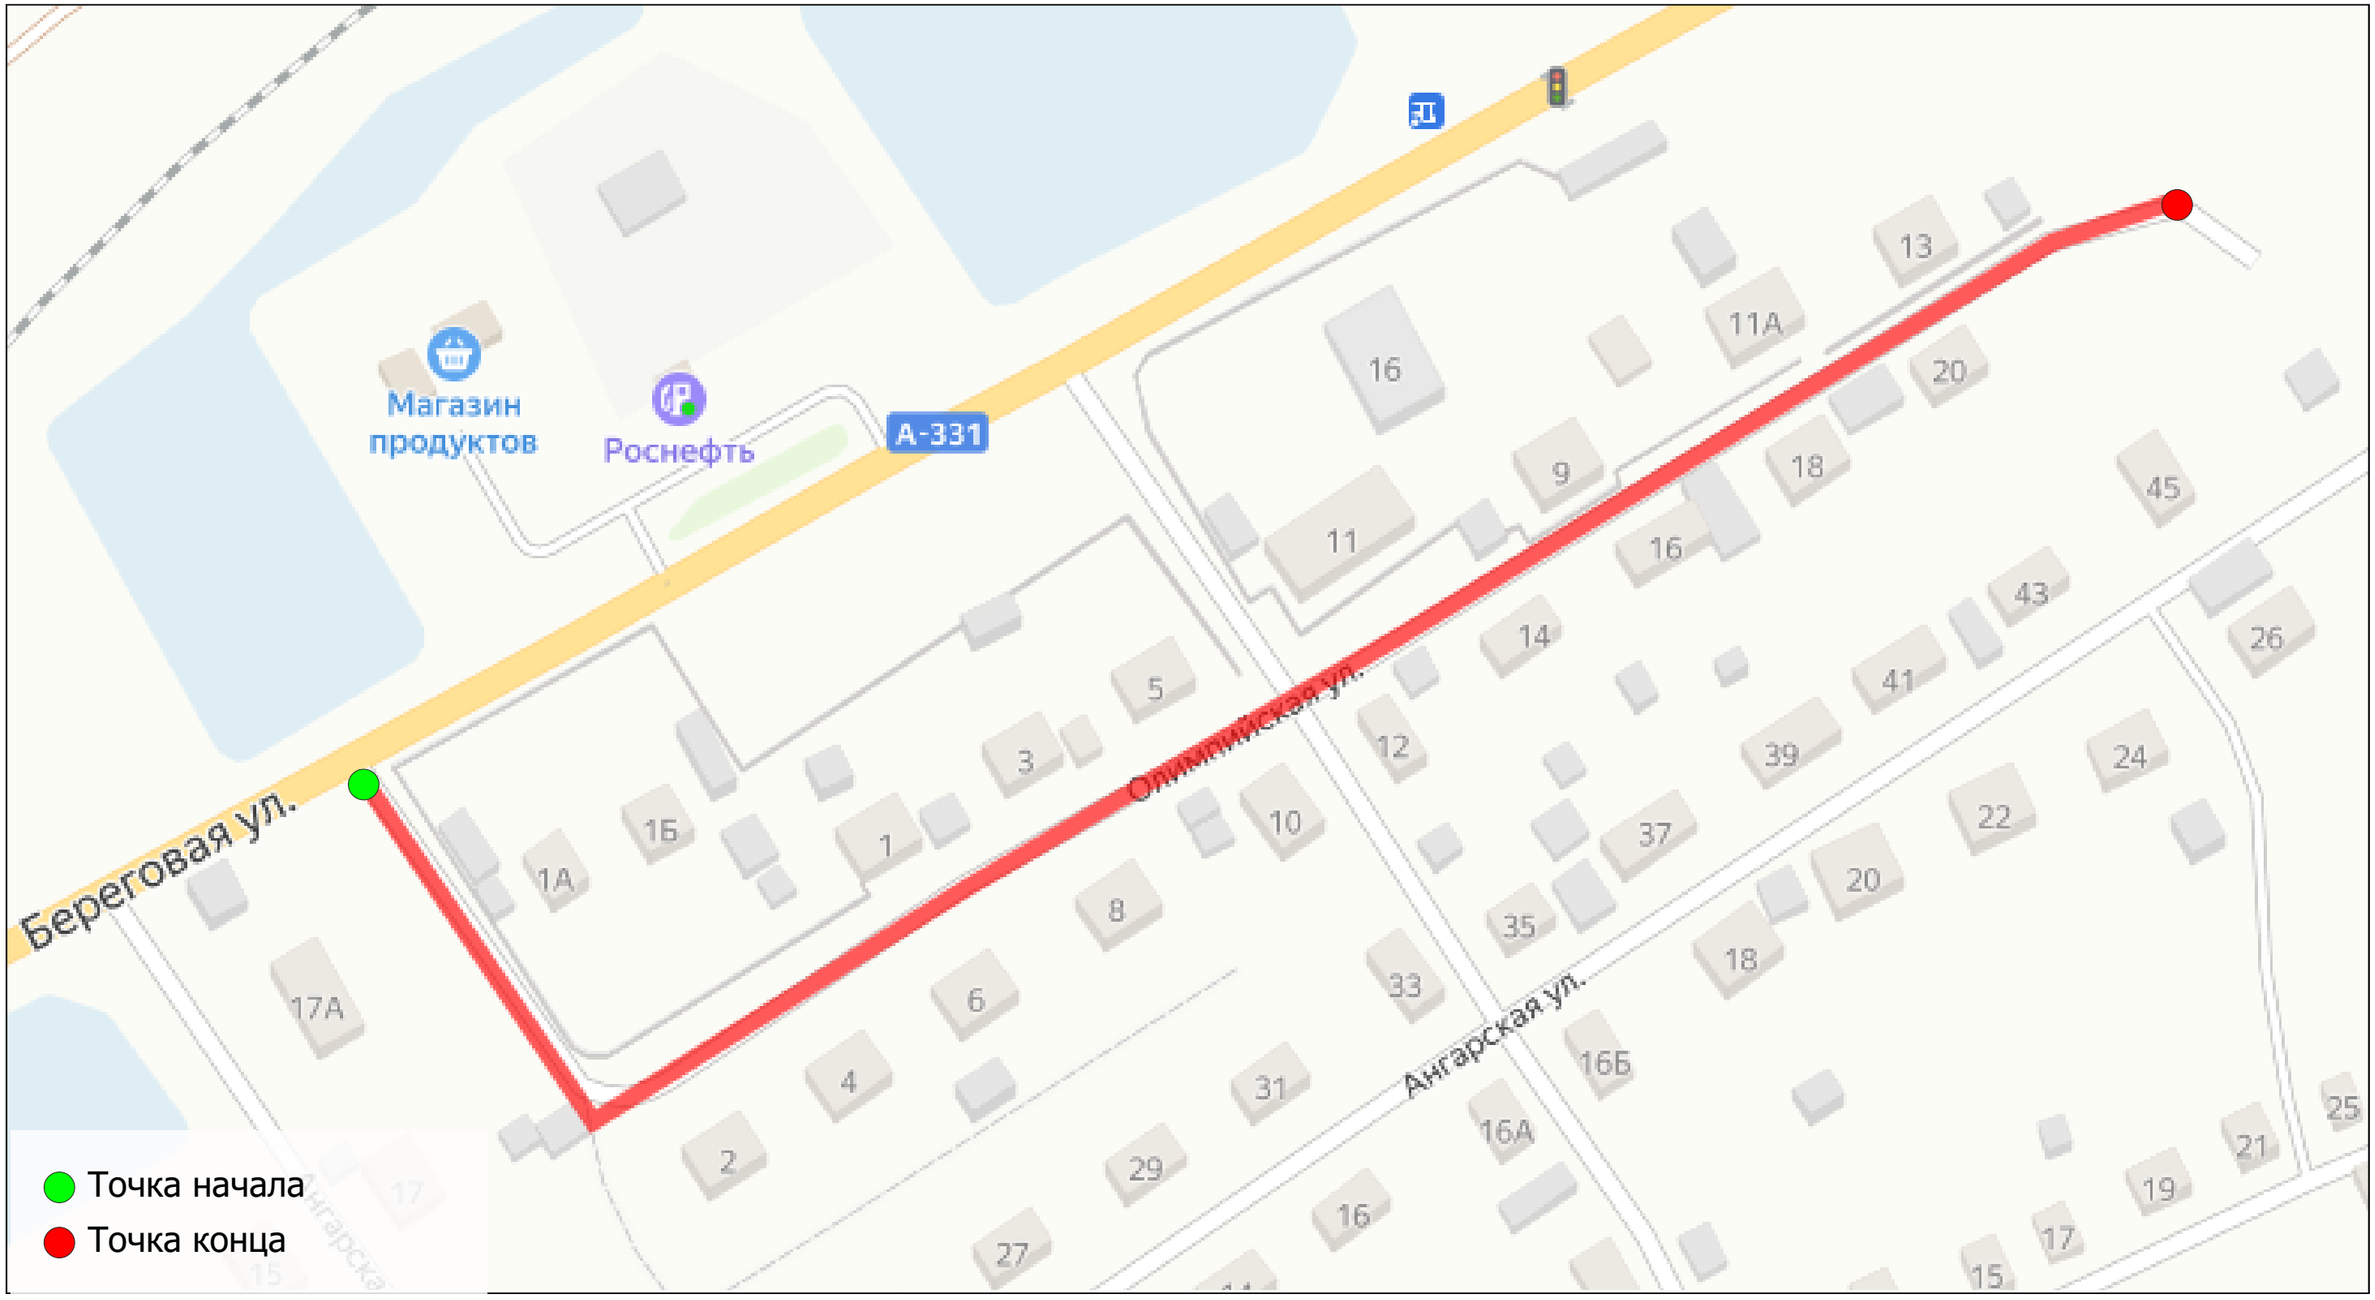

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 9 15 9 37 8 R=5247м 132 329 R=2922м 460
Кривые в плане	57 R=29м P=0; a=84° 135 409 R=98м P=2; a=28° 47
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50 258 4,00

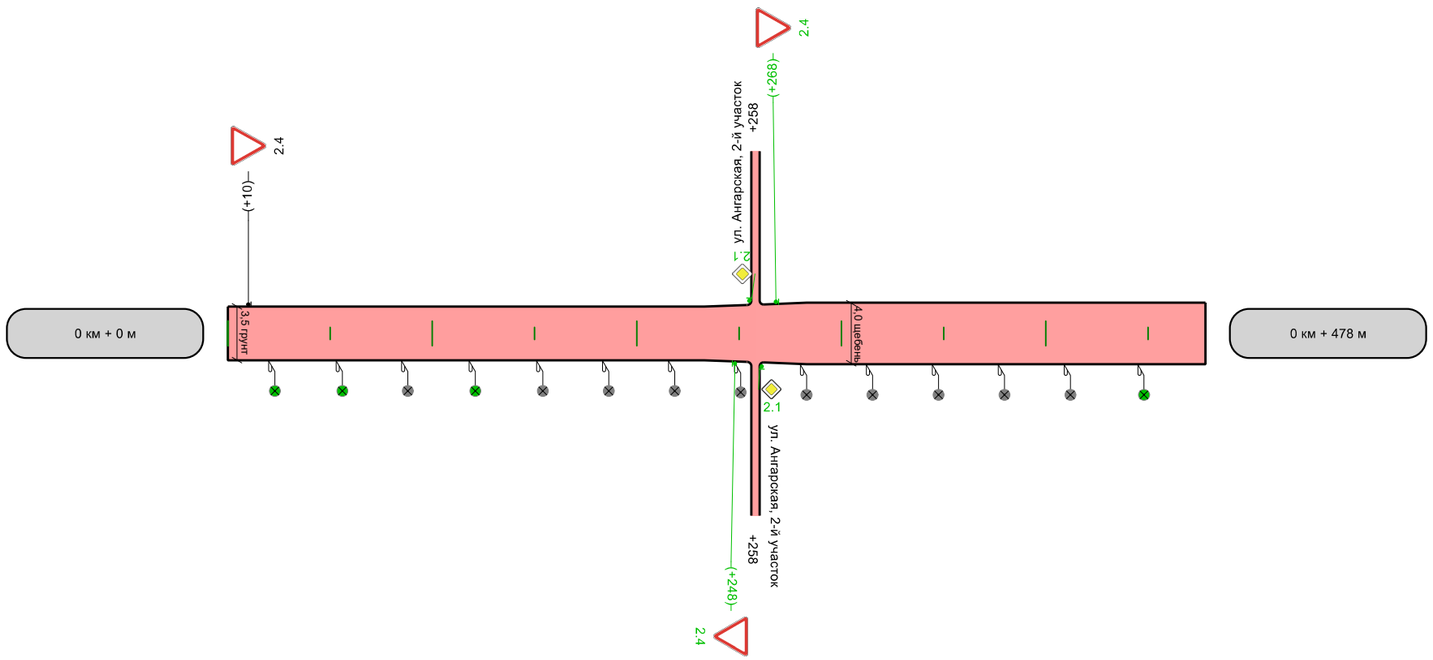

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+248	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+268	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**3**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023	0+056	Населенный пункт	2/2	33	0	Справа
2	0+088	0+088	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+121	0+121	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+154	0+412	Населенный пункт	9/9	0	258	Справа
5	0+448	0+448	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**14/14**	**33**	**258**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Осипенко, д. 3 до жилого дома по ул. Осипенко, д. 18


1-й участок: км 0+000 - км 0+432
2-й участок: км 0+000 - км 0+047

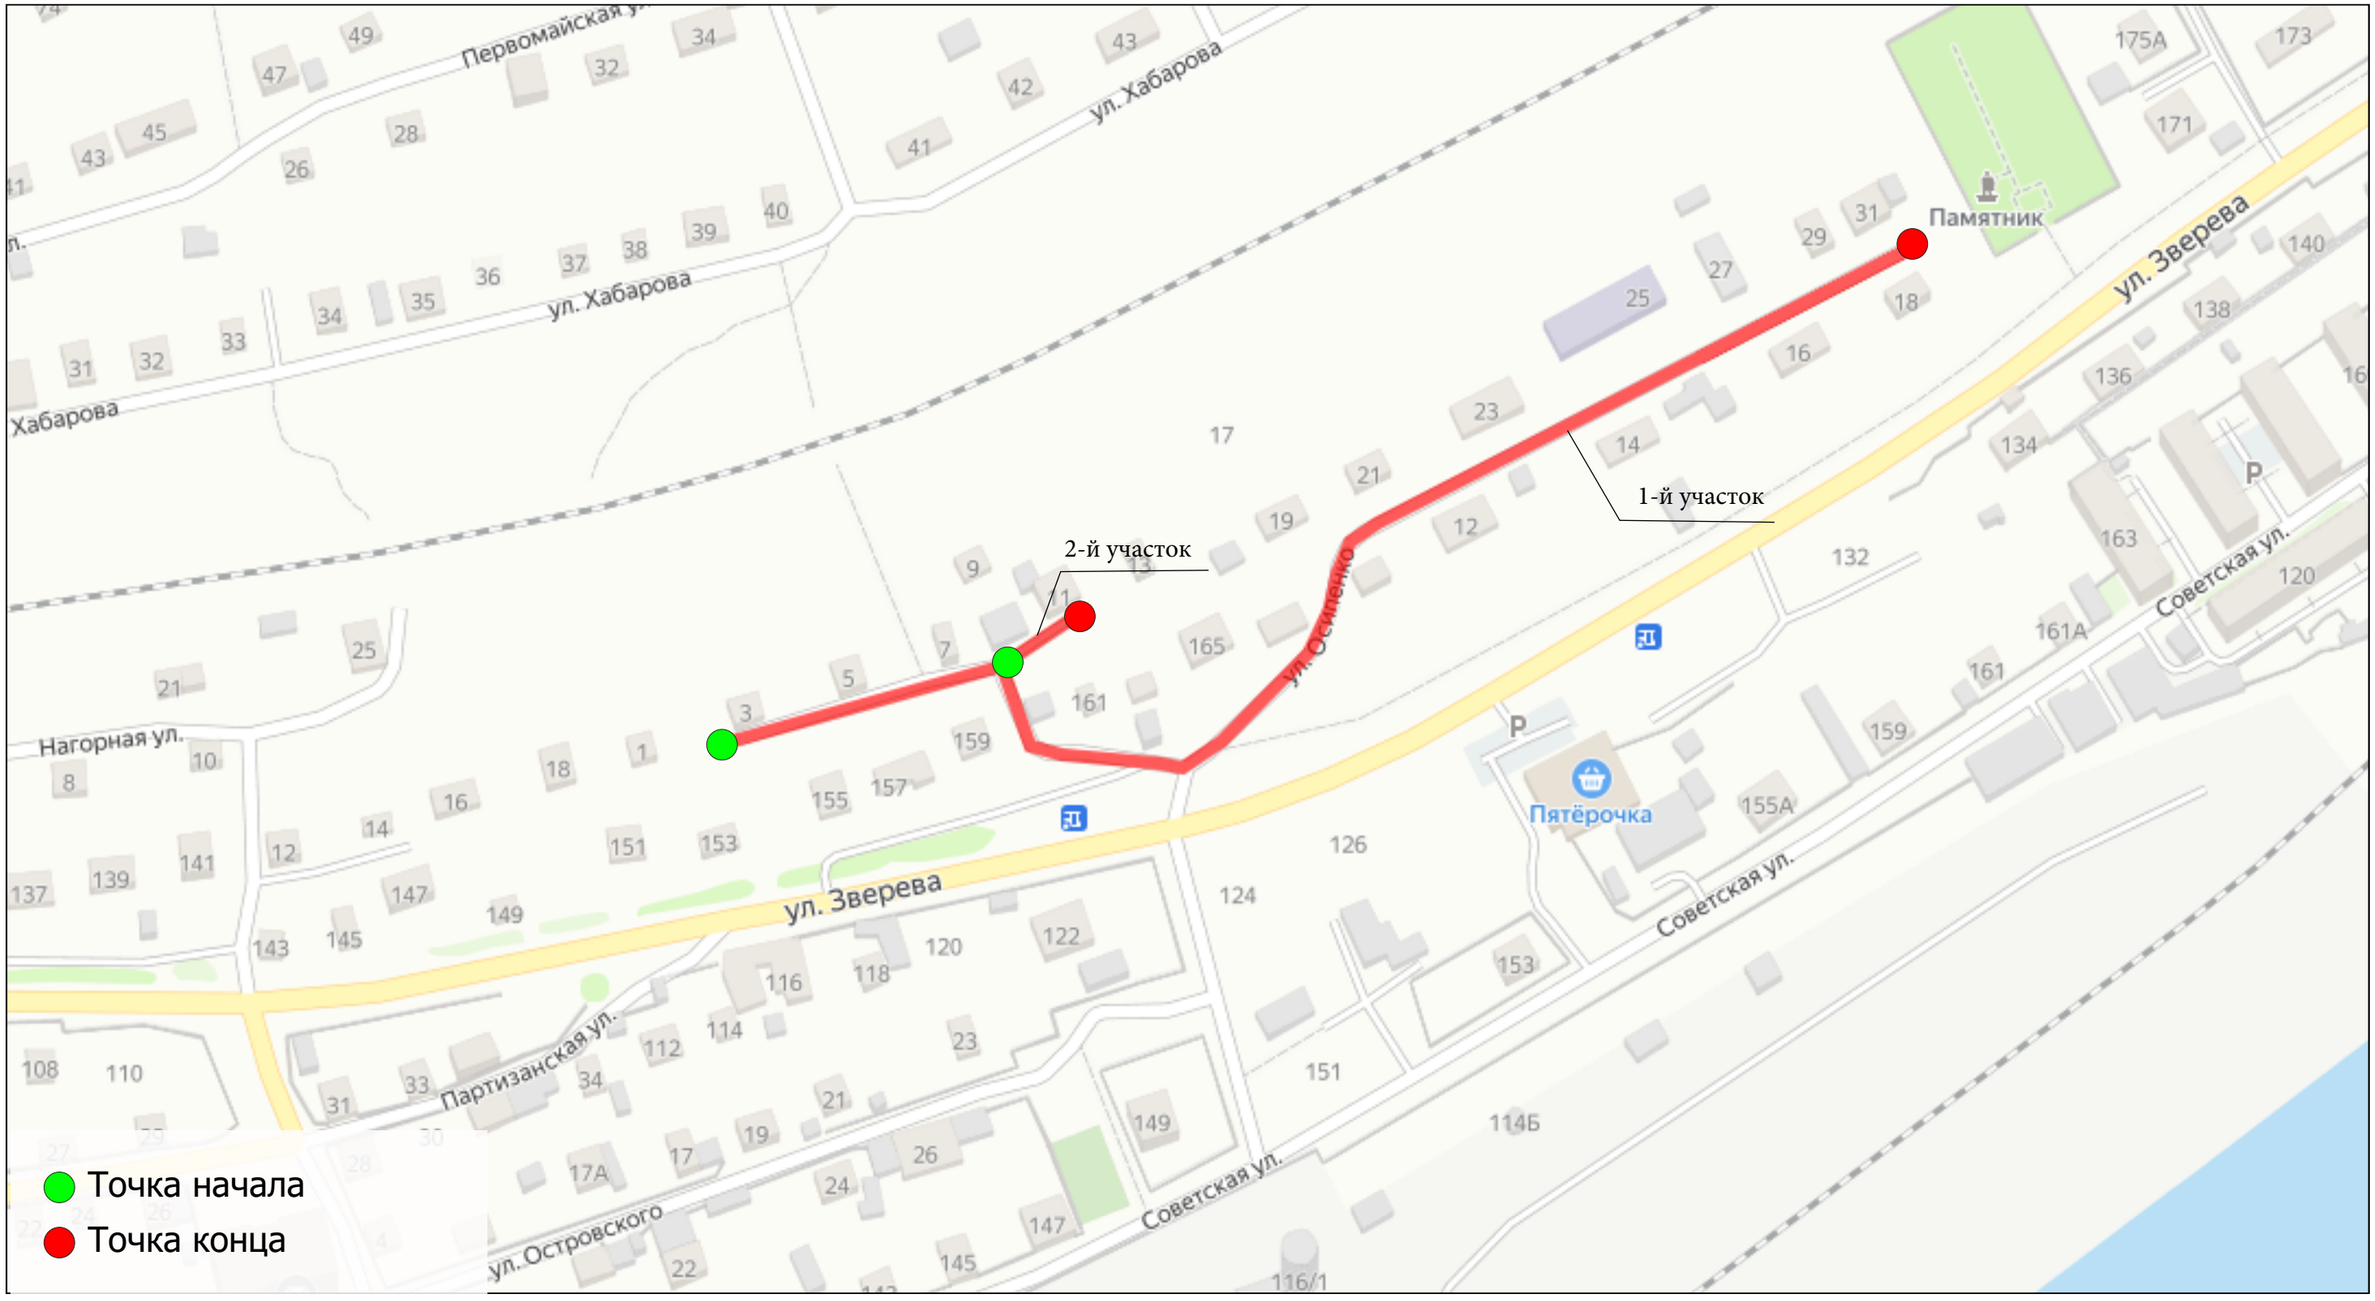

М 1:3000


Горизонтальная дорожная разметка слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
Кривые в плане
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
0
2
16
R=1039м
81
60
115
57
R=660м
185
49
221
47
R=1402м
292
4
71
87
97
115
190
R=15м
P=0; a=69
216
R=14м
240
3,00
140
4,20

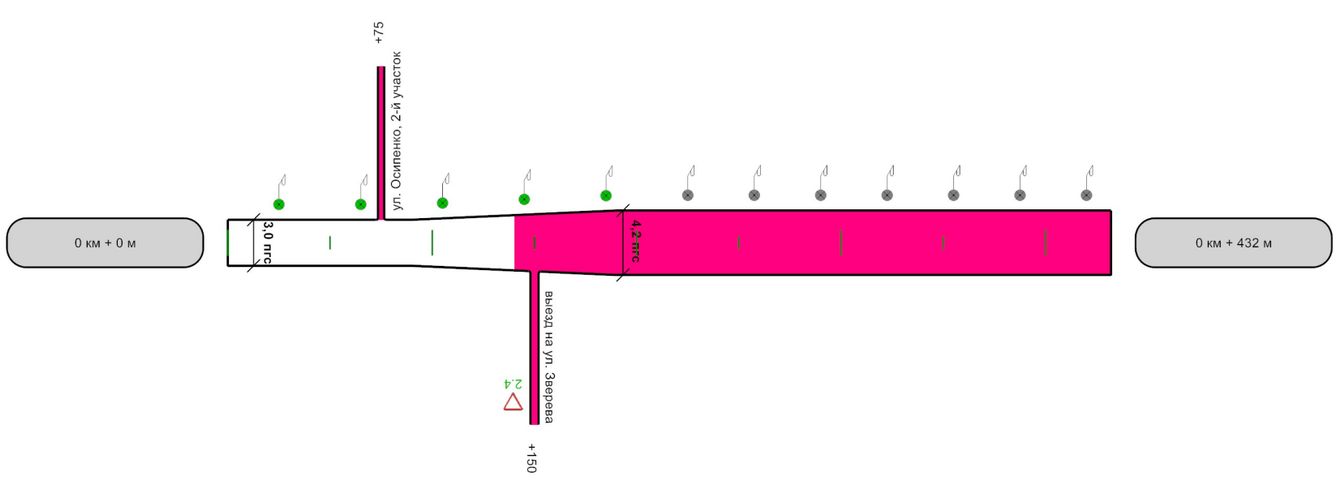
+75
ул. Осипенко, 2-й участок
0 км + 0 м
3,0 пс
4,2 пс
0 км + 432 м
выезд на ул. Зверева
2.4
+150


Горизонтальная дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	0		0+150	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+185	Населенный пункт	5/5	160	0	Слева
2	0+225	0+420	Населенный пункт	7/7	0	195	Слева
Итого:				**12/12**	**160**	**195**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	14
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

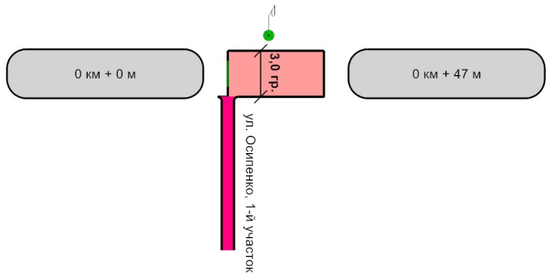

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+020	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**1/1**	**0**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по пер. Путейский, д. 1 до жилого дома по пер. Путейский, д. 4а
км 0+000 - км 0+144



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 18 2 R=2621м 75 10
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 6,00

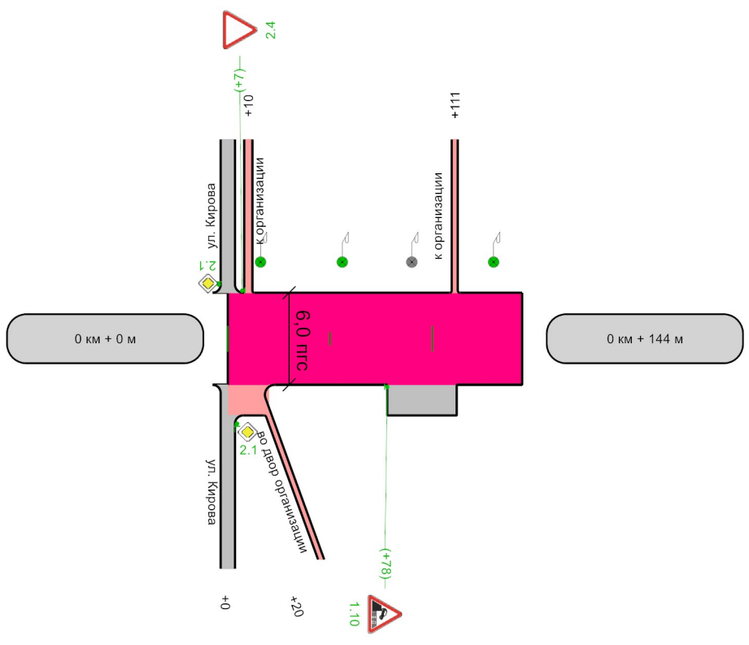

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.10	Выезд на набережную			0+078	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.4	Уступите дорогу			0+007	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+016	0+056	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
2	0+090	0+090	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+130	0+130	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**4/4**	**40**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по пер. Рабочий от жилого дома по ул. Нефтяников д. 6а до ж д пути станции Якурим 730км

1-й участок: км 0+000 - км 0+171
2-й участок: км 0+000 - км 0+092

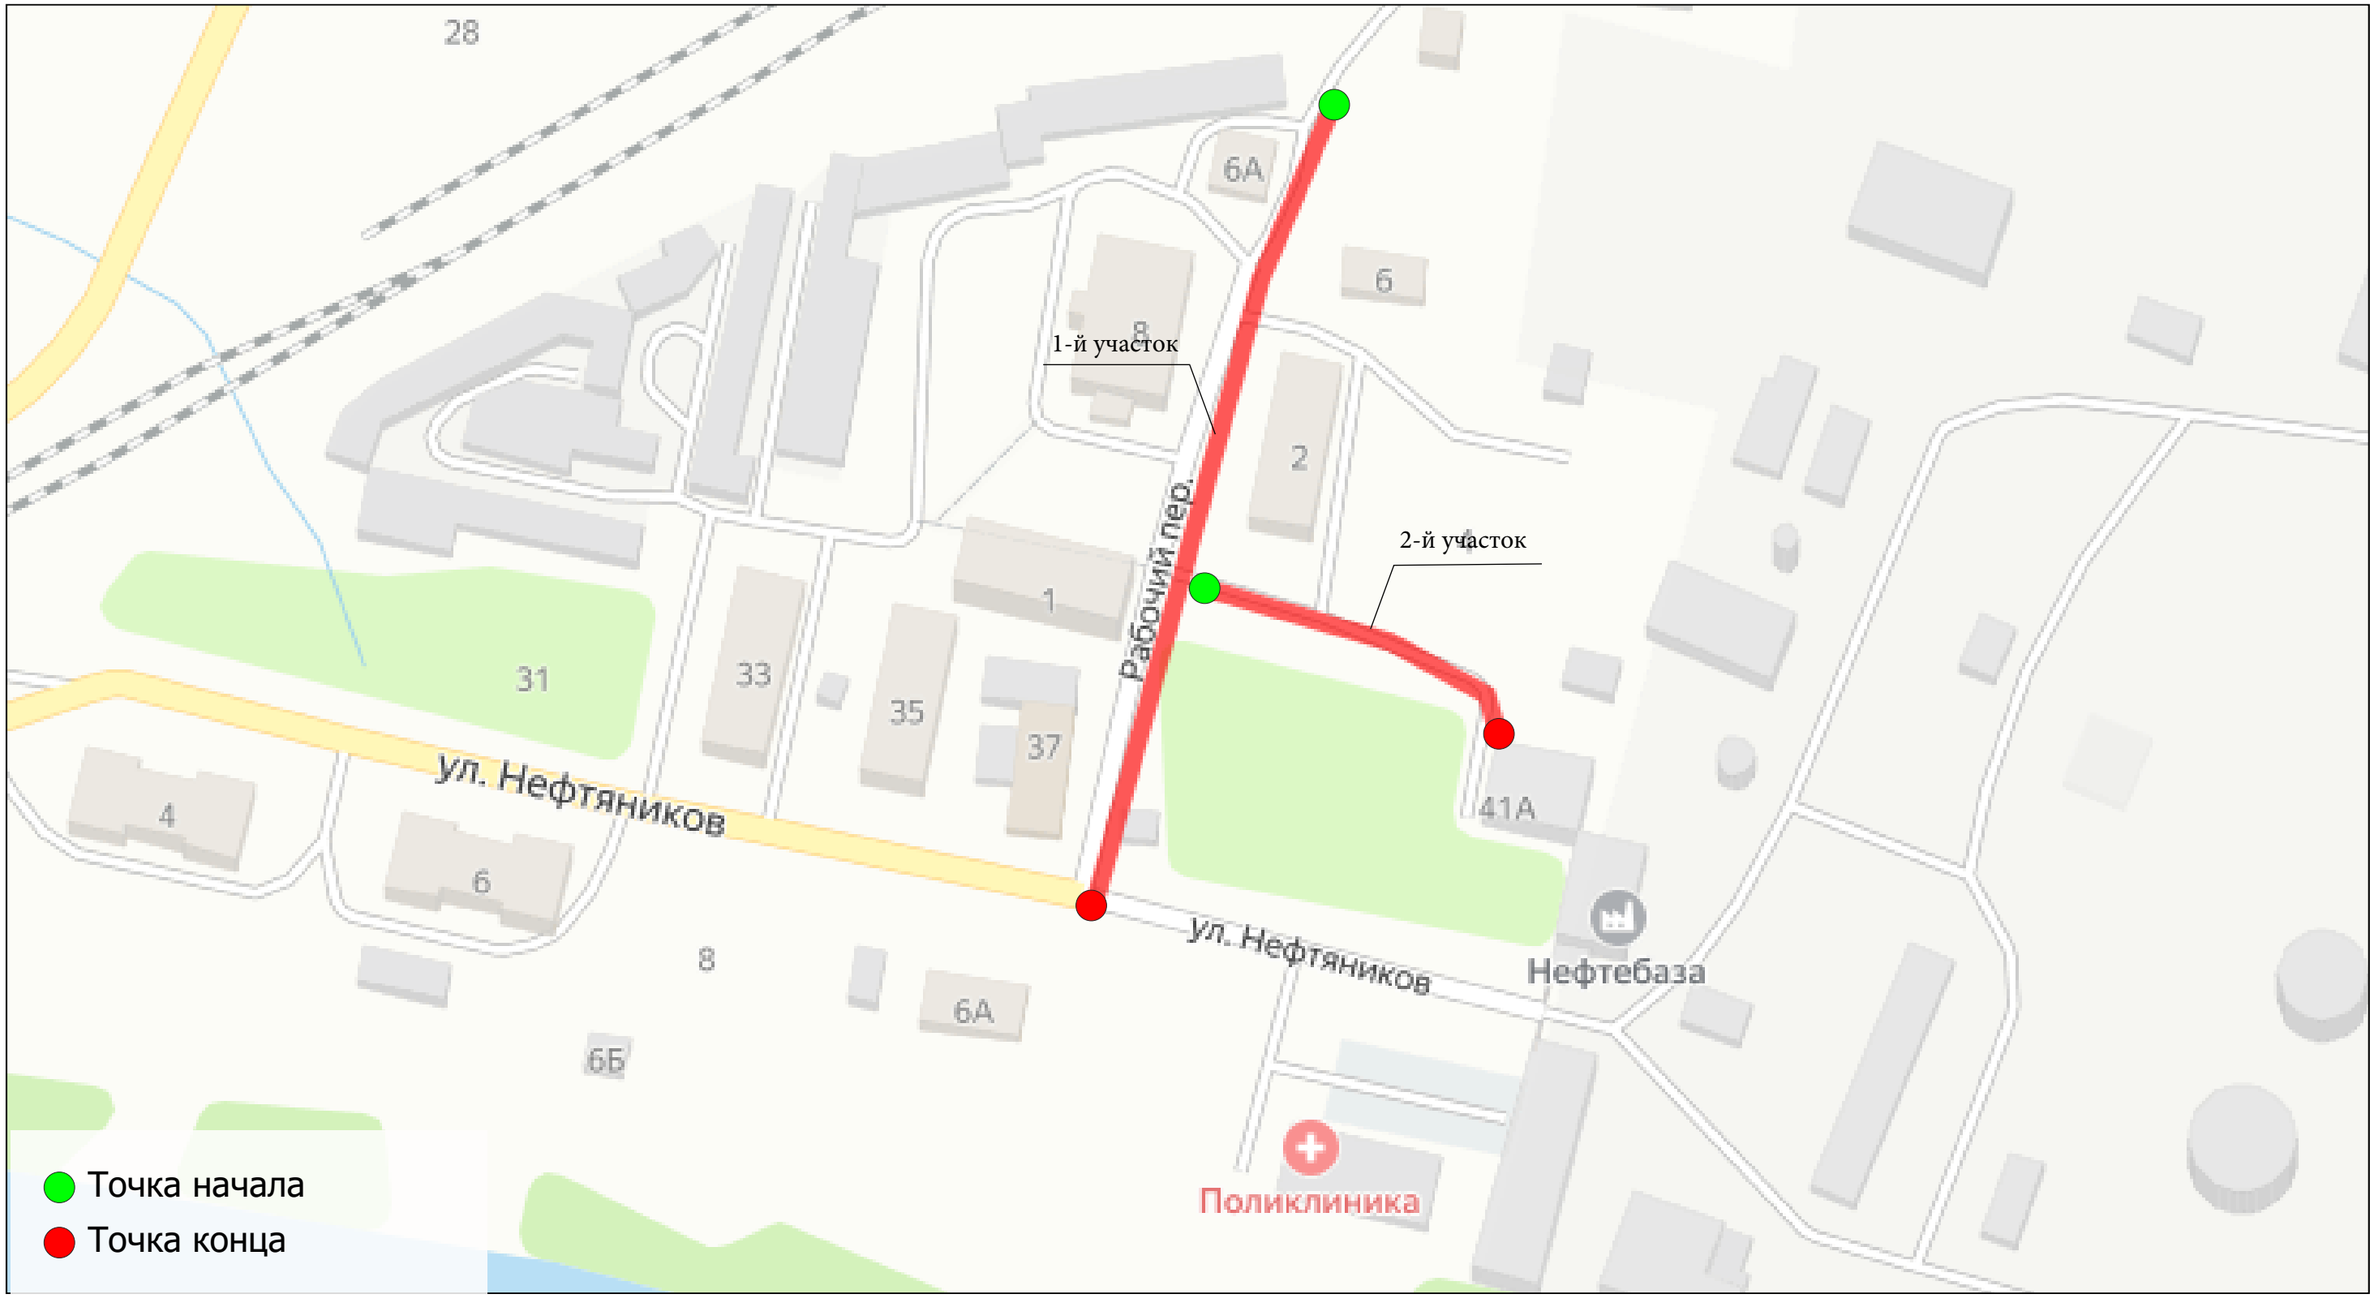

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	70
Кривые в плане	44 — R=614м P=97, a=4° — 98
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,60 | 40 | 4,00

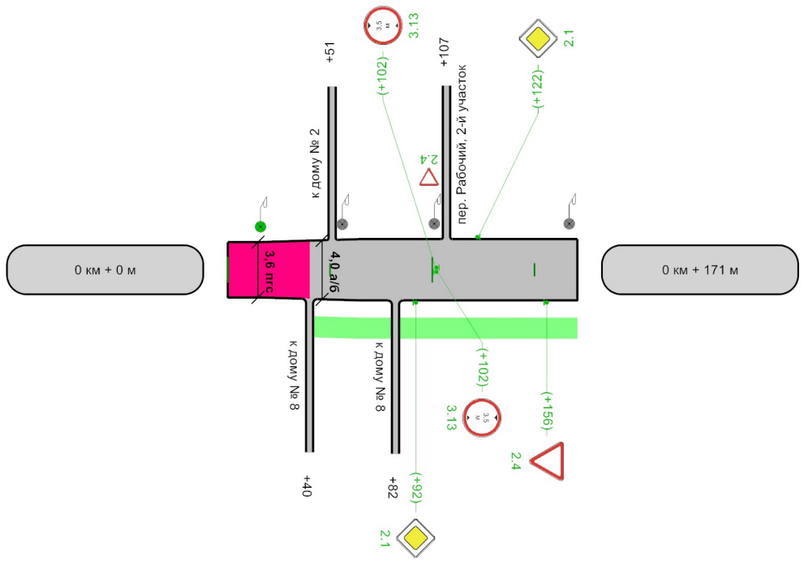

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 40 - 171

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+092	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+122	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+156	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
4	3.13	Ограничение высоты			0+102	Требуется установить	1	по центру в обратном направлении
5	3.13	Ограничение высоты			0+102	Требуется установить	1	по центру в прямом направлении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+016	0+016	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+056	0+056	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+101	0+101	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+167	0+167	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**4/4**	**0**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+040	0+171	Жилая застройка	Справа	131	
Итого:					**131**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0
Кривые в плане	
Тротуары слева	нод. ширина 1,5м, а/б, 0 - 32
Характеристики проезжей части	0 4,00

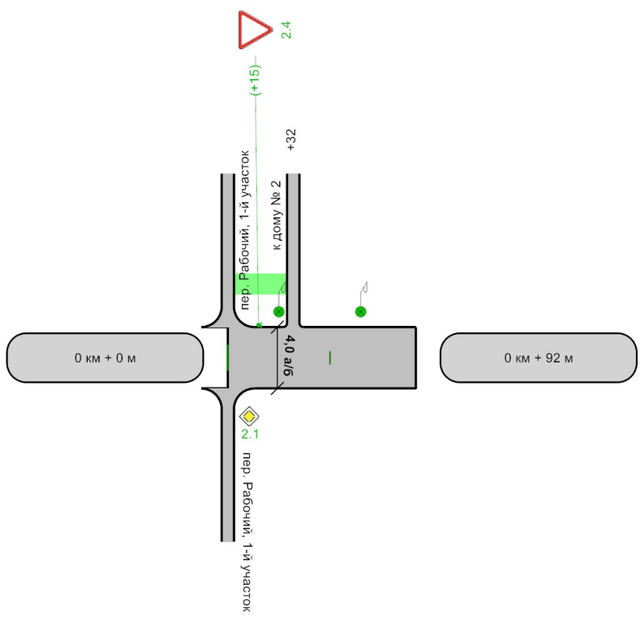

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+065	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**2/2**	**40**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+032	Жилая застройка	Слева	32	
Итого:					**32**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по пер. Связи от жилого дома по ул. Космодемьянской, д. 34 до жилого дома по ул. Хабарова, д.12


км 0+000 - км 0+364

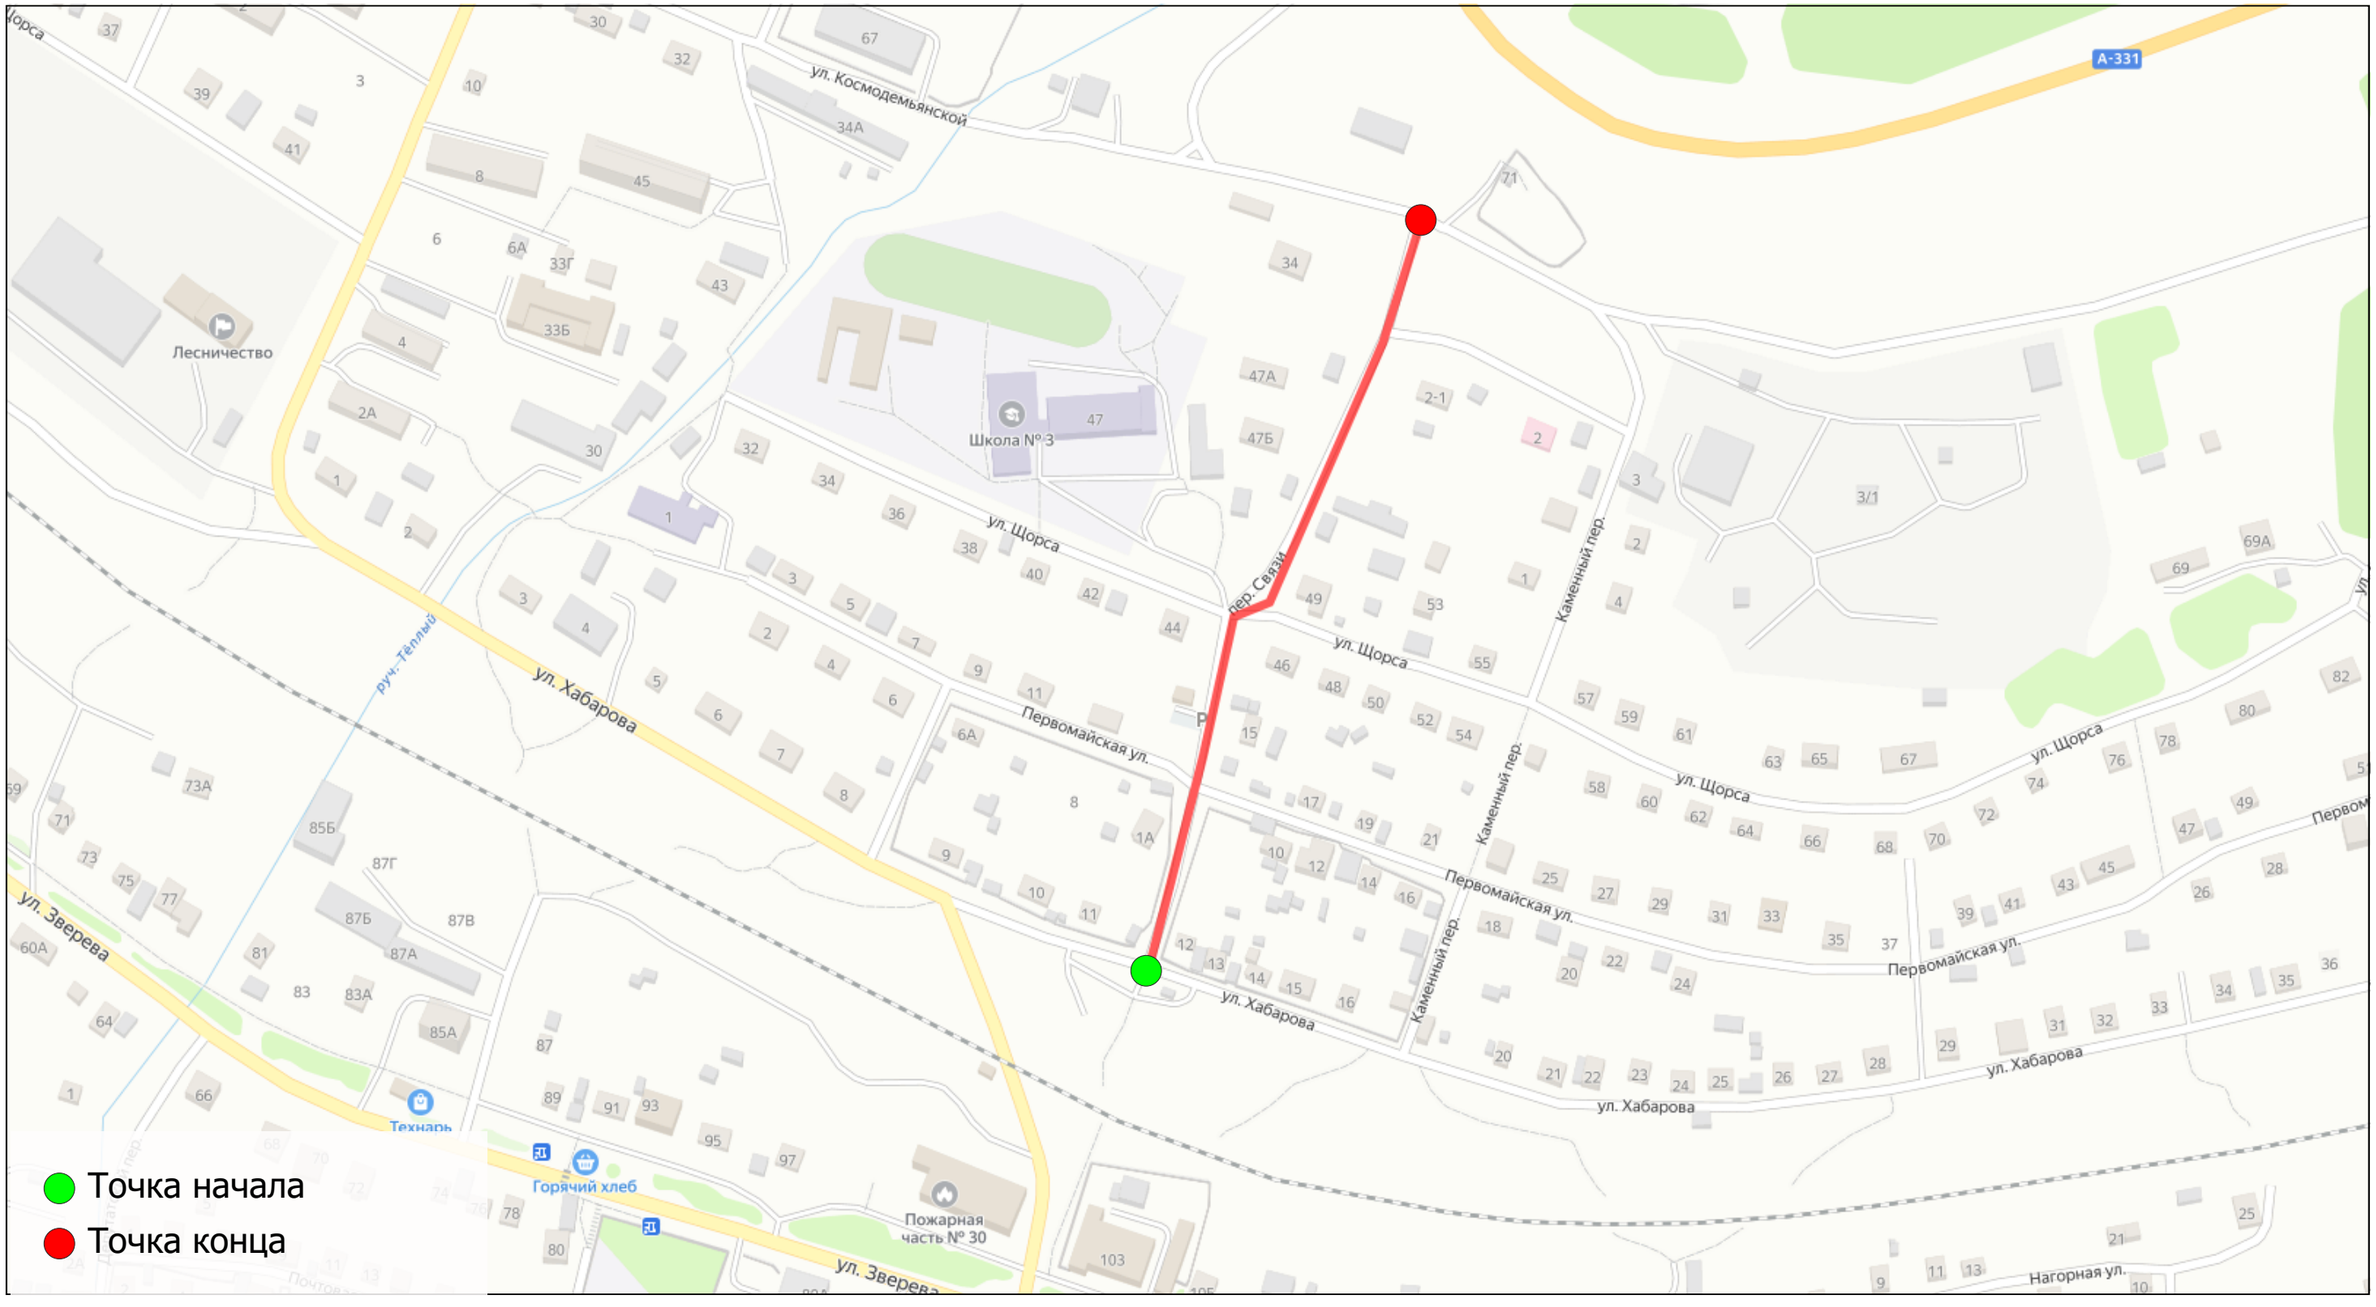

Автодорога по пер. Связи от д. №34 по ул. Космодемьянской до д. №12 по ул. Хабарова

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 99 — R=3075м — 126 — 77 — 125 — 98 — R=2395м — 94 — 168 — 95 — 200 — R=3613м — 132 — 327
Кривые в плане	15 — R=444м P=24; a=11° — 93 — 118 — R=224м P=12; a=11° — 158
Тротуары слева	н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 152
Характеристики проезжей части	0 — 6,20 — 165 — 3,50

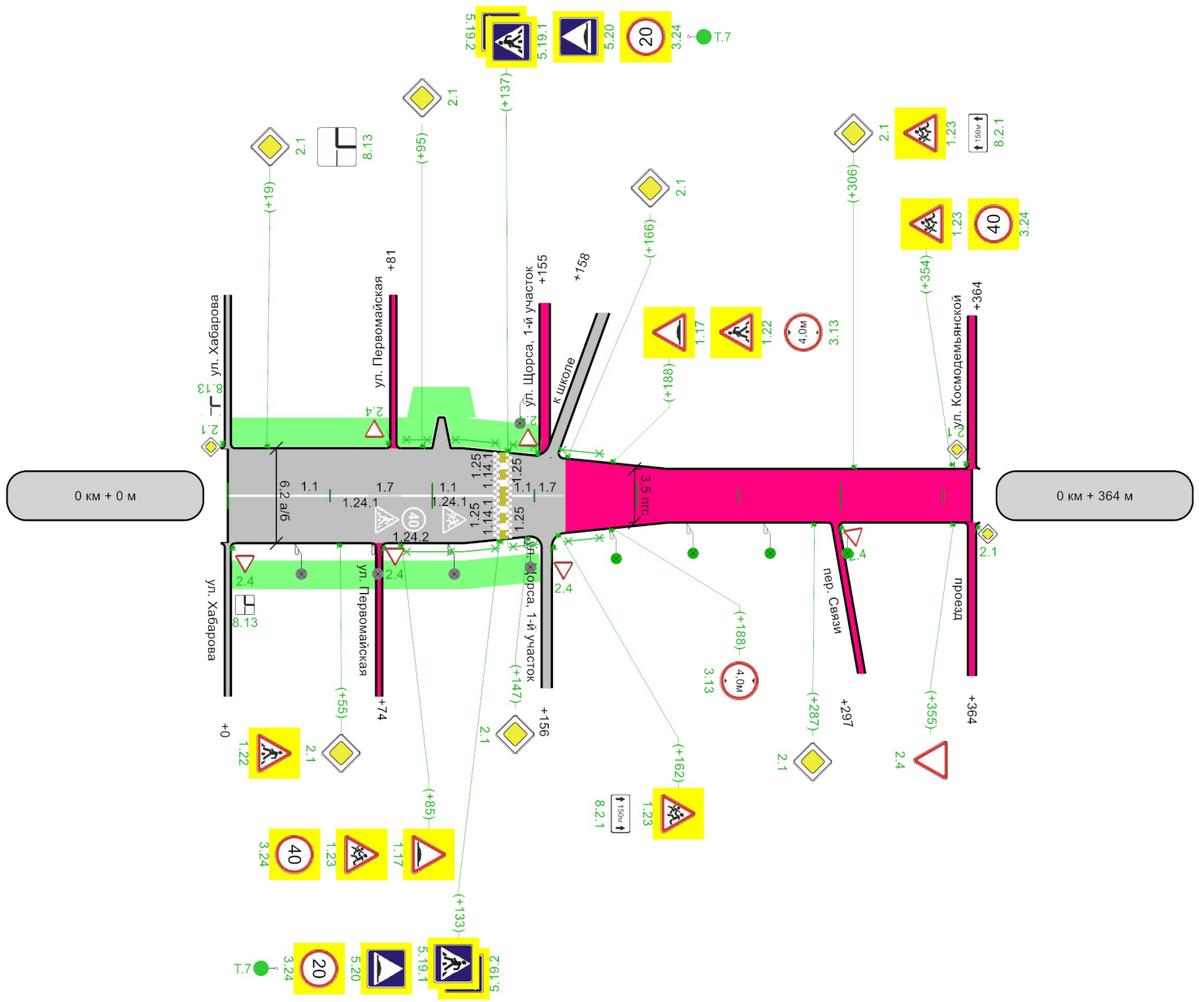

	осевая	1.1 0 - 69	1.7 69 - 85	1.1 85 - 130	1.7 130 - 145	1.7 149 - 164
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				н/д: Оцинкованный металл, 85 - 153		
Тротуары справа		н/д: ширина 2м, а/б, 0 - 152				

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.24.1(шт)(бел)		1.24.2(шт)(бел)	1.25(м)(бел)	ИТОГО, м2 (бел)	ИТОГО, м2 (жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	0.400	0.400	1.540	1.550	1.910	1.000			
Ширина, м	0.10	0.10	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - 1	124,000	31,000	6,200	6,200	1,000	1,000	1,000	12,400	**29,068**	**9,920**	**38,988**
ИТОГО	**124,000**	**31,000**	**6,200**	**6,200**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**12,400**	**29,068**	**9,920**	**38,988**
ЛИН.КМ	**0,124**	**0,031**	**0,006**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**			
ПРИВЕД.КМ	**0,124**	**0,016**	**0,099**	**0,099**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**			
ПЛОЩАДЬ	**12,400**	**1,550**	**9,920**	**9,920**	**1,540**	**1,550**	**1,910**	**0,198**	**29,068**	**9,920**	**38,988**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+085	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+188	Требуется установить	1	слева
3	1.22	Пешеходный переход			0+055	Требуется установить	1	справа
4	1.22	Пешеходный переход			0+188	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+085	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети			0+162	Требуется установить	1	справа
7	1.23	Дети			0+306	Требуется установить	1	слева
8	1.23	Дети			0+354	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Знаки приоритета						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
9	2.1	Главная дорога			0+019	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+095	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога			0+147	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога			0+166	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога			0+287	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+306	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+078	Требуется установить	1	справа на примыкании
17	2.4	Уступите дорогу			0+085	Требуется установить	1	слева на примыкании
18	2.4	Уступите дорогу			0+163	Требуется установить	1	слева на примыкании
19	2.4	Уступите дорогу			0+165	Требуется установить	1	справа на примыкании
20	2.4	Уступите дорогу			0+313	Требуется установить	1	справа на примыкании
21	2.4	Уступите дорогу			0+355	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**13**	
		Запрещающие знаки						
22	3.13	Ограничение высоты			0+188	Требуется установить	1	слева
23	3.13	Ограничение высоты			0+188	Требуется установить	1	справа
24	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+085	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+133	Требуется установить	1	справа
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+137	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+354	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
28	5.19.1	Пешеходный переход			0+133	Требуется установить	1	справа
29	5.19.1	Пешеходный переход			0+137	Требуется установить	1	слева
30	5.19.2	Пешеходный переход			0+133	Требуется установить	1	справа
31	5.19.2	Пешеходный переход			0+137	Требуется установить	1	слева
32	5.20	Искусственная неровность			0+133	Требуется установить	1	справа
33	5.20	Искусственная неровность			0+137	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
34	8.2.1	Зона действия			0+162	Требуется установить	1	справа
35	8.2.1	Зона действия			0+306	Требуется установить	1	слева
36	8.13	Направление главной дороги			0+019	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**36**	
		Всего:					**36**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+085	0+100	15				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
2	0+085	0+133	48				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
3	0+109	0+133	24				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
4	0+137	0+152	15				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
5	0+137	0+152	15				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
6	0+161	0+184	23				Слева	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
7	0+164	0+184	20				Справа	Конструкция перильного типа	Оцинкованный металл	У – 1	1,00	Пешеходный переход
Итого:			**160**									

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+036	0+148	Населенный пункт	4/4	0	112	Справа
2	0+036	0+148	Населенный пункт	4/4	112	0	Справа
3	0+143	0+143	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+190	0+303	Населенный пункт	4/4	113	0	Справа
Итого:				**13/13**	**225**	**112**	

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0+135	Нерегулируемый	наземный	в одном уровне	есть
Итого:		**Пешеходный мост**	**надземный**	**в разных уровнях**	**0**
Итого:		**Регулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**0**
Итого:		**Нерегулируемый**	**наземный**	**в одном уровне**	**1**
Итого:		**Пешеходная галерея**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Надземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Подземный пешеходный переход**	**нет данных**	**нет данных**	**0**
Итого:		**Пешеходный тоннель**	**подземный**	**в разных уровнях**	**0**
Всего:					**1**

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+133	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+137	Пешеходный переход	1	0	-	Слева

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			2	0		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+152	Жилая застройка	Справа	152	
2	0+000	0+152	Жилая застройка	Слева	152	
Итого:					304	0

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+133	4,00	6,00	0,07	1,68	Требуется строительство


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Северная, д. 3 до жилого дома по ул. Северная, д. 15
км 0+000 - км 0+251

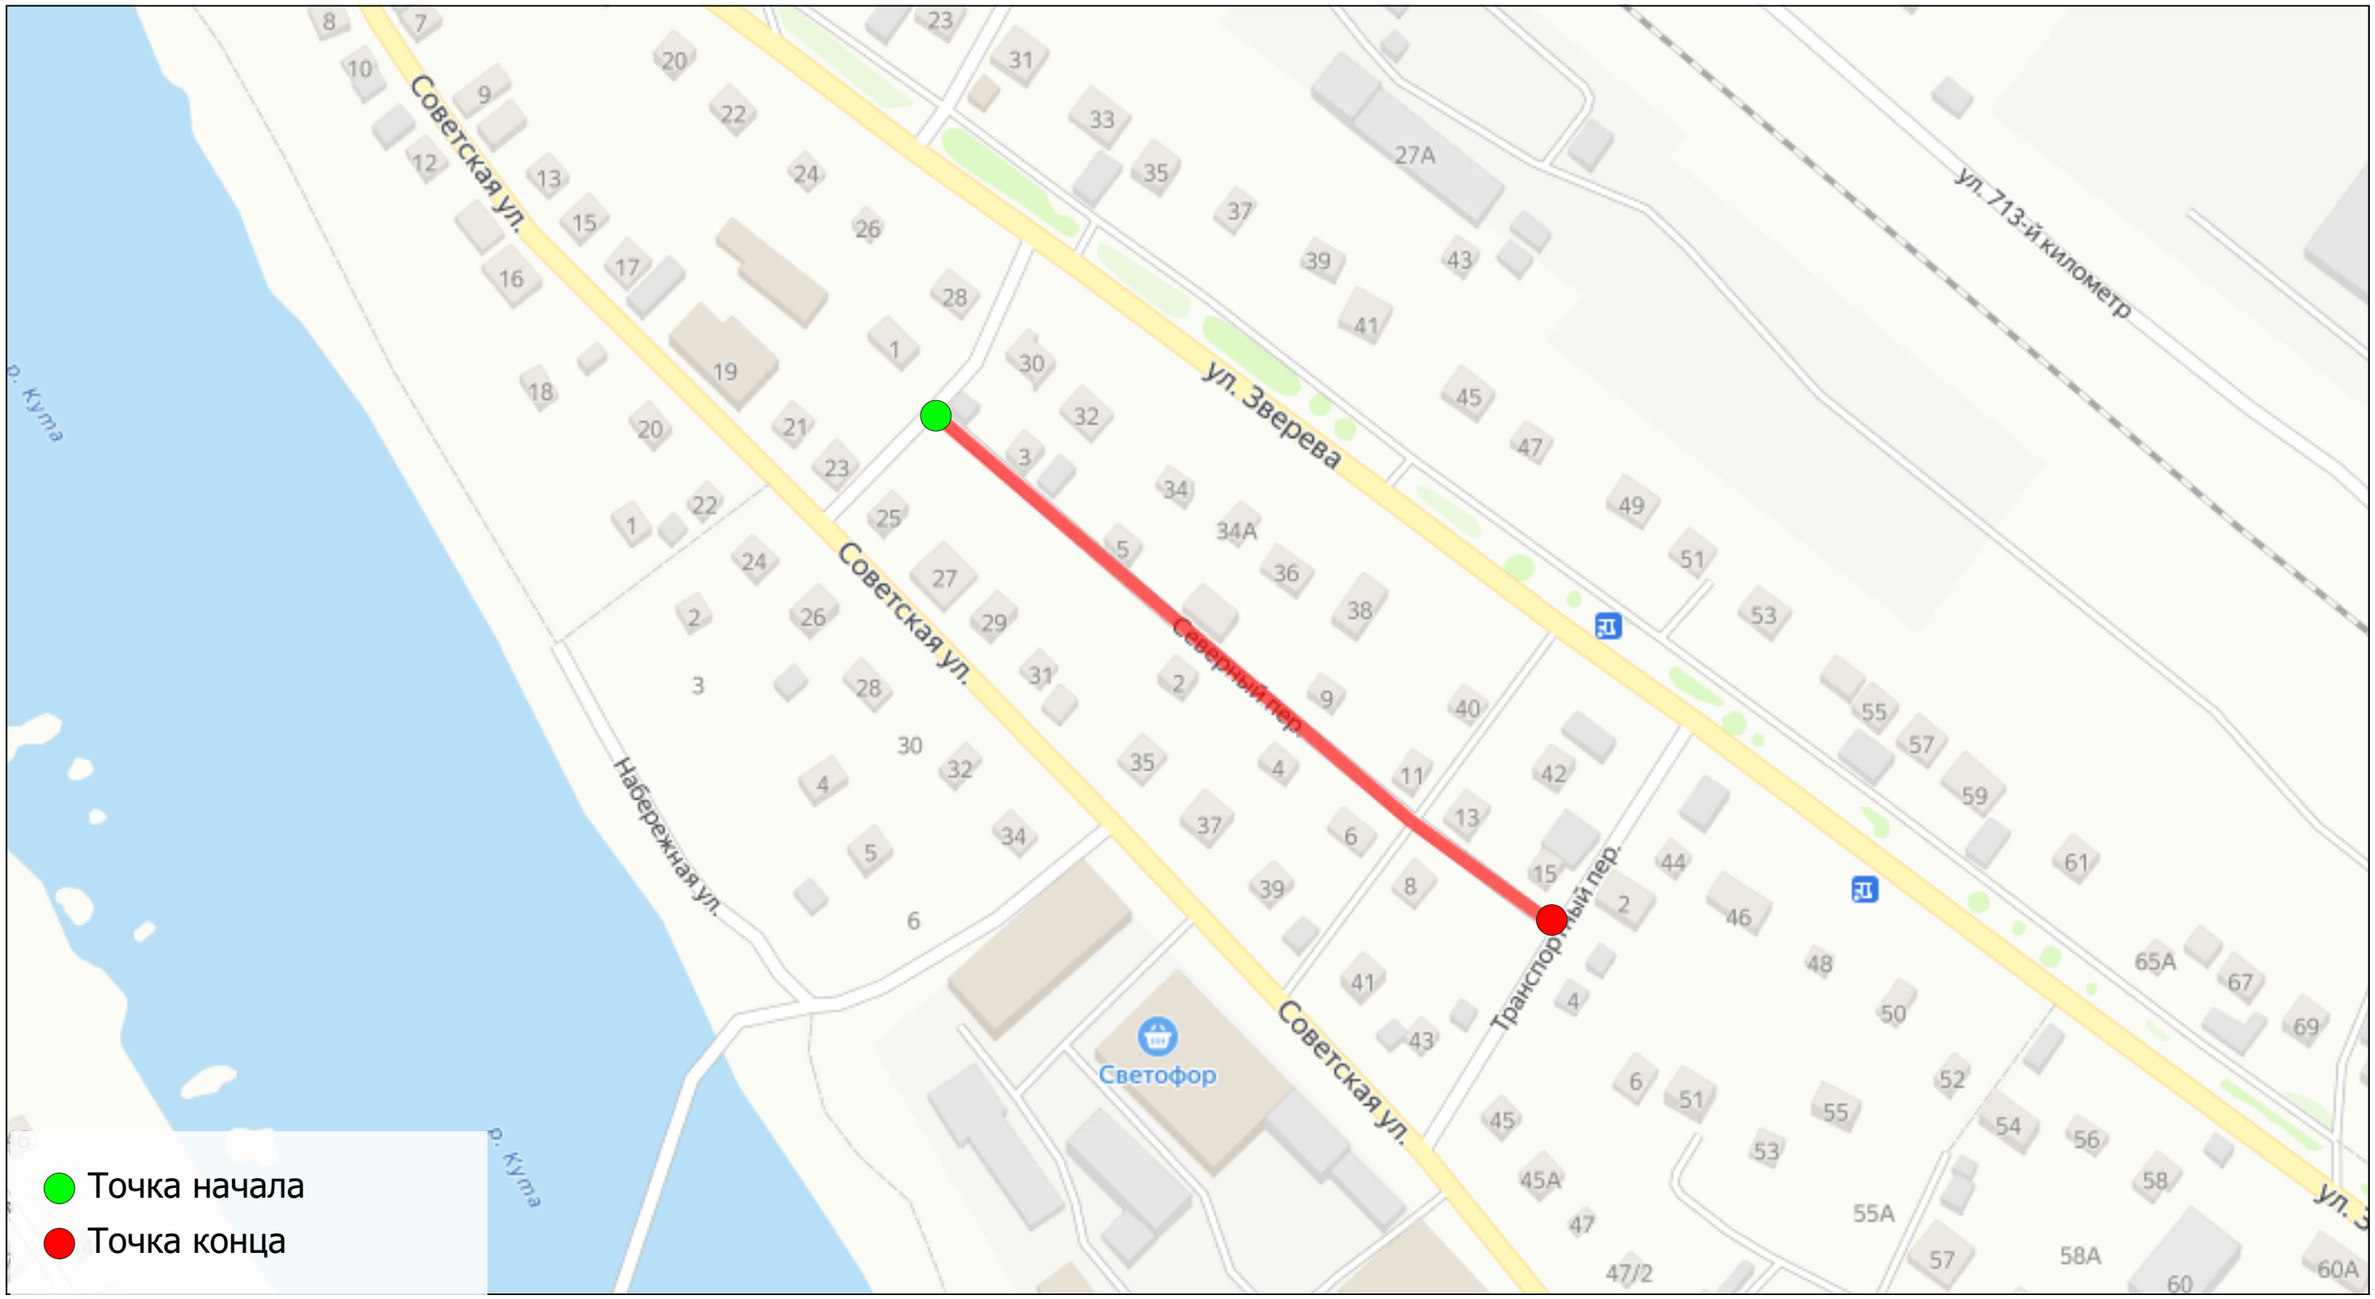

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 / 2 R=2766м 14 / 101 14 / 127 R=4338м 3 / 202
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,20

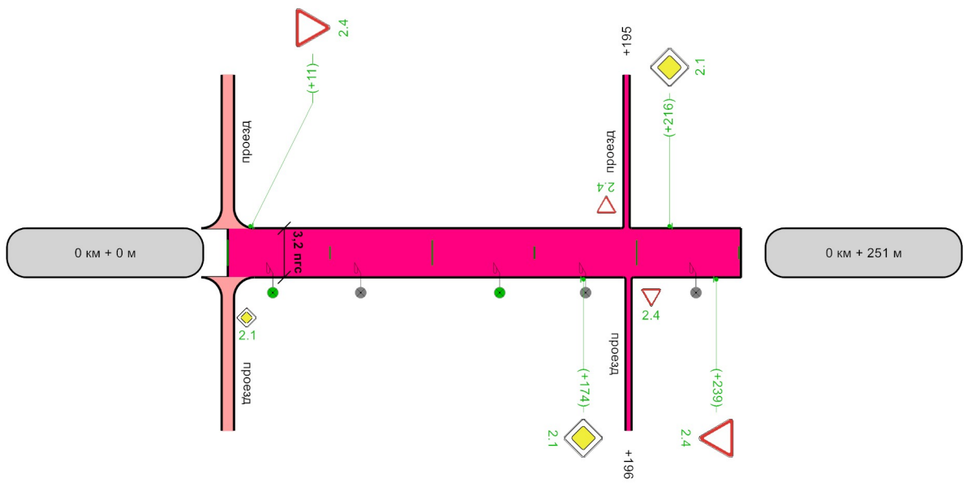

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+174	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+216	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+183	Требуется установить	1	слева на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+184	Требуется установить	1	справа на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу			0+239	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+022	0+022	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+065	0+065	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+133	0+133	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+175	0+175	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+229	0+229	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**5/5**	**0**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Мичурина, д. 3 до жилого дома по ул. Мичурина, д. 17
км 0+000 - км 0+234

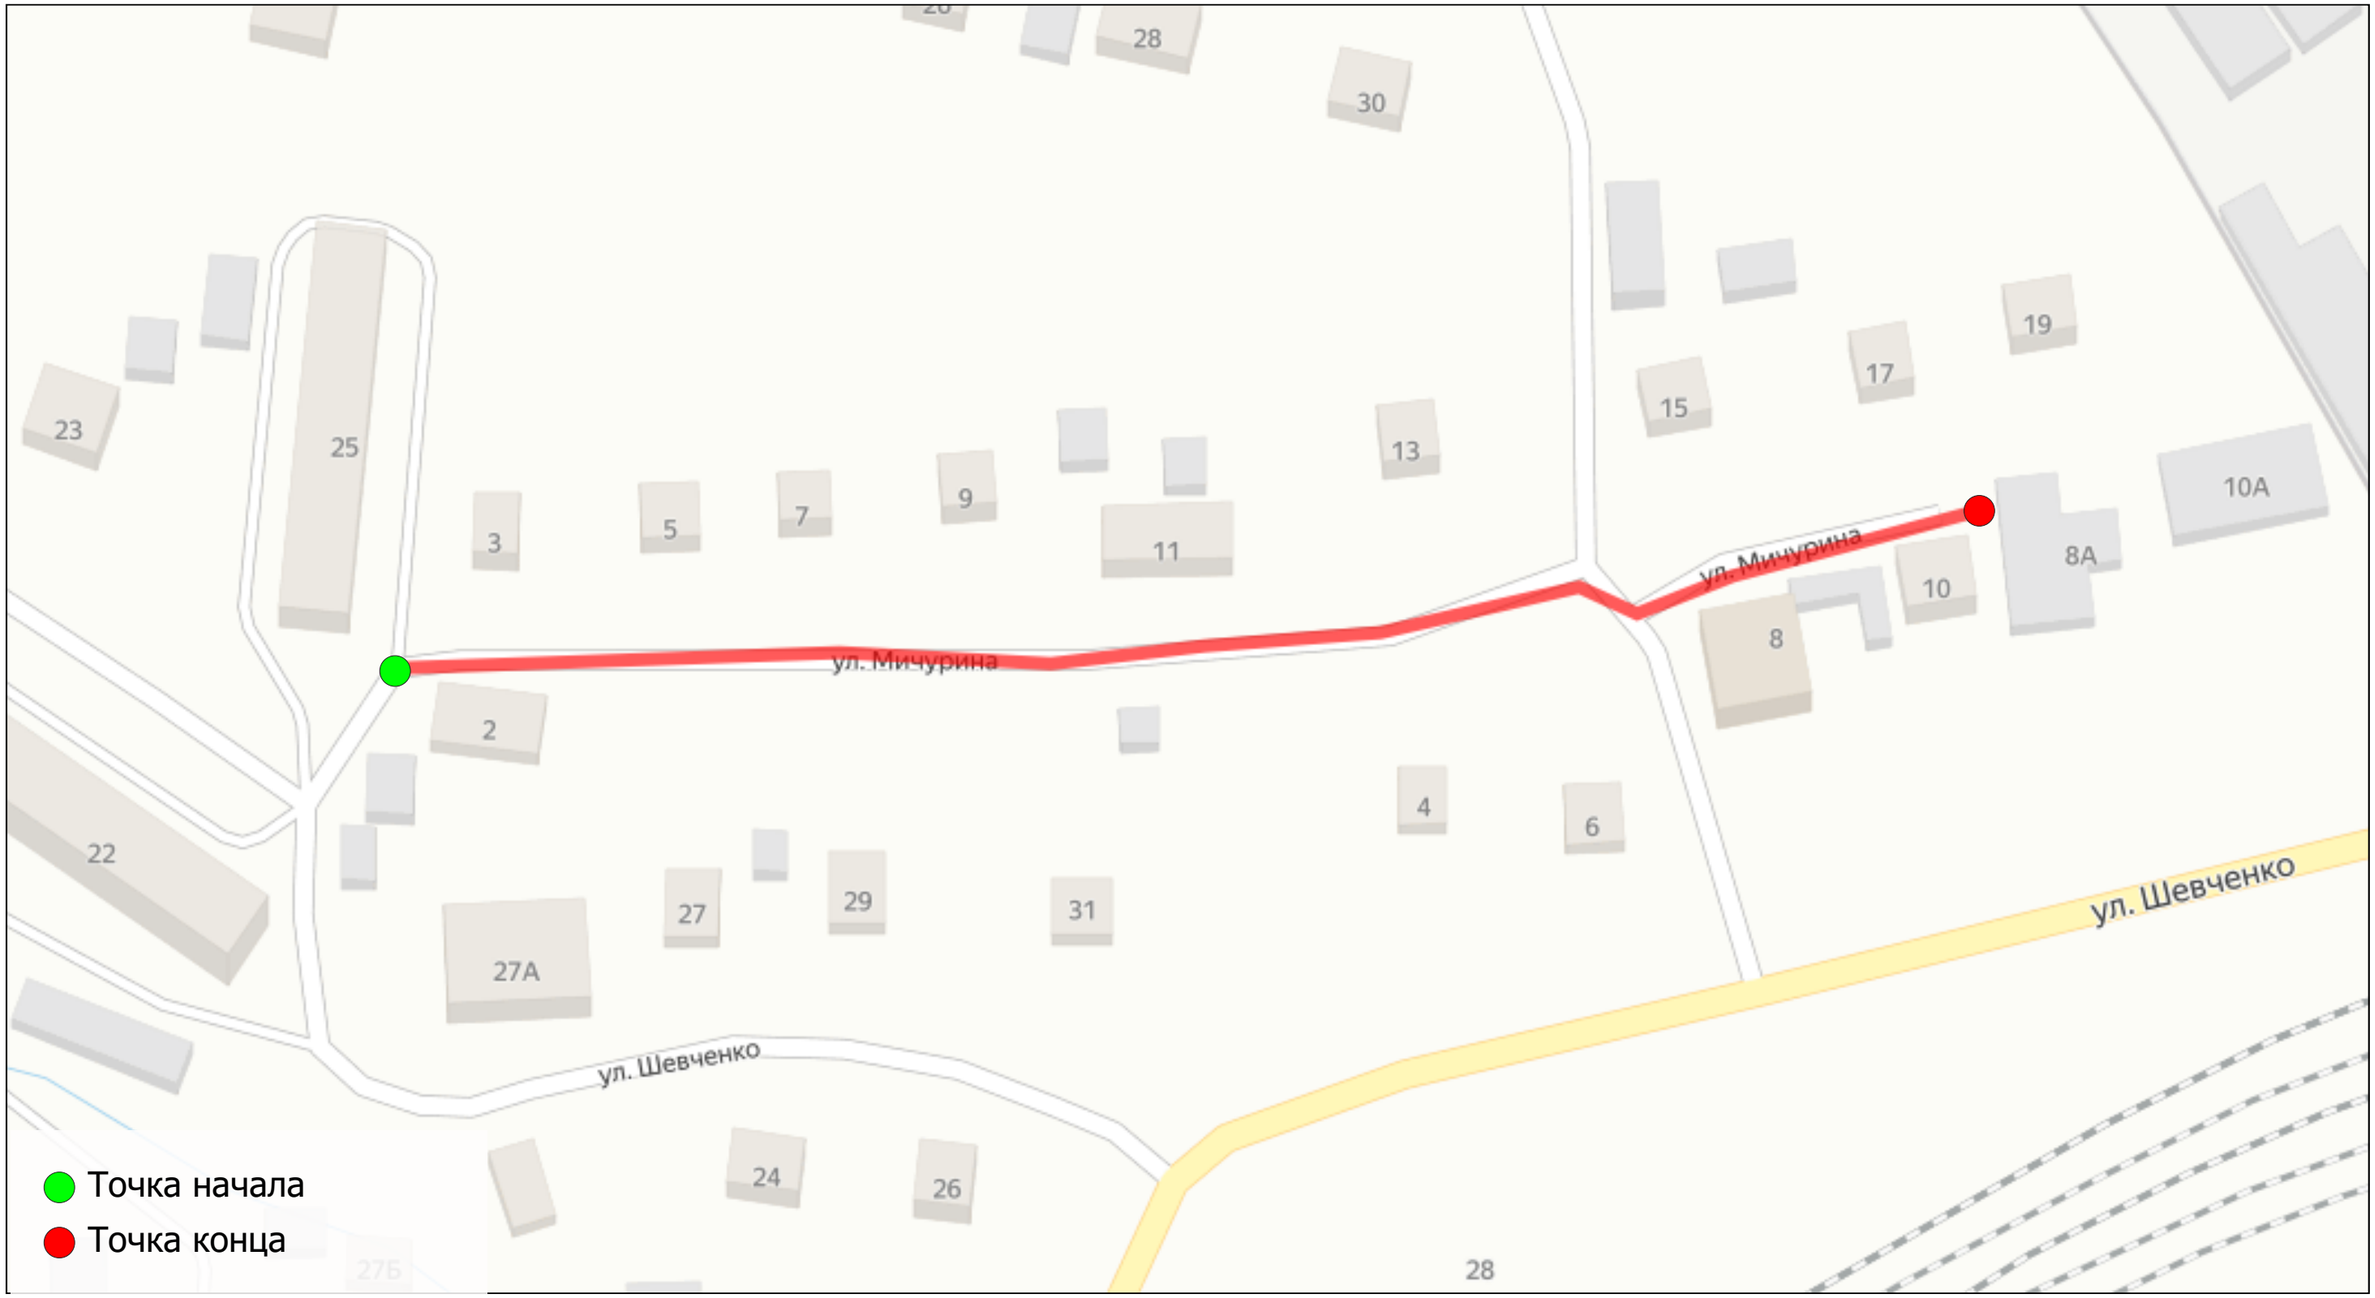

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	54 — 83 (44) — R=4082м — 169 (66)
Кривые в плане	123 — R=216м, P=16, α=8° — 152
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50

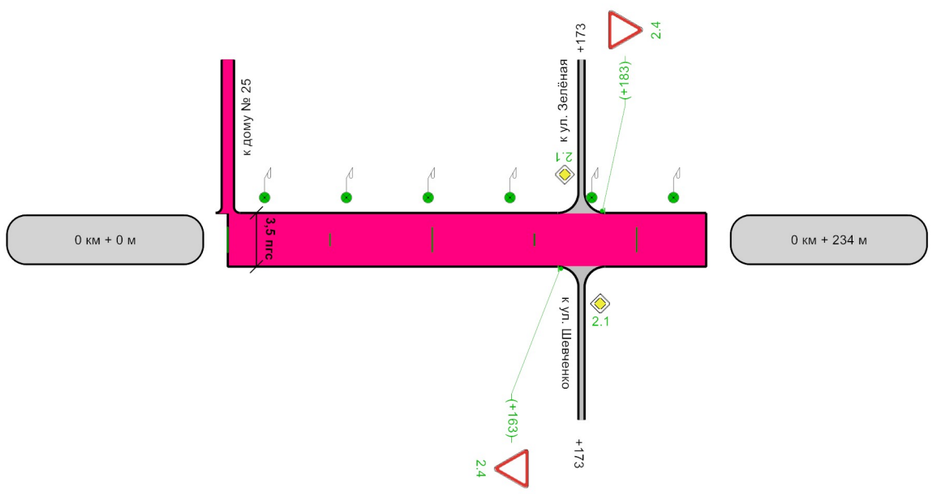

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+163	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+183	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018	0+218	Населенный пункт	6/6	200	0	Слева
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автодороги ул. Черноморская до земельного участка по ул. Молодежная, 1А


км 0+000 - км 0+752

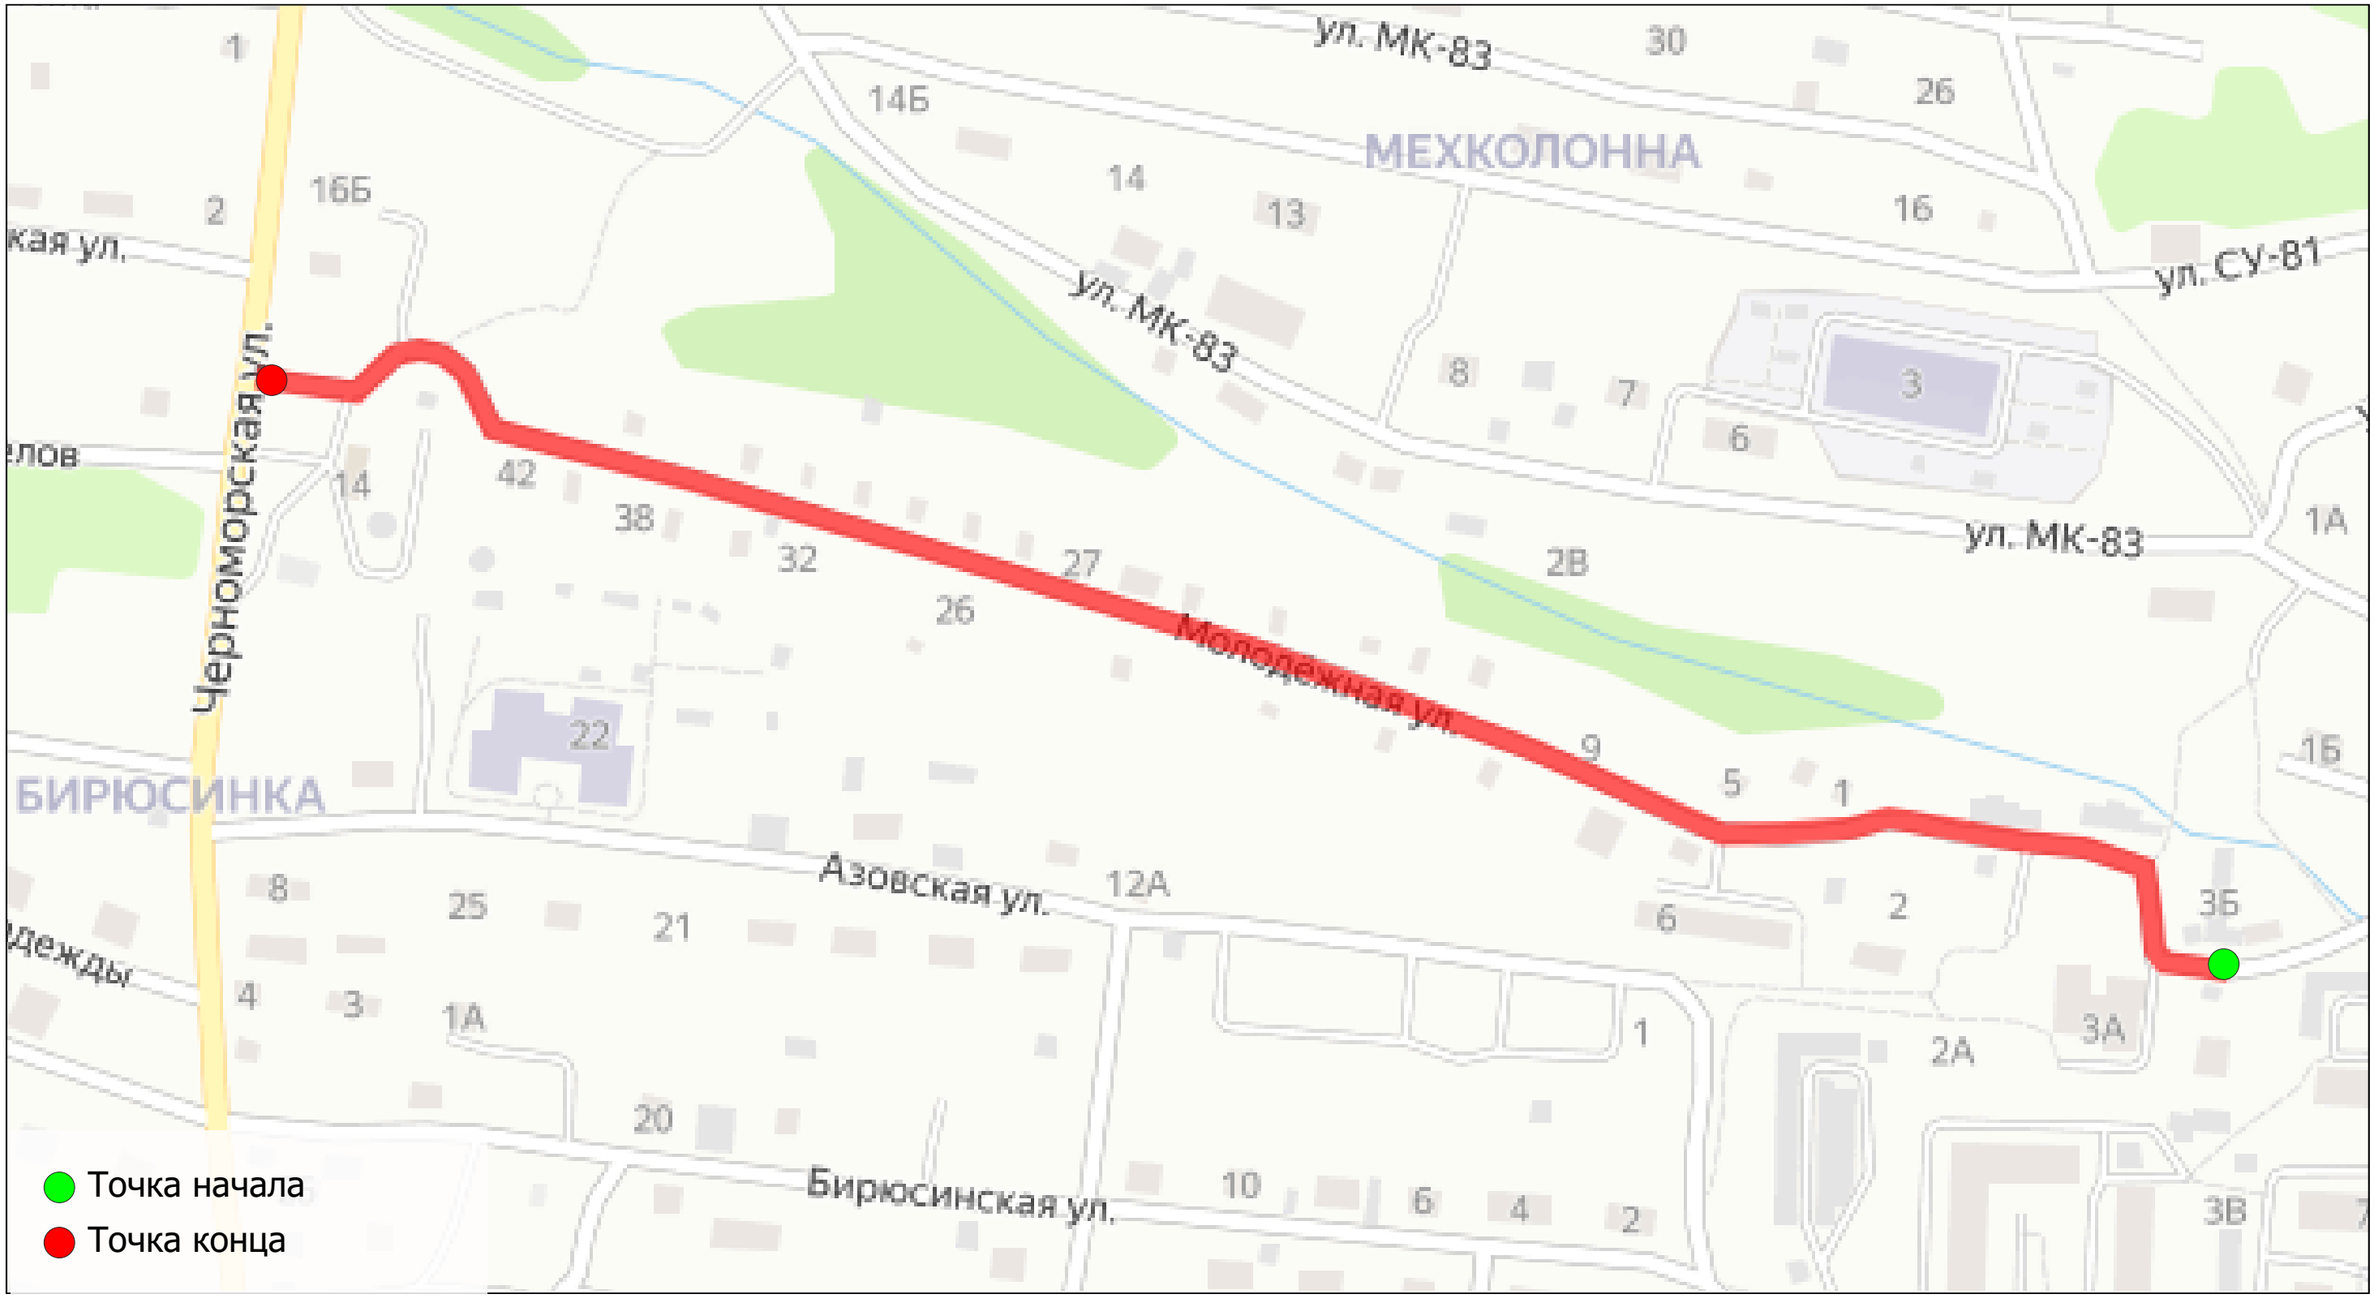

М 1:3000

Автомобильная дорога от автодороги ул. Черноморская до земельного участка по ул. Молодежная, 1А

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	58 · 73 (327) R=11345м · 84 (442) · 92 (581) R=4137м · 56 (727)
Кривые в плане	313 R=1984м P=428; a=3° 403
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,50 · 57 · 3,50

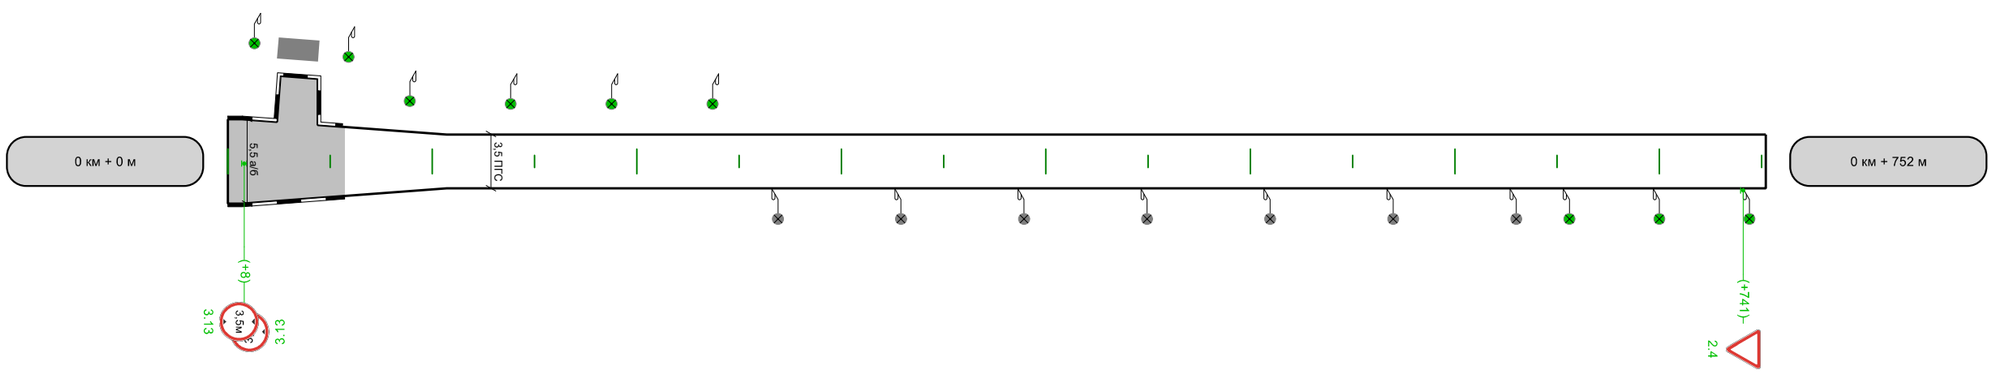

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+741	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+008	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013	0+237	Населенный пункт	6/6	224	0	Слева
2	0+269	0+630	Населенный пункт	7/7	0	361	Справа
3	0+656	0+744	Населенный пункт	3/3	88	0	Справа
Итого:				**16/16**	**312**	**361**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+024	0+044	Населенный пункт	Слева		20
Итого:					**0**	**20**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Первопроходцев, д. 2 до земельного участка ул. Первопроходцев, д. 8
км 0+000 - км 0+131

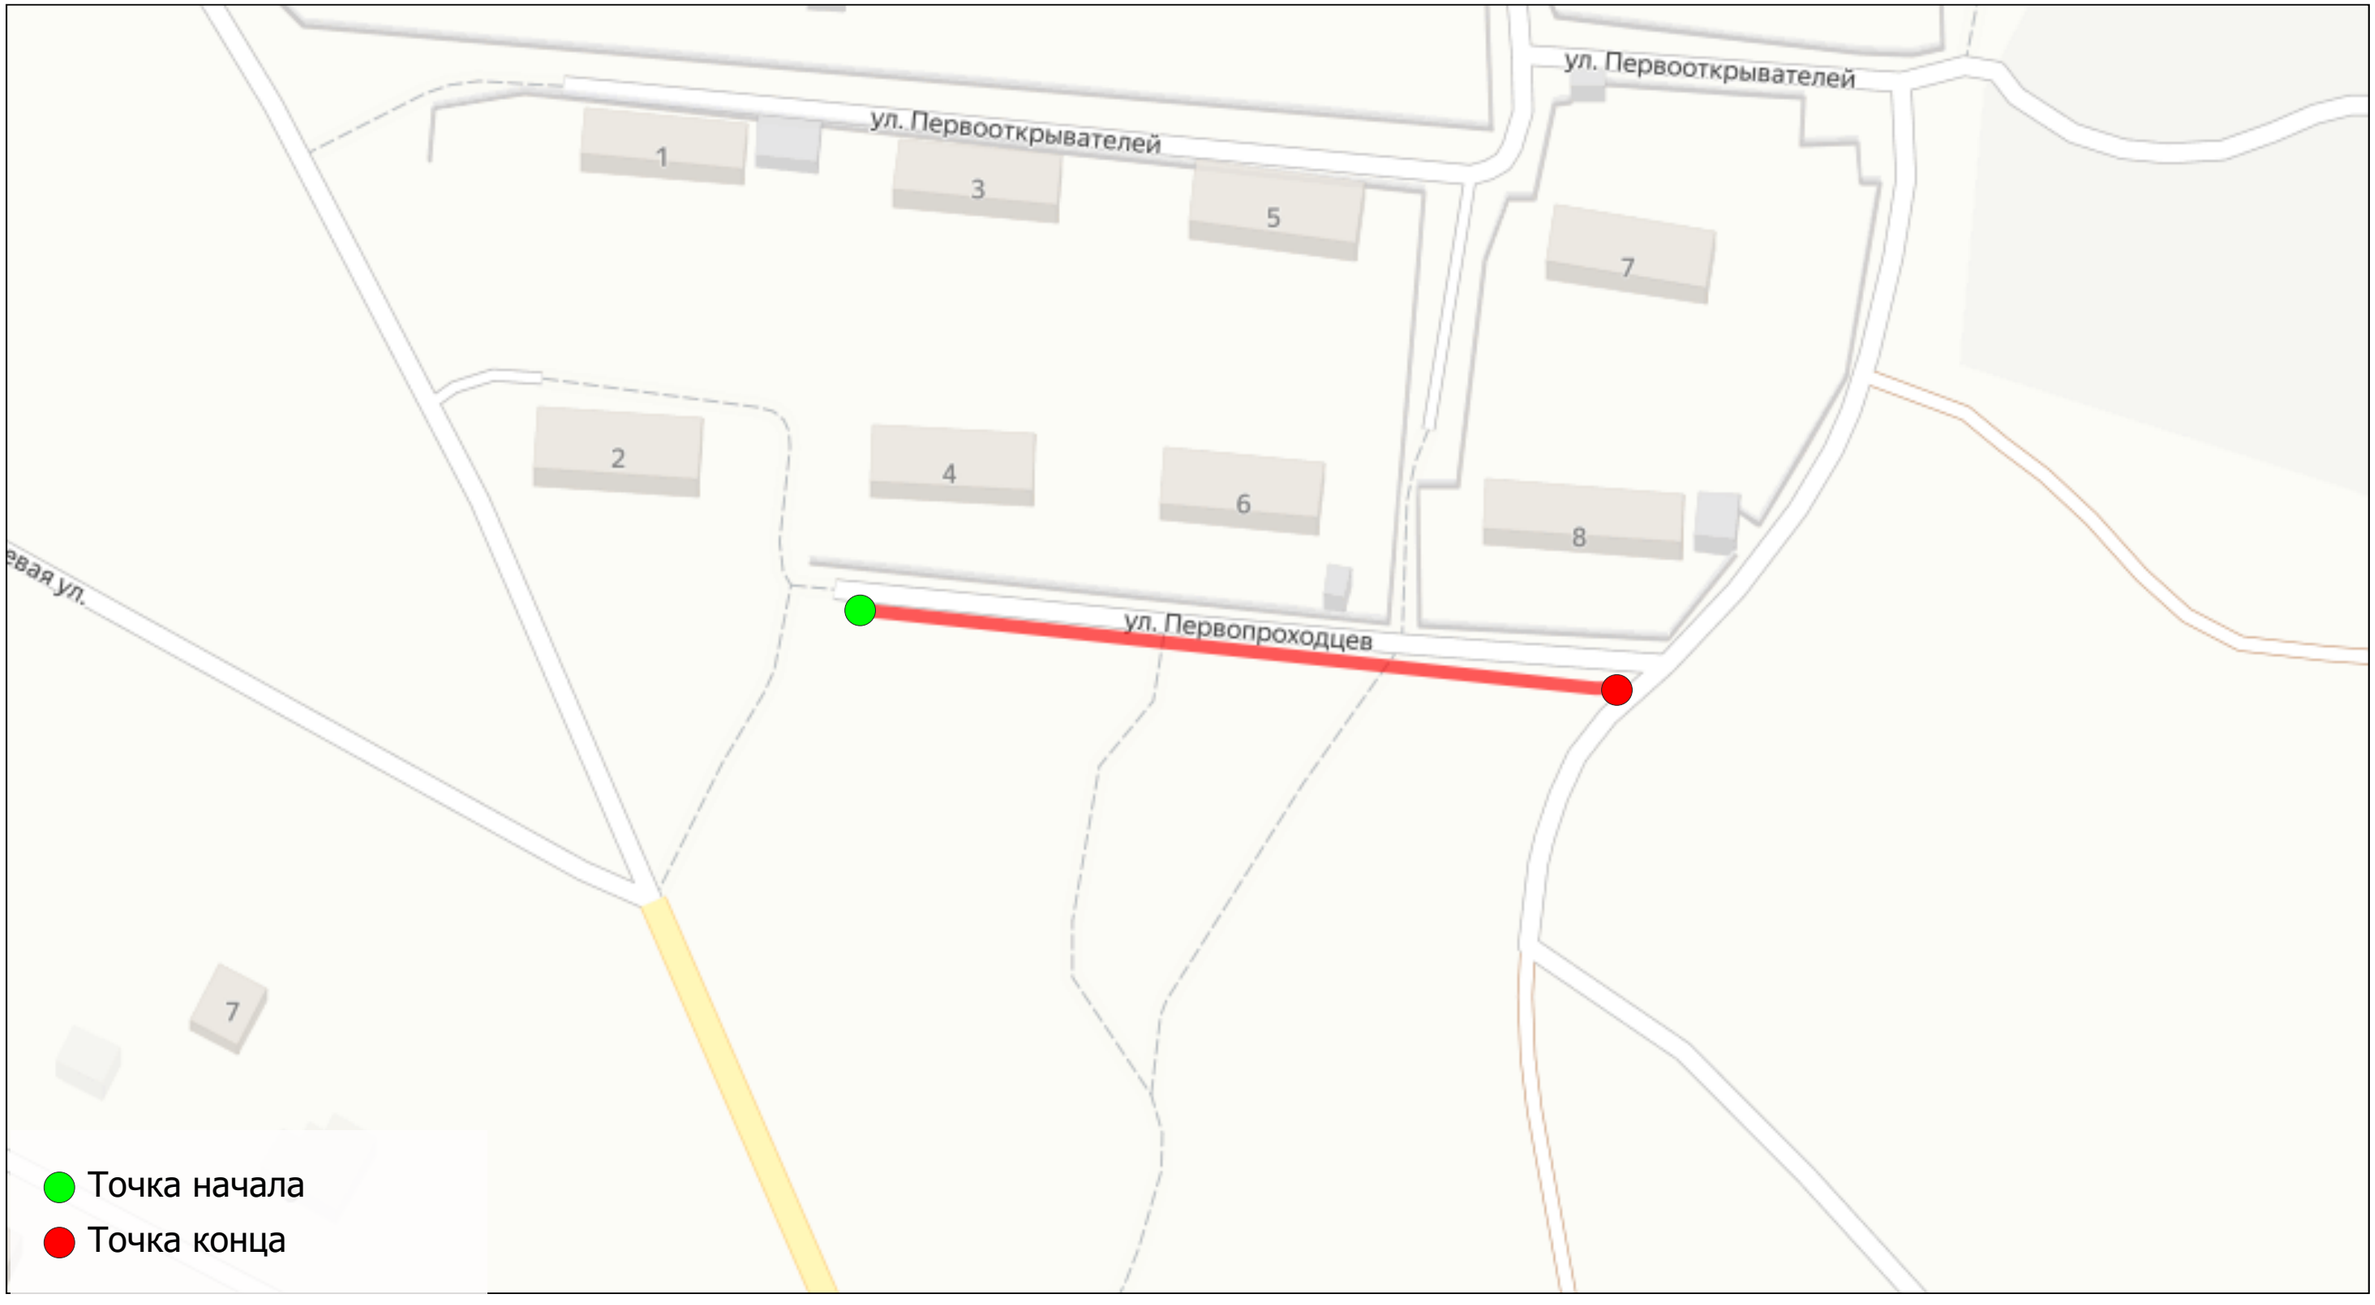

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	20 10 20 R=2705м 22 124
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00 44 3,00

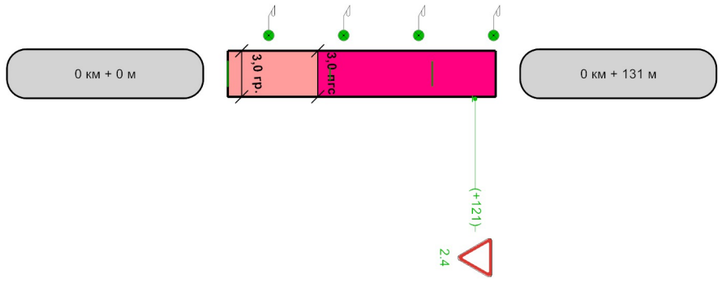

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+121	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+130	Населенный пункт	4/4	110	0	Слева
Итого:				**4/4**	**110**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до д.№4а по ул. Подгорная

1-й участок: км 0+000 - км 0+255
2-й участок: км 0+000 - км 0+721
3-й участок: км 0+000 - км 0+367

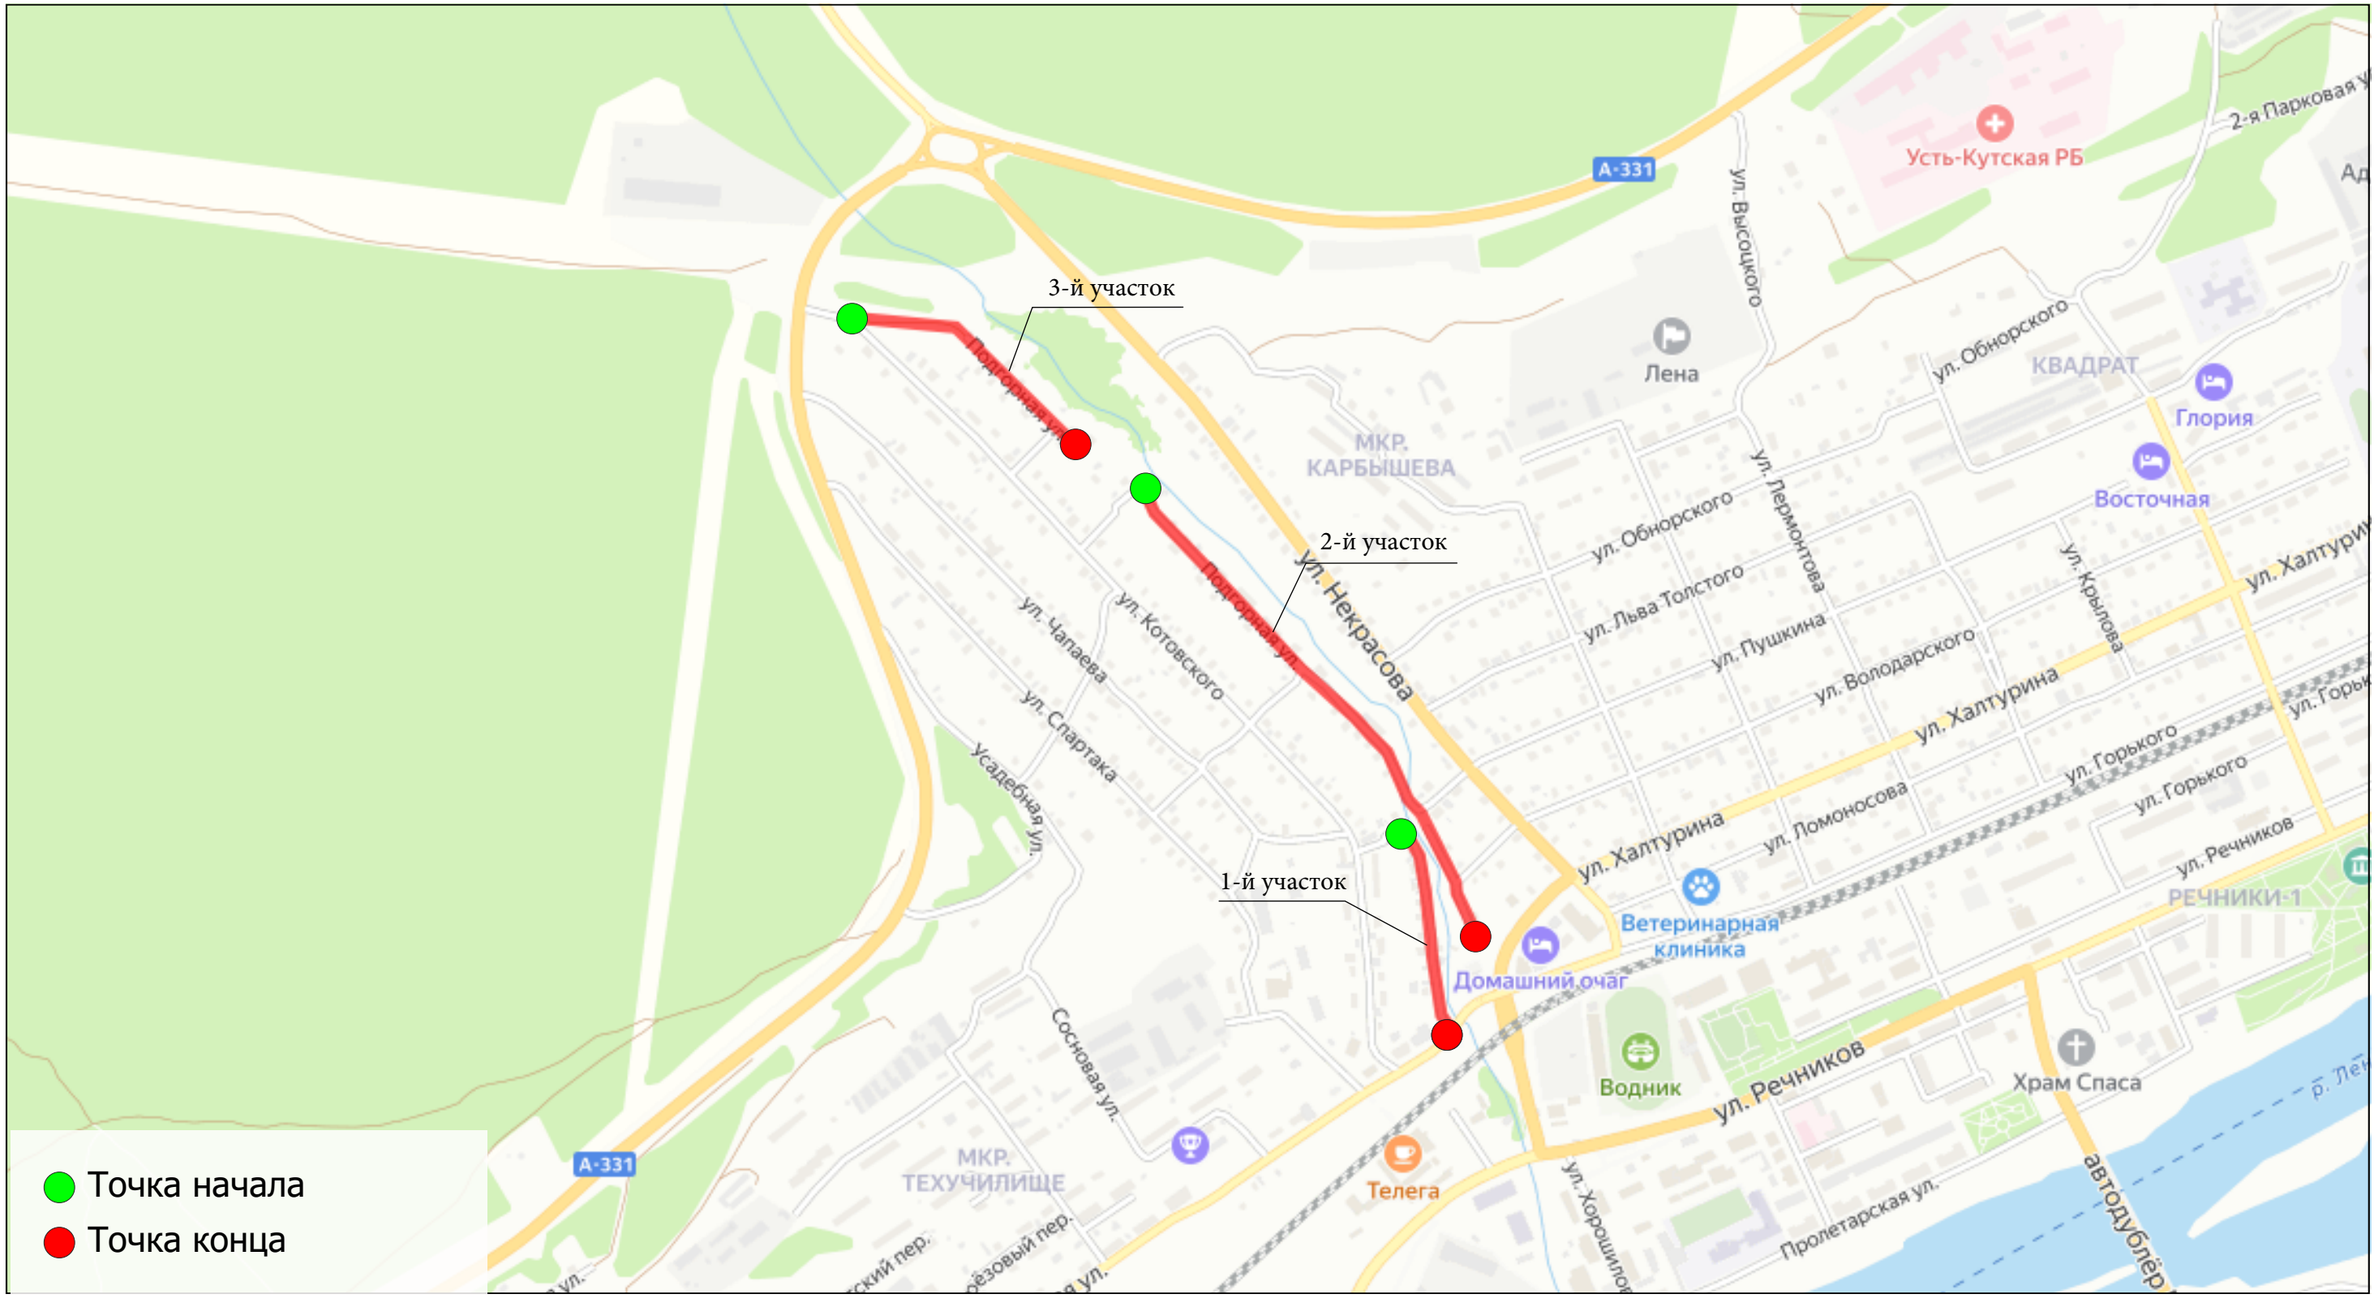

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13 — 84 — 8 — R=1873м — 139 — 37 — 159 — 38 — R=852м
Кривые в плане	171 — R=181м P=2; a=43° — 240
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 90 — 4,50

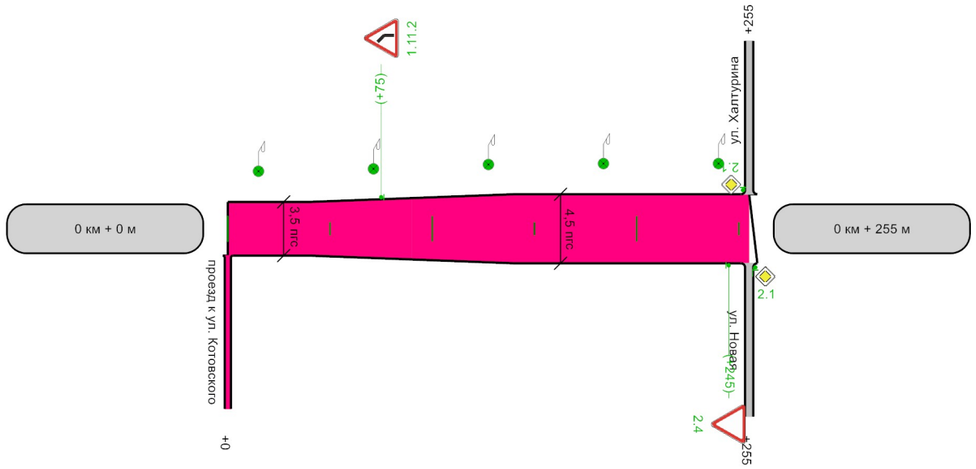

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+075	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.4	Уступите дорогу			0+245	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+255	Населенный пункт	11/11	250	0	Справа
2	0+015	0+240	Населенный пункт	5/5	225	0	Слева
Итого:				**16/16**	**475**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12 — 711
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,50

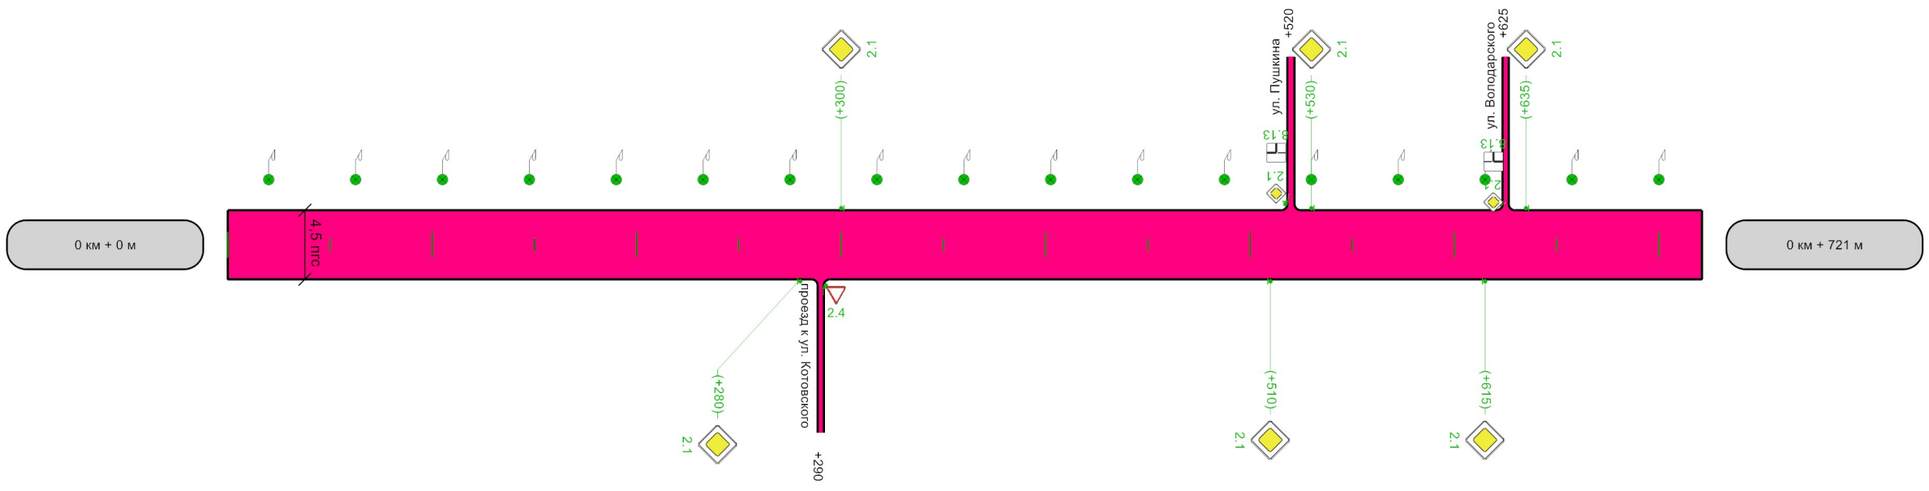

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+300	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+510	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+530	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+615	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+635	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+700	Населенный пункт	17/17	680	0	Слева
Итого:				**17/17**	**680**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 4 R=1566м 81 55 103 55 R=2591м 167 30
Кривые в плане	25 R=24м P=0; a=28° 65 125 R=122м P=2; a=38° 165
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

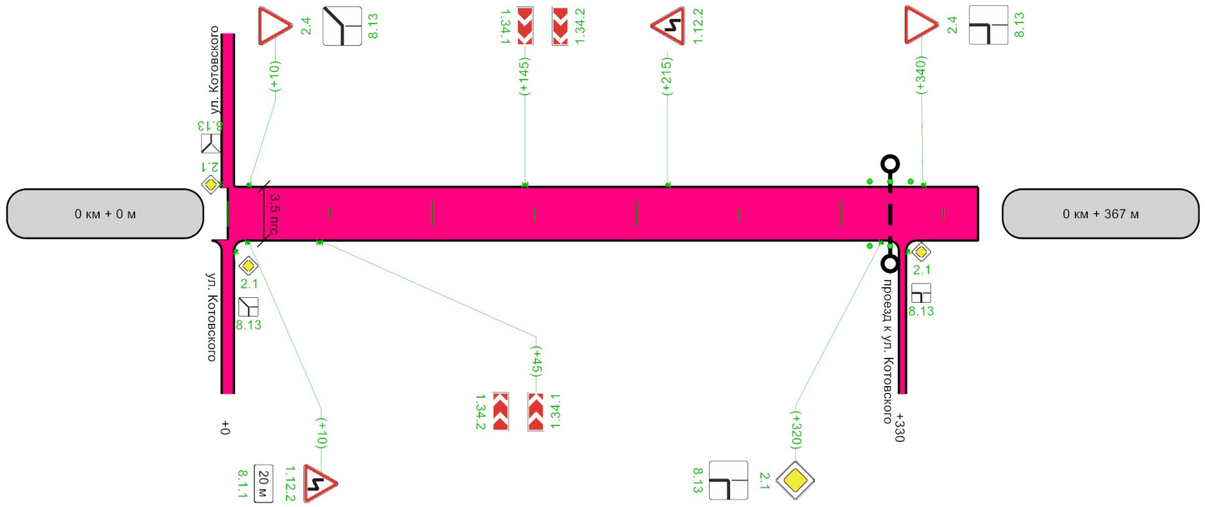

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+010	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты			0+215	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+045	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+145	Требуется установить	1	слева
5	1.34.2	Направление поворота			0+045	Требуется установить	1	справа
6	1.34.2	Направление поворота			0+145	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+320	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+340	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.1.1	Расстояние до объекта			0+010	Требуется установить	1	справа
11	8.13	Направление главной дороги			0+320	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	8.13	Направление главной дороги			0+340	Требуется установить	1	слева
13	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**13**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+314	0+324	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+314	0+334	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**30/5**					

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Портовая от жилого дома по ул. Зыряновка, д.4 до примыкания с ул. Поконечный ручей


км 0+000 - км 1+910



М 1:3000

Автомобильная дорога по ул. Портовая: от жилого дома по ул. Зыряновка, д.4 до примыкания с ул. Поконечный ручей


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	113 R=140м 137 170 R=462м 244 277 R=315м 327 414 R=351м 479 605 R=712м 669 812 R=262м P=19; a=8° 849 911 R=7614м R=751м P=77; a=6° 984
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

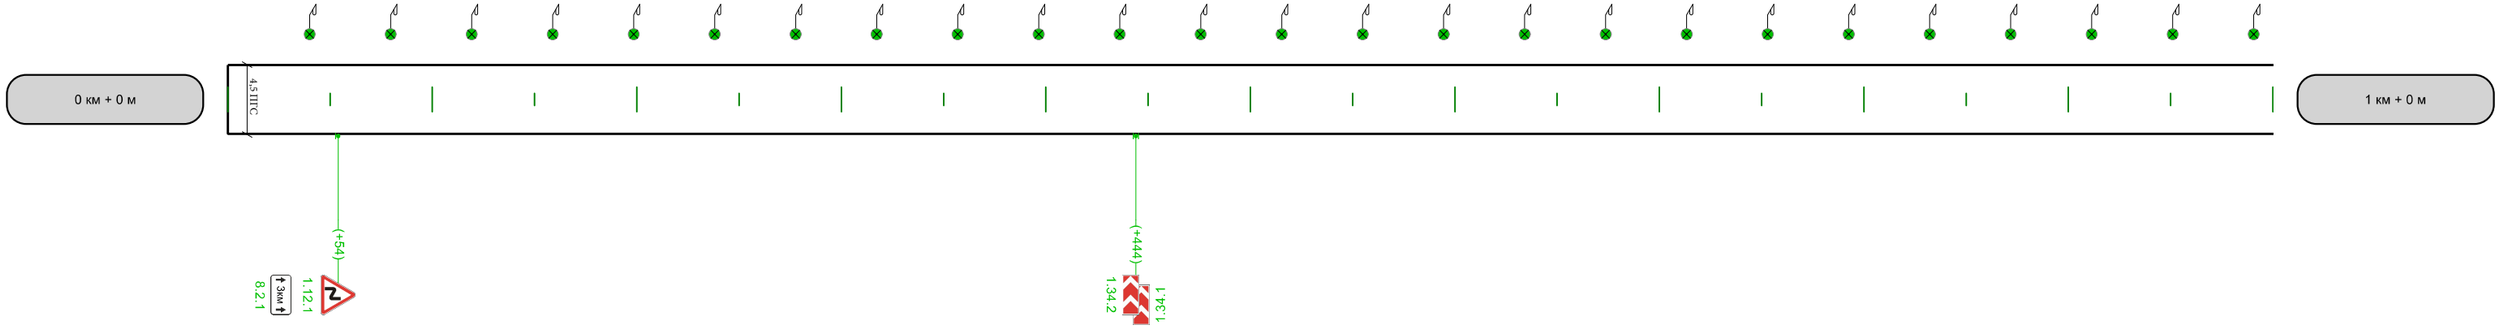

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	27 27 7 7 92 92 10 10 6 R=2881м 104 340 R=2478м 548 570 R=2450м 768 798 R=7284м
Кривые в плане	63 R=202м P=6; a=21° 135 155 R=83м P=2; a=27° 194 214 R=218м P=11; a=11° 256 276 R=346м P=18; a=11° 340 382 R=210м P=2; a=50° 564 585 R=98м P=1; a=49° 680 841 R=146м P=5; a=17° 884
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

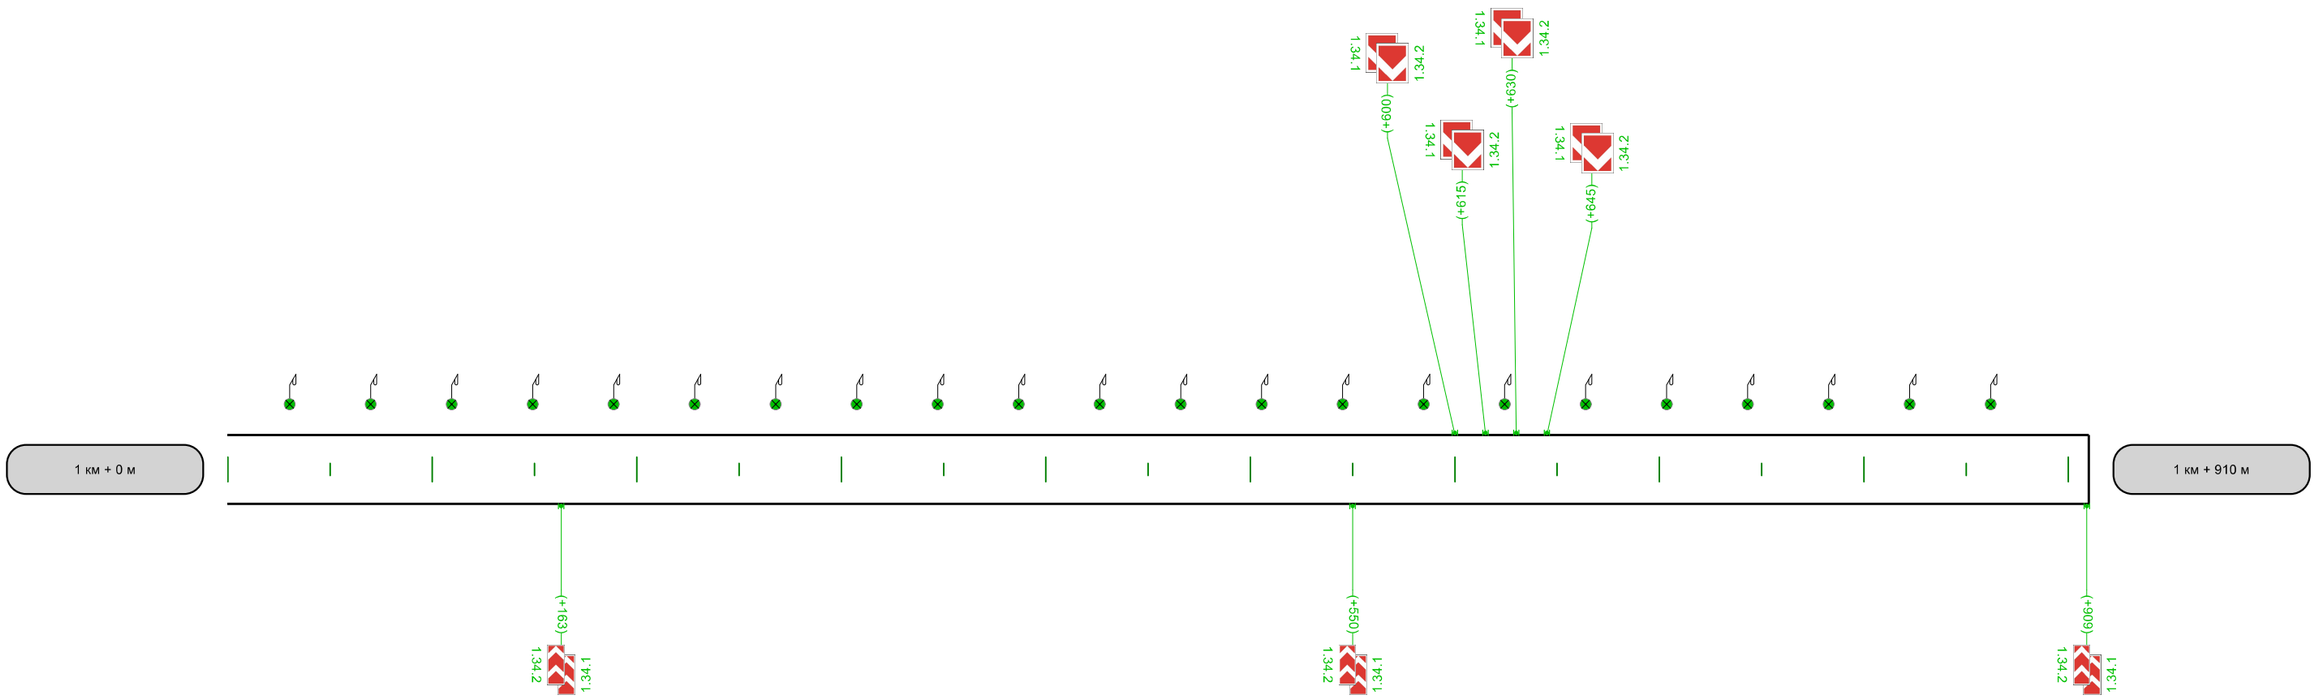

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+054	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+444	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			1+163	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			1+550	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			1+600	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			1+615	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			1+630	Требуется установить	1	слева
8	1.34.1	Направление поворота			1+645	Требуется установить	1	слева
9	1.34.1	Направление поворота			1+909	Требуется установить	1	справа
10	1.34.2	Направление поворота			0+444	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			1+163	Требуется установить	1	справа
12	1.34.2	Направление поворота			1+550	Требуется установить	1	справа
13	1.34.2	Направление поворота			1+600	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			1+615	Требуется установить	1	слева
15	1.34.2	Направление поворота			1+630	Требуется установить	1	слева
16	1.34.2	Направление поворота			1+645	Требуется установить	1	слева
17	1.34.2	Направление поворота			1+909	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**17**	
		Итого:					**17**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
18	8.2.1	Зона действия			0+054	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**18**	
		Всего:					**18**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+040	1+862	Населенный пункт	47/47	1822	0	Слева
Итого:				**47/47**	**1822**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Почтовая, д.2 до жилого дома по ул. Зверева, д.92

1-й участок: км 0+000 - км 0+206
2-й участок: км 0+000 - км 0+232

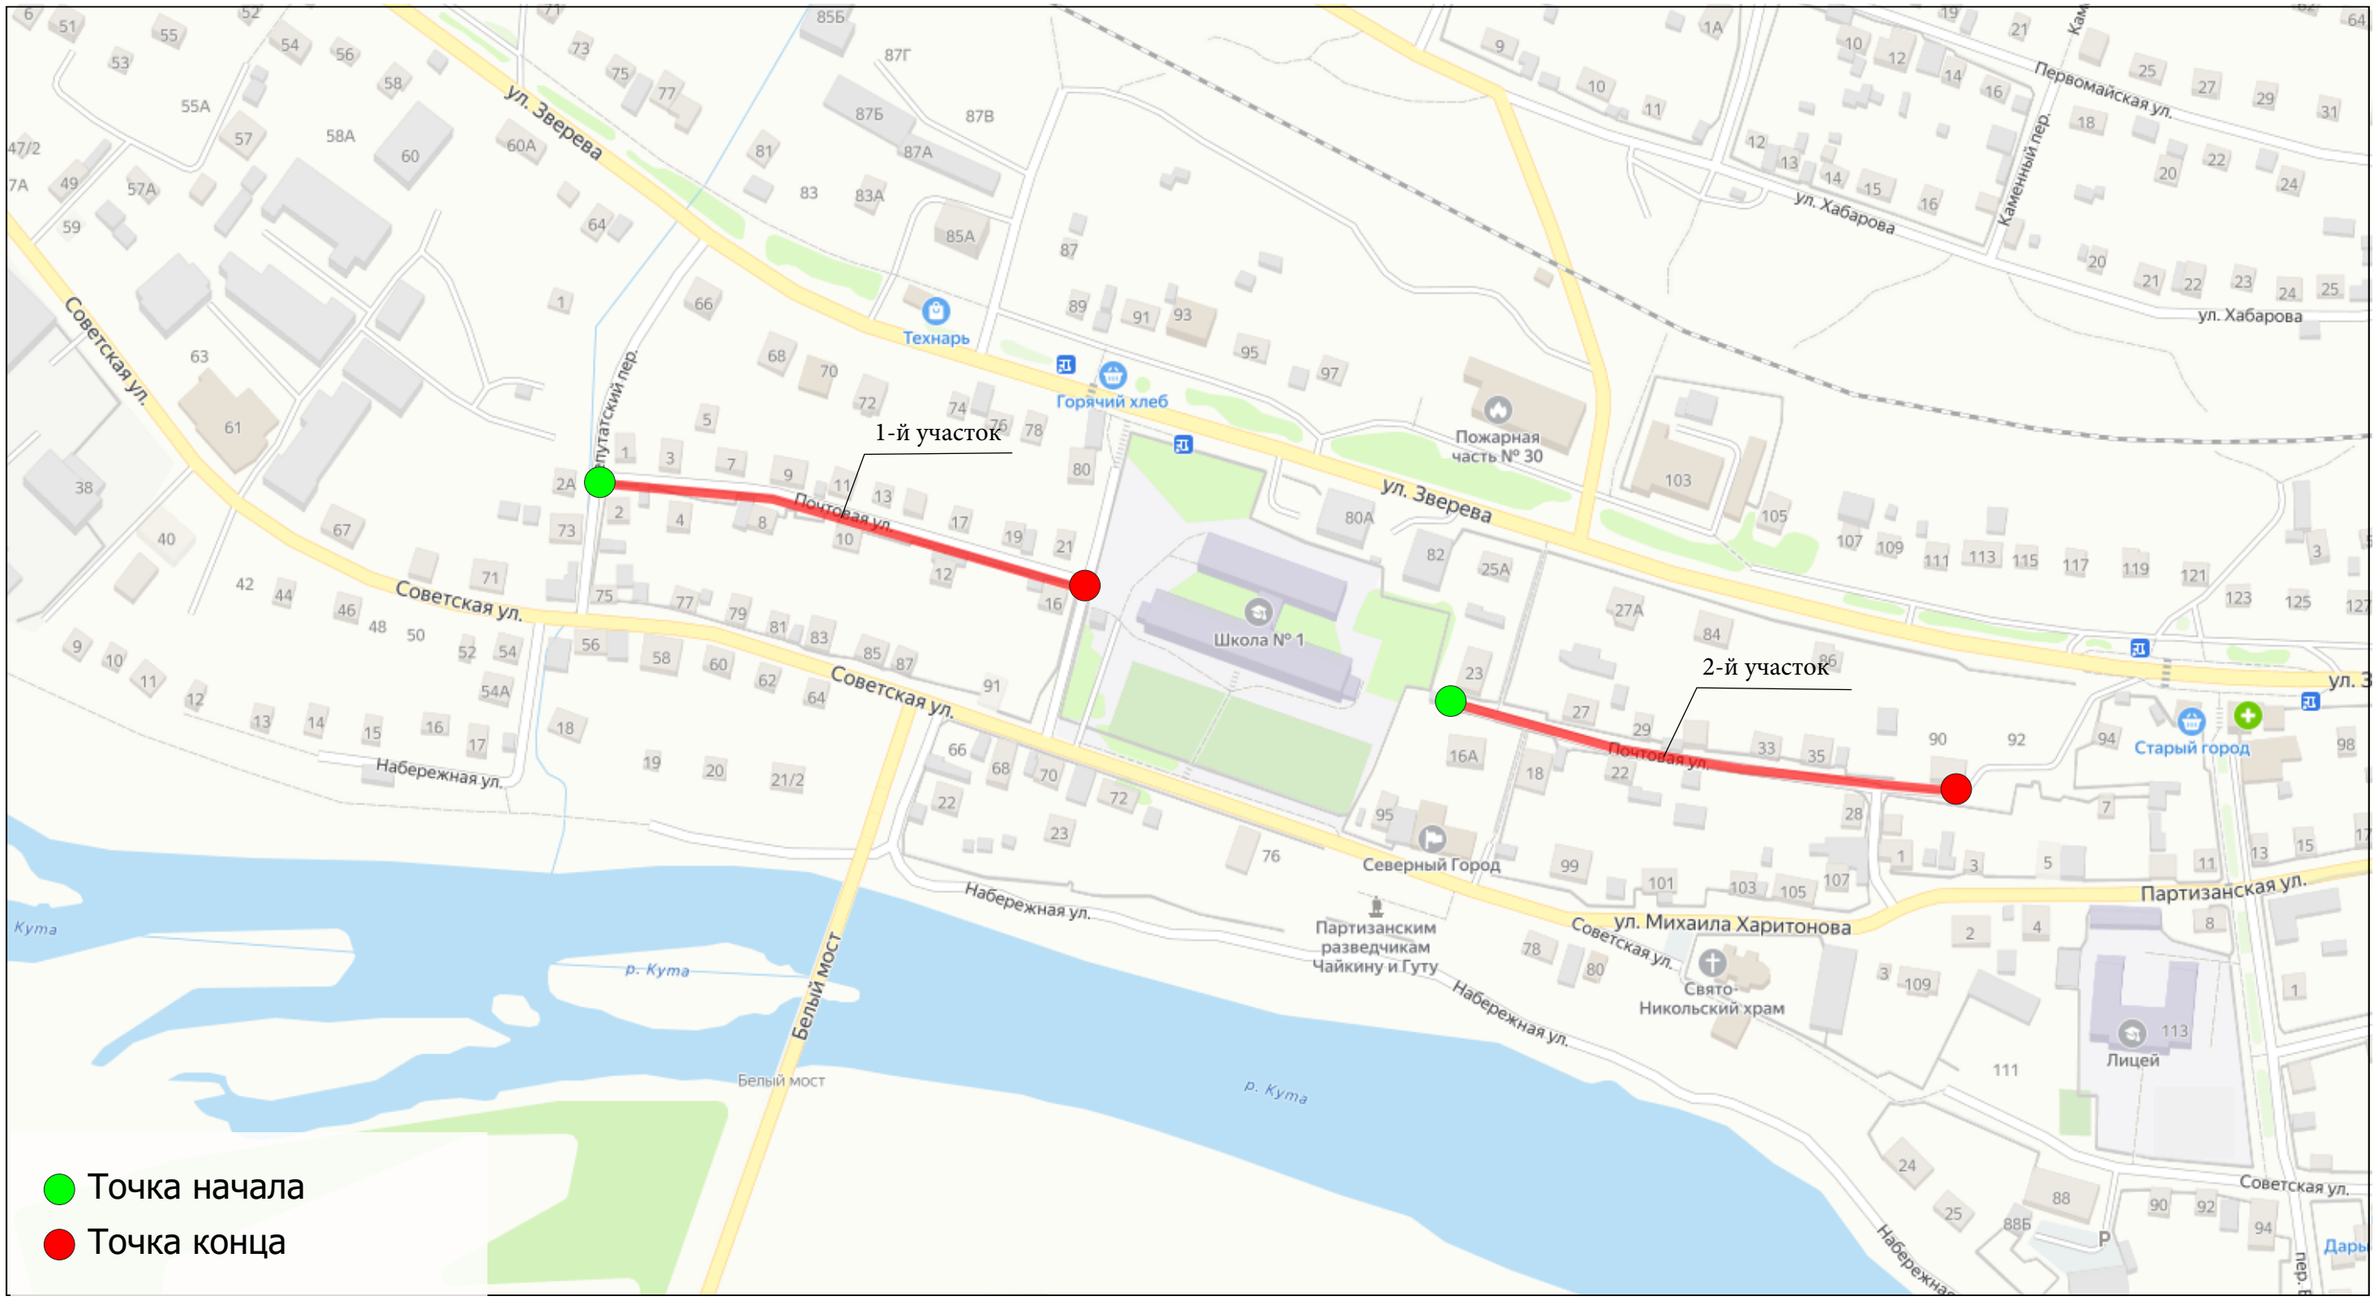

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 42 2 R=3878м 3 155
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

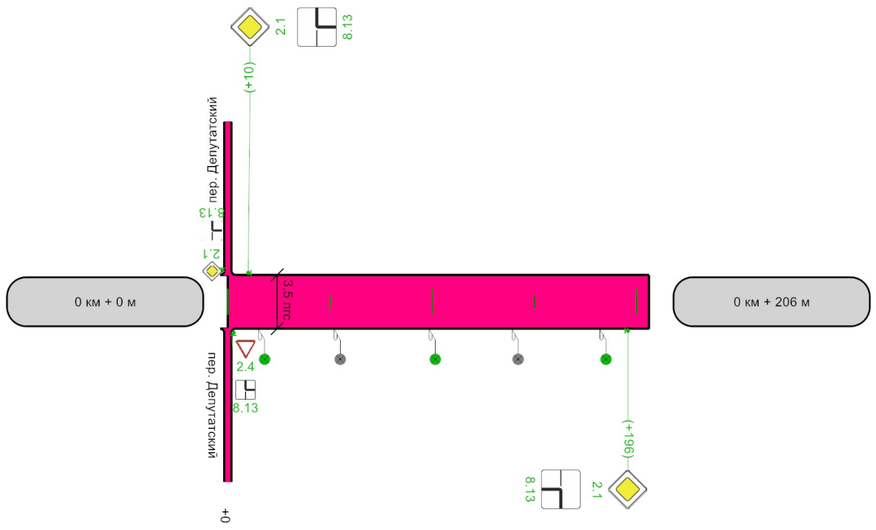

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+196	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	8.13	Направление главной дороги			0+196	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+018	0+185	Населенный пункт	3/3	167	0	Справа
2	0+055	0+142	Населенный пункт	2/2	0	87	Справа
Итого:				**5/5**	**167**	**87**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 149 21 R=4865м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

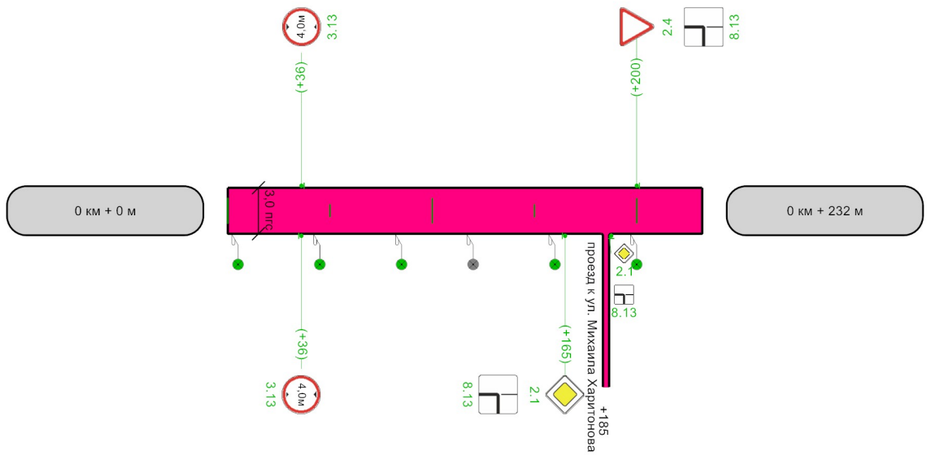

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+165	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.13	Ограничение высоты			0+036	Требуется установить	1	слева
4	3.13	Ограничение высоты			0+036	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.13	Направление главной дороги			0+165	Требуется установить	1	справа
6	8.13	Направление главной дороги			0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+085	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
2	0+120	0+120	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+160	0+200	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**6/6**	**120**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Малая, д.1 до жилого дома по ул. Малая, д.7

км 0+000 - км 0+470

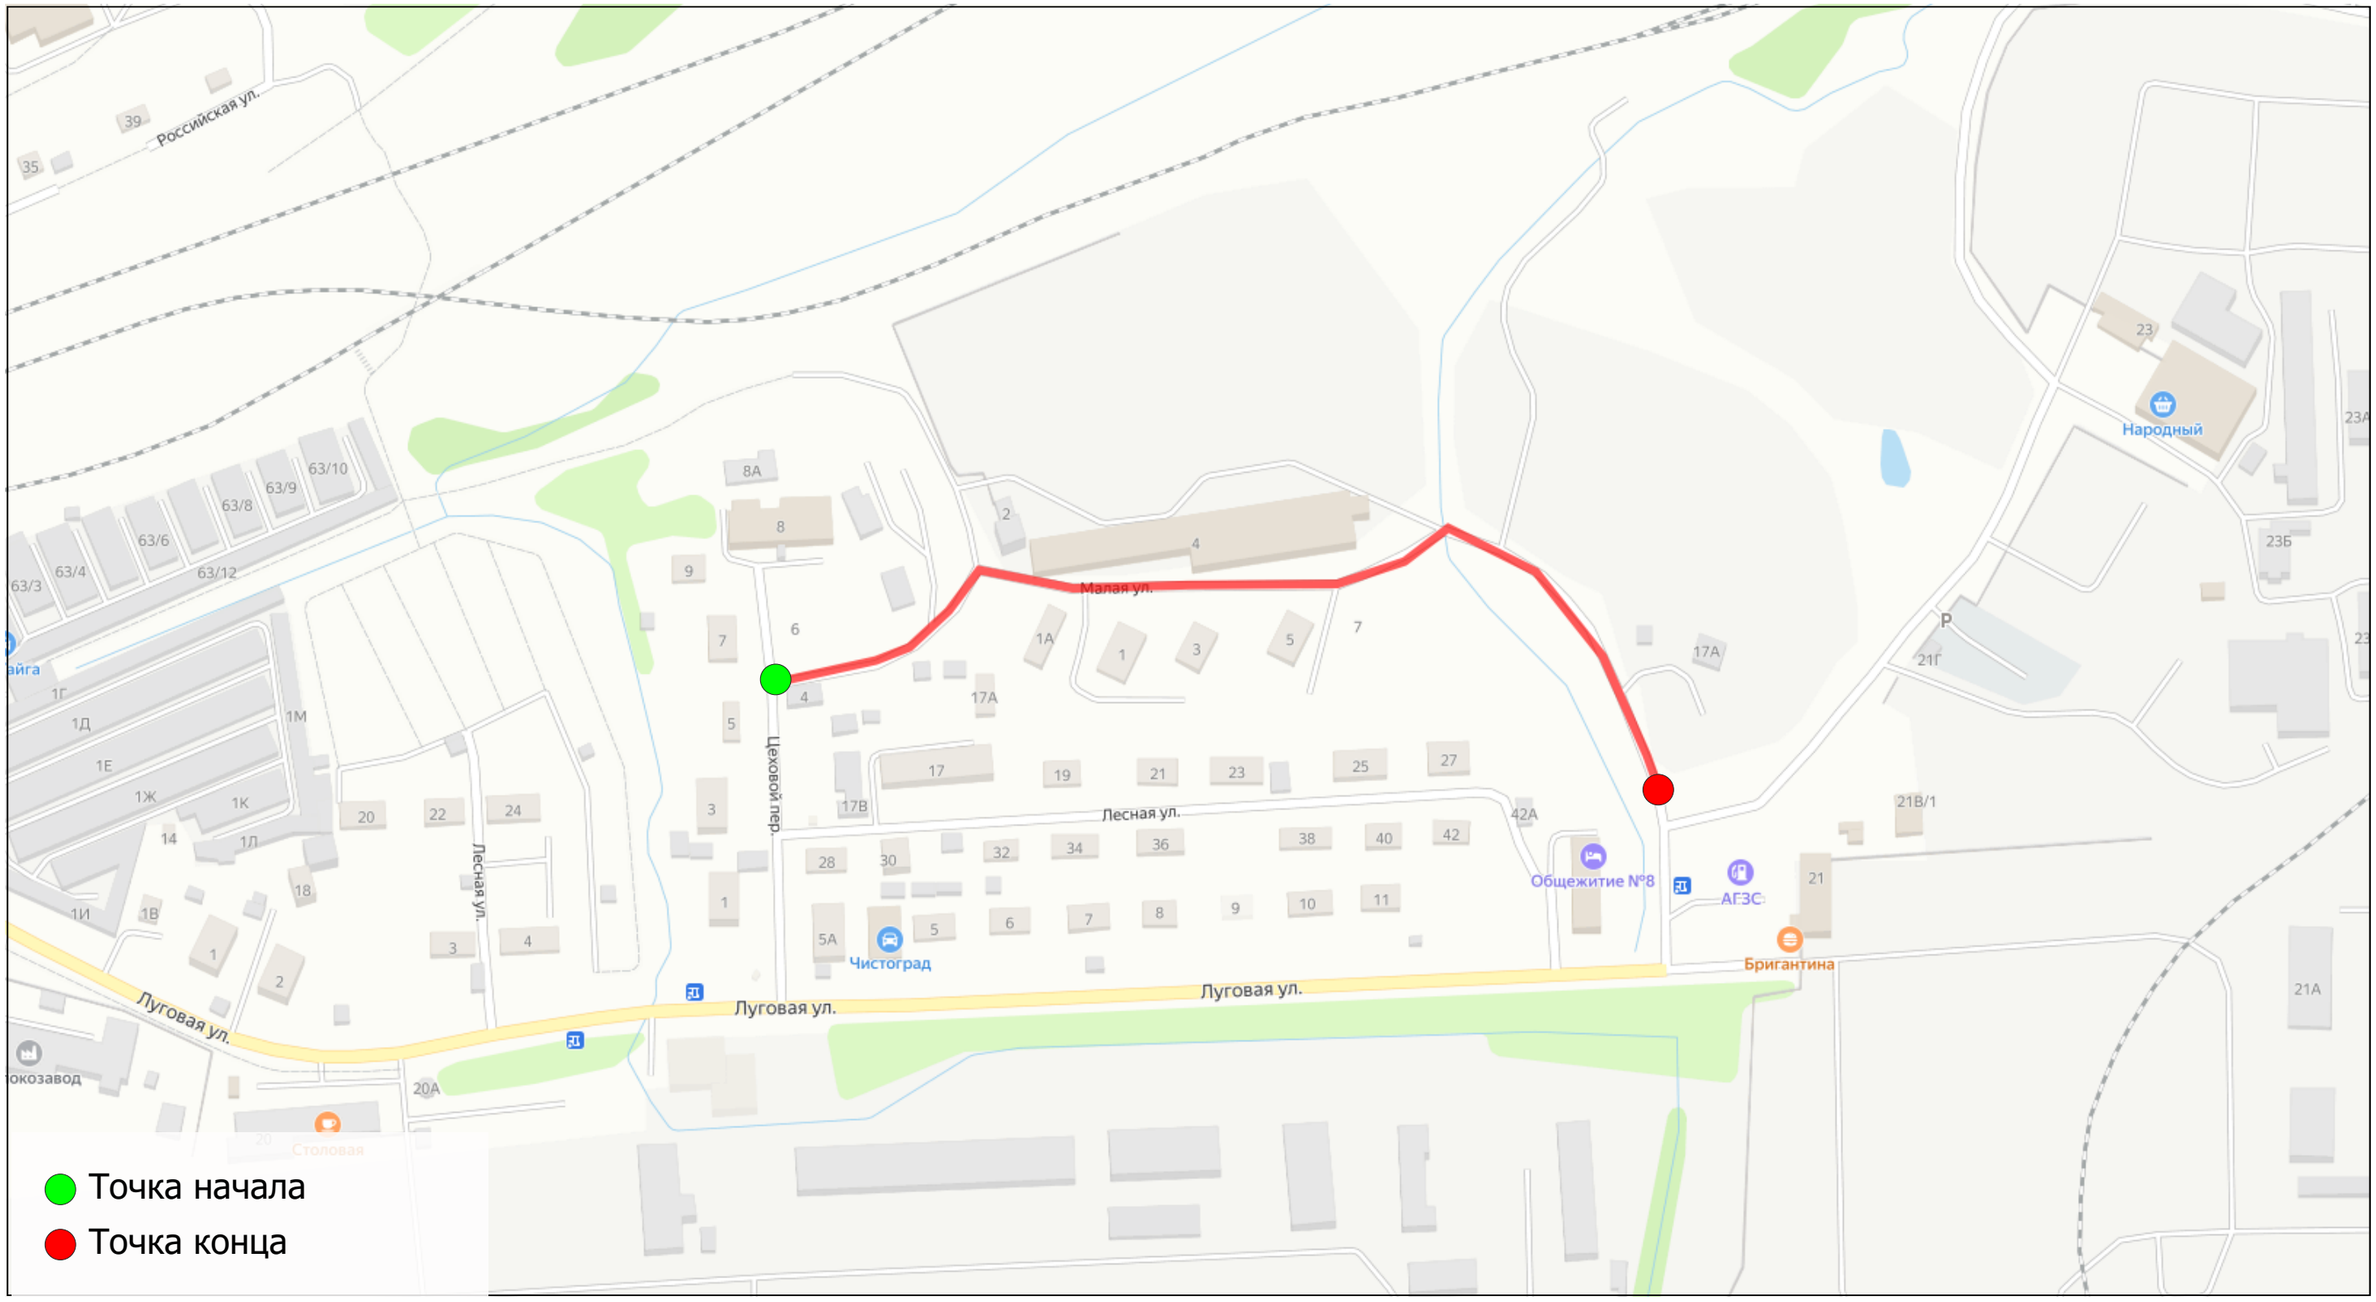

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 — 14 (105) — R=3888м — 34 (184)
Кривые в плане	47 R=56м P=1; a=37° 83 — R=76м P=2; a=23° 302 334
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0: 6,00 | 100: 4,00

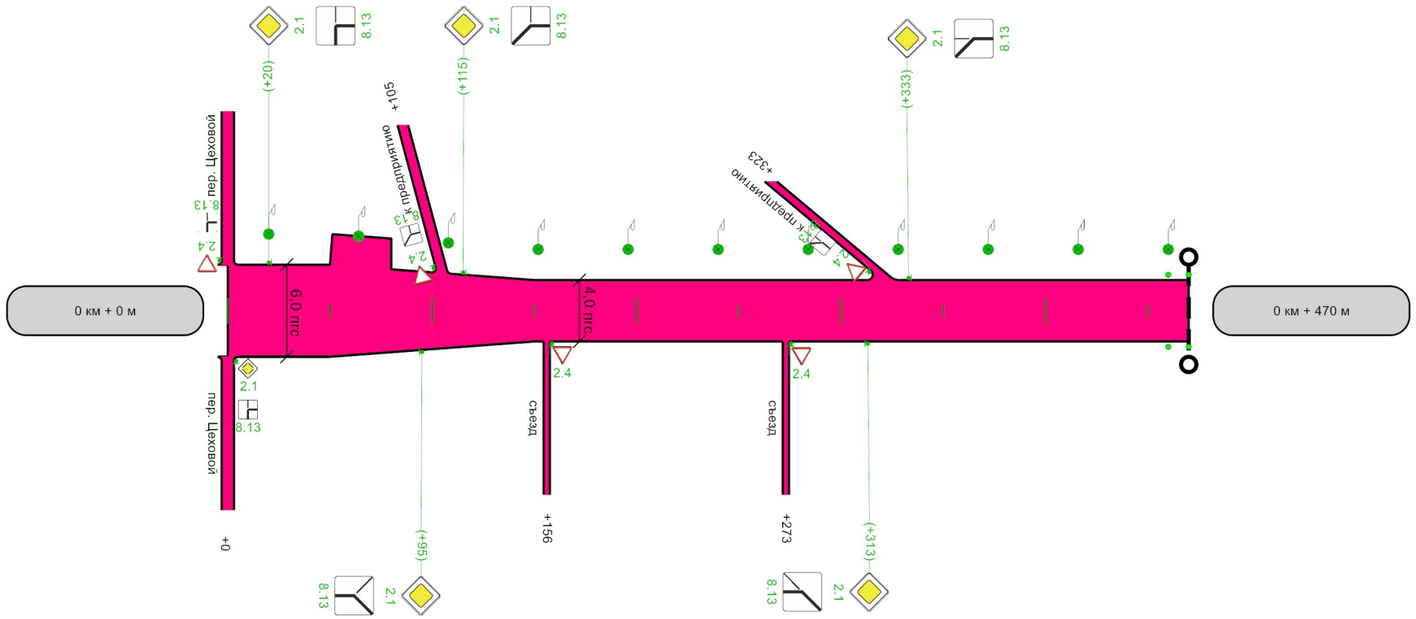

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+095	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+313	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+333	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+105	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+156	Требуется установить	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу			0+273	Требуется установить	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу			0+323	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги			0+020	Требуется установить	1	слева
11	8.13	Направление главной дороги			0+095	Требуется установить	1	справа
12	8.13	Направление главной дороги			0+115	Требуется установить	1	слева
13	8.13	Направление главной дороги			0+333	Требуется установить	1	слева
14	8.13	Направление главной дороги			0+105	Требуется установить	1	слева на примыкании
15	8.13	Направление главной дороги			0+323	Требуется установить	1	слева на примыкании
16	8.13	Направление главной дороги			0+313	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					7	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					16	
		Всего:					16	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+460	0+470	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+460	0+470	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+460	Населенный пункт	11/11	440	0	Слева
Итого:				**11/11**	**440**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Матросова, уч. № 16 до жилого дома по ул. Матросова, д. 65


км 0+000 - км 1+522

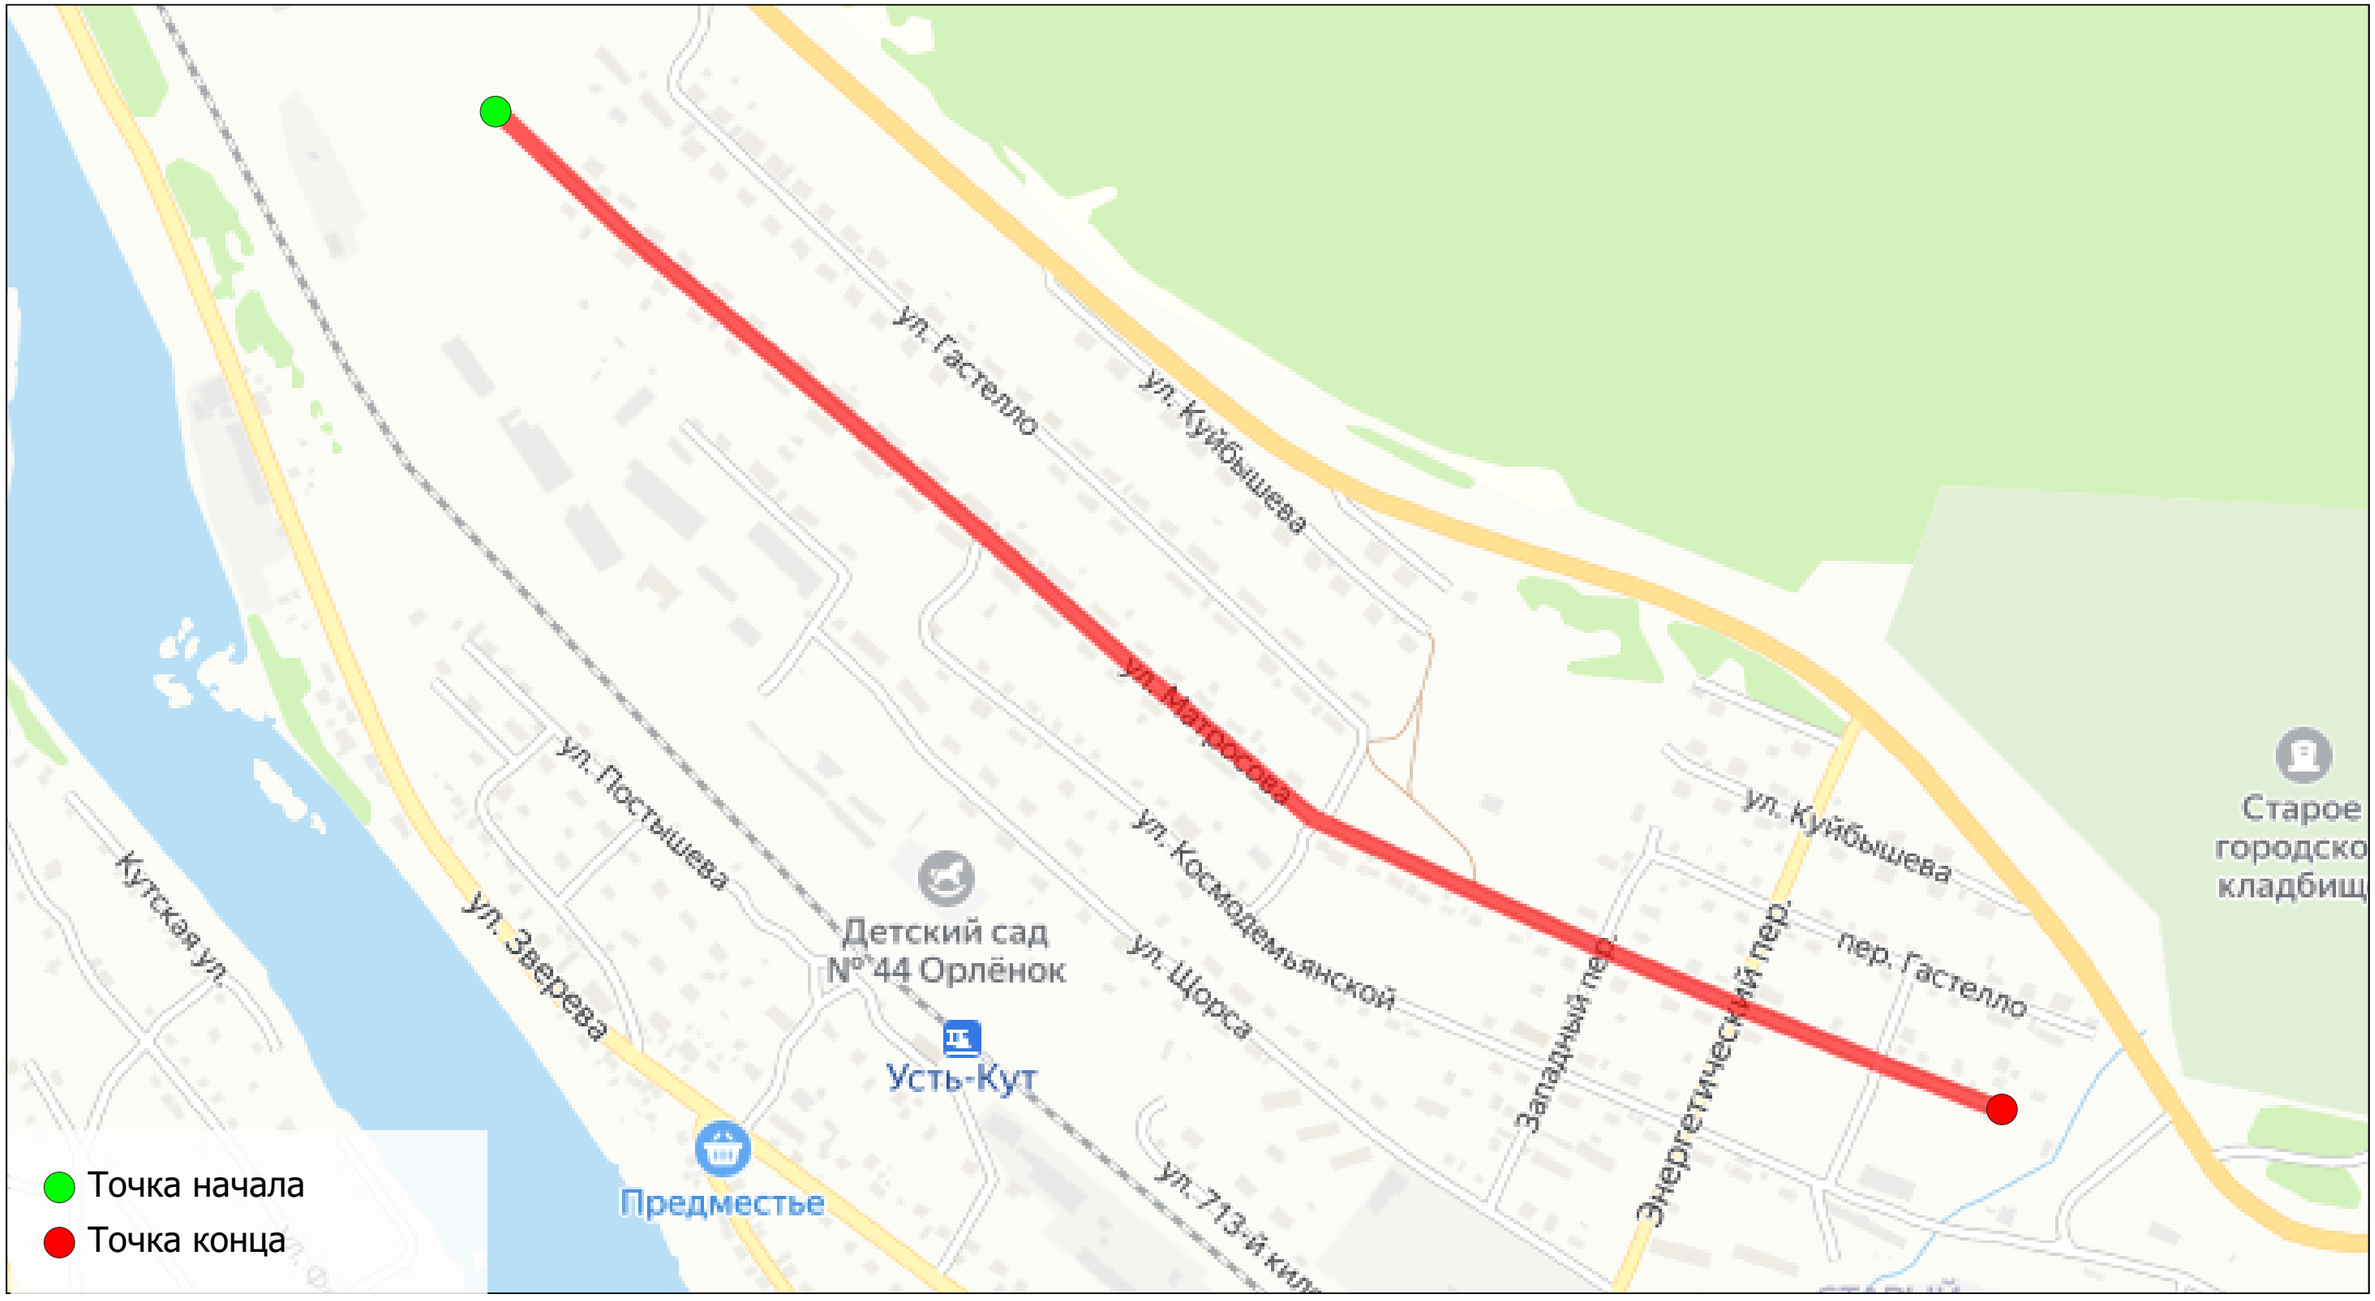

М 1:3000

Автомобильная дорога от земельного участка по ул. Матросова, уч. № 16 до жилого дома по ул. Матросова, д. 65


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4 — 4 (35) — R=5594м — 20 (173) — 15 (500) — R=1612м — 37 (536) — 37 (556) — R=2036м — 19 (673) — 19 (699) — R=3982м — 4 (761) — 6 (883) — R=5398м
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 243 - 1000
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 234 — 5,90

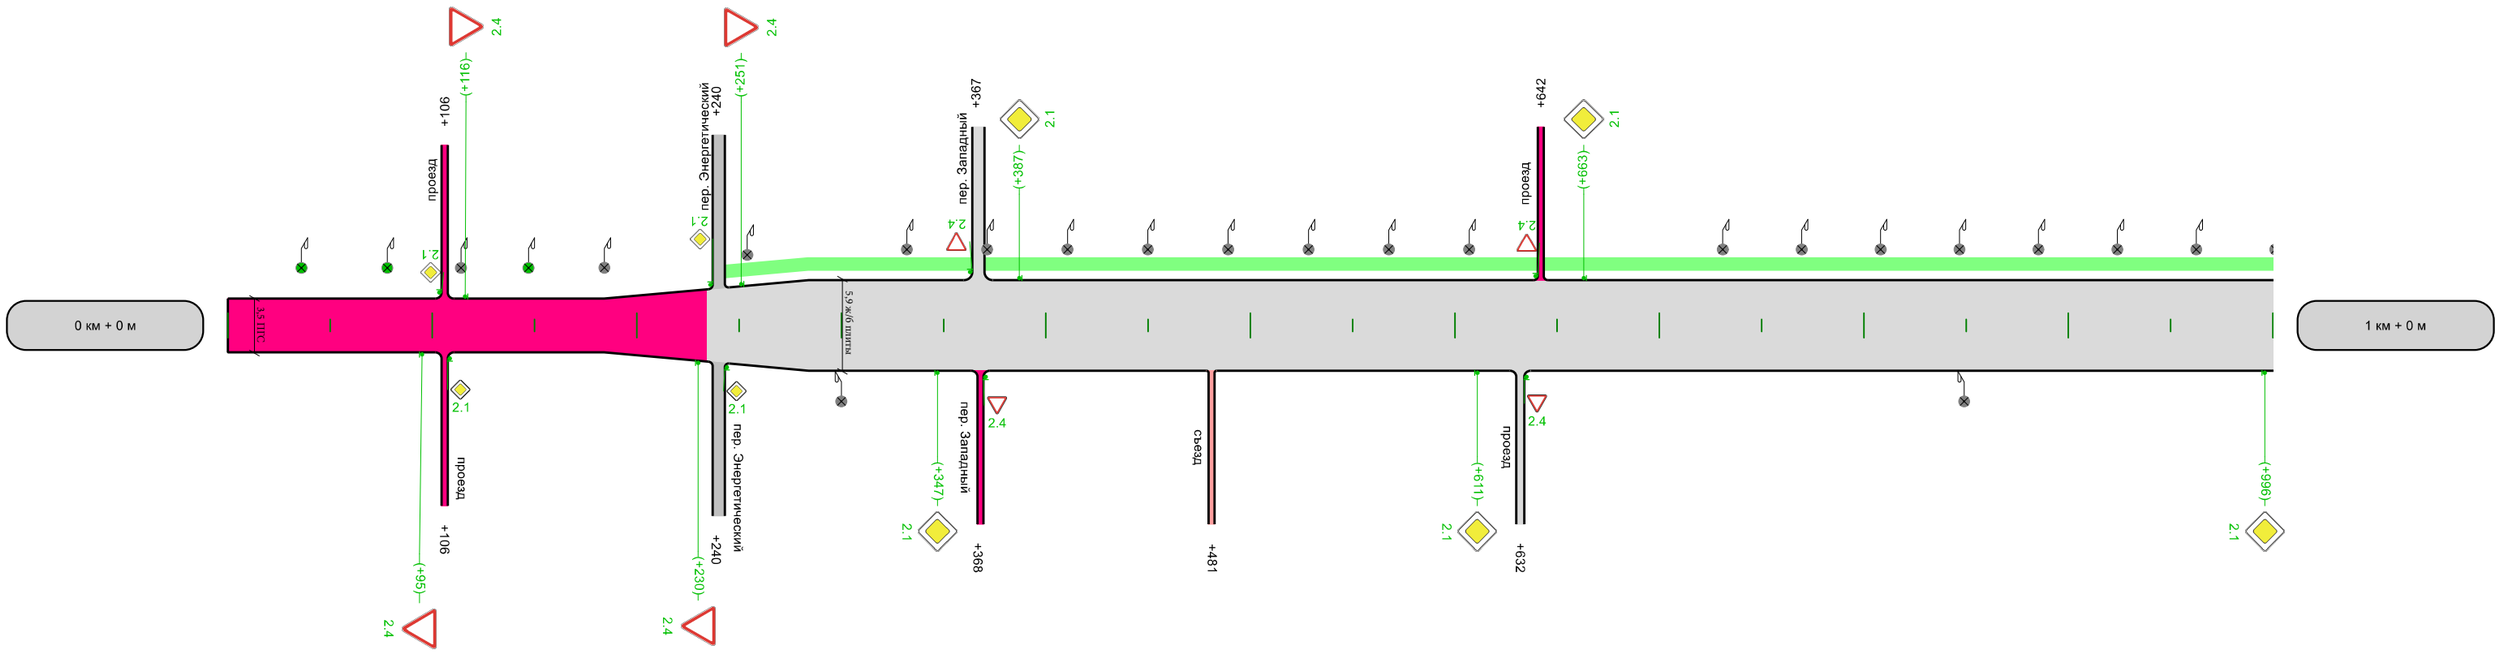

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 R=5398м 54 25 237 21 R=6186м 371 41 398 41 R=6688м 504 26
Кривые в плане	278 R=321м P=31; a=6° 312
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 522
Характеристики проезжей части	5,90

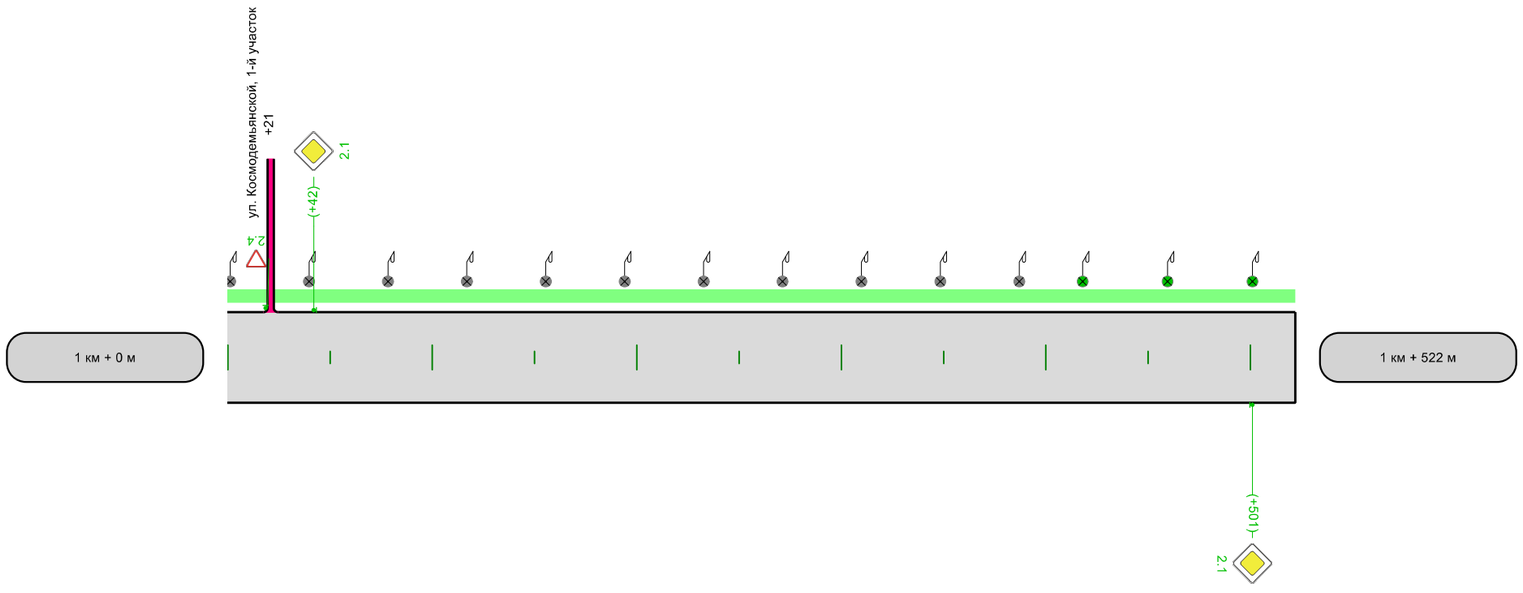

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+347	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+387	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+611	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+663	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+996	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			1+042	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			1+501	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+095	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+116	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+230	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+251	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+036	0+078	Населенный пункт	2/2	42	0	Слева
2	0+114	0+254	Населенный пункт	3/3	0	140	Слева
3	0+147	0+147	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+300	0+300	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+332	0+607	Населенный пункт	8/0	0	275	Слева
6	0+731	1+387	Населенный пункт	18/18	0	656	Слева
7	0+849	0+849	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
8	1+418	1+501	Населенный пункт	3/3	83	0	Слева
Итого:				**37/29**	**125**	**1071**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+243	1+522	Населенный пункт	Слева	1279	
Итого:					**1279**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Майская от жилого дома по ул. Майская, д.9 до земельного участка по ул. Майская, д. 17
км 0+000 - км 0+394

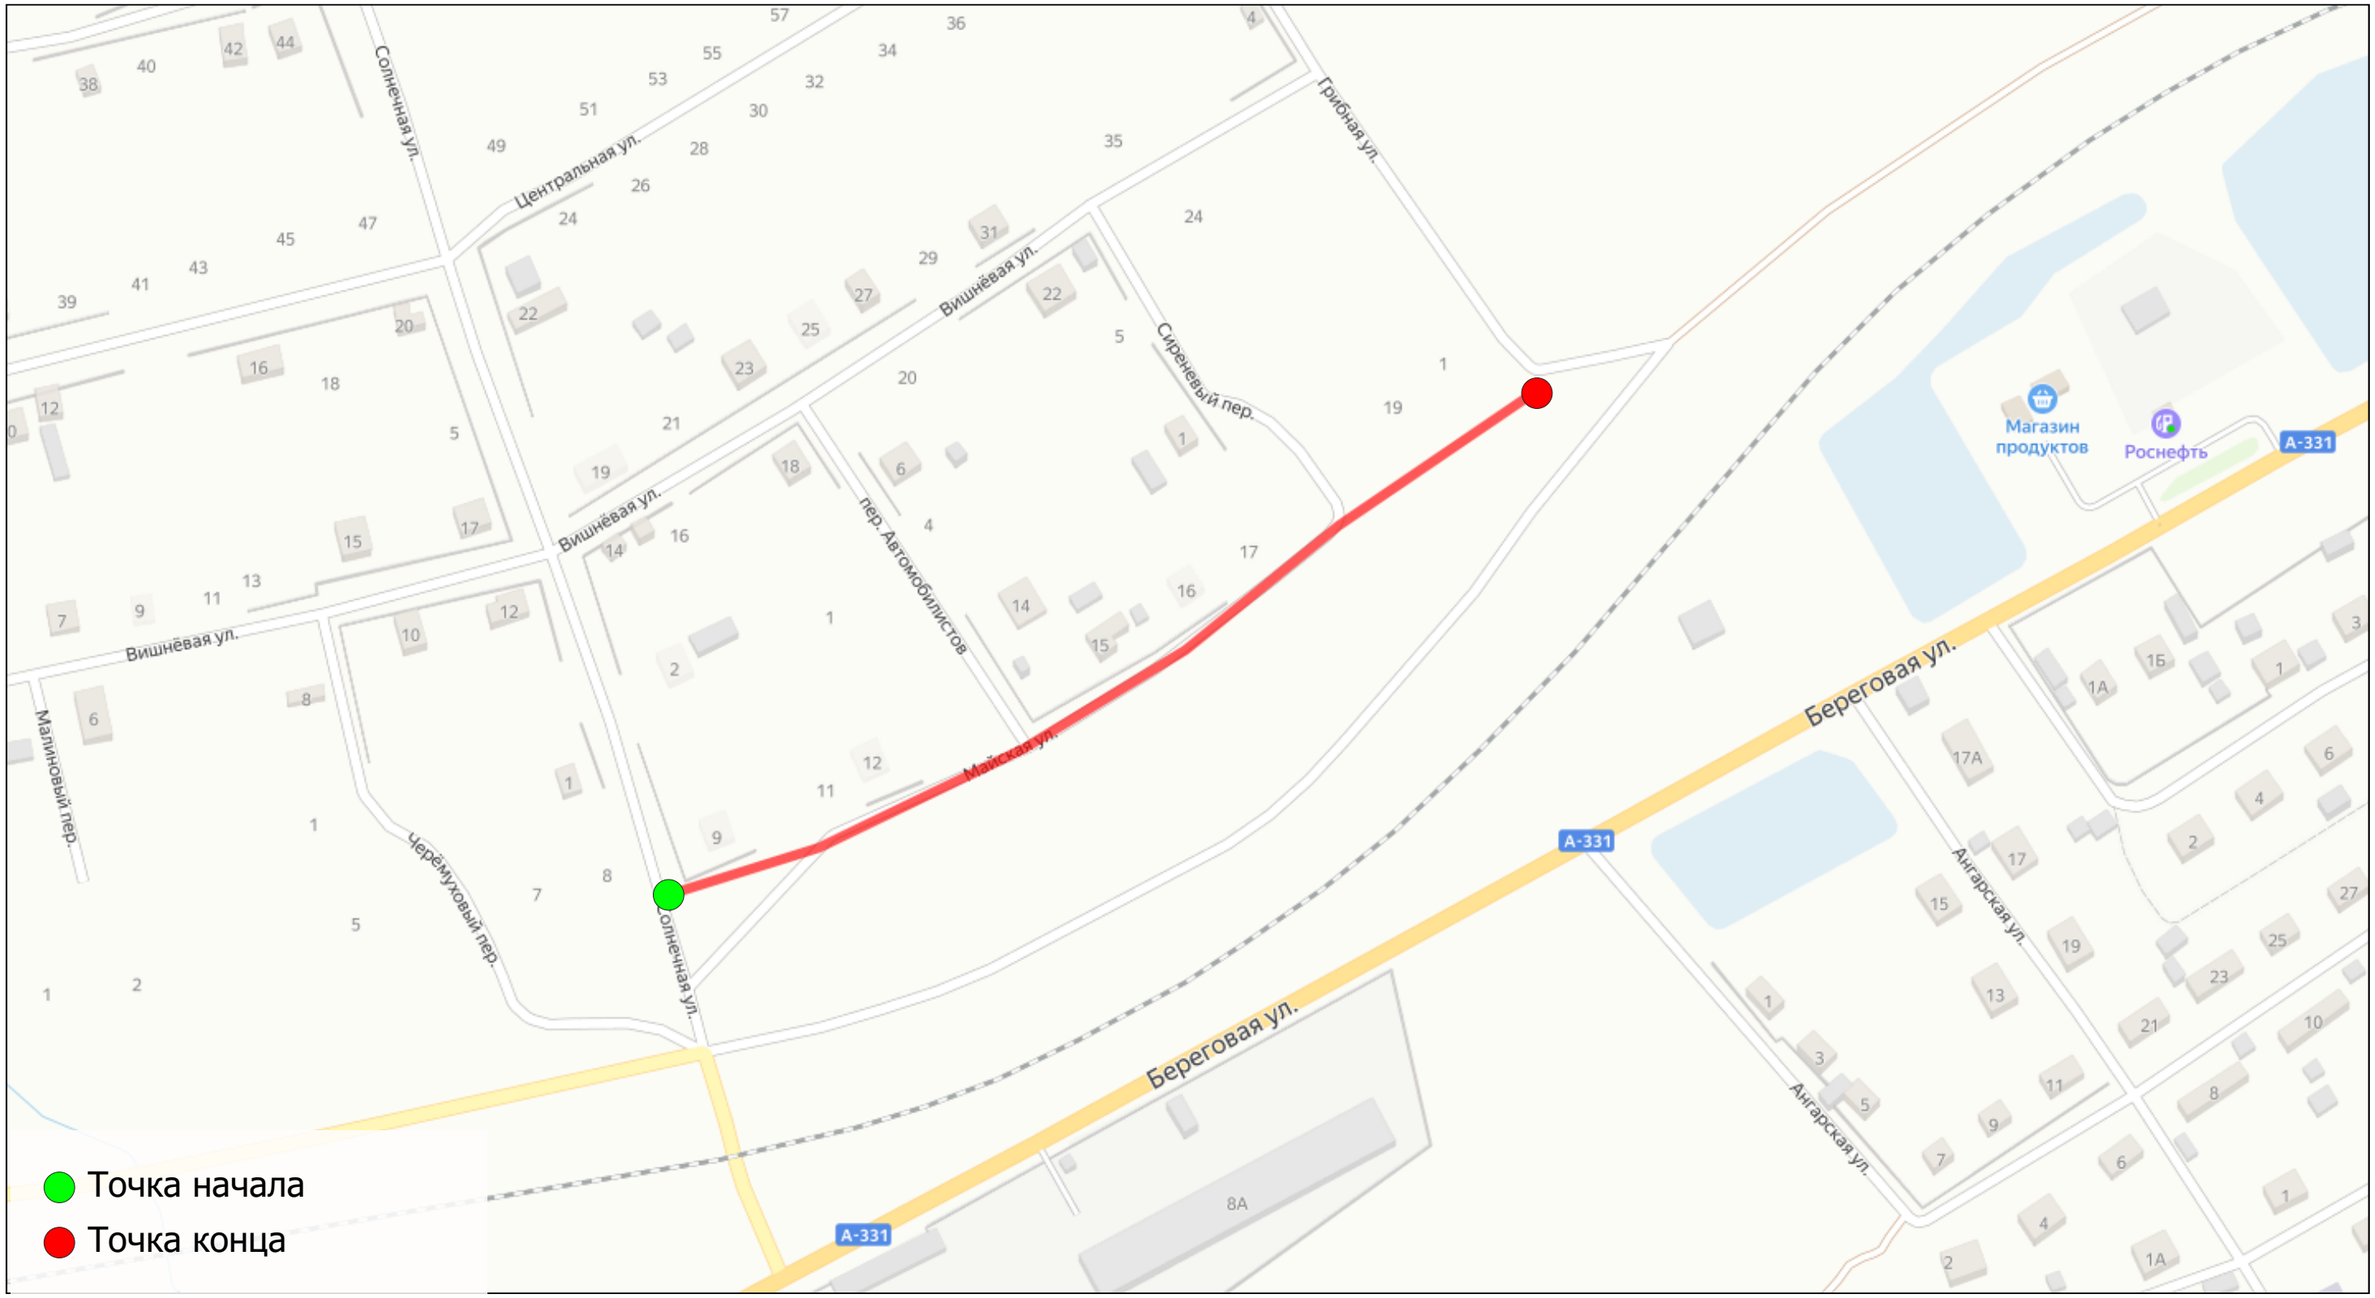

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13
Кривые в плане	20 R=645м 55 P=27; a=14°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00 230 3,00

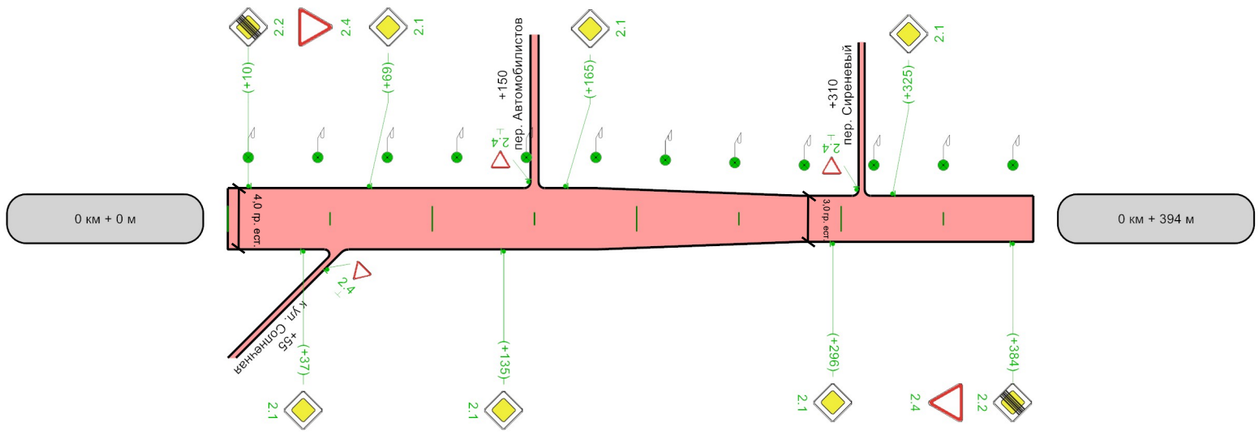

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+037	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+069	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+165	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+296	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+325	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги			0+384	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+384	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+384	Населенный пункт	12/12	374	0	Слева
Итого:				**12/12**	**374**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Островского, д. 2 до жилого дома по ул. Островского, д.26
км 0+000 - км 0+481

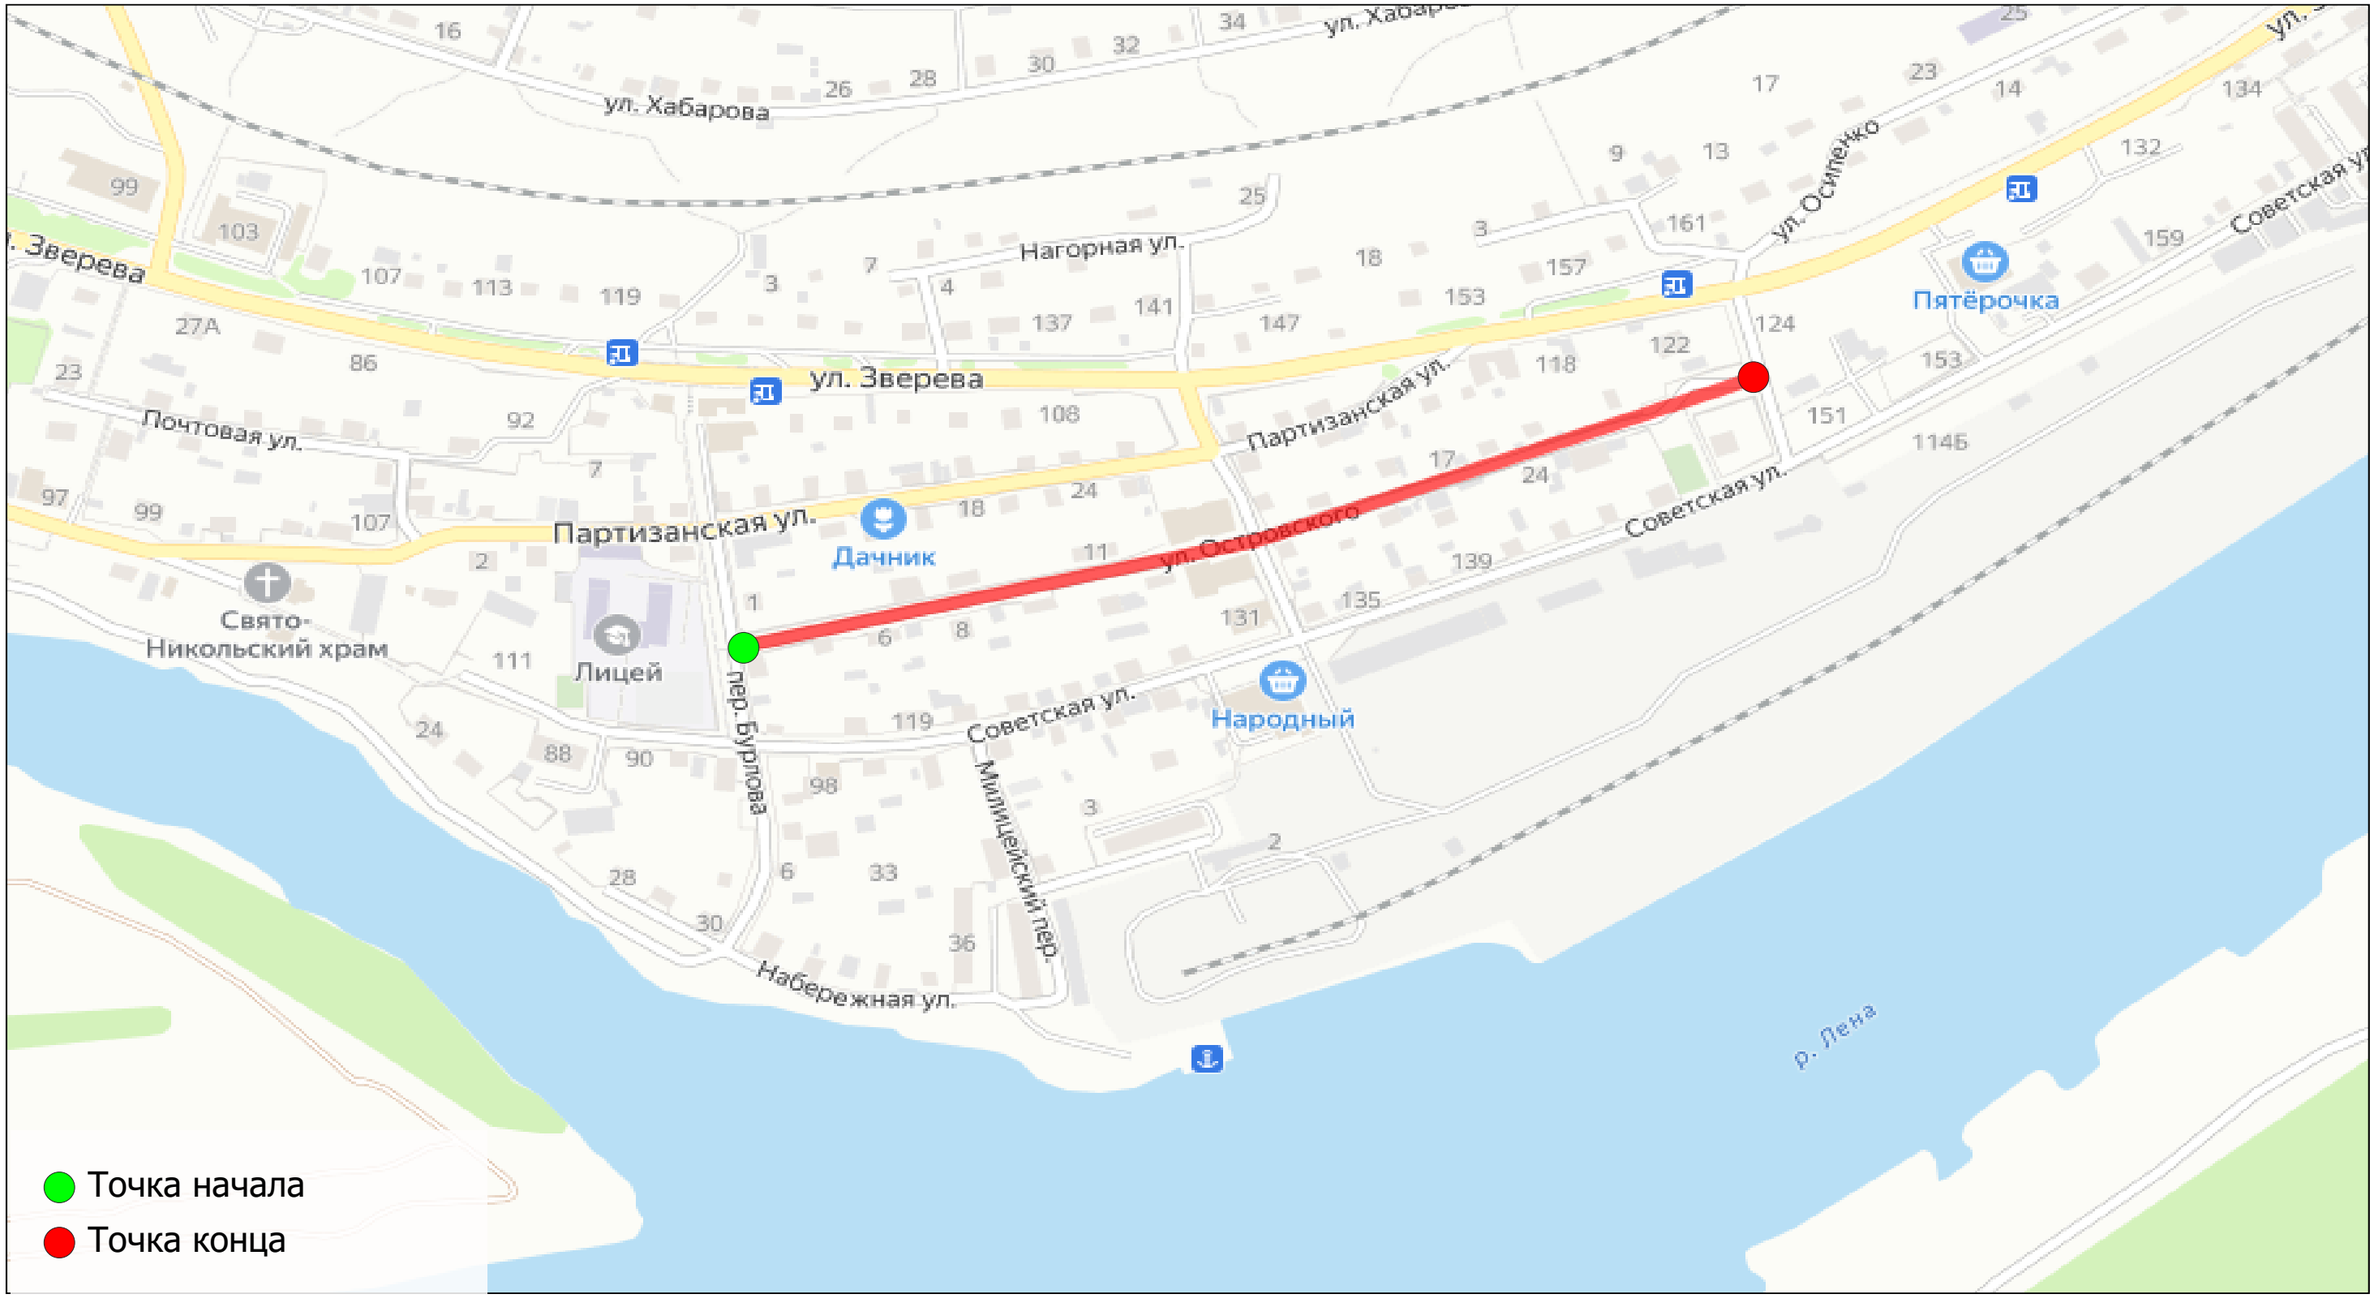

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5 — 292 — 3 — R=5168м — 398 — 20
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 6,20 — 142 — 6,00 — 4,60 — 240 — 6,00 — 4,00

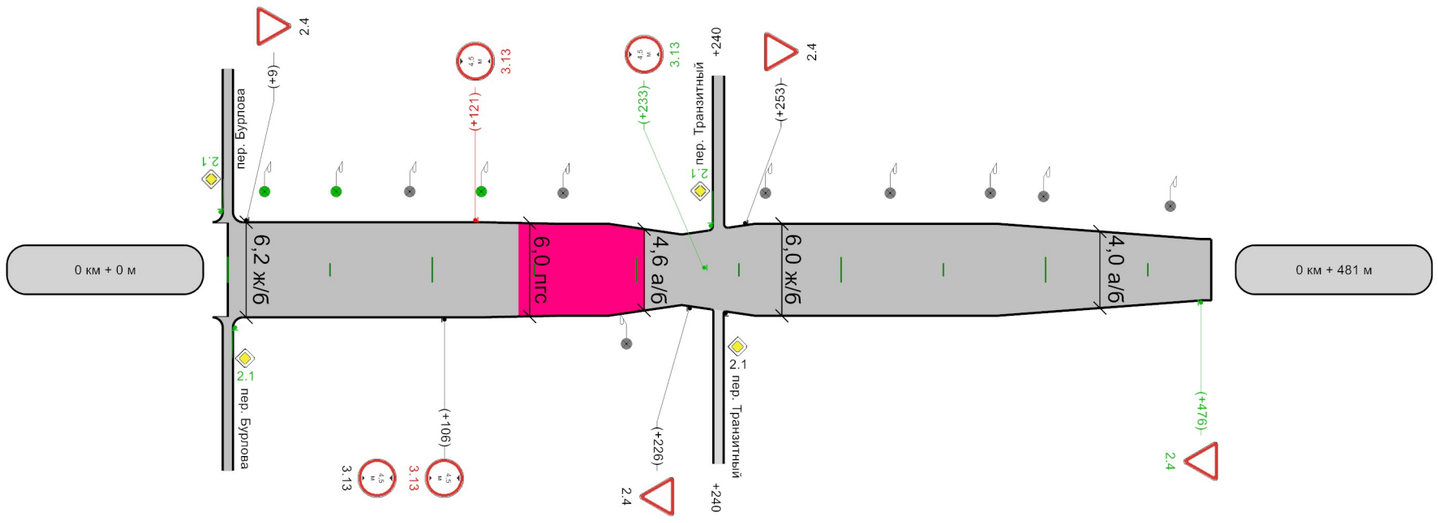

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+270	Установлено	1	справа на примыкании
2	2.1	Главная дорога			0+270	Требуется установить	1	справа на примыкании
3	2.4	Уступите дорогу			0+009	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+226	Установлено	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+253	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+476	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
7	3.13	Ограничение высоты			0+106	Установлено	1	справа
8	3.13	Ограничение высоты			0+106	Демонтировать	1	справа
9	3.13	Ограничение высоты			0+121	Демонтировать	1	слева
10	3.13	Ограничение высоты			0+233	Требуется установить	1	по центру в обратном направлении
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018	0+053	Населённый пункт	2/2	35	0	Слева
2	0+089	0+164	Населённый пункт	2/2	0	75	Слева
3	0+124	0+124	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+195	0+195	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+263	0+324	Населённый пункт	2/2	0	61	Слева
6	0+373	0+399	Населённый пункт	2/2	0	26	Слева
7	0+461	0+461	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**11/11**	**35**	**162**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от пересечения ул. Корчагина с автодорогой по ул. Черноморская до жилого дома по ул. Корчагина, д. 8
км 0+000 - км 0+218

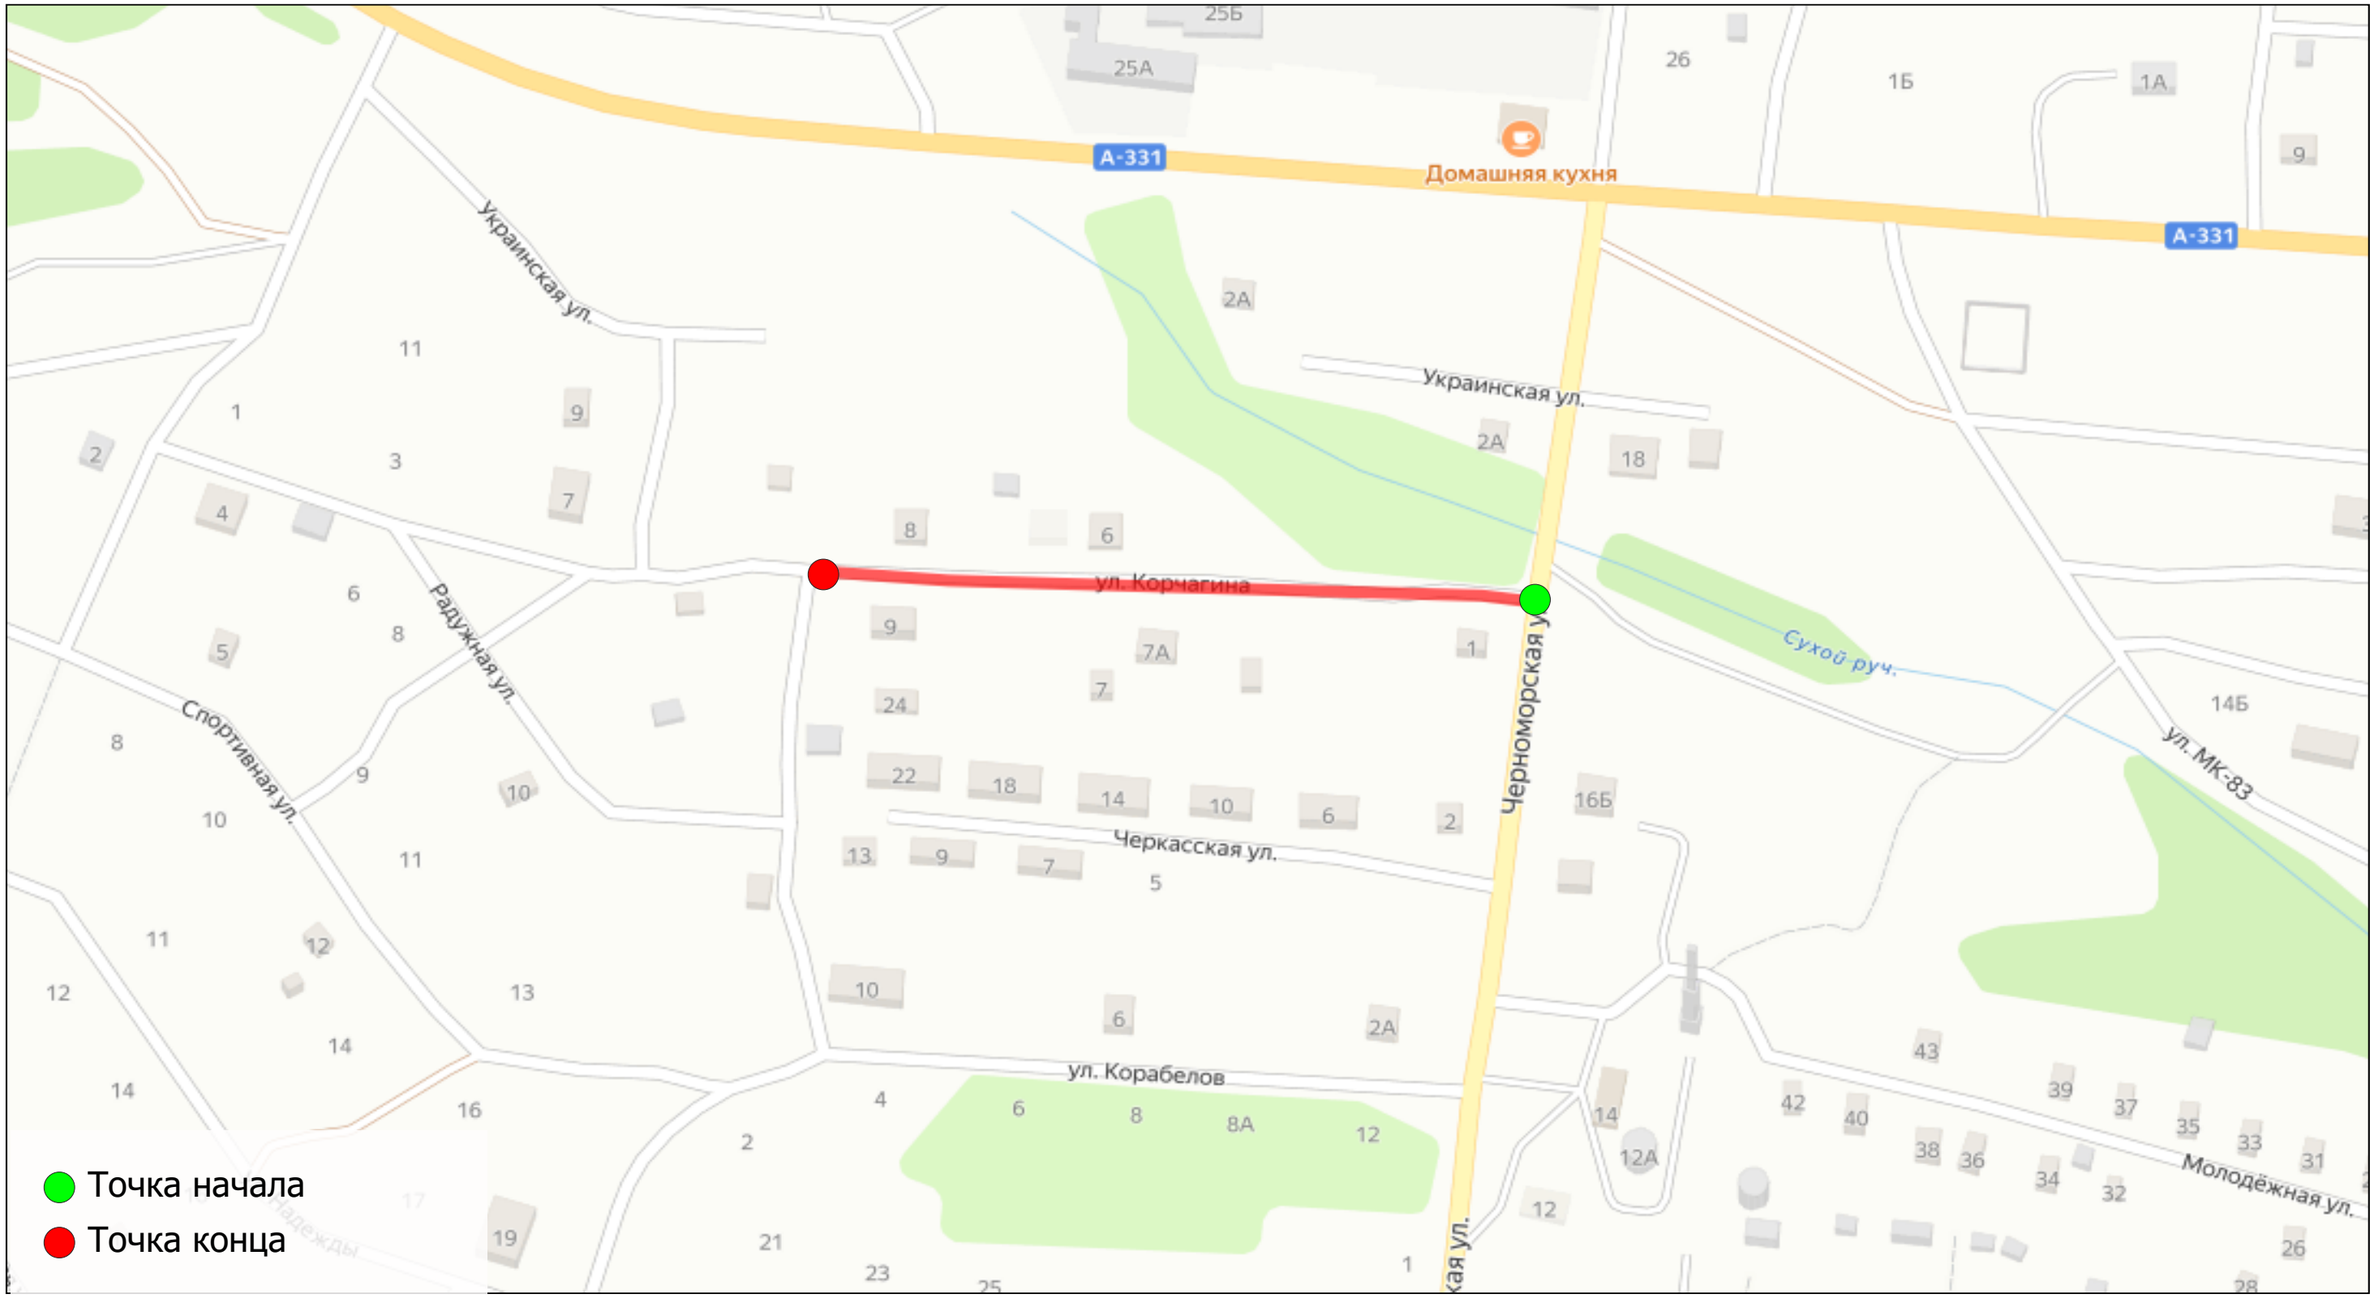

М 1:3000


Горизонтальная дорожная разметка слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
63
44
74
R=1562м
Кривые в плане
103
R=435м
P=51; a=5°
140
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
3,50


0 км + 0 м
0 км + 218 м
3.5 пс
проезд
(+204)
2.4


Горизонтальная дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+204	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+210	Населённый пункт	6/6	200	0	Справа
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по пер. Павлова, д.1 до жилого дома по пер. Павлова, д. 7
км 0+000 - км 0+119

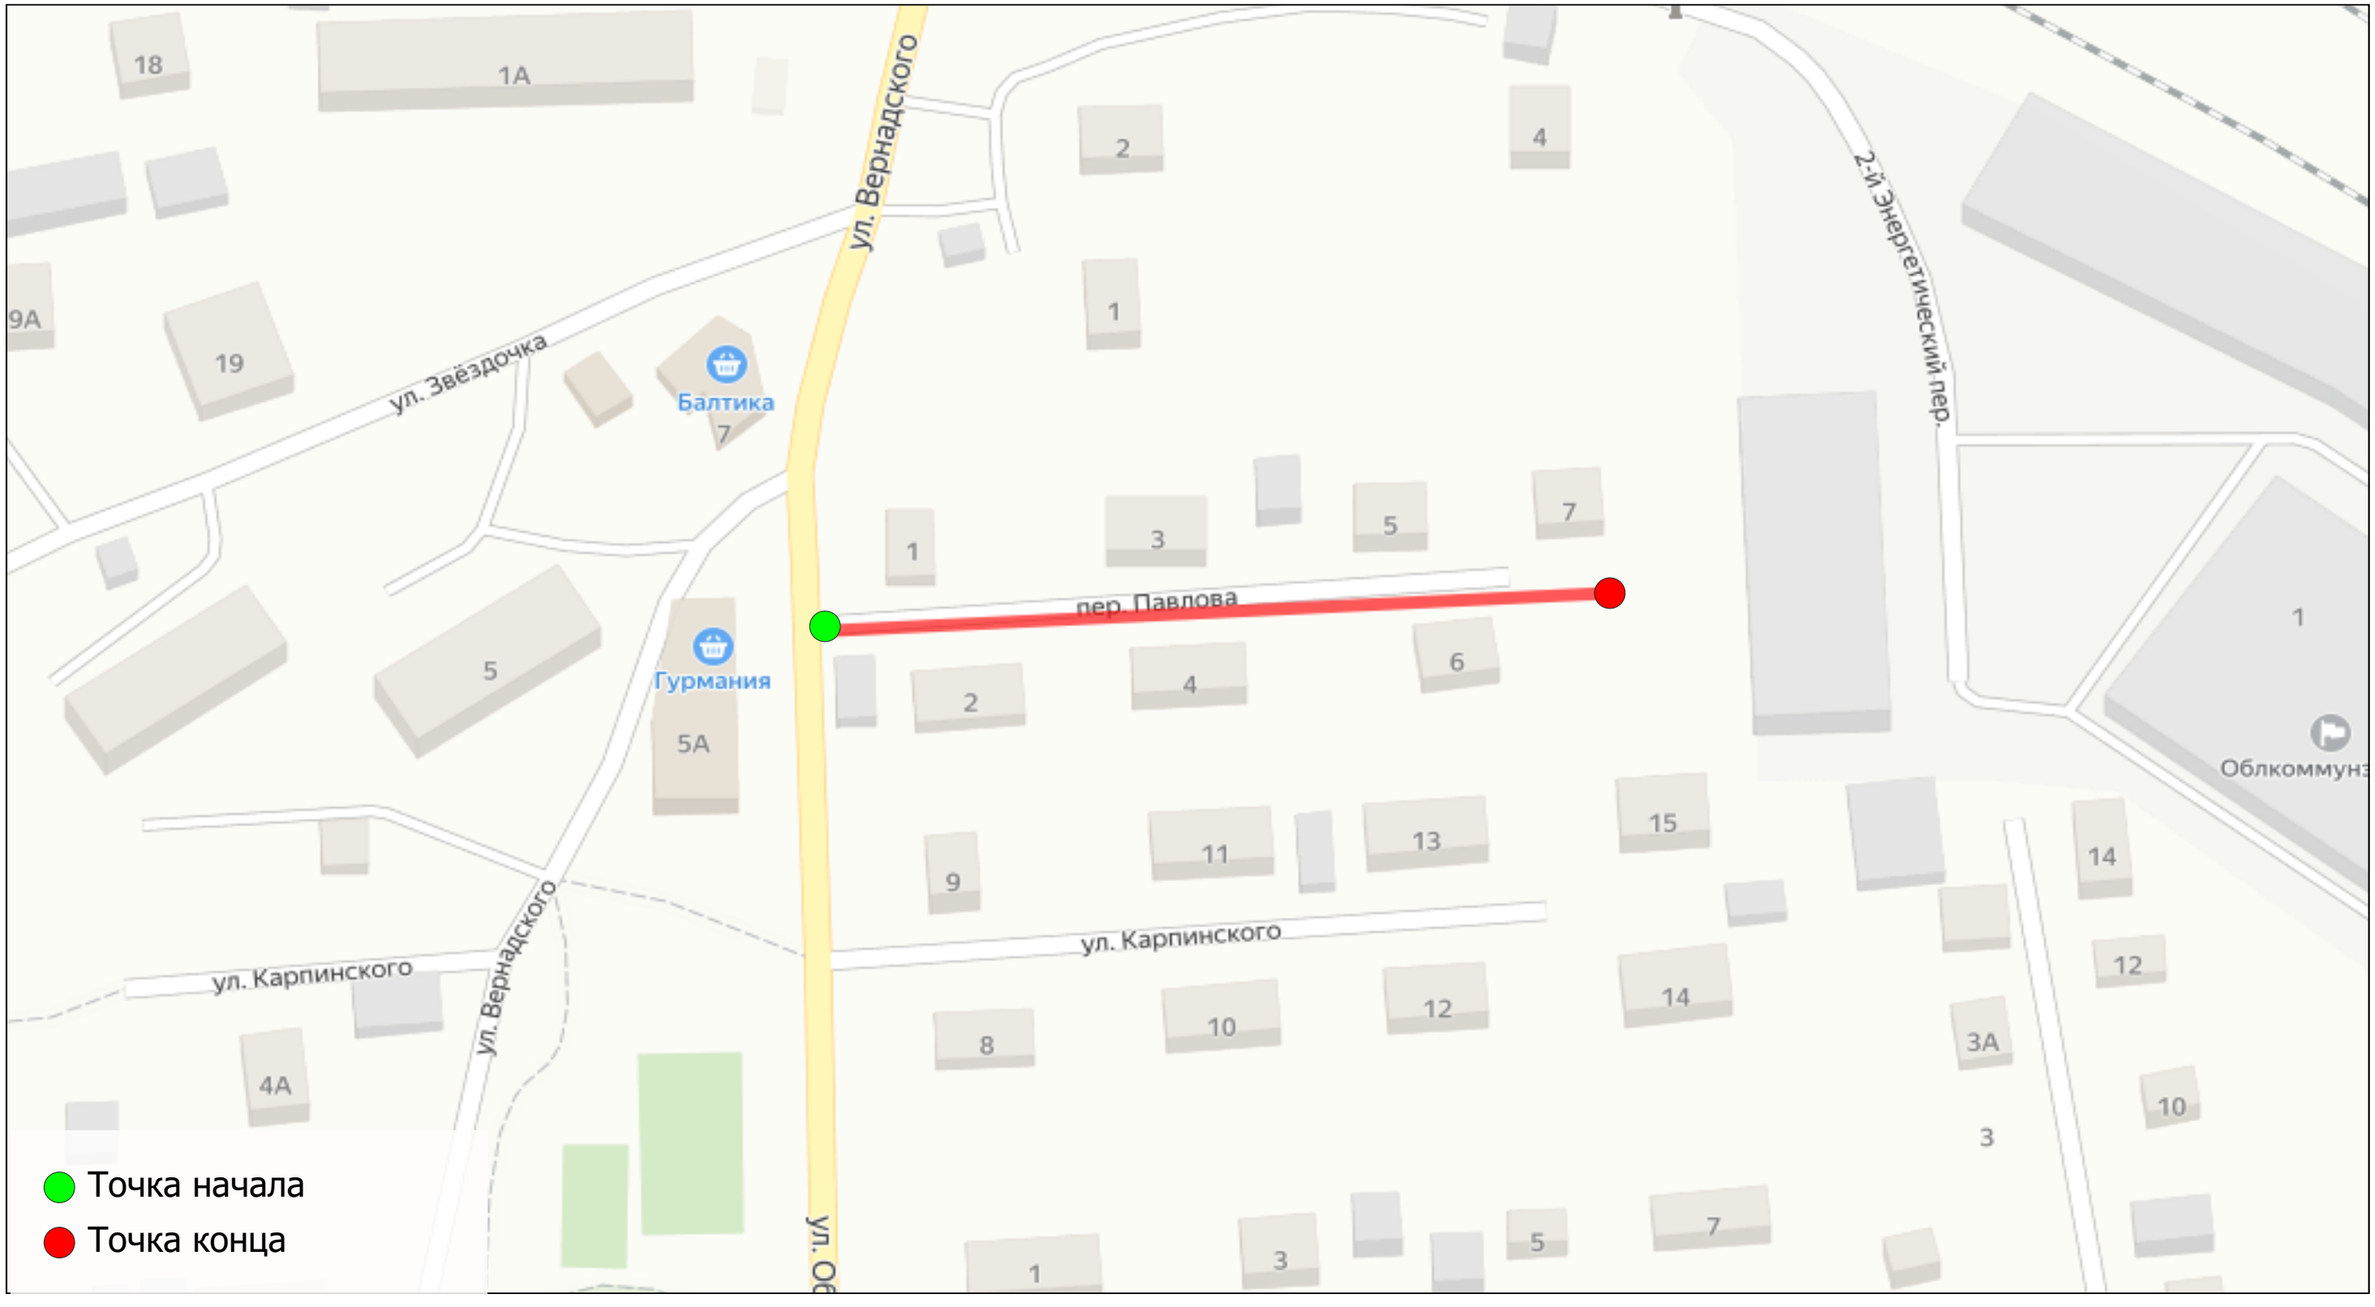

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5 23 7 R=2425м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

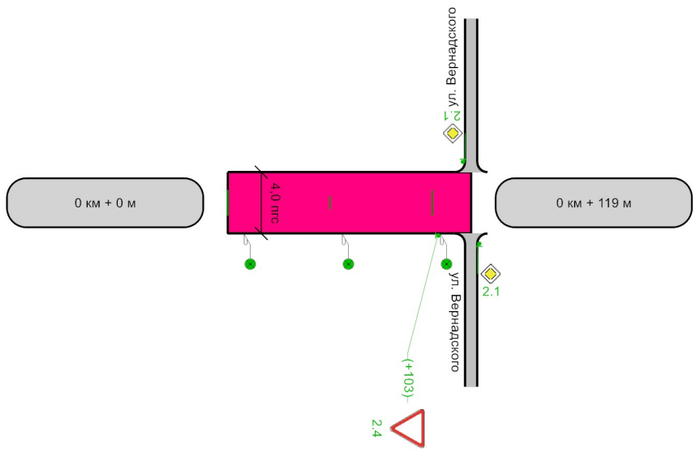

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+103	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+107	Населённый пункт	3/3	96	0	Справа
Итого:				**3/3**	**96**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Панихинская, д. 1а, до жилого дома по ул. Панихинская, д. 27
км 0+000 - км 0+404

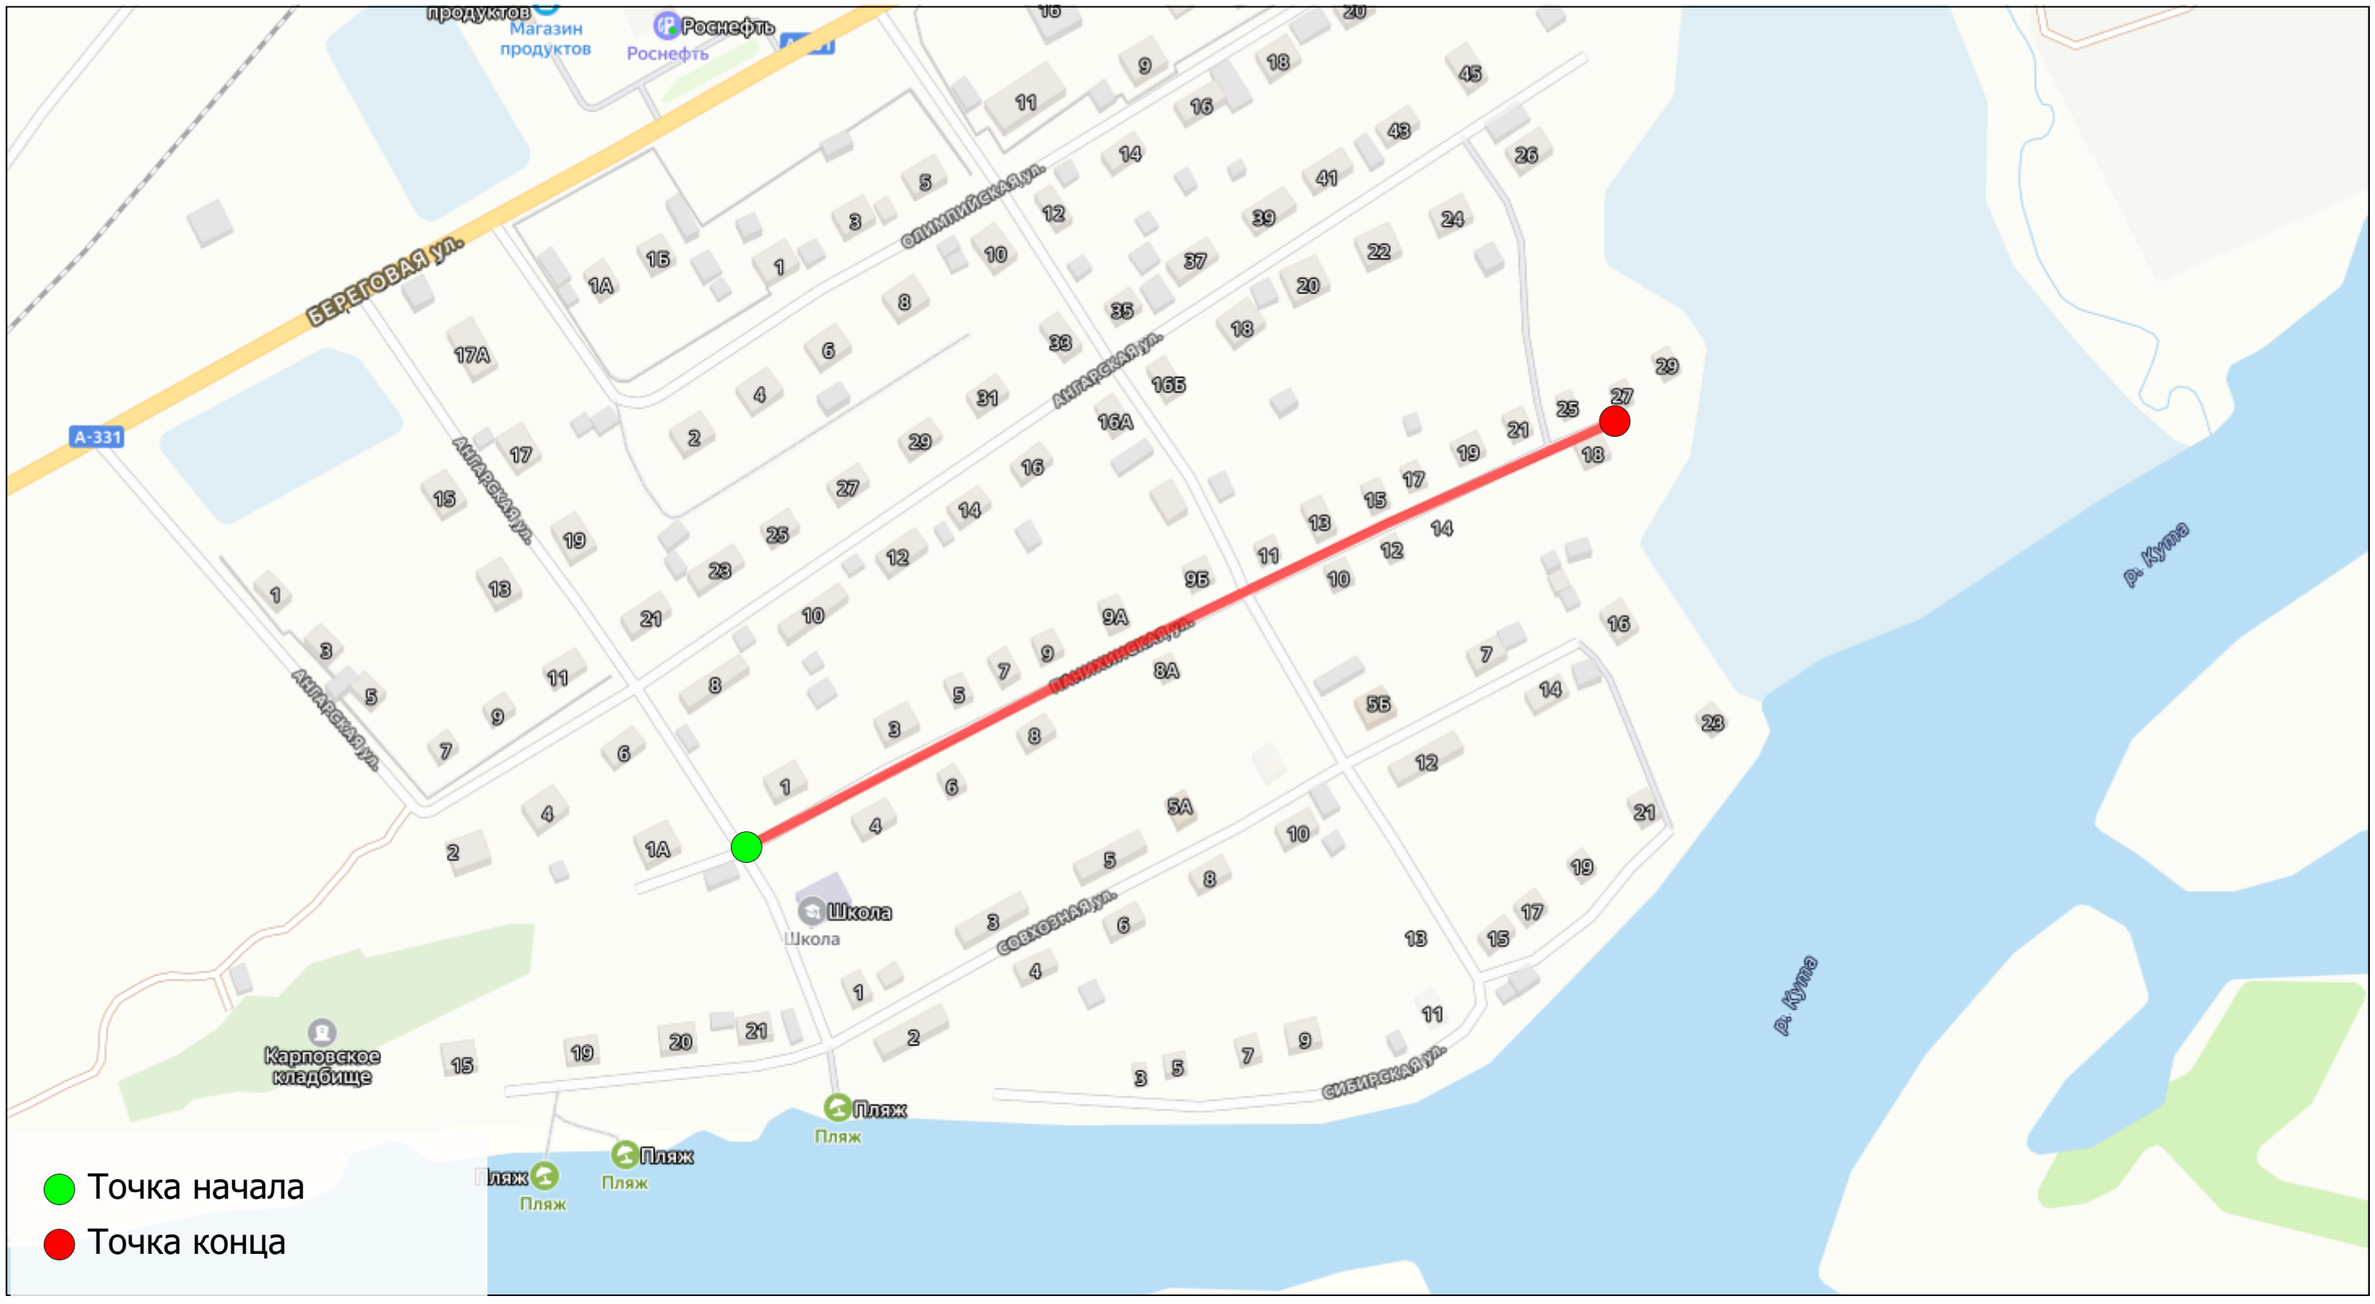

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле	22	16 / 127	R=5541м	16 / 305	
Кривые в плане		R=182м 87 18 106			
Тротуары слева					
Характеристики проезжей части	3,00	40	4,00	273	3,00

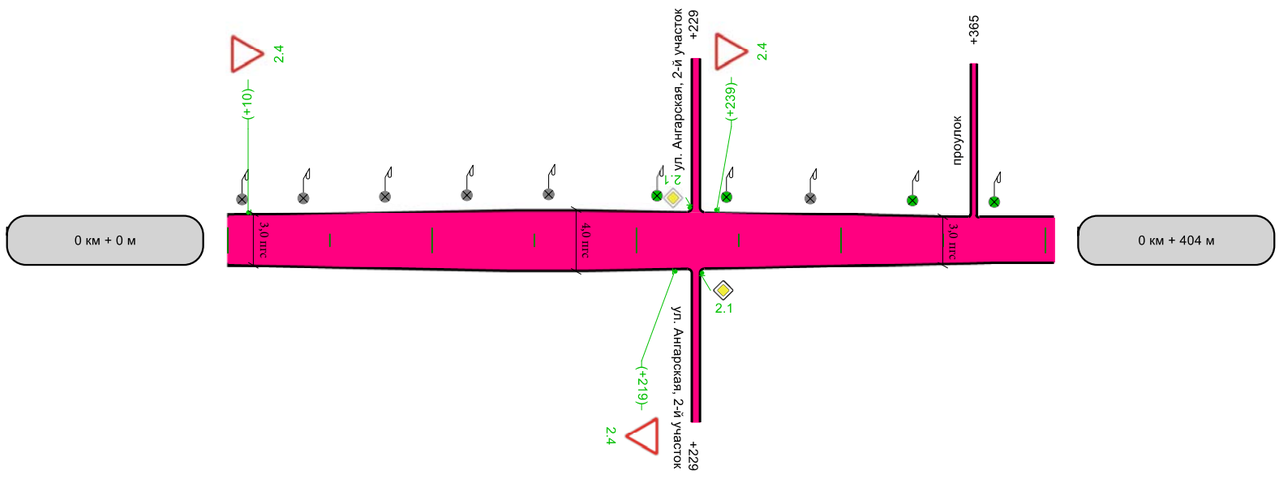

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+219	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+239	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+007	0+037	Населенный пункт	2/2	0	30	Слева
2	0+077	0+157	Населенный пункт	3/3	0	80	Слева
3	0+210	0+244	Населенный пункт	2/2	34	0	Слева
4	0+285	0+285	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+335	0+375	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**10/10**	**74**	**110**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога общего пользования от жилого дома по ул. Лазо, д. 56 до жилого дома по ул. Лазо, д. 2а
1-й участок: км 0+000 - км 1+394
2-й участок: км 0+000 - км 0+125

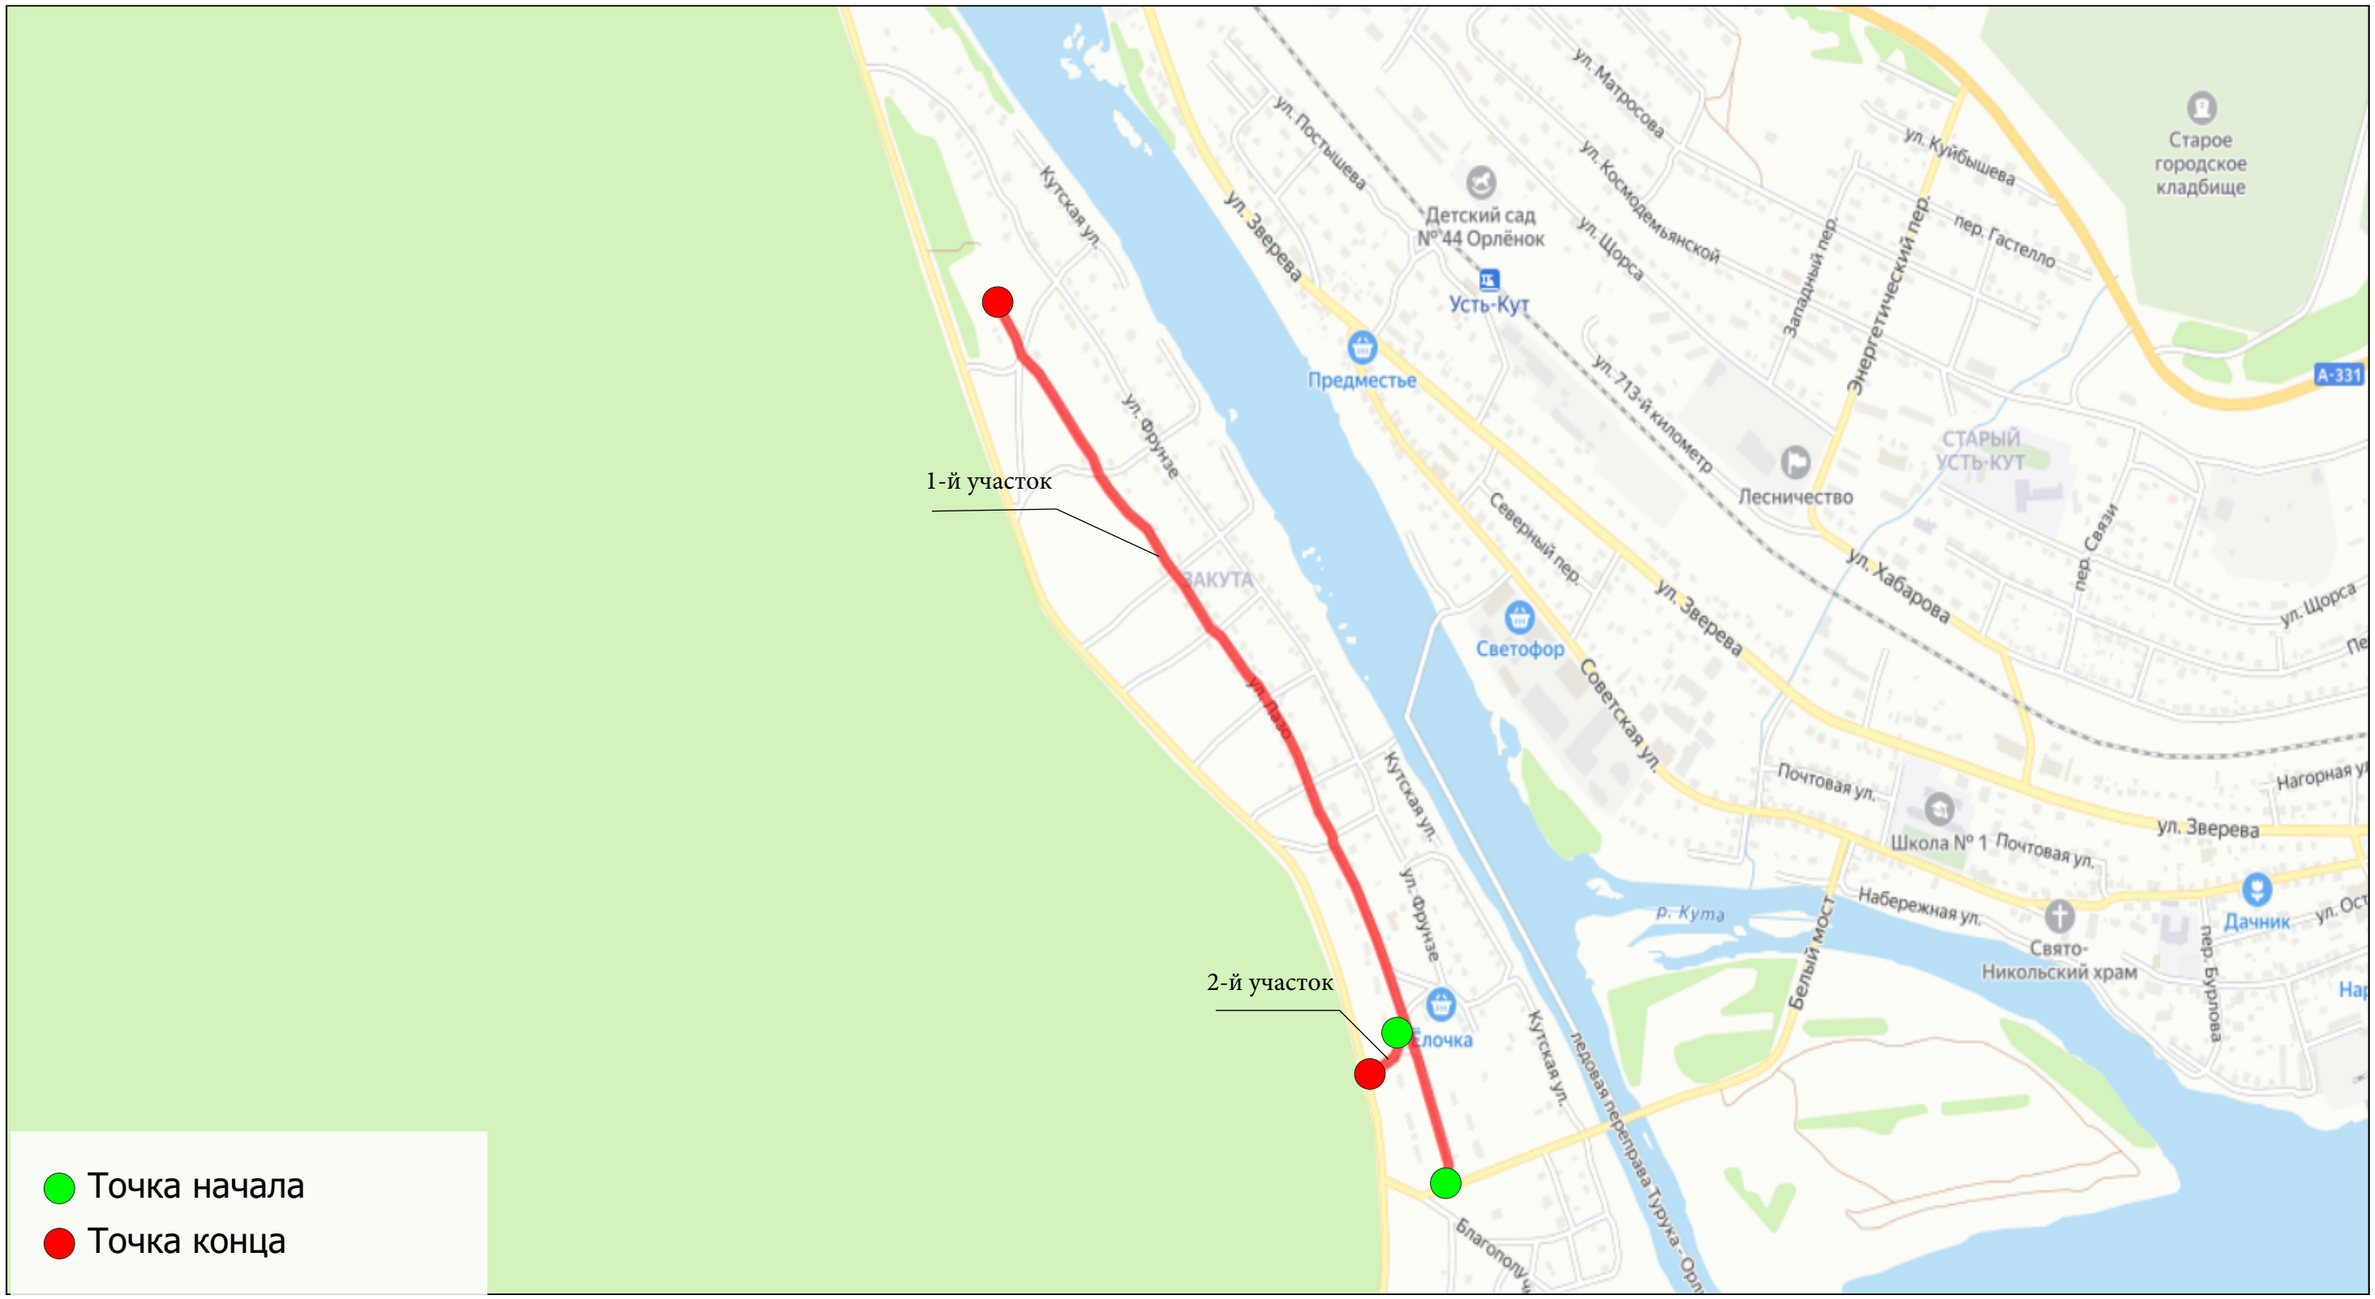

М 1:3000

Автодорога общего пользования от жилого дома по ул. Лазо, д. 56 до жилого дома по ул. Лазо, д. 2а, 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 57 2 R=1239м 84 10 524 R=2545м 607 23 653 21 R=3624м 766 10 789 11 R=3864м 883 14 908 15 R=2979м
Кривые в плане	8 R=89м P=1; a=38° 66 86 R=397м P=37; a=6° 129 275 R=328м P=29; a=6° 317 614 R=219м P=15; a=8° 694
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,00 — 505 — 3,20 — 871 — 3,00

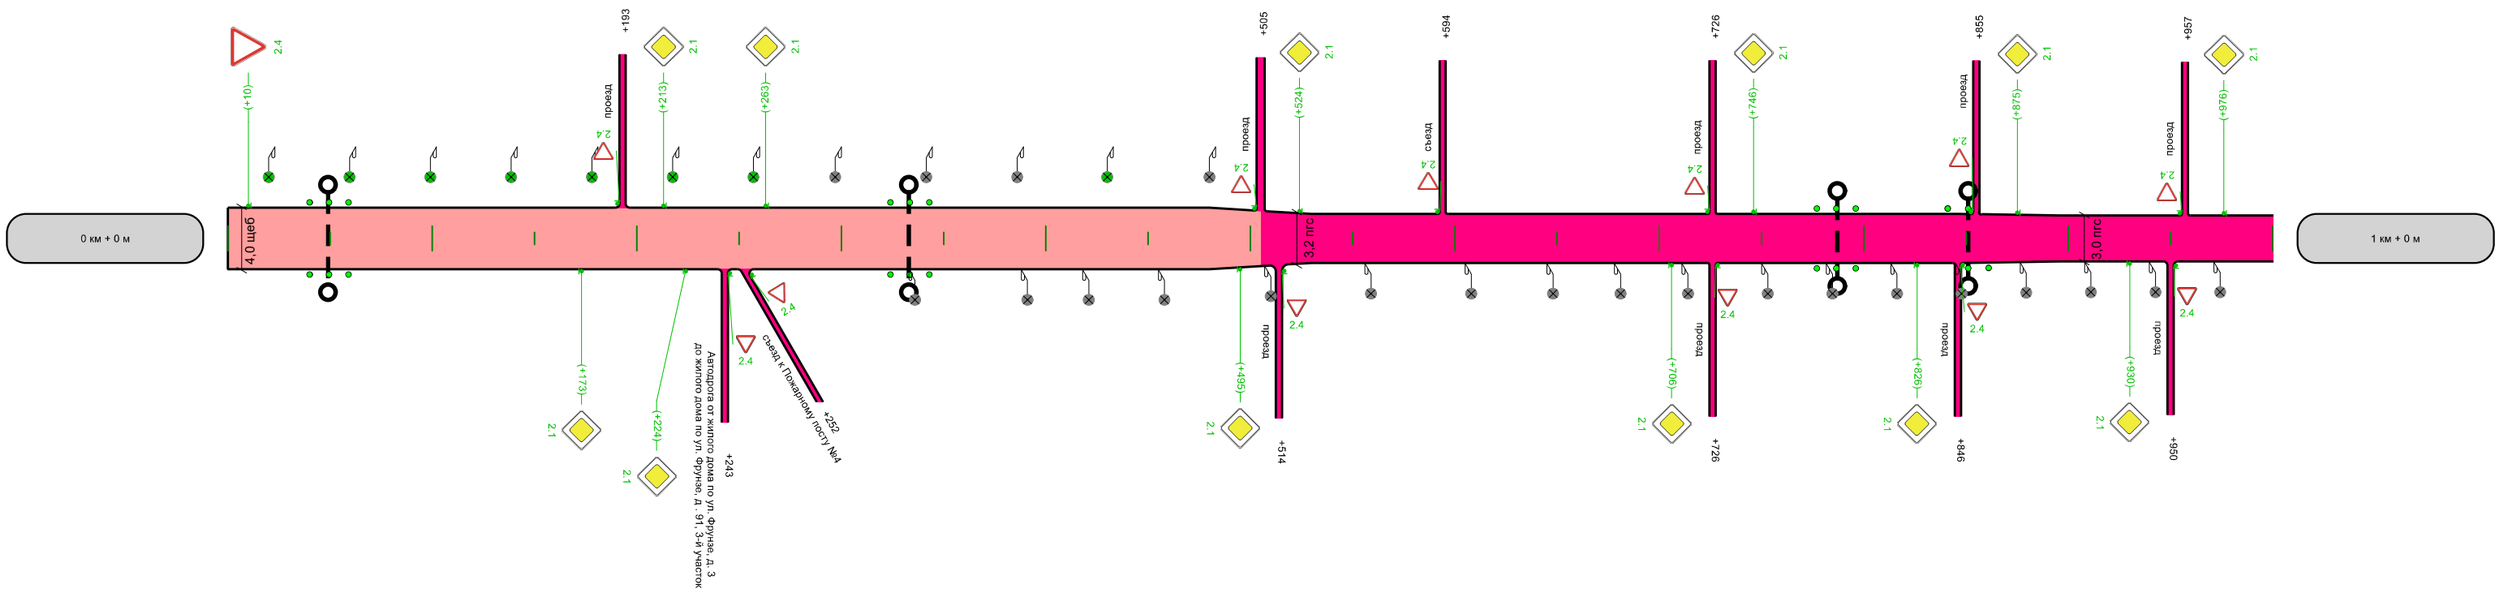

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 R=2979м 34 53 34 77 R=2296м 2 150 21 281 R=2436м 394
Кривые в плане	268 R=222м P=9; a=13° 320
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00 | 153 | 2,50 | 331 | 3,50

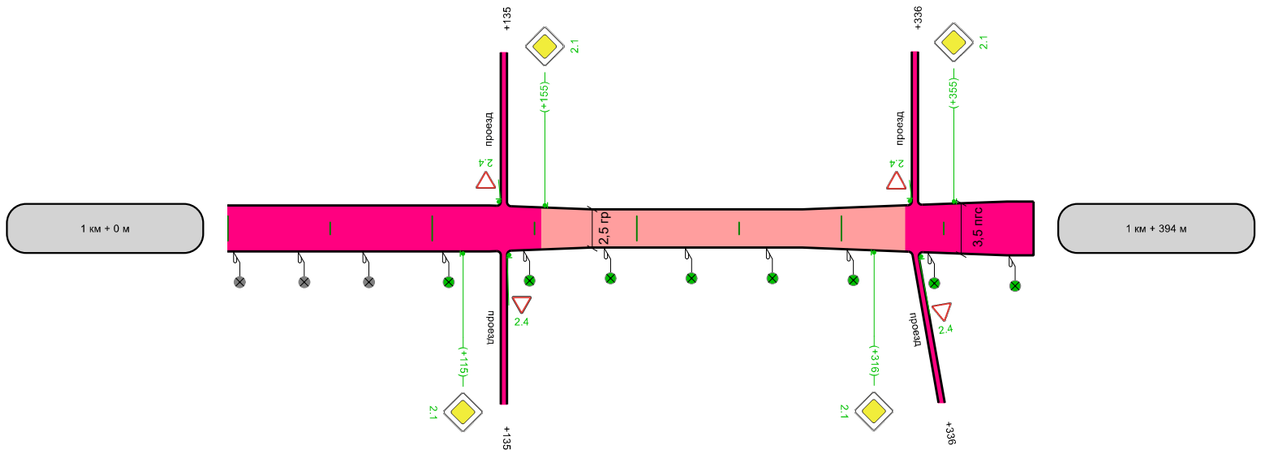

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+173	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+213	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+224	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+263	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+495	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+524	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+706	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+746	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+826	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+875	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+930	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+976	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			1+115	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1+155	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			1+316	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			1+355	Требуется установить	1	слева
17	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**17**	
		Итого:					**17**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**17**	
		Всего:					**17**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+040	0+059	19/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+040	0+059	19/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+324	0+343	19/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+324	0+343	19/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+777	0+796	19/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+777	0+796	19/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба


1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	0+841	0+851	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
8	0+841	0+851	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
9	0+851	0+861	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**144/18**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+257	Жилая застройка	7/7	237	0	Слева
2	0+297	0+386	Жилая застройка	3/3	0	89	Слева
3	0+336	0+391	Жилая застройка	2/2	0	55	Справа
4	0+421	0+458	Жилая застройка	2/2	0	37	Справа
5	0+430	0+430	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
6	0+480	0+480	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
7	0+510	0+608	Жилая застройка	3/3	0	98	Справа
8	0+648	0+714	Жилая застройка	3/3	0	66	Справа
9	0+753	1+069	Жилая застройка	11/11	0	316	Справа
10	1+108	1+385	Жилая застройка	8/8	277	0	Справа
Итого:				**41/41**	**514**	**661**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	67
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

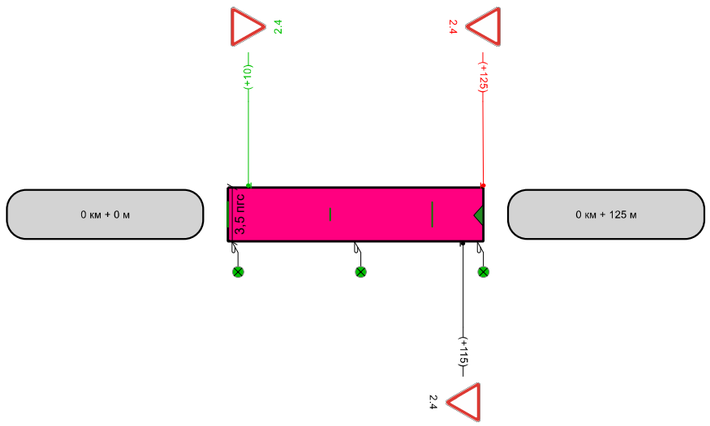

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+115	Установлено	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+125	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+125	Жилая застройка	3/3	120	0	Справа
Итого:				**3/3**	**120**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Ленина от примыкания с автодорогой ул. Дачная до жилого дома по ул. Звёздинская д. 22
км 0+000 - км 0+276

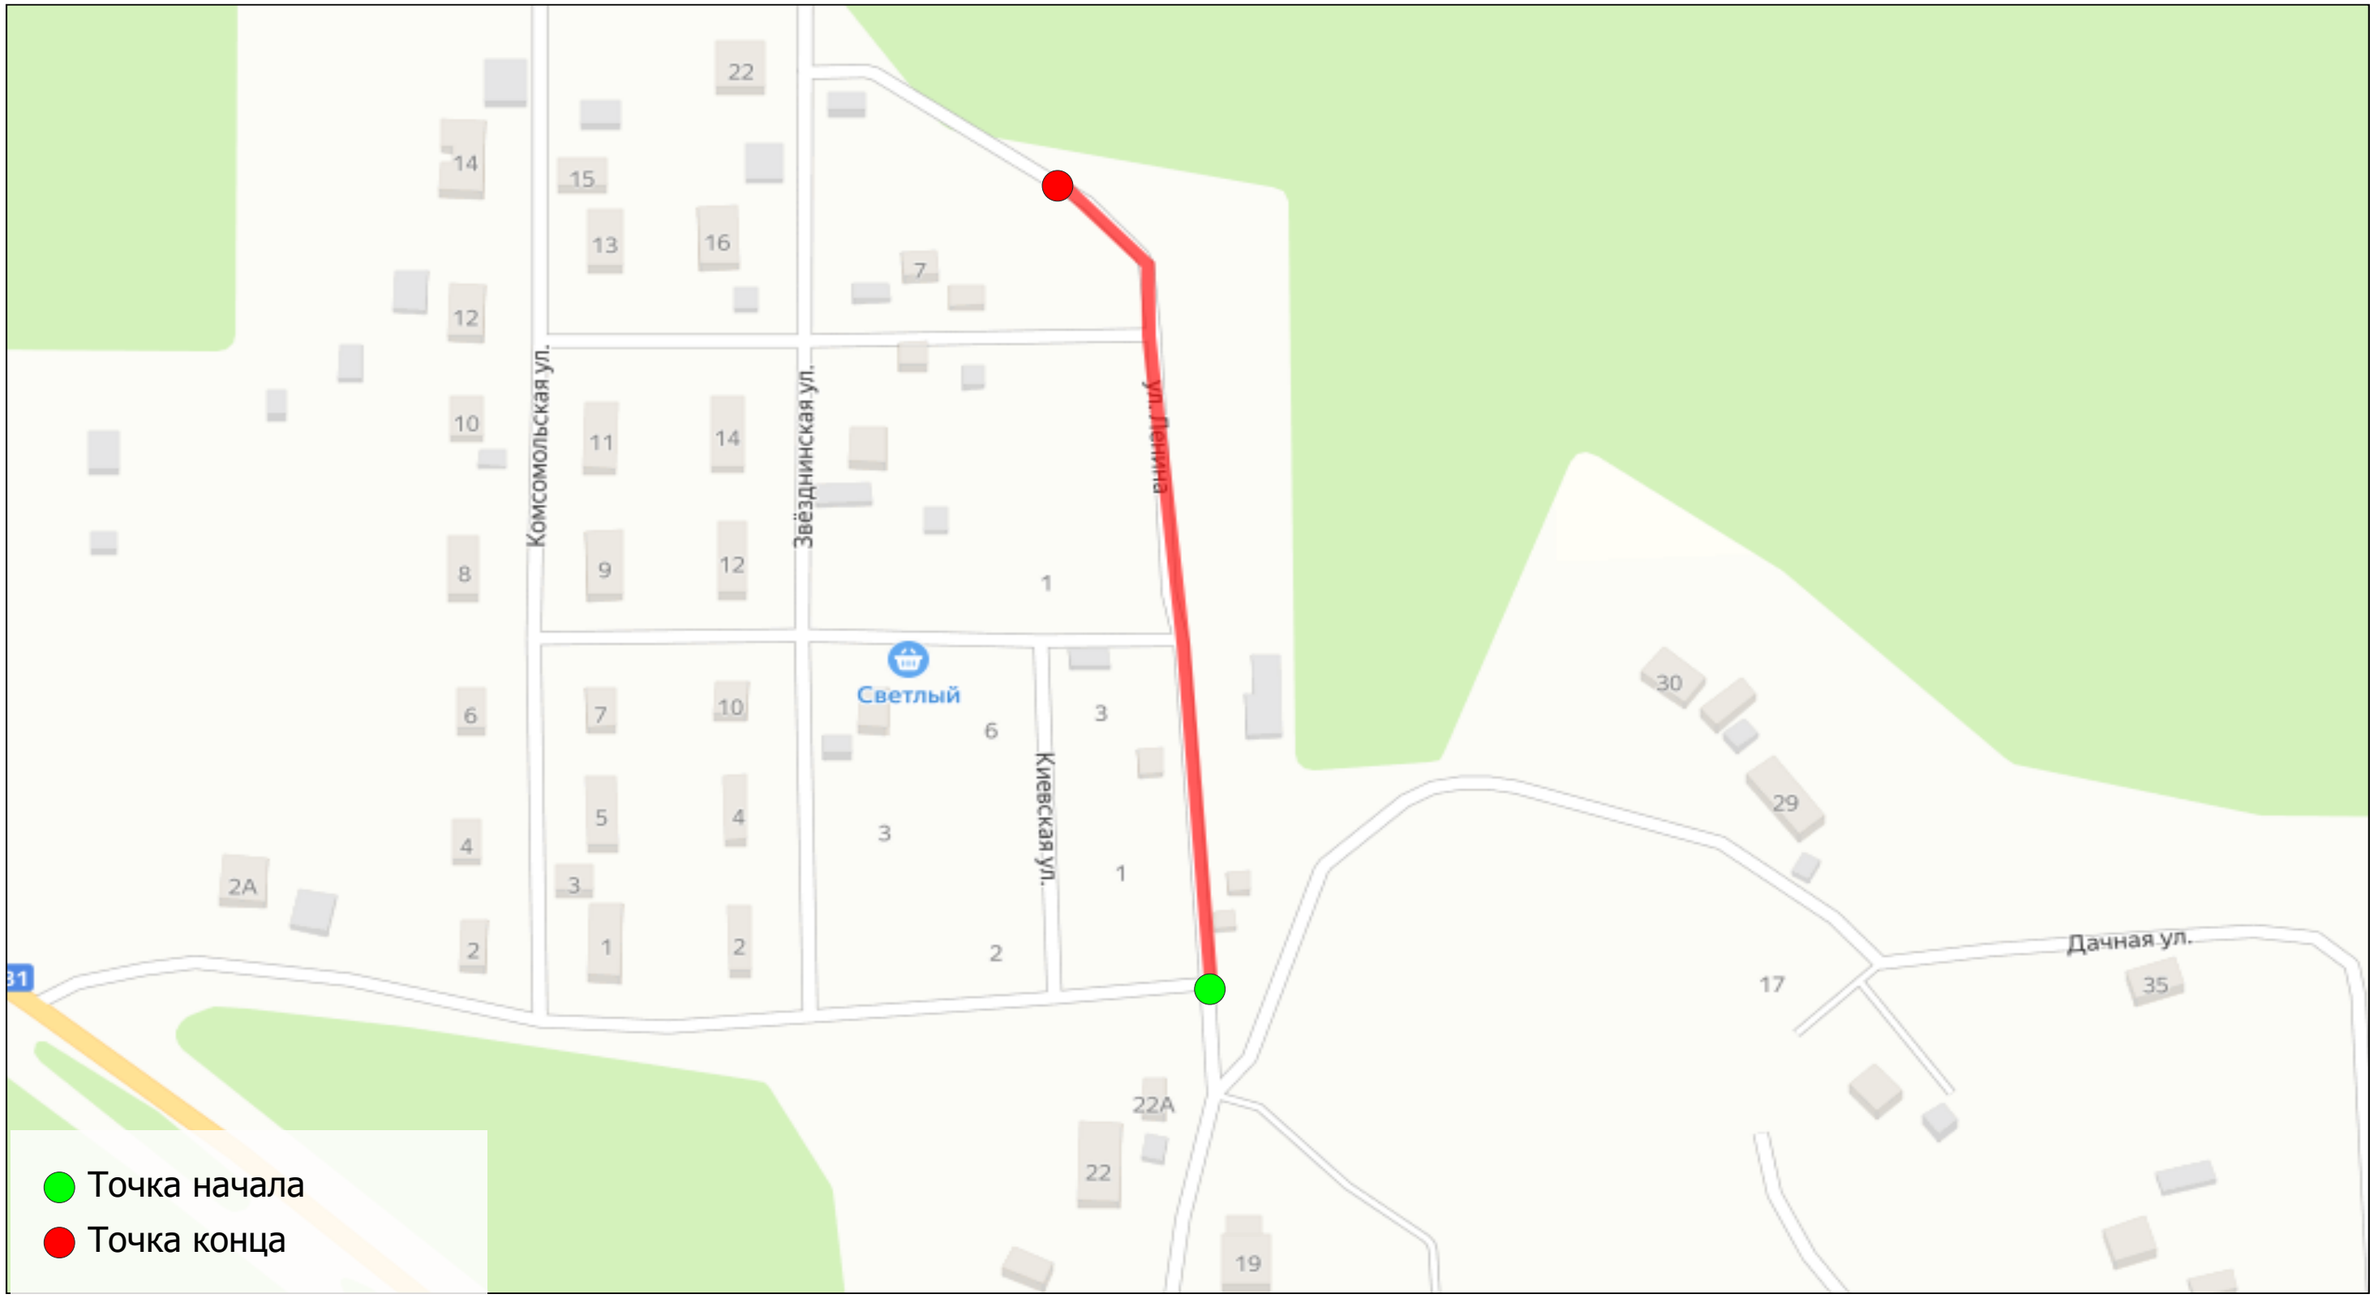

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	67
Кривые в плане	29 R=369м P=45; a=5°59 214 R=250м P=31; a=5°
Тротуары слева	н/д: а/б гор, 0 - 206
Характеристики проезжей части	0 4,00 200 3,70

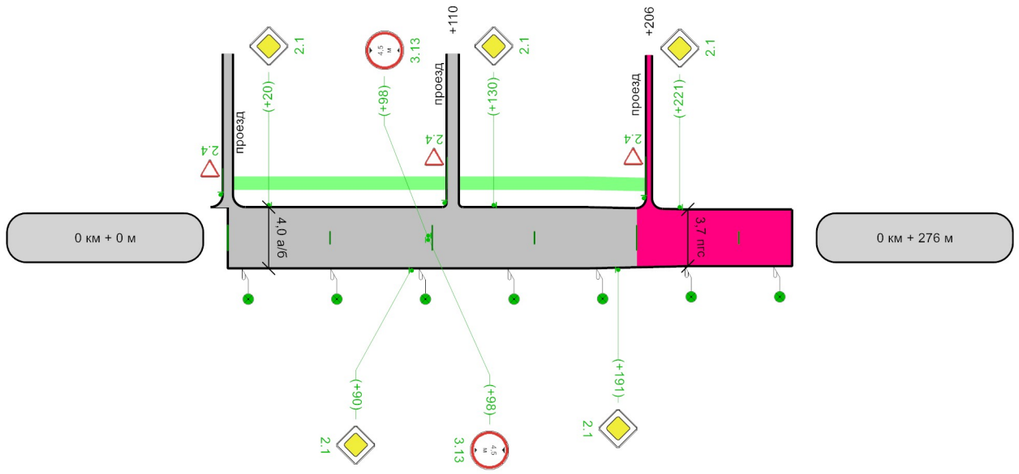

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+191	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+221	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+000	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+110	Требуется установить	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу			0+206	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
9	3.13	Ограничение высоты			0+098	Требуется установить	1	по центру в обратном направлении
10	3.13	Ограничение высоты			0+098	Требуется установить	1	по центру в прямом направлении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+270	Населённый пункт	7/7	260	0	Справа
Итого:				**7/7**	**260**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+206	Жилая застройка	Слева	206	
Итого:					**206**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. 2-я Молодежная от автодороги ул. Волжская до территории МОУ СОШ № 7 ул. 2-я Набережная, 13
км 0+000 - км 0+067

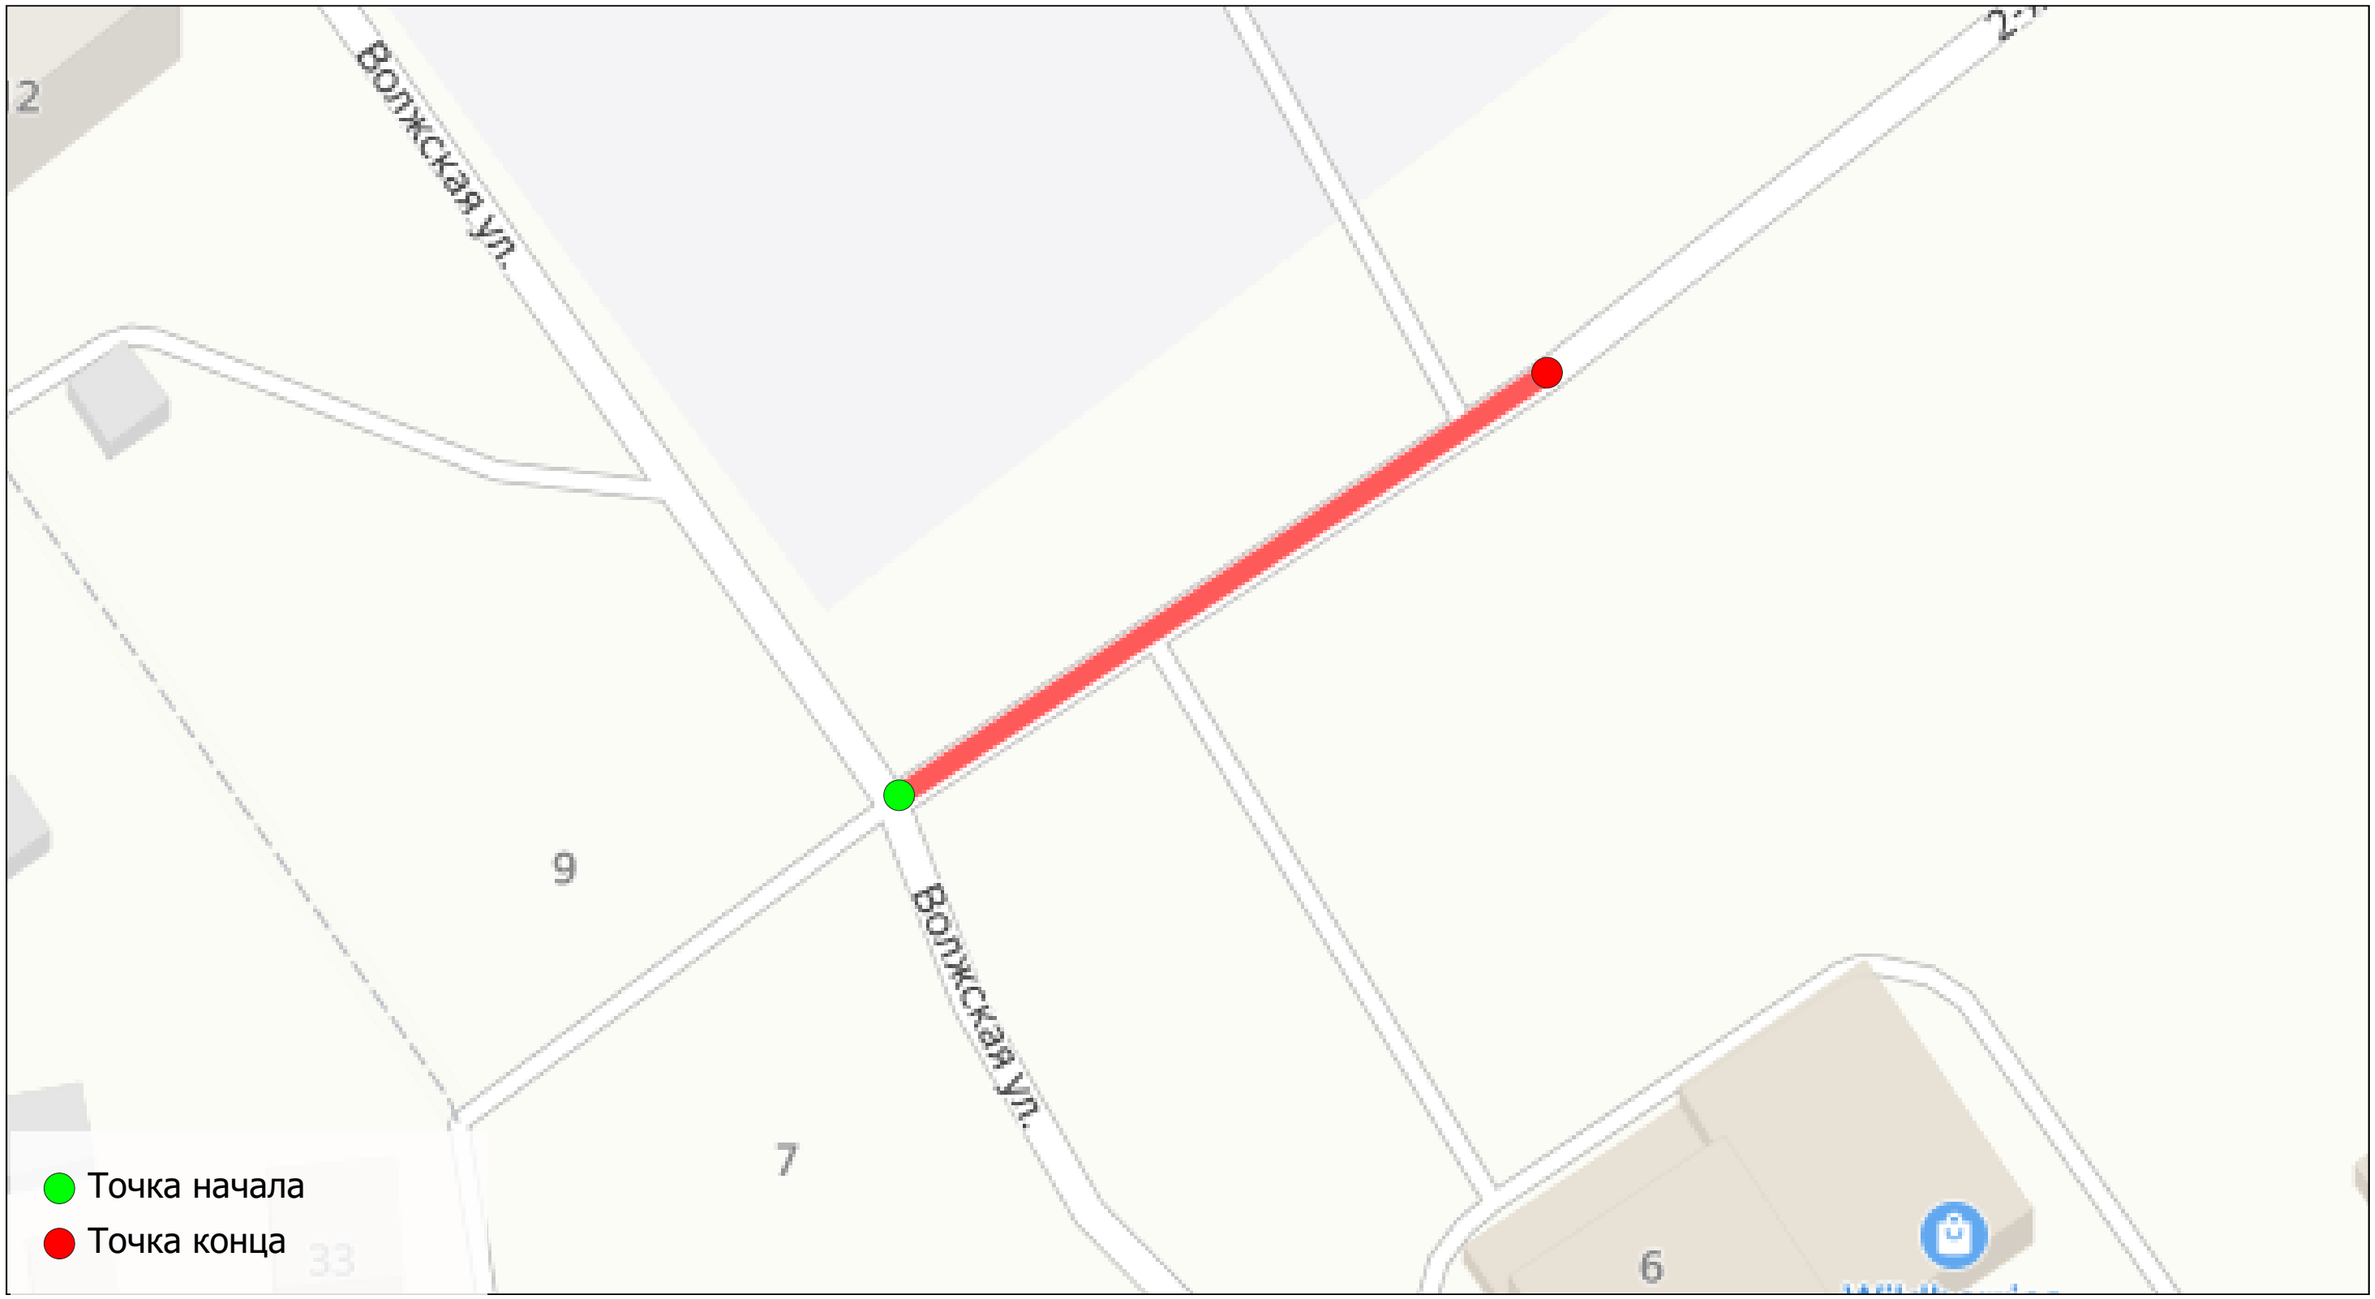

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	89
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, ж/б пл, 0 - 67
Характеристики проезжей части	4,00

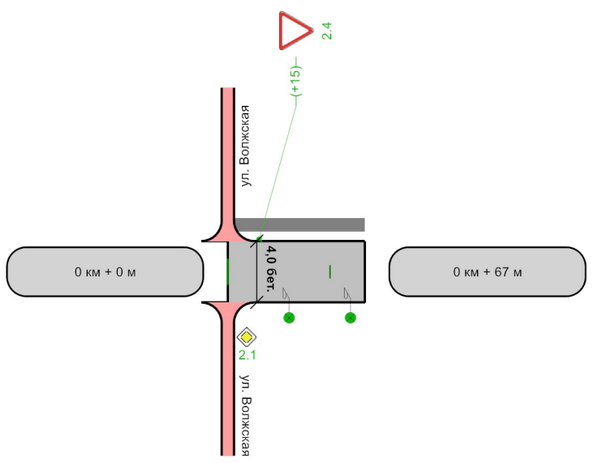

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+060	Населенный пункт	2/2	0	0	Справа
Итого:				**2/2**	**0**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+067	Жилая застройка	Слева		67
Итого:					**0**	**67**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Монтажная от автодороги по ул. Энтузиастов (северная сторона) до ул. Ангарстроевская (южная сторона)

1-й участок: км 0+000 - км 0+390
2-й участок: км 0+000 - км 0+384

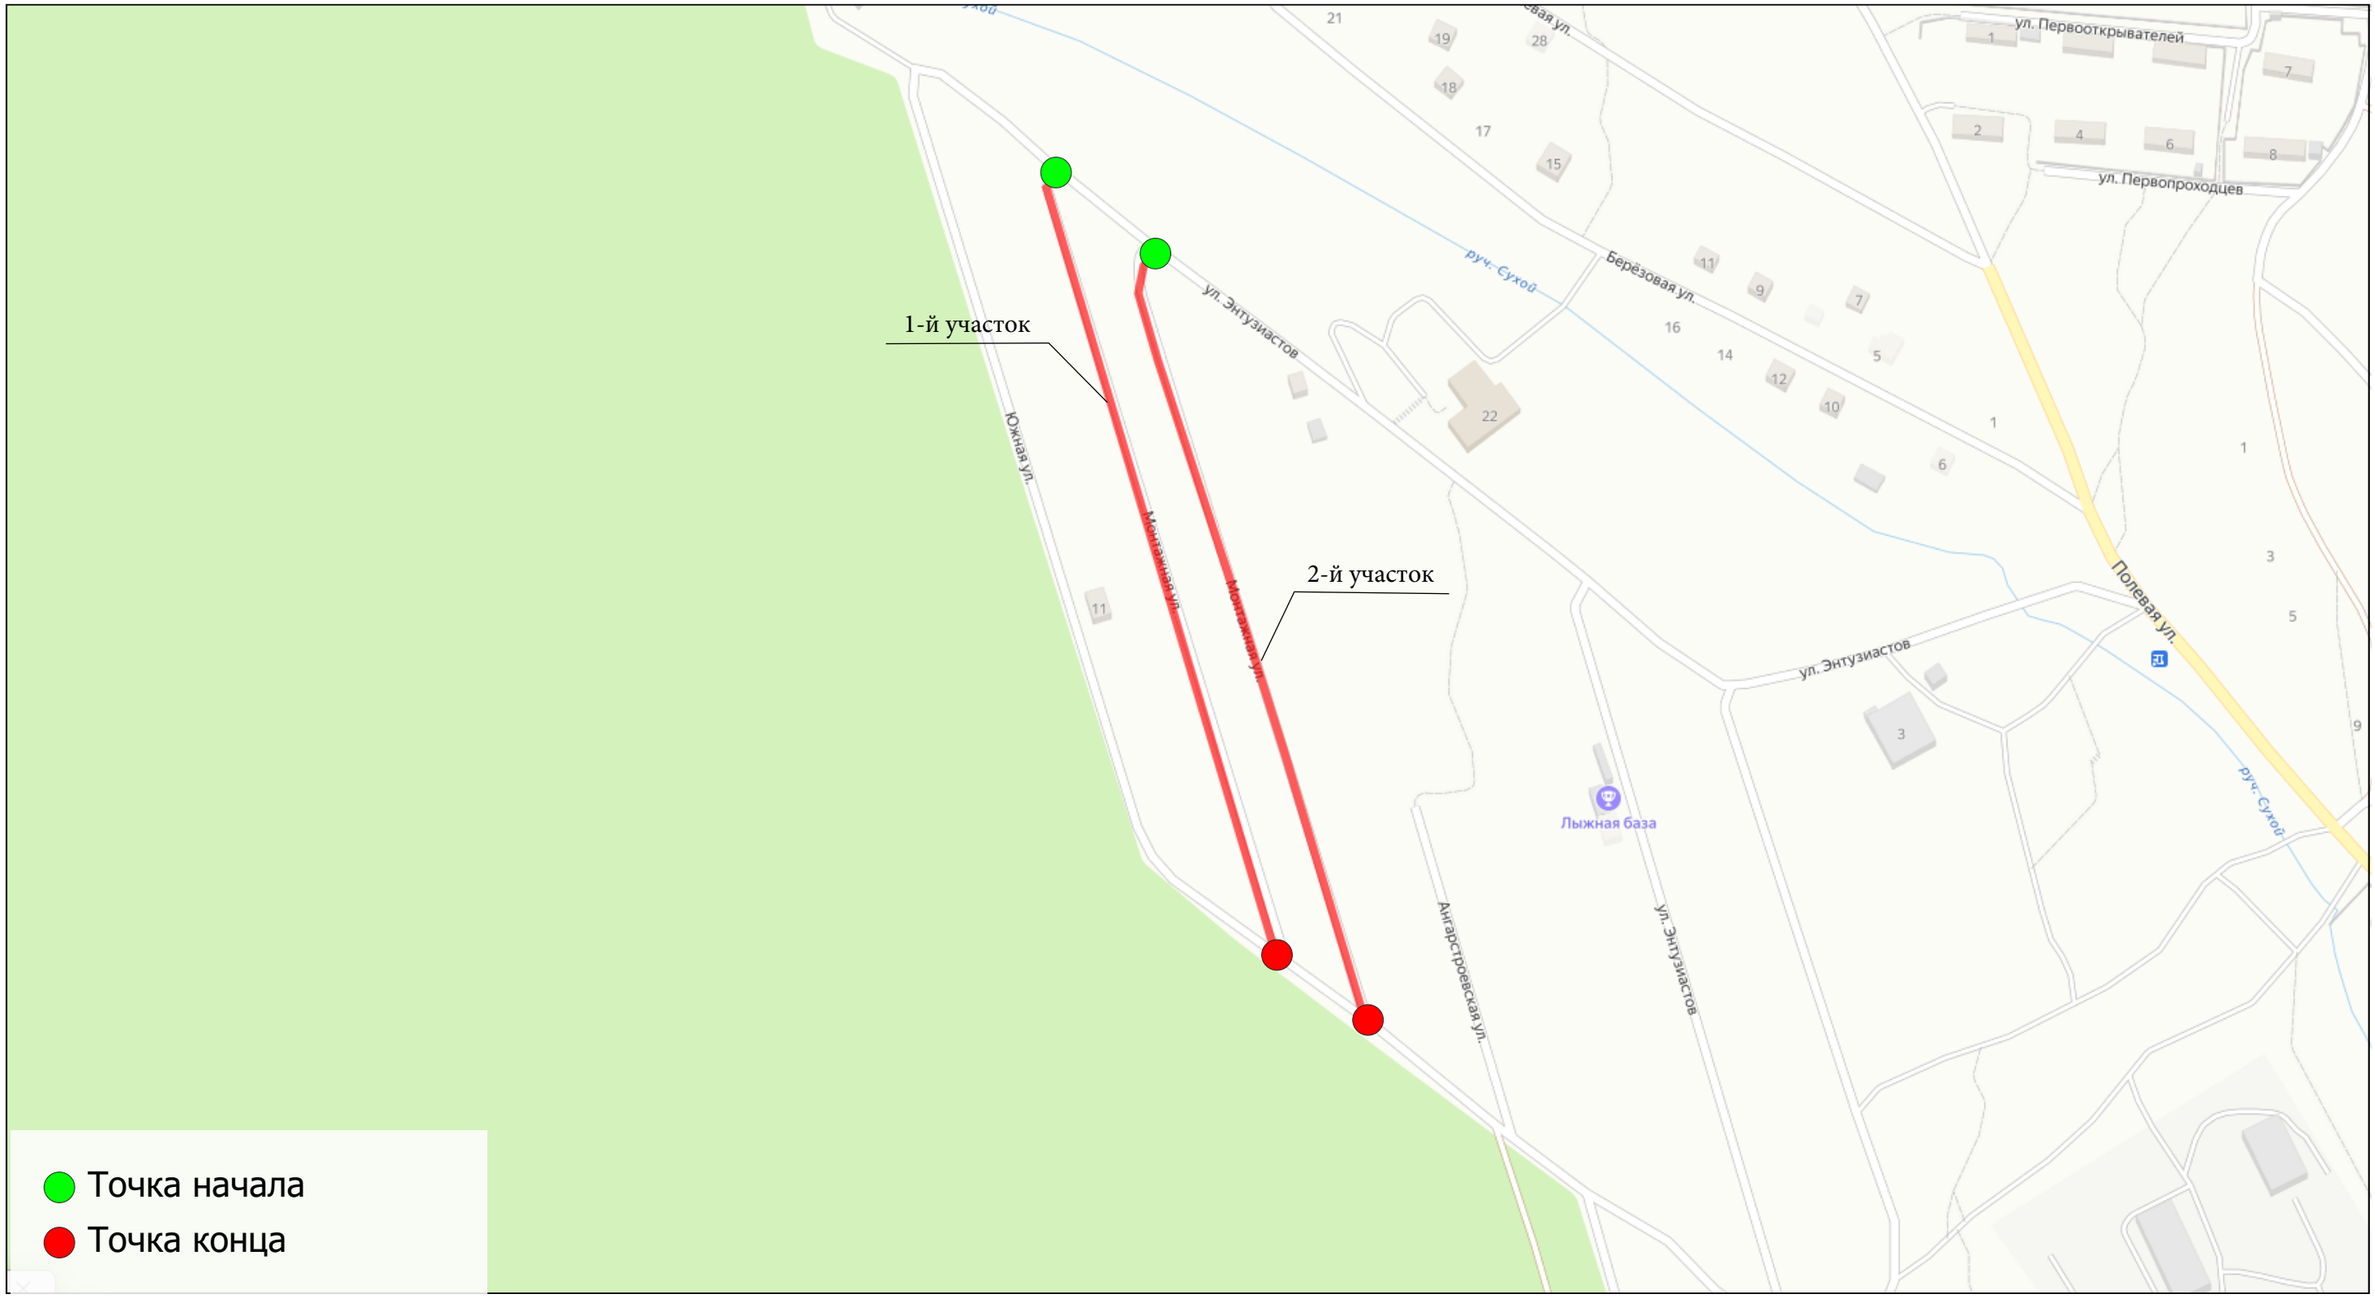

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

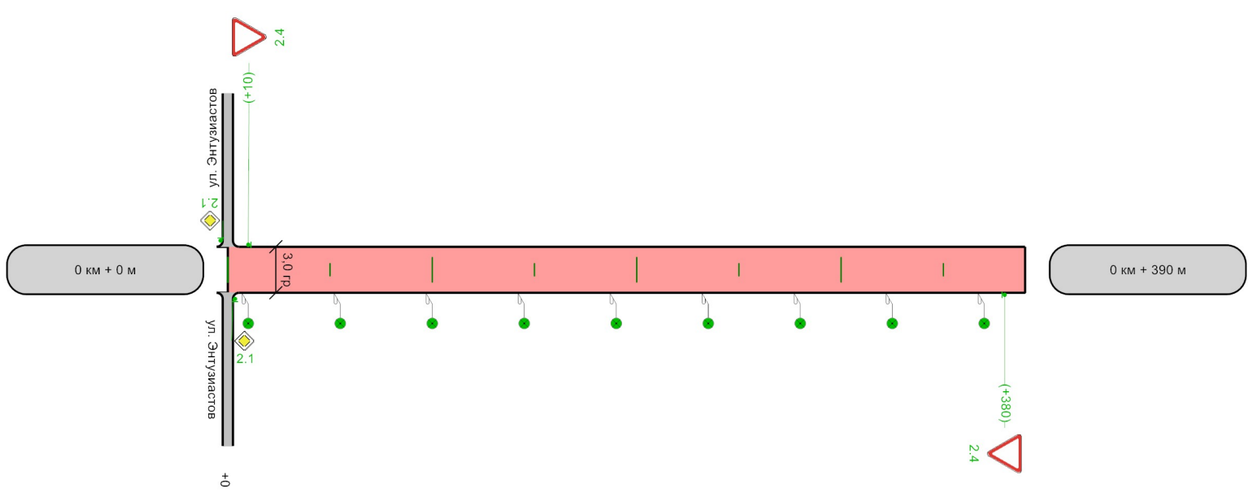

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+380	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+370	Населенный пункт	9/9	360	0	Справа
Итого:				**9/9**	**360**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

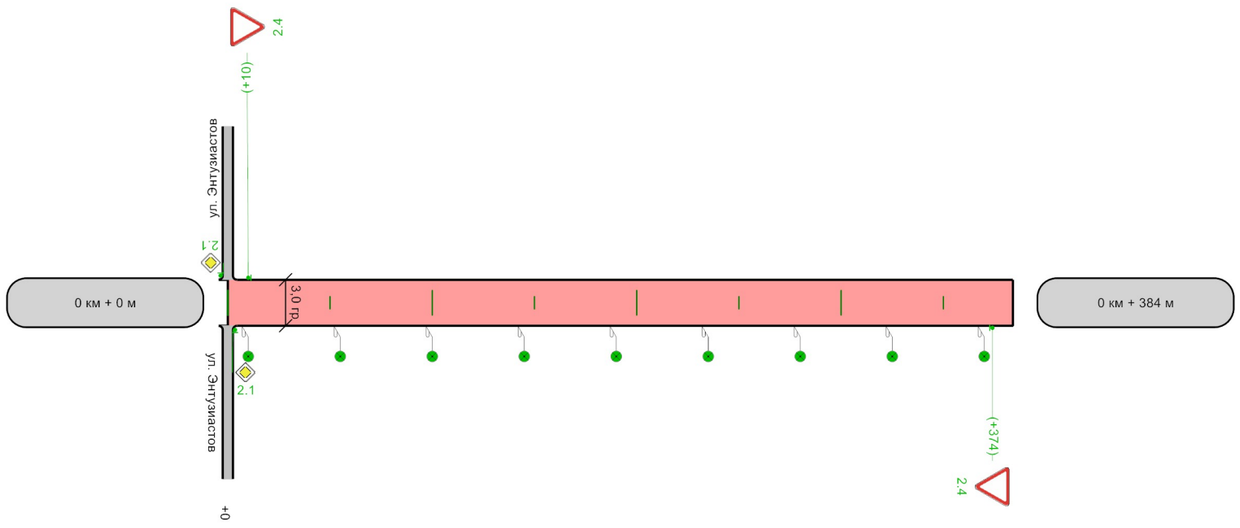

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+374	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+370	Населенный пункт	9/9	360	0	Справа
Итого:				**9/9**	**360**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Нагорная, д. 7 до жилого дома по ул. Нагорная, д. 25
км 0+000 - км 0+221

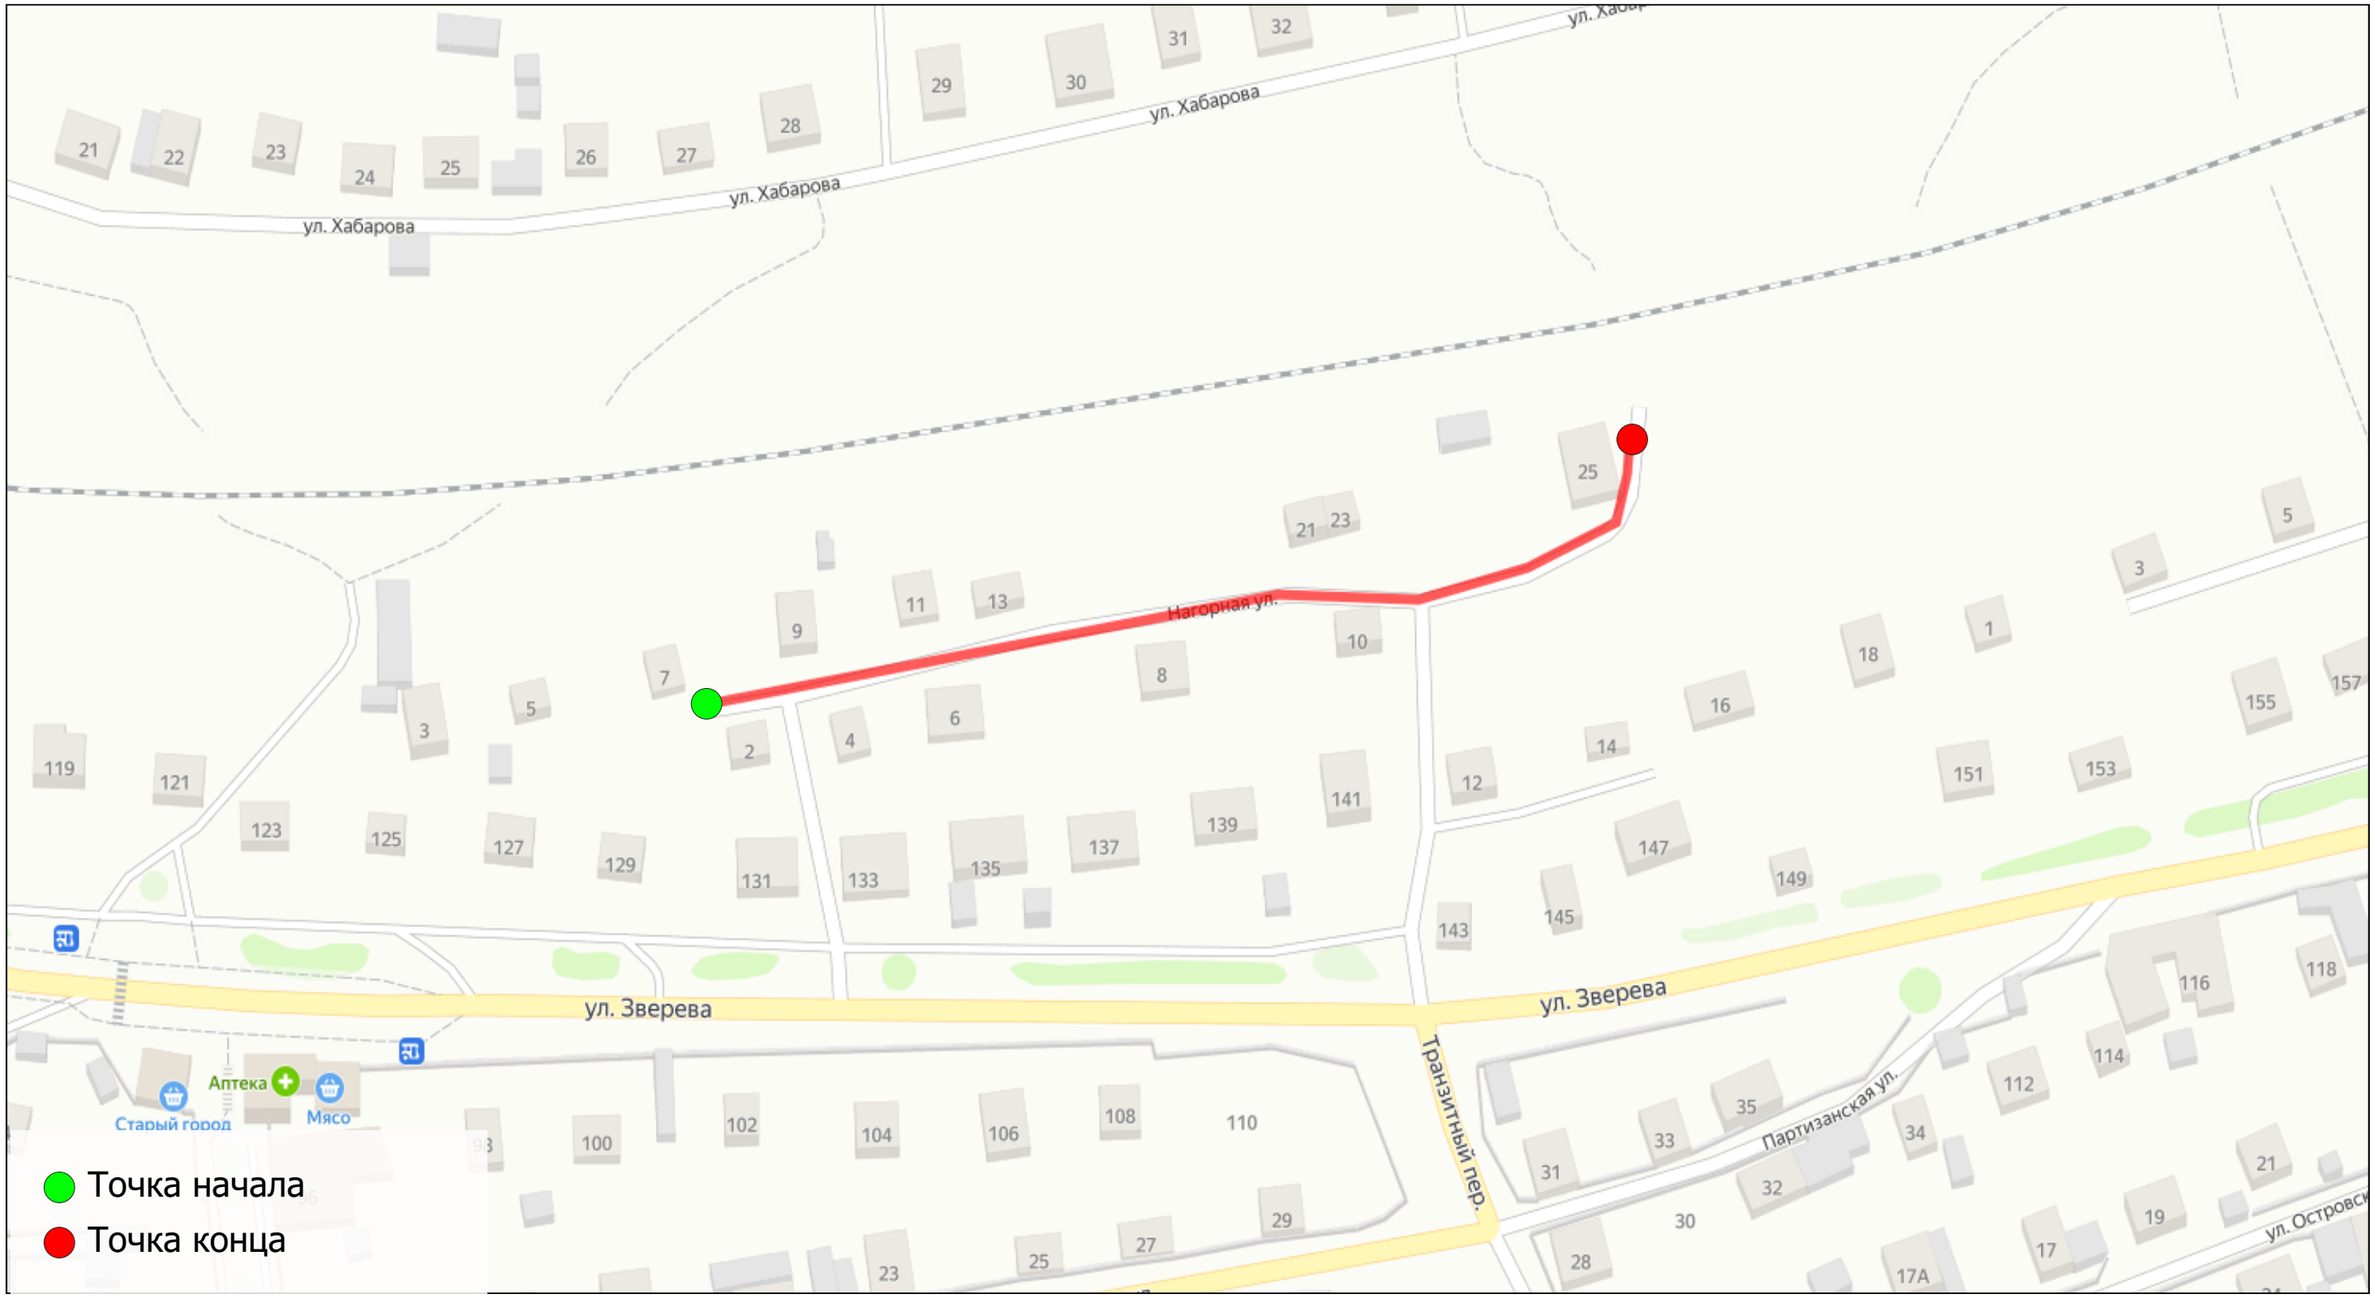

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 39 R=3627м 115 12 143 12 R=755м
Кривые в плане	152 R=33м P=0; a=87°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

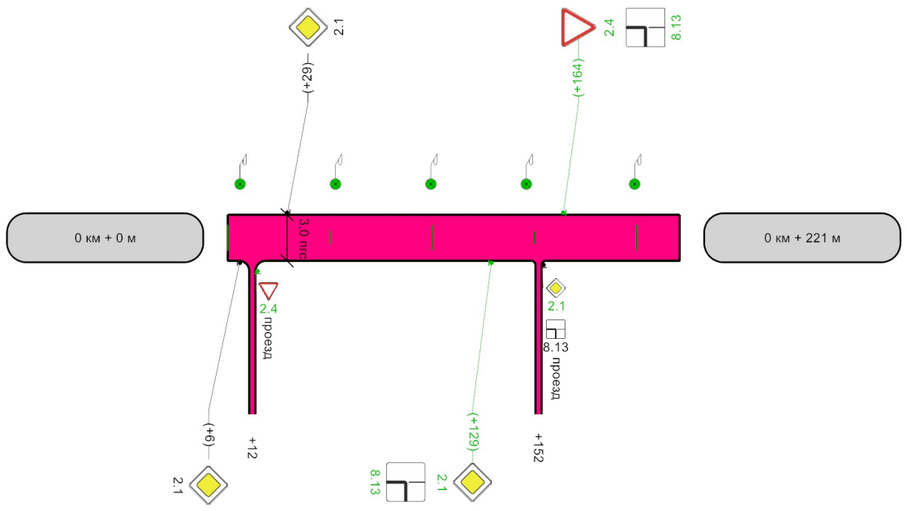

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+006	Установлено	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+029	Установлено	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+129	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	справа на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	справа на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу			0+164	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+129	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+130	Установлено	1	справа на примыкании
9	8.13	Направление главной дороги			0+164	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**9**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006	0+146	Населённый пункт	4/4	140	0	Слева
2	0+199	0+199	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**5/5**	**140**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Обнорского от жилого дома по ул. Некрасова, д. 20, до жилого дома по ул. Васильевского, д. 9


км 0+000 - км 0+704

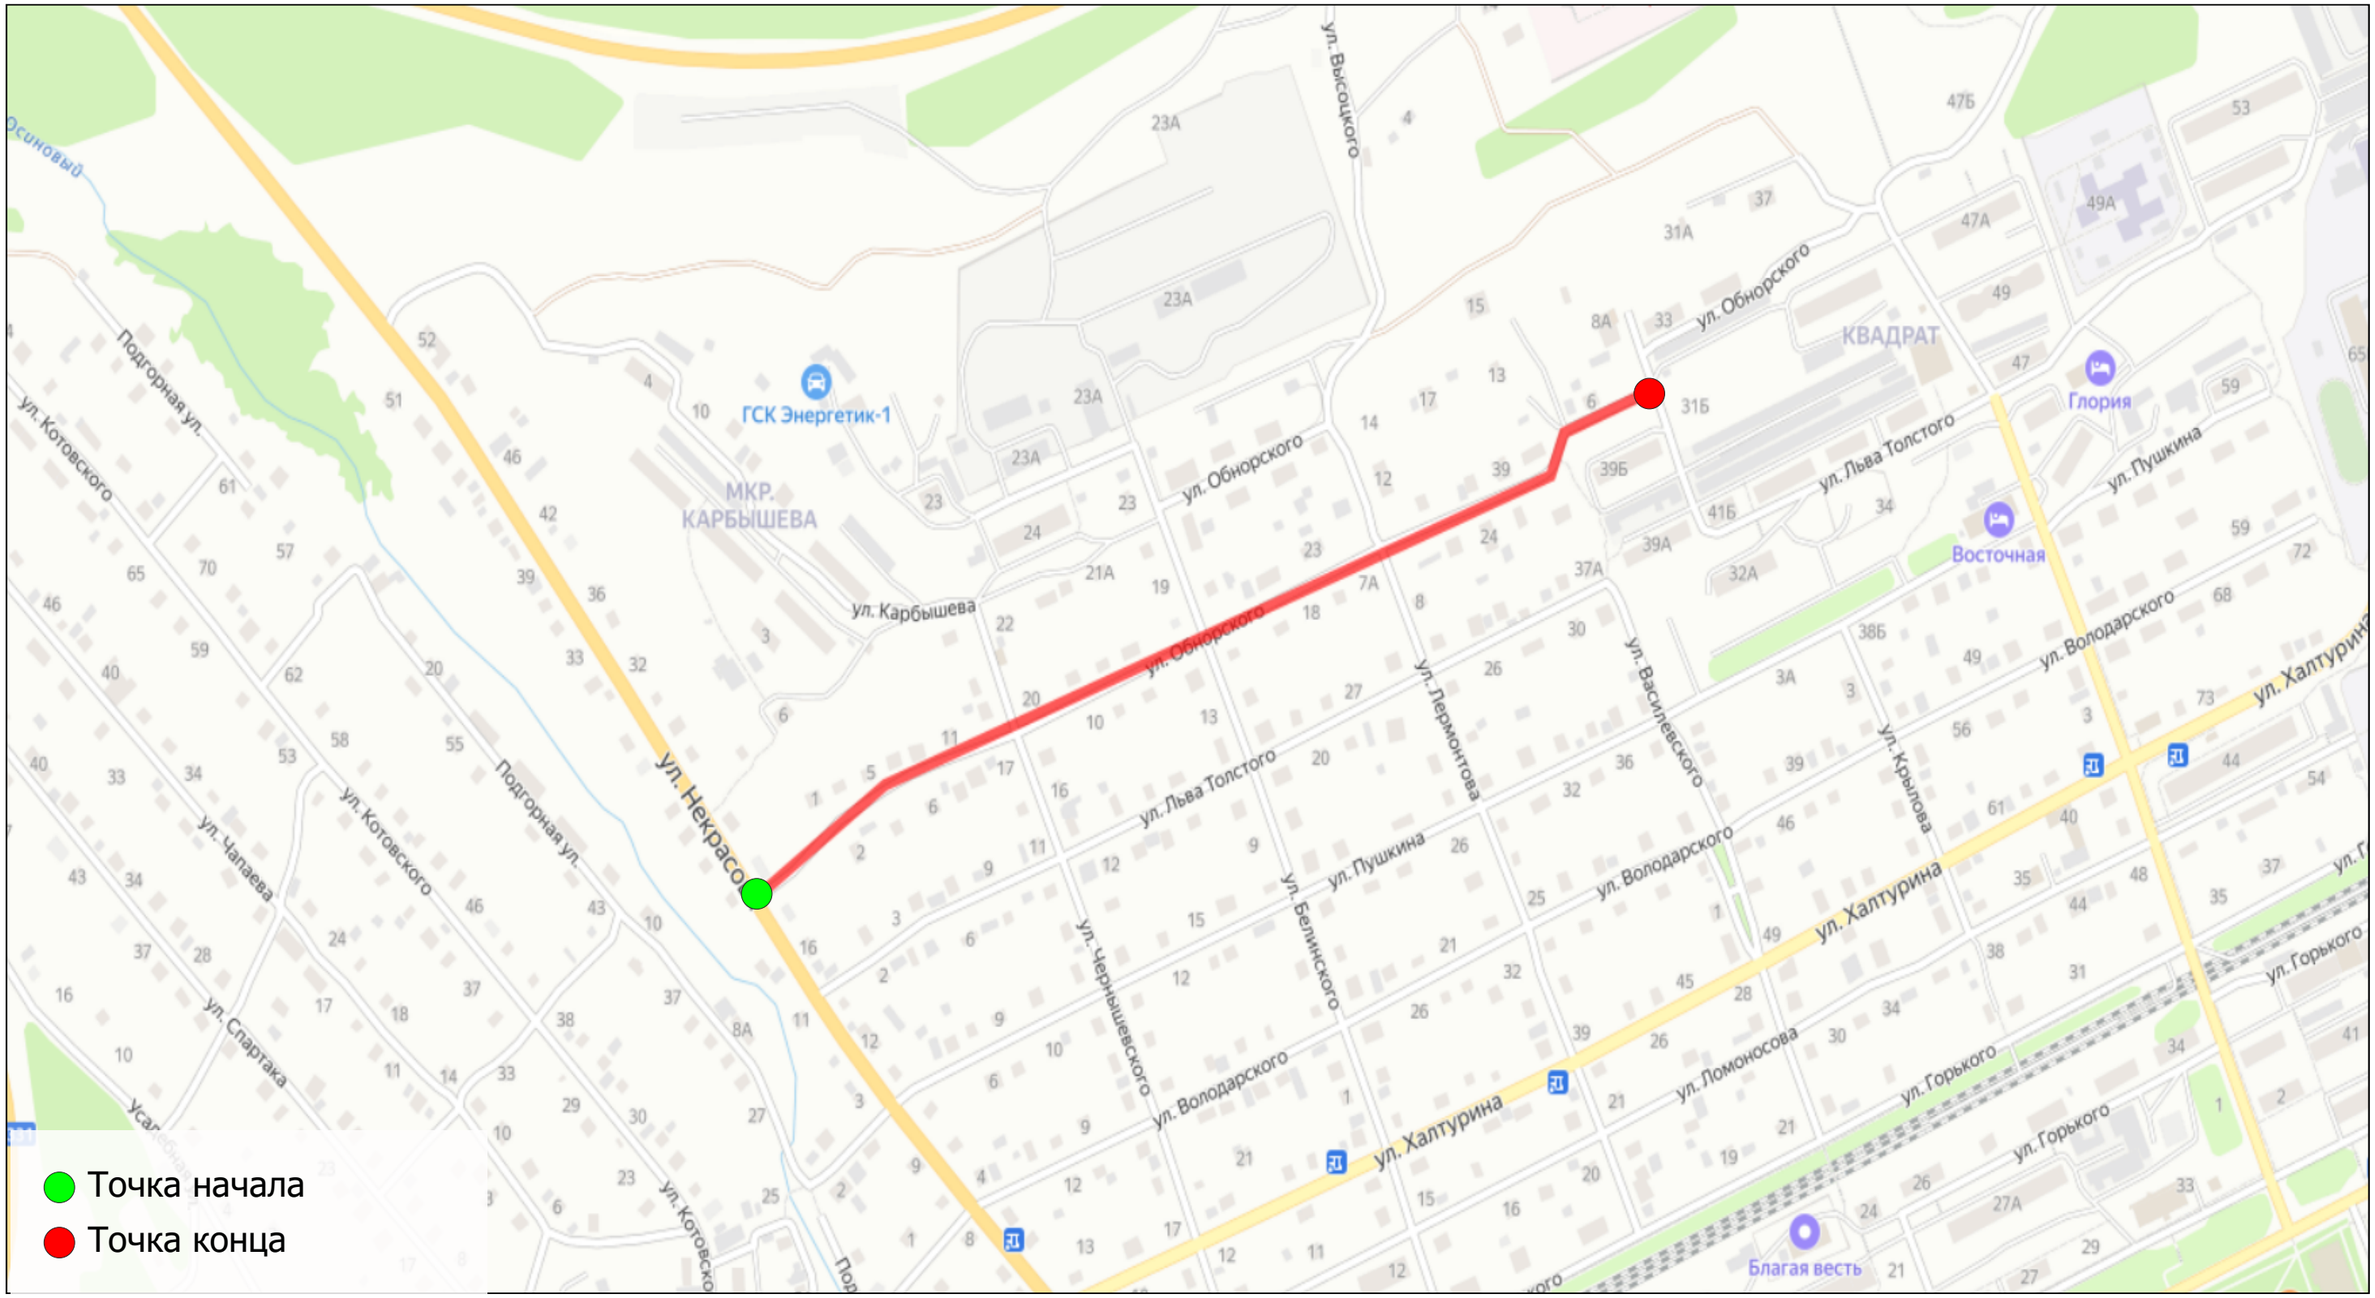

М 1:3000

Автодорога общего пользования по ул. Обнорского: от жилого дома по ул. Некрасова, д. 20

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	20 — 265 — 18 — R=2286м — 311 — 40 — 412 — 31 — R=2185м — 615 — 136
Кривые в плане	56 — R=26м — 77 — R=33м — 106; 206 — R=422м — 300
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

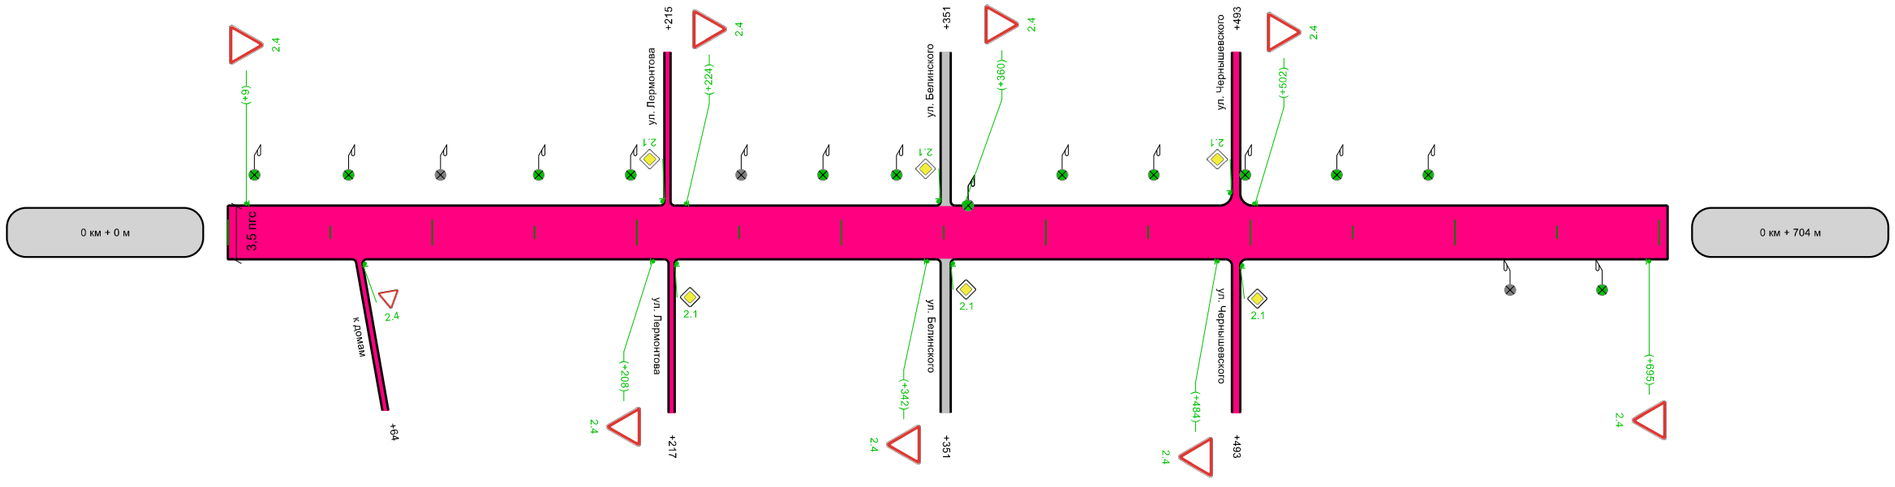

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+208	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+224	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+342	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+360	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+484	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+502	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+695	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+013	0+059	Жилая застройка	2/2	46	0	Слева
2	0+104	0+251	Жилая застройка	2/2	0	147	Слева
3	0+152	0+197	Жилая застройка	2/2	45	0	Слева
4	0+291	0+327	Жилая застройка	2/2	36	0	Слева
5	0+362	0+362	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
6	0+362	0+362	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
7	0+408	0+587	Жилая застройка	5/5	179	0	Слева
8	0+627	0+627	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
9	0+672	0+672	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
Итого:				**17/17**	**306**	**147**	

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
