394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 3, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога по ул. Украинская от жилого дома по ул. Радужная, д. 9 до автомобильной дороги ул. Черноморская	6
5.	Автодорога от земельного участка по ул. Приленская, 1Б до жилого дома по ул. Ушакова, д.42	10
6.	Автодорога от жилого дома по ул. Щусева, д. 21Б до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»	17
7.	Автодорога от жилого дома по ул. Грибоедова, д.9 до жилого дома по ул. Щусева, д. 45	23
8.	Автодорога по ул. Энтузиастов от ул. Геофизиков 2-я, д.2. до ул. Южная	35
9.	Автодорога по ул. Южная от ул. Энтузиастов до ул. Монтажная	48
10.	Автодорога от ул. 2-я Таежная д.9. до ул. 2-я Таежная д.16	51
11.	Автодорога от жилого дома по ул. Некрасова, д.14 до жилого дома по ул. Л. Толстова, д.51	61
12.	Автодорога от жилого дома по ул. Черкасская, д. 13 до жилого дома по ул. Черкасская, д. 2	67
13.	Автодорога от жилого дома по ул. Ломоносова, д. 10 до жилого дома по ул. Чернышевского, д. 21	70
14.	Автодорога по ул. Чернышева от земельного участка по пер. 2-й Энергетический, 1 до жилого дома по ул. Балахня, д. 17	74
15.	Автодорога от земельного участка по ул. 405 городок, 11а до жилого дома по ул. 405 городок, 34	79
16.	Автодорога от жилого дома по ул. Степана Разина, д. 2 до жилого дома по ул. Степана Разина, д 32	88
17.	Автодорога от жилого дома по пер. Флотский, д. 1 до жилого дома по пер. Флотский, д. 2	91
18.	Автодорога от жилого дома по ул. Фрунзе, д. 3 до жилого дома по ул. Фрунзе, д. 91	95
19.	Автодорога от жилого дома по ул. Фурманова, д.1 до жилого дома по ул. Фурманова, д. 25	104
20.	Автодорога по пер. Цветочный от автодороги по ул. Герцена до автодороги ул. Ковпака	107
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Сибирская, д.23 до жилого дома по ул. Совхозная, д. 19	111
22.	Автодорога от ул. Жилого дома по 40 лет Победы, д. 1 до жилого дома по ул. 40 лет Победы, д. 16	115
23.	Автодорога по пер. Транзитный от жилого дома по ул. Партизанская, д. 31 до жилого дома по ул. Советская, д. 133	118
24.	Автодорога от жилого дома по ул. Зверева, д. 44 до жилого дома по ул. Советская, д. 45	122
25.	Автодорога от жилого дома по ул. Бирюсинская, д. 25 до территории по ул. Транспортных строителей участок, д. 1	126
26.	Автодорога от жилого дома по ул. Донская, д. 9 до жилого дома по ул. Трудовая, д. 23	130
27.	Автодорога от земельного участка по ул. Пришвина до жилого дома по ул. Седова, д. 15а	135
28.	Автодорога от жилого дома по ул. Пугачева, д. 30 до жилого дома по ул. Пугачева, д. 1	140
29.	Автодорога от жилого дома по ул. Суворова, д. 20 до жилого дома по ул. Суворова, д.2	144
30.	Автодорога по ул. СУ-81 от автодороги ул. Зелёная до автодороги ул. Коммунальная	147
31.	Автодорога по ул. Судостроительная от территории МОУ СОШ №10 д. №70 по ул. Пушкина до жилого дома по ул. Халтурина, д. 66	154
32.	Обосновывающая часть ПОДД	159

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				


Условные обозначения элементов обустройства дороги

Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Украинская от жилого дома по ул. Радужная, д. 9 до автомобильной дороги ул. Черноморская км 0+000 - км 0+258

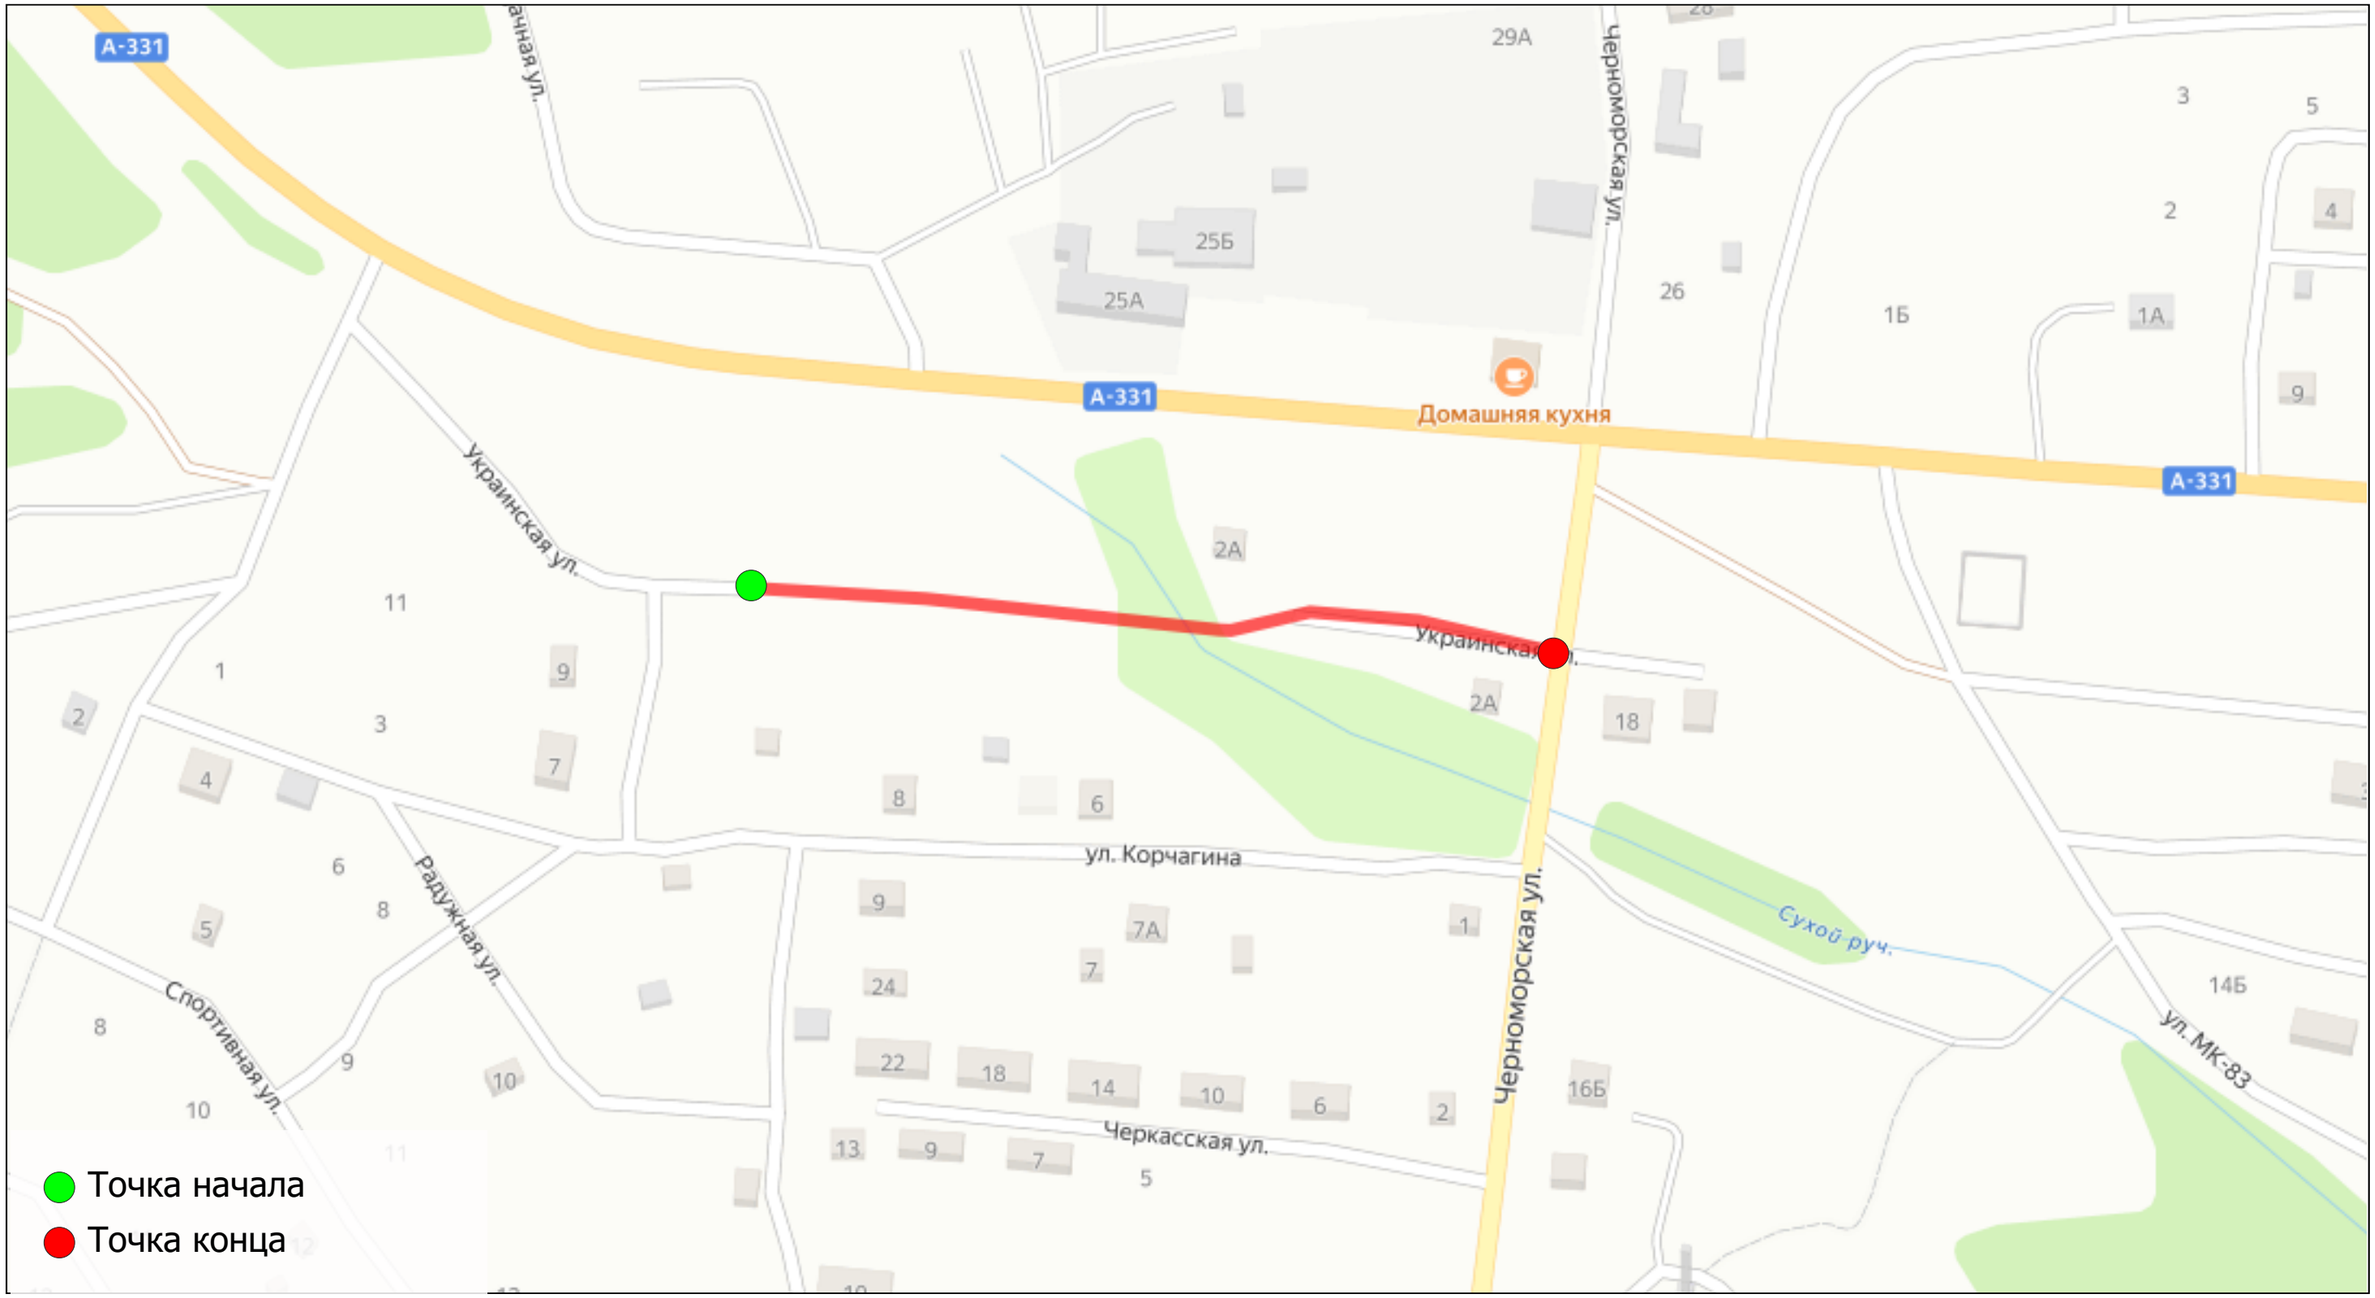

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 53 9 R=1152м 65 138 64 170 R=1035м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00 100 3,00

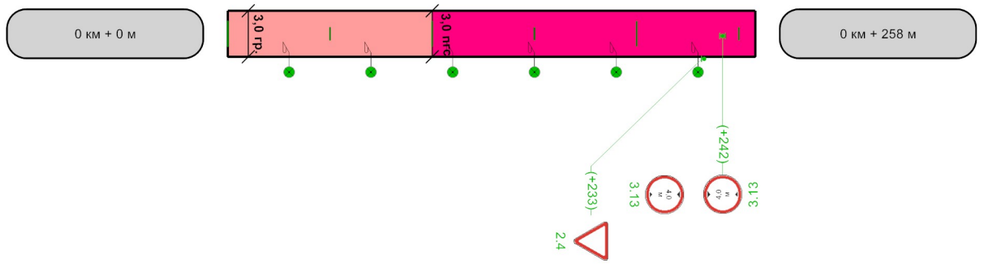

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+233	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+242	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+230	Населенный пункт	6/6	200	0	Справа
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Приленская, 1Б до жилого дома по ул. Ушакова, д.42


км 0+000 - км 1+332
км 0+000 - км 0+100

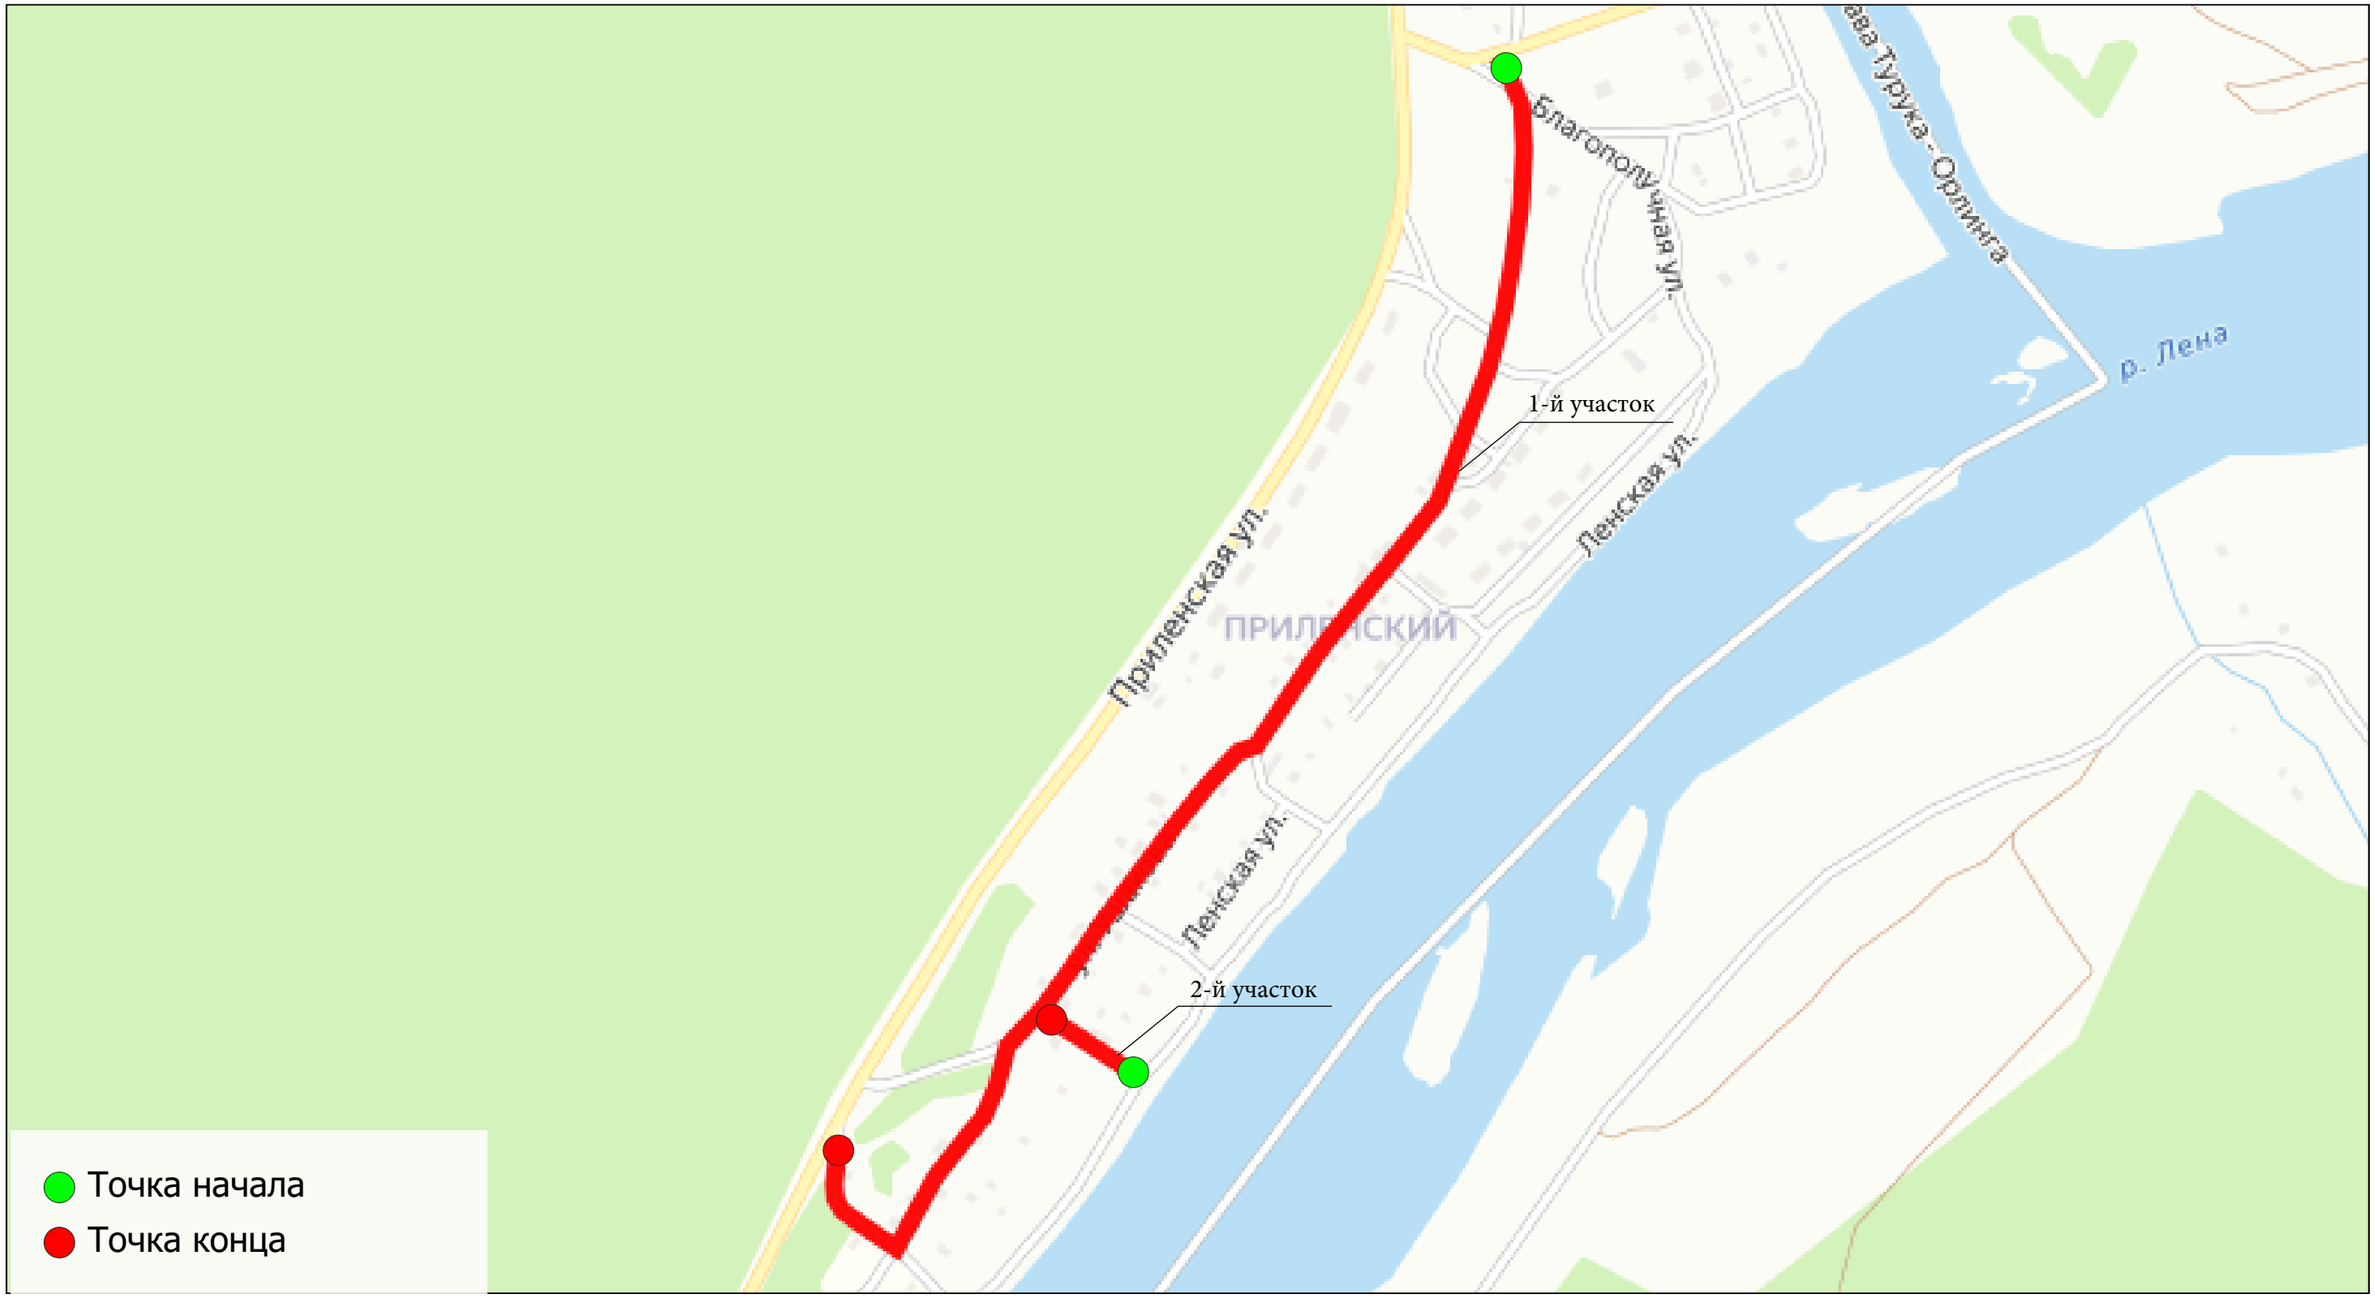

М 1:3000

Автомобильная дорога от земельного участка по ул. Приленская, 1Б до жилого дома по ул. Ушакова, д.42, 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 R=2491м 10 61 8 120 R=2355м 48 255 47 282 R=2929м 22 488 23 723 R=3760м 2 804 1 892 R=2771м
Кривые в плане	12 R=90м P=3; a=19° 62 864 R=672м P=22; a=18°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

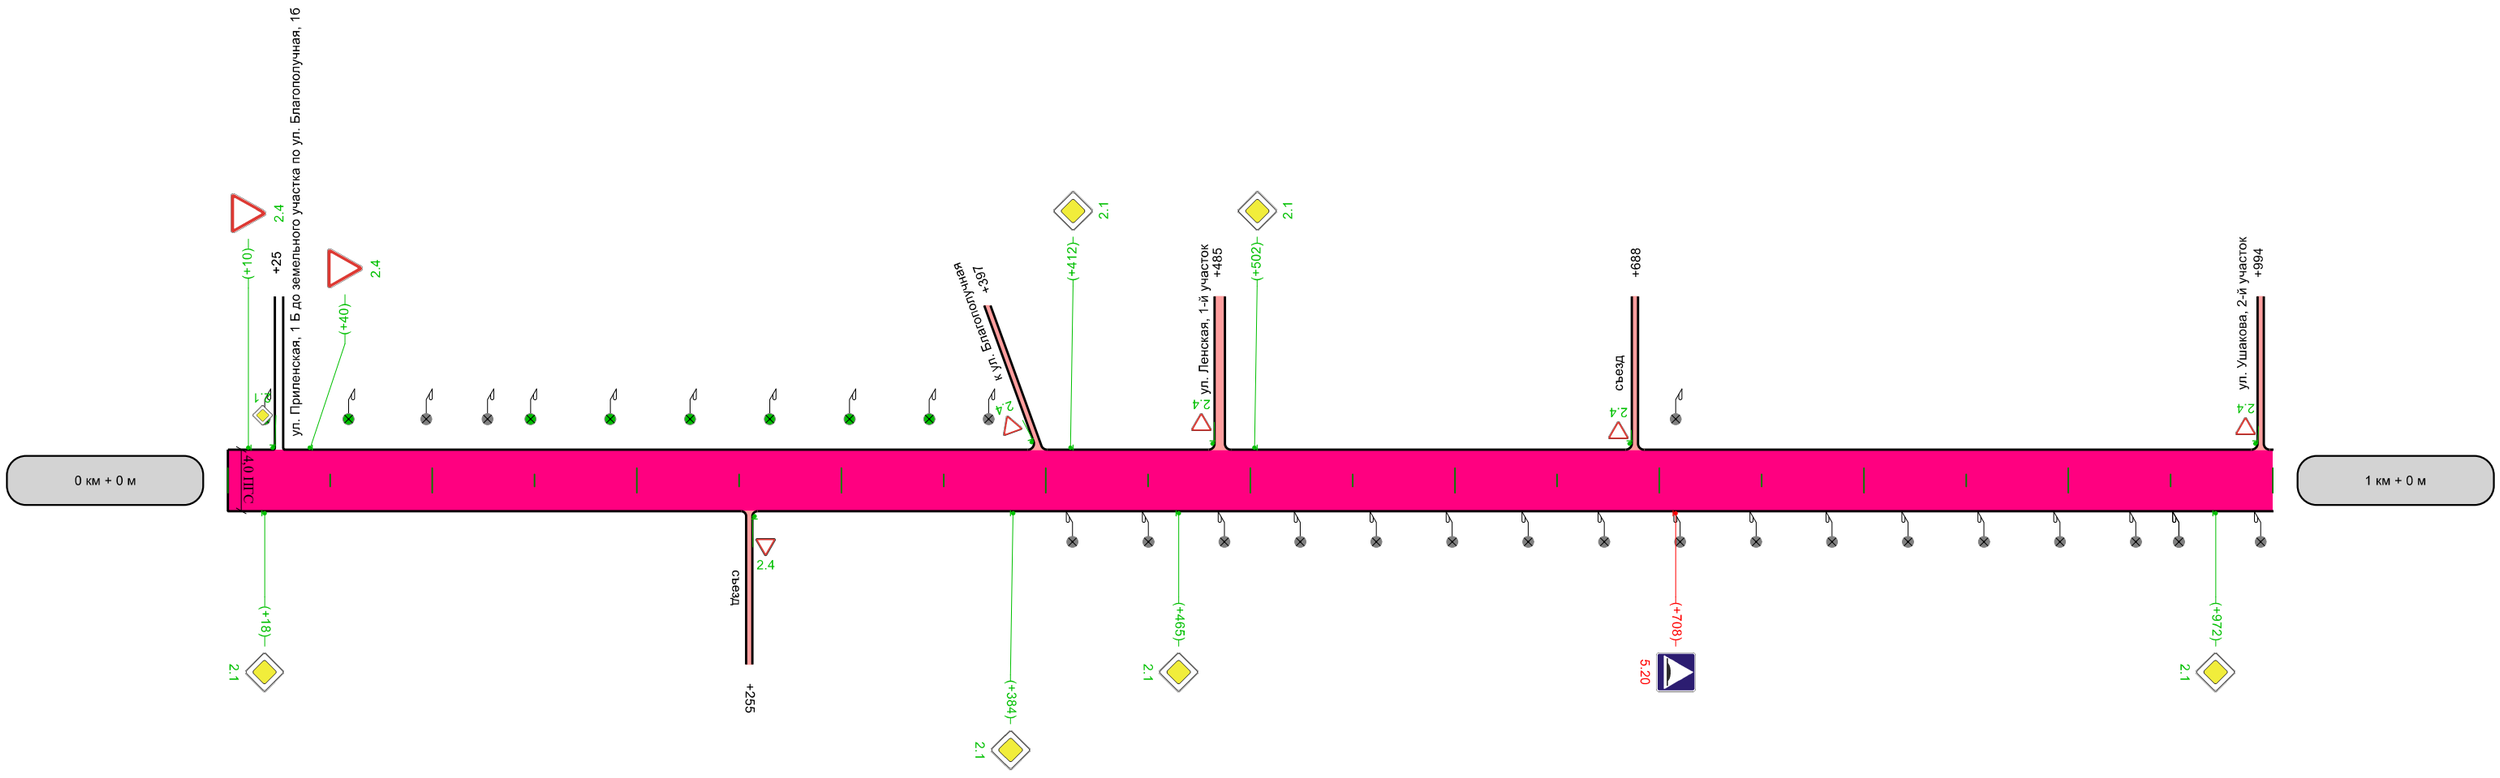

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — R=2771м — 74 — 97 — 74 — 63 — 174 — R=1612м — 126 — 277
Кривые в плане	R=672м P=22; a=18° — 74 — 174 — R=39м P=0; a=147° — 277
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

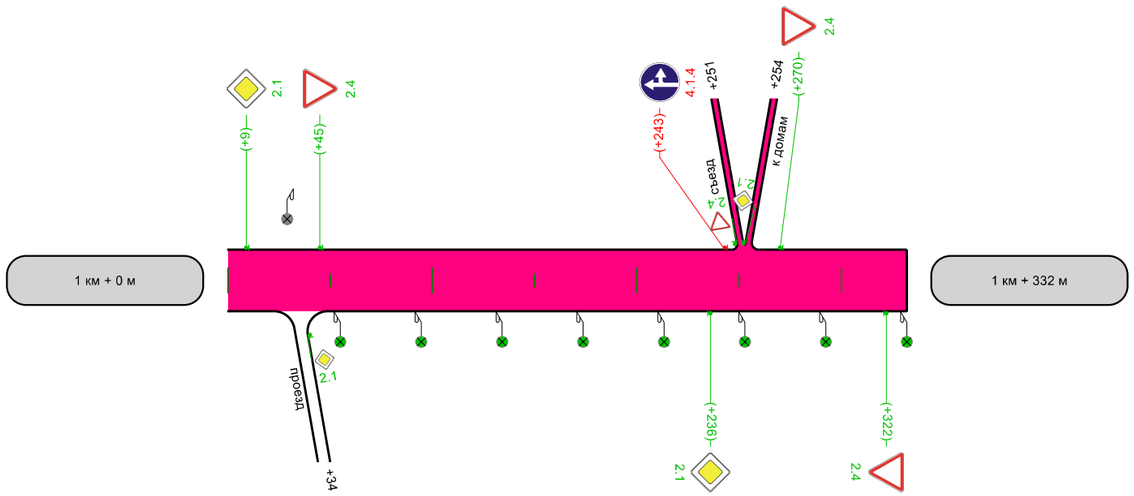

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+018	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+384	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+412	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+465	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+502	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+972	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			1+009	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога			1+236	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+040	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			1+045	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			1+270	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			1+322	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**13**	
		Предписывающие знаки						
14	4.1.4	Движение прямо или направо			1+243	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
15	5.20	Искусственная неровность			0+708	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**13**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+018	0+059	Населенный пункт	2/2	41	0	Слева
2	0+097	0+127	Населенный пункт	2/2	0	30	Слева
3	0+148	0+343	Населенный пункт	6/6	195	0	Слева
4	0+372	0+372	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+413	0+933	Населенный пункт	15/15	0	520	Справа
6	0+708	0+708	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+954	0+955	Населенный пункт	1/1	0	1	Справа
8	0+954	0+955	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
9	0+994	0+994	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
10	1+029	1+029	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
11	1+055	1+332	Населенный пункт	8/8	277	0	Справа
Итого:				**39/39**	**514**	**551**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 / 2 R=847м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

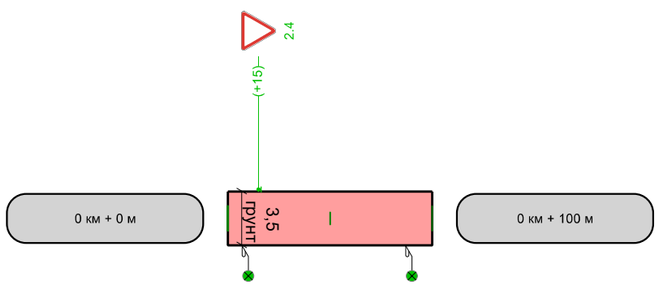

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+090	Населенный пункт	2/2	80	0	Справа
Итого:				**2/2**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Щусева, д. 21Б до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»

1-й участок: км 0+000 - км 0+585
2-й участок: км 0+000 - км 0+076

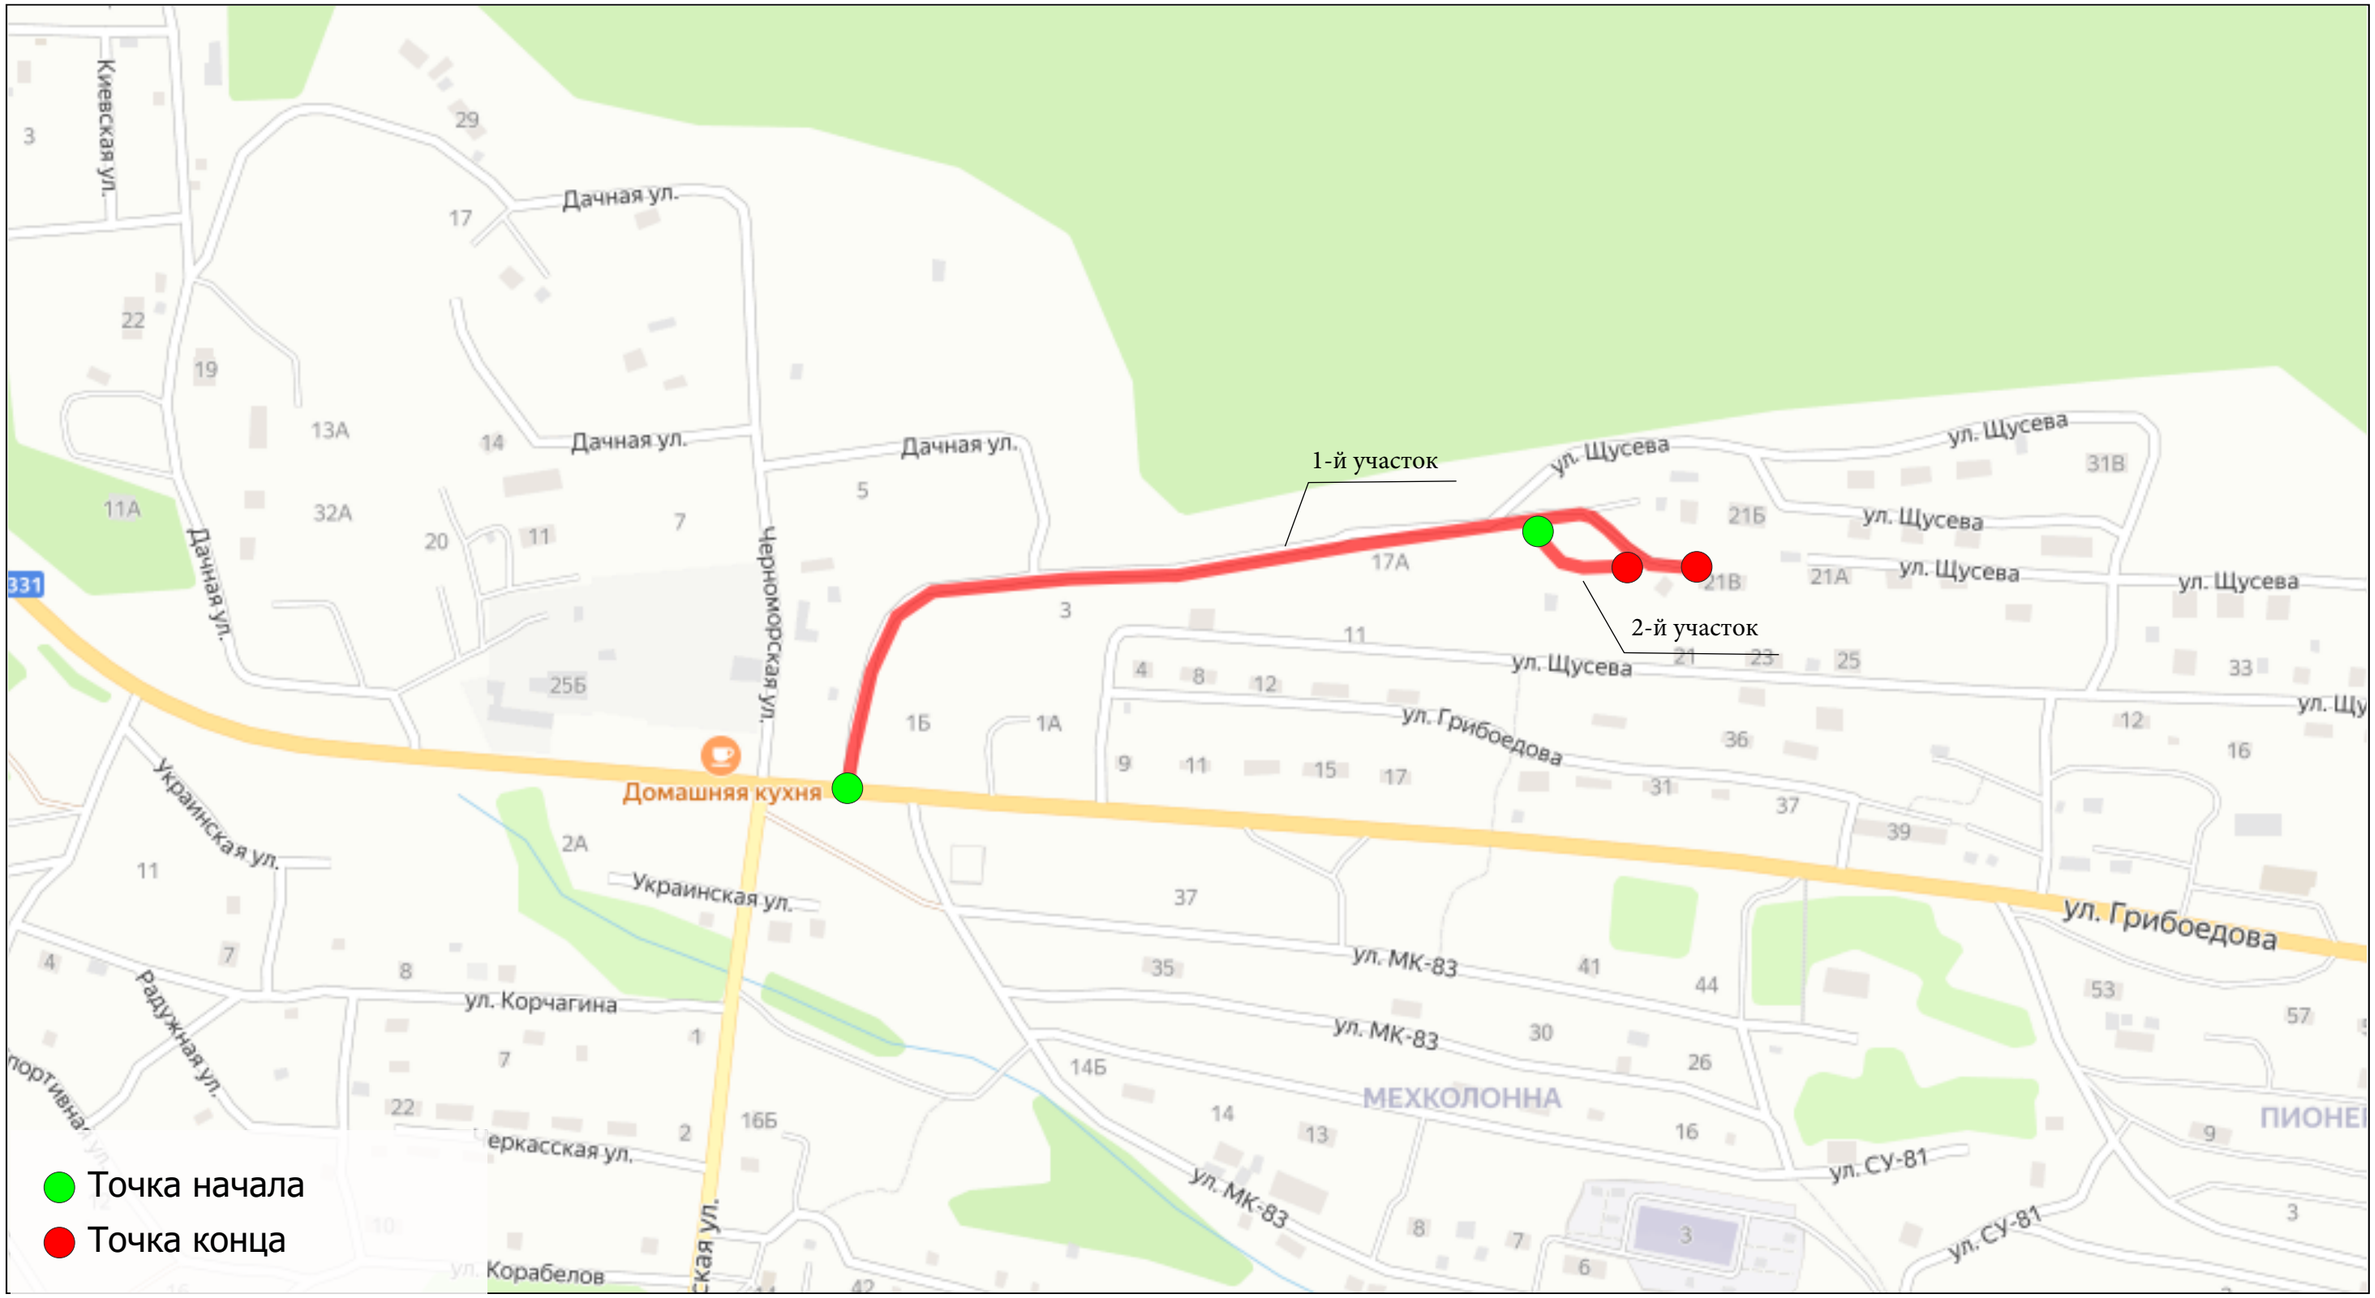

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	77 · 84 (84) R=3867м · 39 (259) · 58 (442) R=1840м · 58 (585)
Кривые в плане	R=140м P=1; a=80° (80 – 130)
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,00

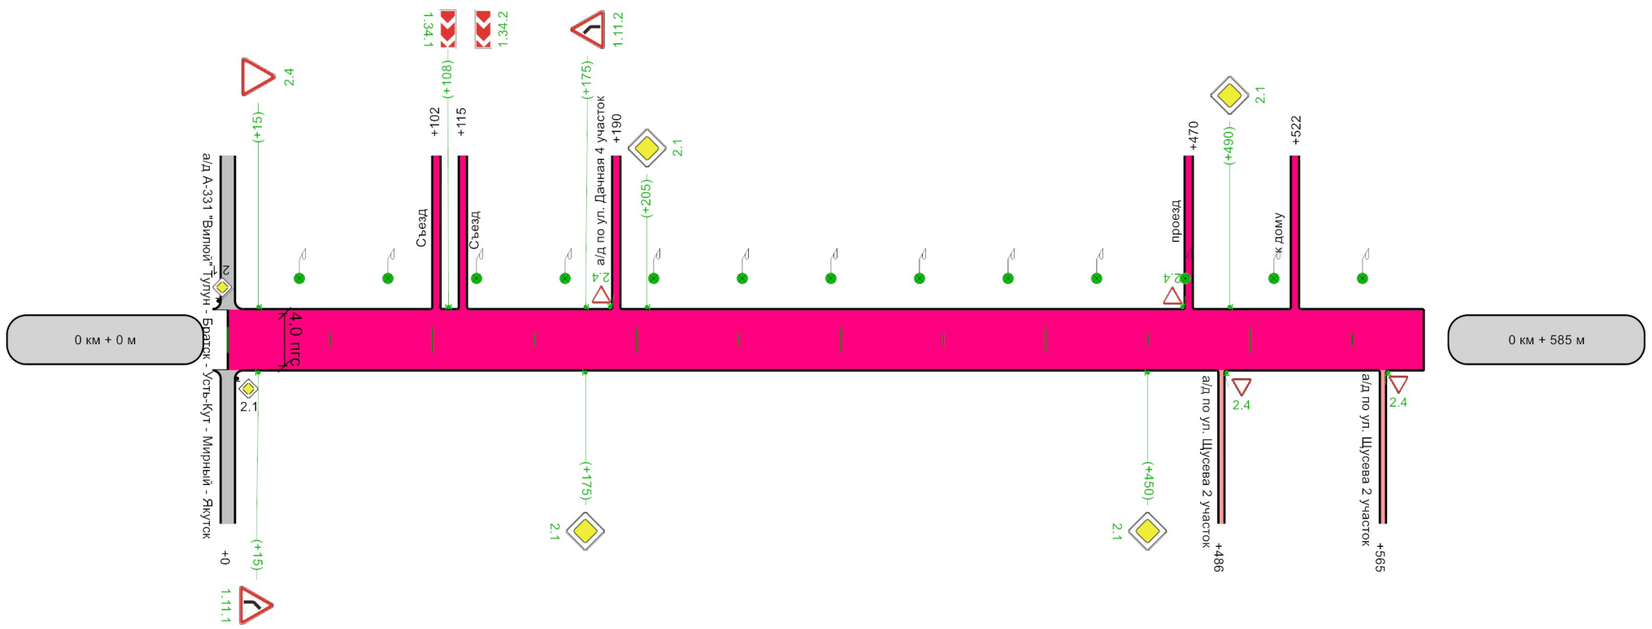

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+015	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+175	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+108	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+108	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+205	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+450	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+490	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**9**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+555	Населенный пункт	13/13	520	0	Слева
Итого:				**13/13**	**520**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 99 2 R=1109м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

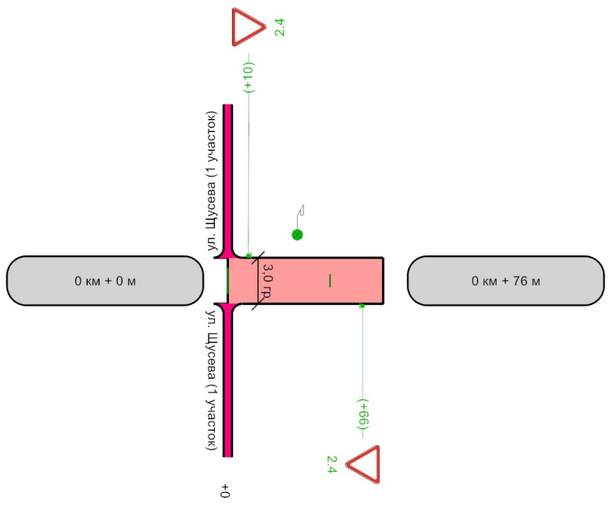

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+066	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+034	0+034	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**1/1**	**0**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Грибоедова, д.9 до жилого дома по ул. Щусева, д. 45


1-й участок: км 0+000 - км 0+979
2-й участок: км 0+000 - км 0+355
3-й участок: км 0+000 - км 0+340
4-й участок: км 0+000 - км 0+018
5-й участок: км 0+000 - км 0+654

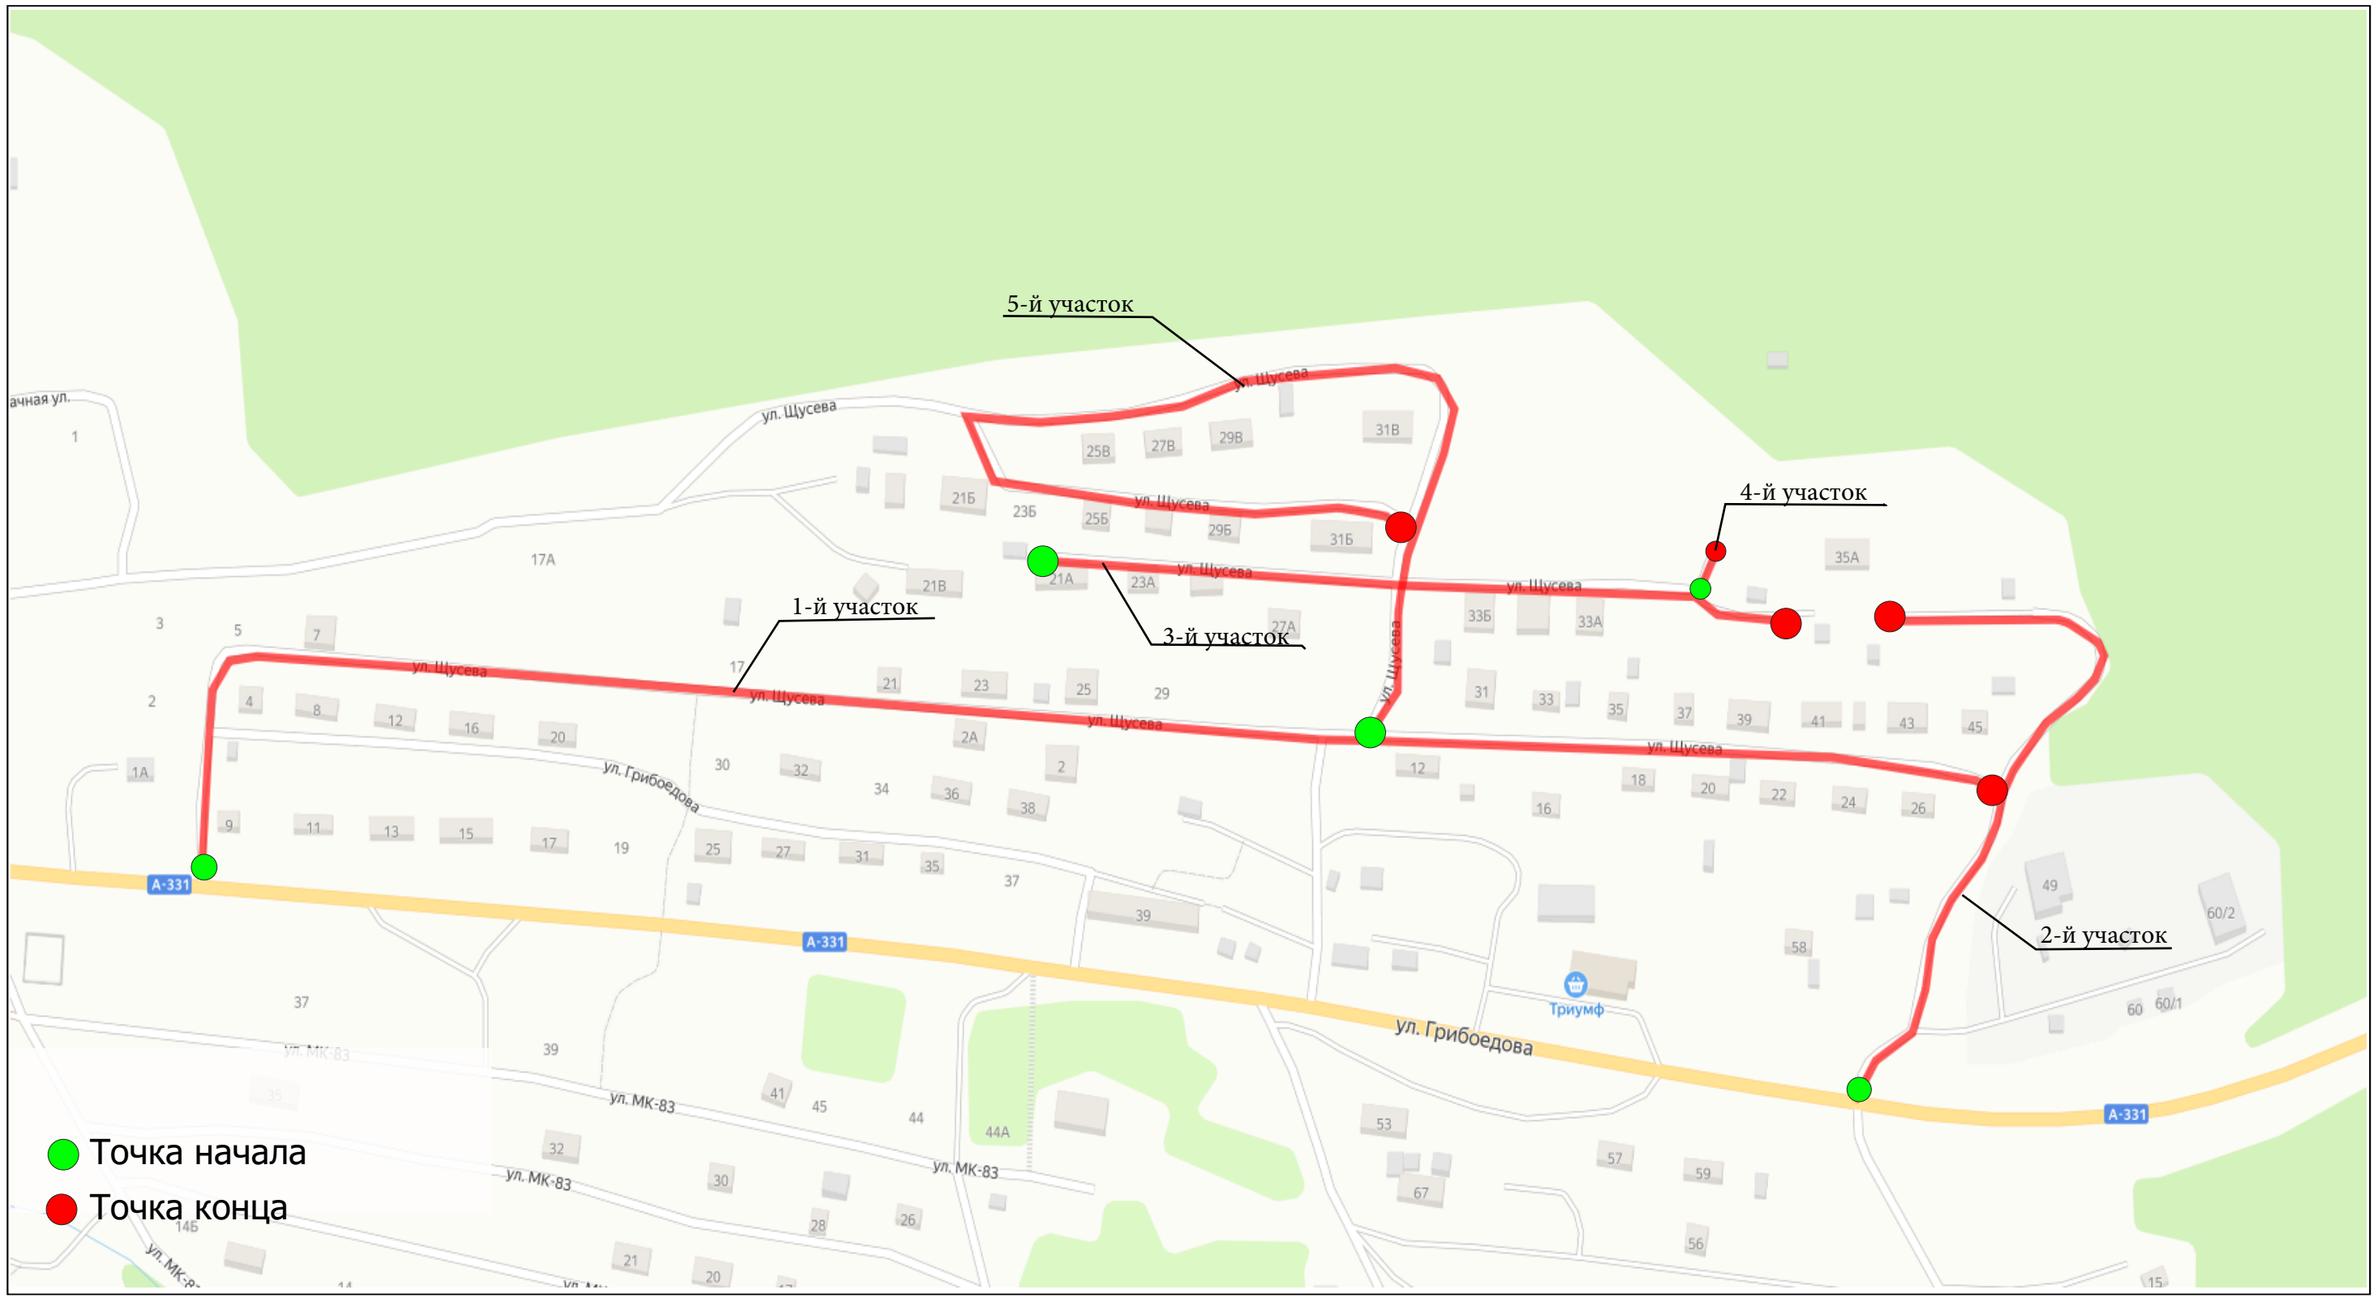

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Грибоедова, д.9 до жилого дома по ул. Щусева, д. 45, 1-й участок

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	68 — 75 — 93 — R=973м — 165 — 0 — 467 — 13 — R=4301м — 539 — 3 — 635 — 4 — R=4254м — 702 — 12 — 731 — 12 — R=3200м — 790 — 6 — 826 — 6 — R=1825м
Кривые в плане	71 — R=63м P=0; a=106° — 125 — 944 — R=795м P=102; a=4°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,00 — 67 — 3,00 — 510 — 3,00

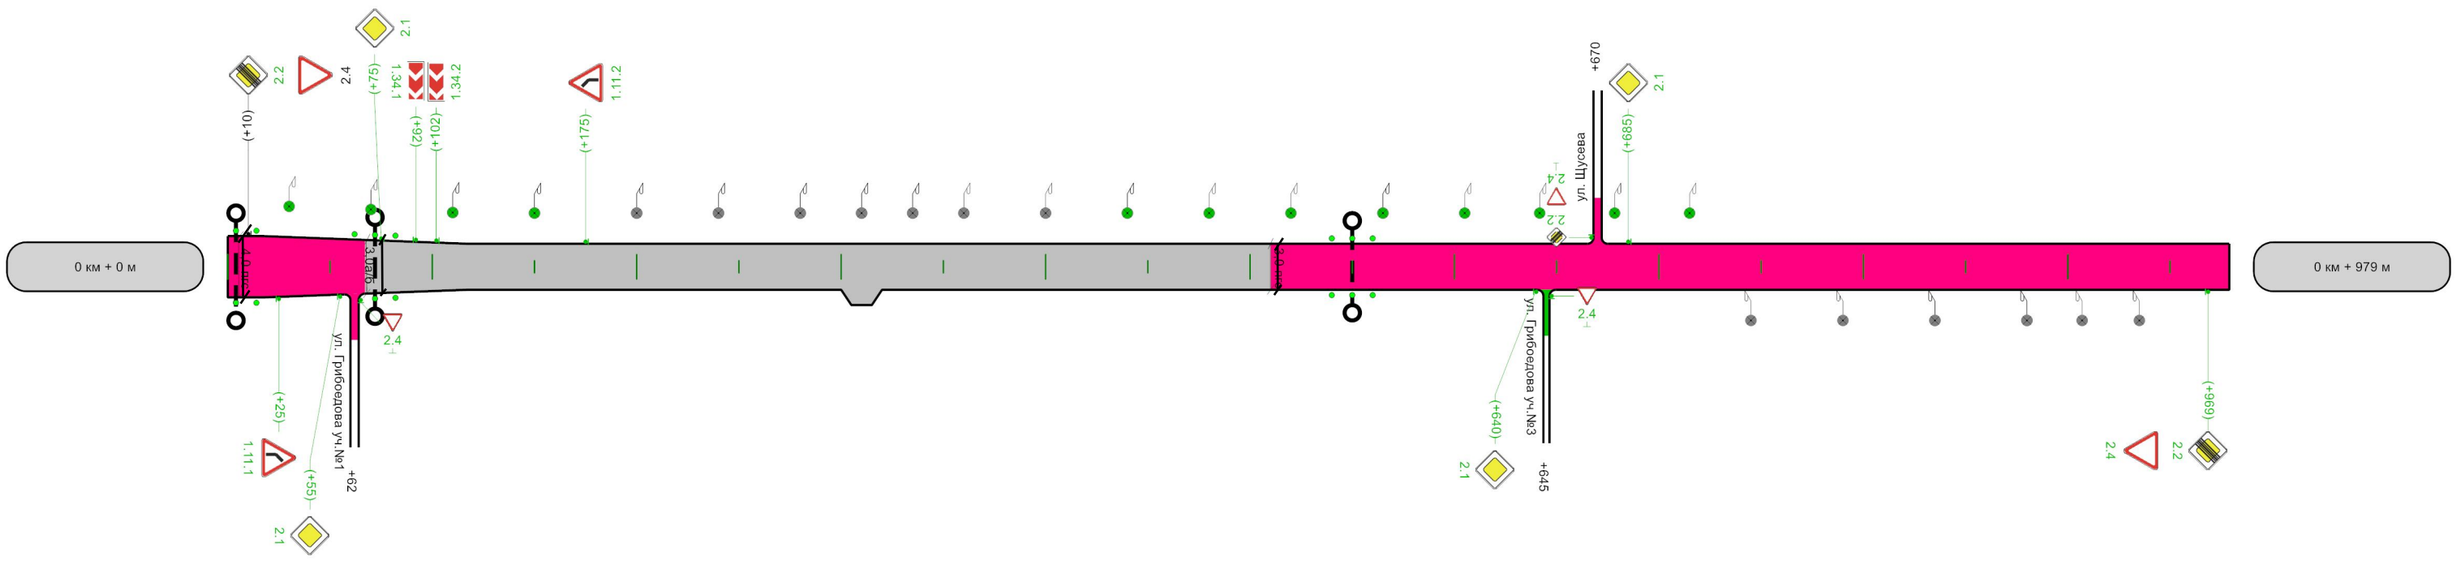

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+025	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+175	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+092	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+102	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+640	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+685	Требуется установить	1	слева
9	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
10	2.2	Конец главной дороги			0+989	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+989	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+004	0+014	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+004	0+014	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+062	0+082	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0+072	0+082	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+540	0+560	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+540	0+560	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**90/15**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+070	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
2	0+110	0+150	Населённый пункт	2/2	0	40	Слева
3	0+110	0+150	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
4	0+200	0+280	Населённый пункт	3/3	0	80	Слева
5	0+200	0+280	Населённый пункт	3/3	80	0	Слева
6	0+310	0+335	Населённый пункт	2/2	0	25	Слева
7	0+310	0+335	Населённый пункт	2/2	25	0	Слева
8	0+360	0+400	Населённый пункт	2/2	0	40	Слева
9	0+440	0+565	Населённый пункт	2/2	0	125	Слева
10	0+440	0+565	Населённый пункт	2/2	125	0	Слева
11	0+480	0+520	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
12	0+605	0+715	Населённый пункт	4/4	110	0	Слева
13	0+745	0+790	Населённый пункт	2/2	0	45	Справа
14	0+835	0+880	Населённый пункт	2/2	0	45	Справа
15	0+835	0+880	Населённый пункт	2/2	45	0	Справа
16	0+907	0+935	Населённый пункт	2/2	0	28	Справа
Итого:			Населённый пункт	**38/38**	**505**	**428**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	74
Кривые в плане	228 R=609м P=3; a=139° 279
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 80
Характеристики проезжей части	0 4,00 80 3,50

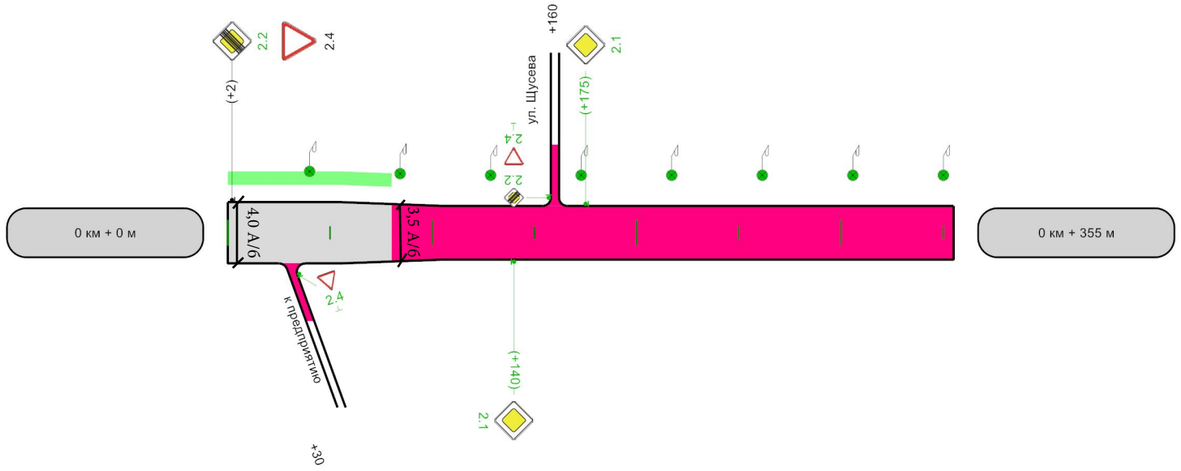

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+140	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+002	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+002	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+040	0+350	Населённый пункт	8/8	310	0	Слева
Итого:				**8/8**	**310**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+080	Жилая застройка	Слева	80	
Итого:					**80**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12 — 200 — 1 — R=4540м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 105 — 3,00

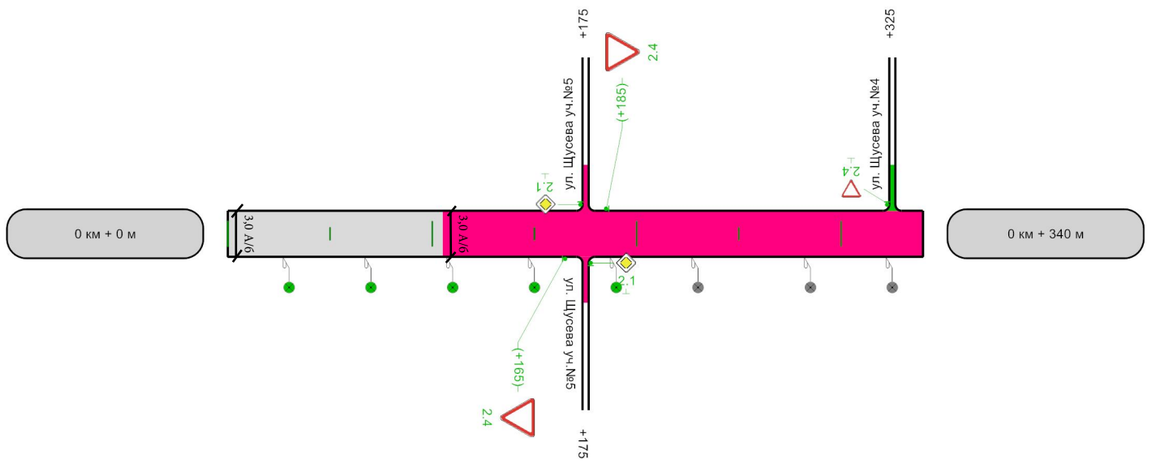

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+165	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+185	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+190	Населённый пункт	5/5	160	0	Справа
2	0+230	0+285	Населённый пункт	2/2	0	55	Справа
3	0+325	0+325	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**8/8**	**160**	**55**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	113 — 97 — 134 — R=1380м — 309 — 20 — 405 — 46 — R=3244м — 569 — 5
Кривые в плане	125 — R=609м, P=3; a=110° — 201 — 406 — R=37м, P=0; a=178° — 461
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 3,00

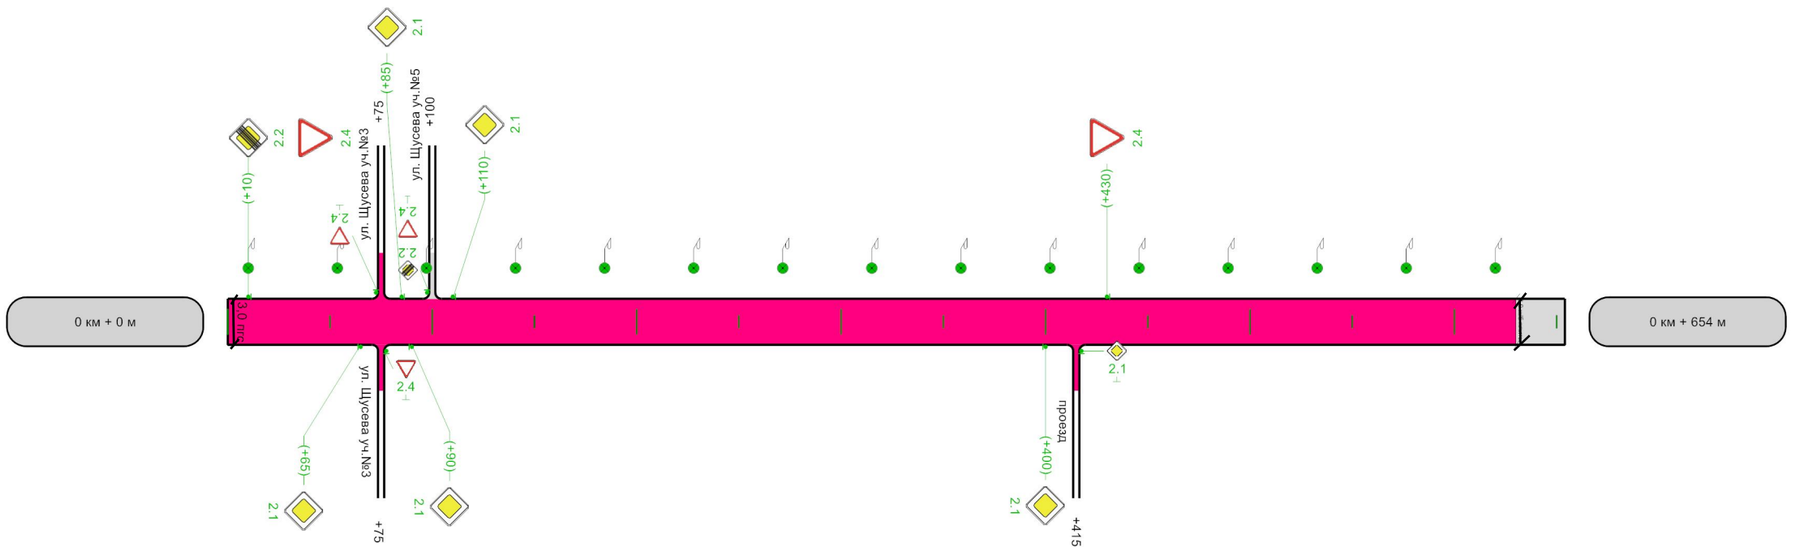

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+065	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+085	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+110	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+400	Требуется установить	1	справа
6	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+430	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+620	Населенный пункт	15/15	610	0	Слева
Итого:				**15/15**	**610**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Энтузиастов от ул. Геофизиков 2-я, д.2. до ул. Южная

1-й участок: км 0+000 - км 0+709
2-й участок: км 0+000 - км 0+377
3-й участок: км 0+000 - км 0+313

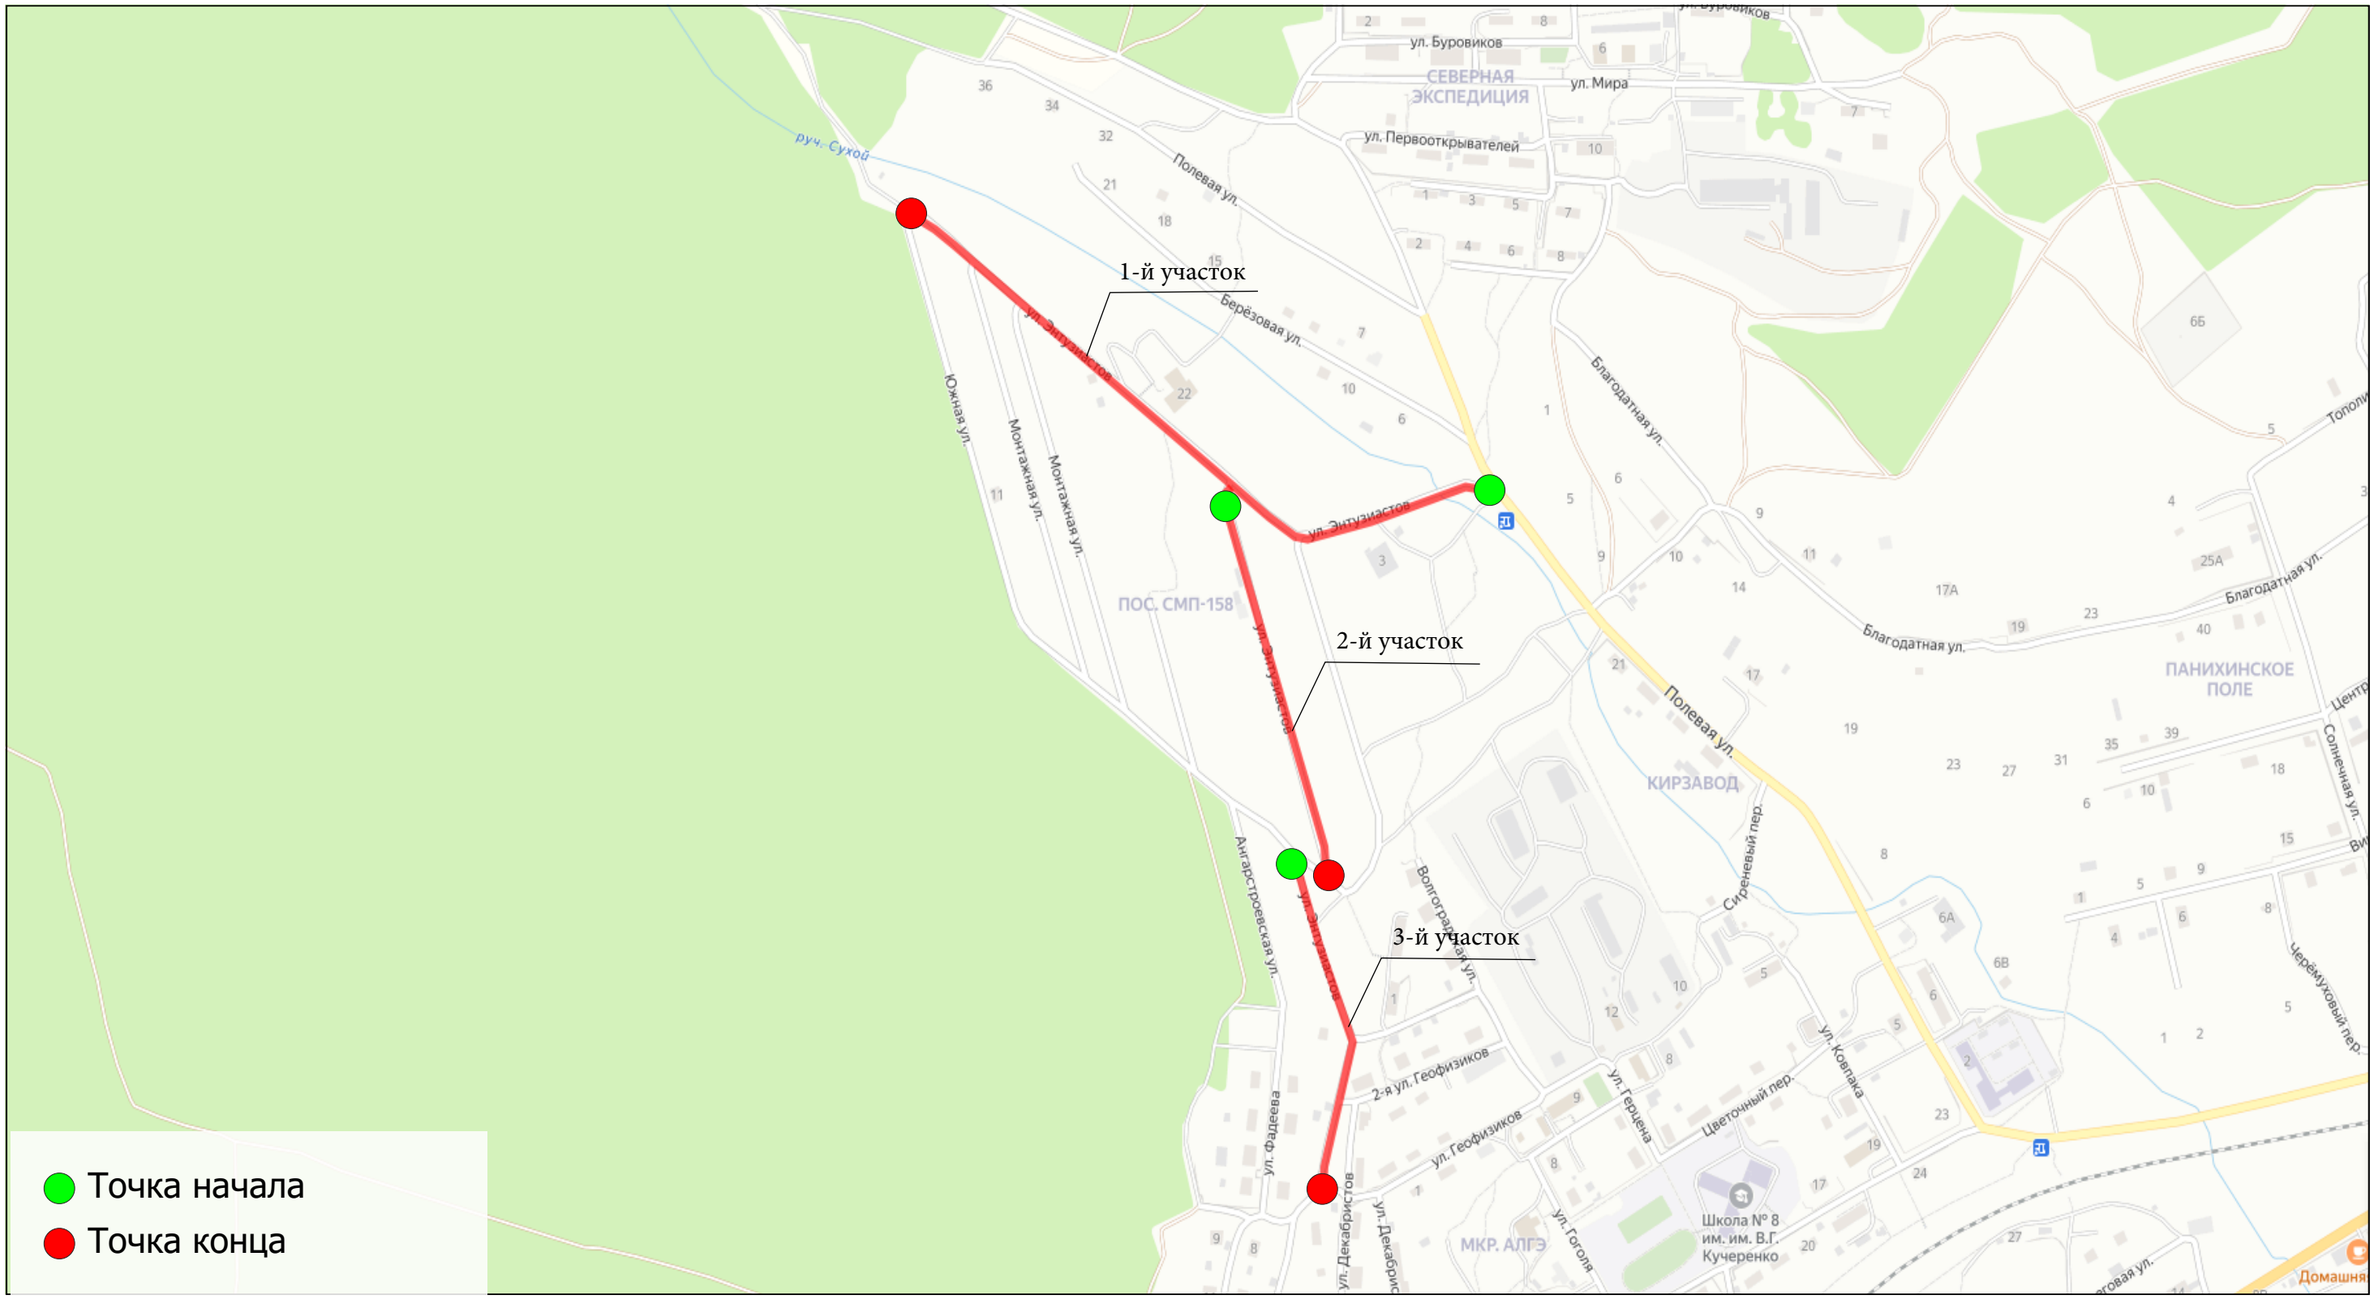

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 3 21 R=1500м 124 156 124 188 R=1905м 66 297 686
Кривые в плане	28 R=135м P=4; a=21° 77 185 R=133м P=1; a=59° 222 604 R=253м P=8; a=18° 682
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 10 - 686
Характеристики проезжей части	0 6,00 6,00 4,00 4,00 120 6,00

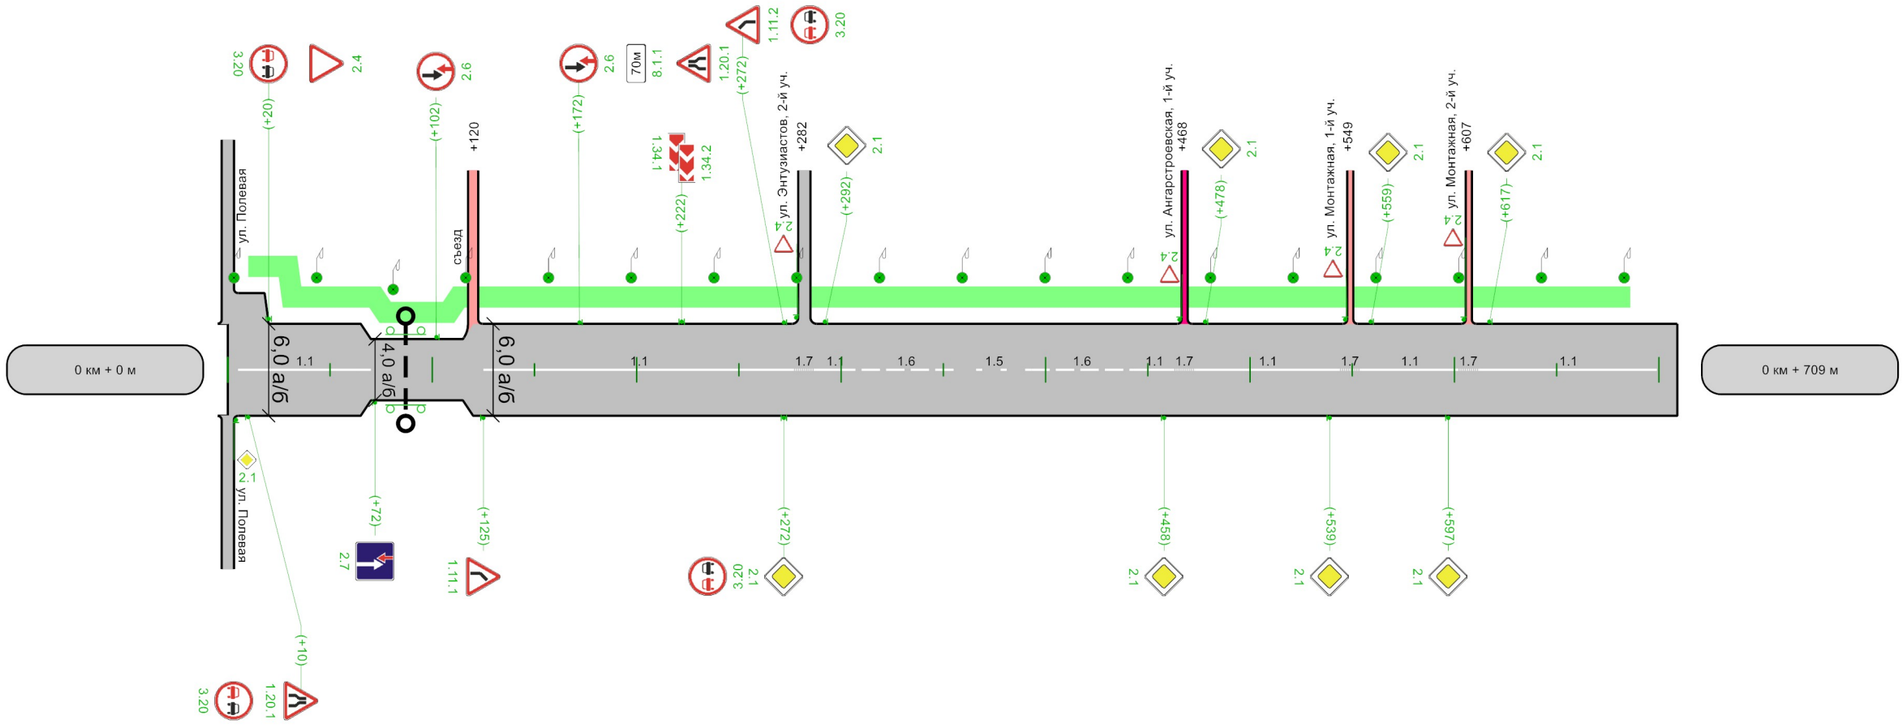

осевая	1.1 5 - 70 | 1.1 125 - 277 | 1.7 277 - 287 | 1.1 287 - 307 | 1.6 307 - 357 | 1.5 357 - 393 | 1.6 393 - 443 | 1.1 443 - 463 | 1.7 463 - 473 | 1.1 473 - 544 | 1.7 544 - 554 | 1.1 554 - 602 | 1.7 602 - 612 | 1.1 612 - 699
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	463,000	36,000	100,000	40,000	**56,700**
ИТОГО	**463,000**	**36,000**	**100,000**	**40,000**	**56,700**
ЛИН.КМ	**0,463**	**0,036**	**0,100**	**0,040**	
ПРИВЕД.КМ	**0,463**	**0,009**	**0,075**	**0,020**	
ПЛОЩАДЬ	**46,300**	**0,900**	**7,500**	**2,000**	**56,700**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+125	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+272	Требуется установить	1	слева
3	1.20.1	Сужение дороги			0+010	Требуется установить	1	справа
4	1.20.1	Сужение дороги			0+172	Требуется установить	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
6	1.34.2	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+272	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+292	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	2.1	Главная дорога			0+458	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+478	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+539	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+559	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+597	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+617	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+020	Требуется установить	1	слева
16	2.6	Преимущество встречного движения			0+102	Требуется установить	1	слева
17	2.6	Преимущество встречного движения			0+172	Требуется установить	1	слева
18	2.7	Преимущество перед встречным движением			0+072	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
19	3.20	Обгон запрещен			0+010	Требуется установить	1	справа
20	3.20	Обгон запрещен			0+020	Требуется установить	1	слева
21	3.20	Обгон запрещен			0+272	Требуется установить	1	слева
22	3.20	Обгон запрещен			0+272	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	8.1.1	Расстояние до объекта			0+172	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**23**	
		Всего:					**23**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+077	0+097	20				Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 3	0,75	Водопропускная труба
2	0+077	0+097	20				Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 3	0,75	Водопропускная труба
Итого:			**40**									

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+003	0+683	Населённый пункт	18/18	680	0	Слева
Итого:				**18/18**	**680**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+010	0+686	Жилая застройка	Слева	676	
Итого:					**676**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Элементы дороги в продольном профиле	27 2	R=7648м	16 329	
Кривые в плане				
Тротуары слева				
Характеристики проезжей части	0 6,00	180 4,00		4,00

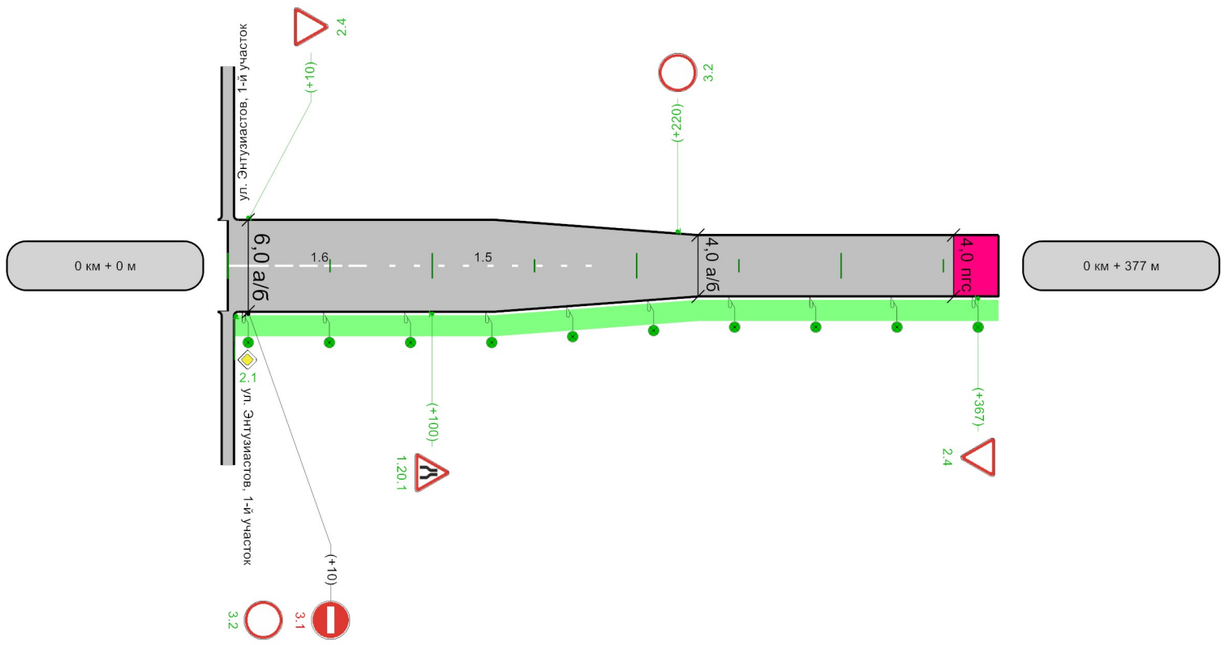

	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 180	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 377				

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	20,000	110,000	50,000	8,500
ИТОГО	20,000	110,000	50,000	8,500
ЛИН.КМ	0,020	0,110	0,050	
ПРИВЕД.КМ	0,020	0,028	0,038	
ПЛОЩАДЬ	2,000	2,750	3,750	8,500

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.20.1	Сужение дороги			0+100	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки приоритета						
2	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+367	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
4	3.1	Въезд запрещен			0+010	Демонтировать	1	справа
5	3.2	Движение запрещено			0+010	Требуется установить	1	справа
6	3.2	Движение запрещено			0+220	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+367	Населённый пункт	10/10	357	0	Справа
Итого:				**10/10**	**357**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+377	Жилая застройка	Справа	377	
Итого:					**377**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 49 2 R=4932м 167
Кривые в плане	R=345м 164 184
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

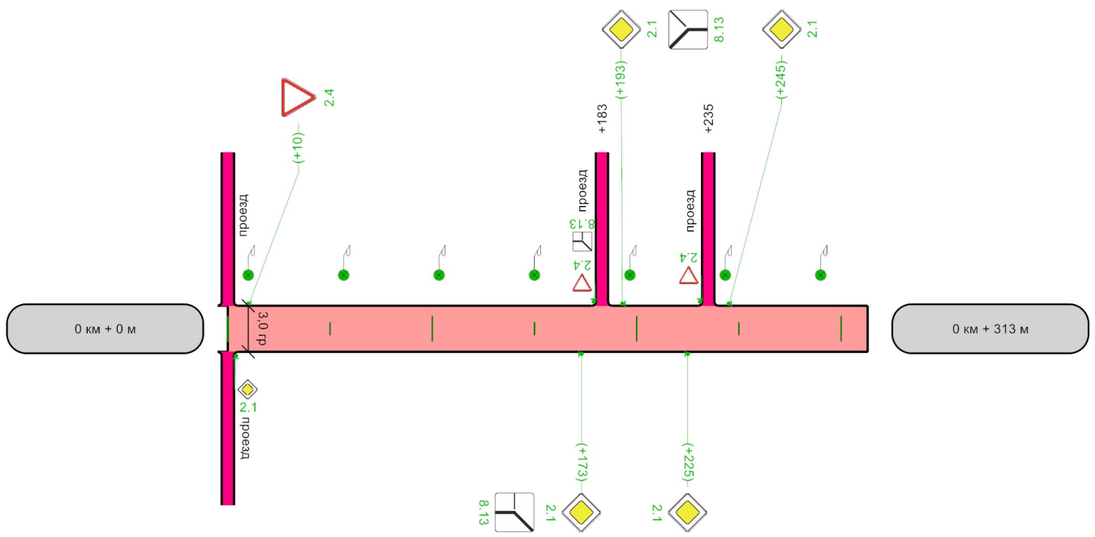

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+173	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+193	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+225	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+245	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+183	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+235	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.13	Направление главной дороги			0+193	Требуется установить	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги			0+173	Требуется установить	1	справа
10	8.13	Направление главной дороги			0+183	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+290	Населённый пункт	7/7	280	0	Слева
Итого:				**7/7**	**280**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Южная от ул. Энтузиастов до ул. Монтажная
км 0+000 - км 0+382

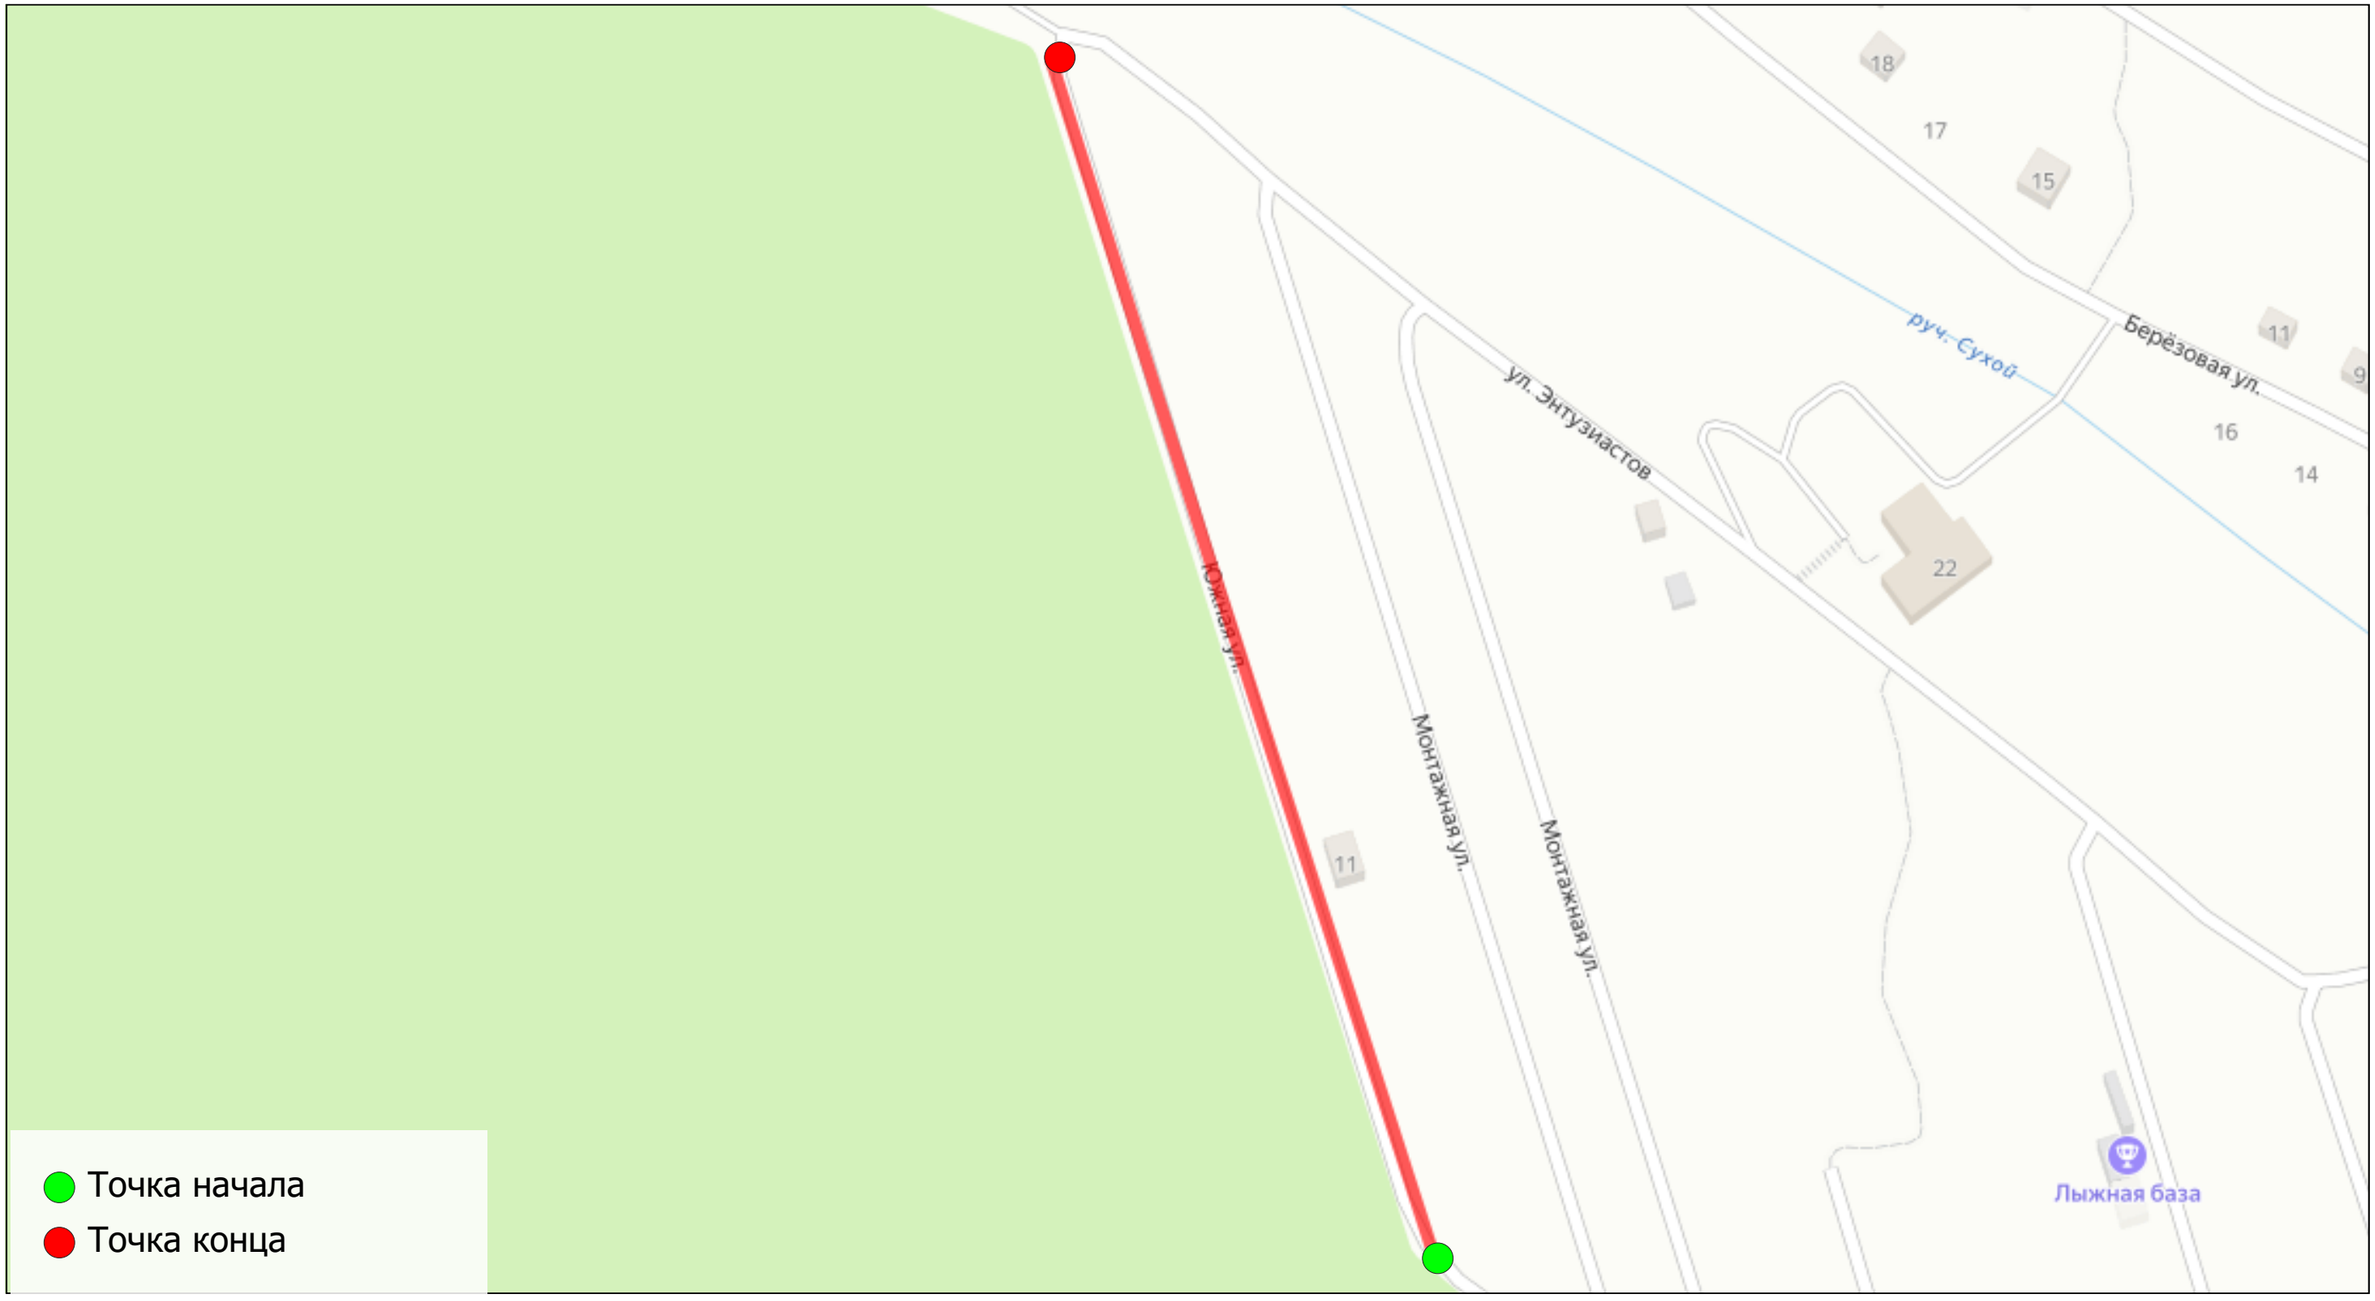

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 9 3 R=6859м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5 3,20



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+367	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+370	Населенный пункт	10/10	360	0	Справа
Итого:				**10/10**	**360**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ул. 2-я Таежная д.9. до ул. 2-я Таежная д.16

1-й участок: км 0+000 - км 0+309
2-й участок: км 0+000 - км 0+318
3-й участок: км 0+000 - км 0+166
4-й участок: км 0+000 - км 0+186

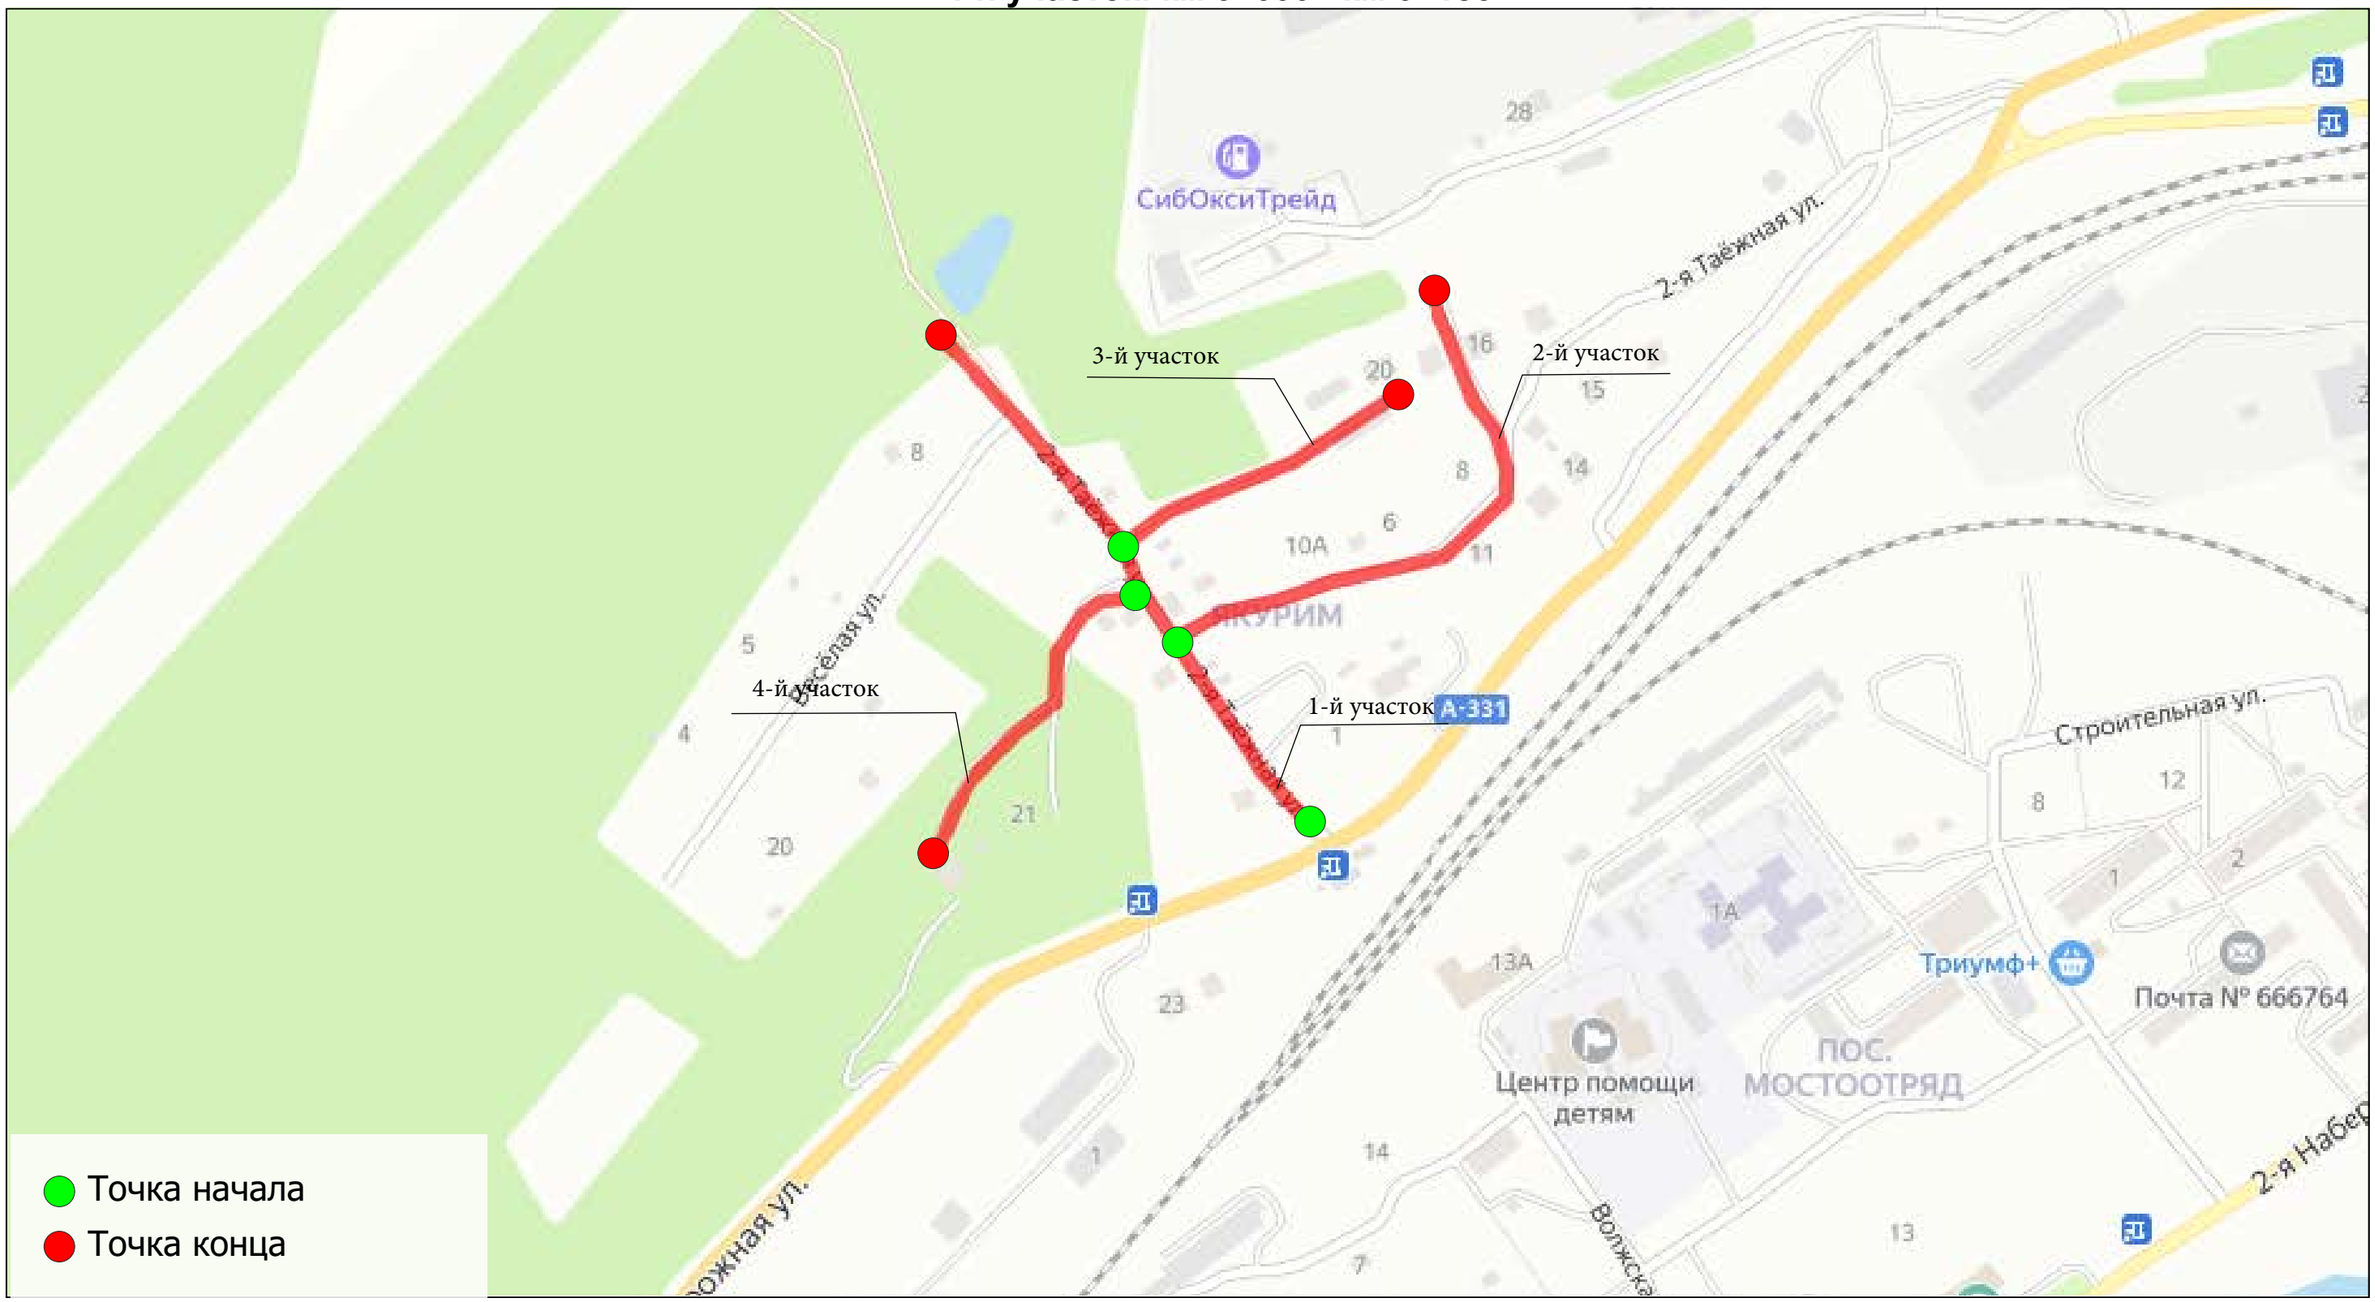

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 82 R=1773м 137 81 2
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

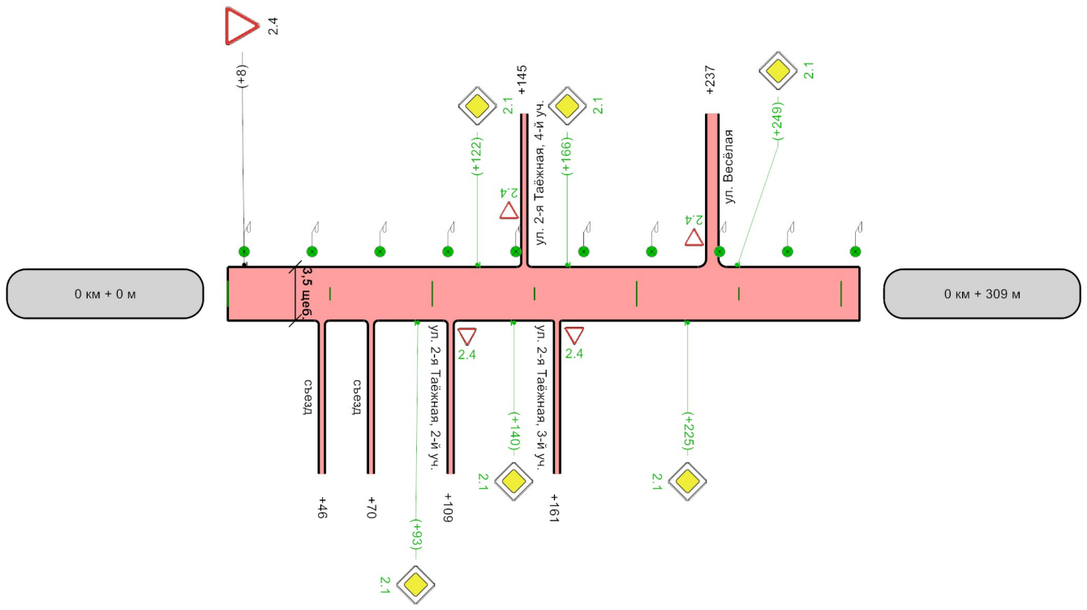

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+093	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+122	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+140	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+166	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+225	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+249	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+008	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+008	0+307	Населенный пункт	10/10	299	0	Слева
Итого:				**10/10**	**299**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	3 26 R=1696м 51 55 87 55 R=1038м 219 73 256 73 R=855м
Кривые в плане	118 R=80м P=1; a=70° 237
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00 90 3,00

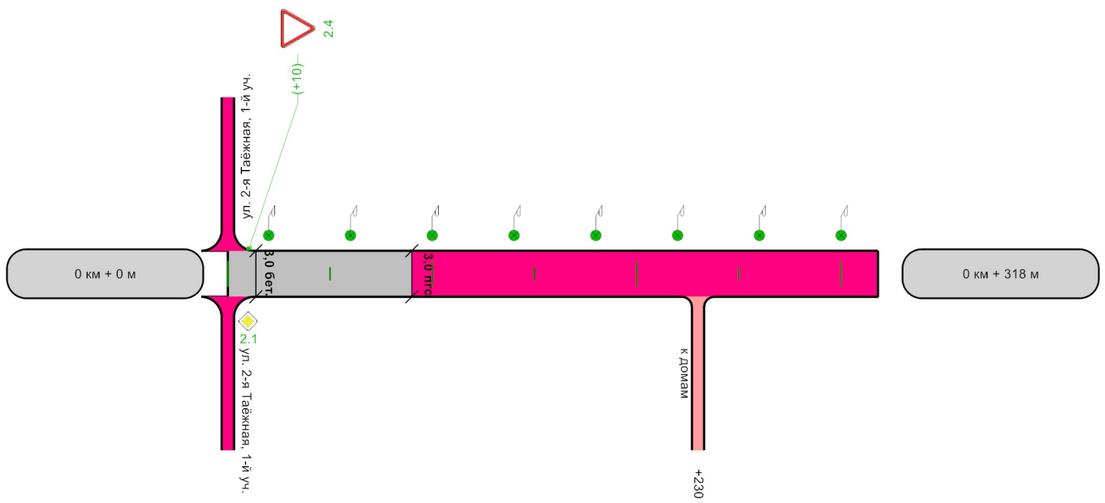

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+318		12/12	308	0	Слева
2	0+020	0+300	Населенный пункт	8/8	280	0	Слева
Итого:				**20/20**	**588**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	17 R=2854м
Кривые в плане	R=21м P=0; a=39° 58 83 R=155м P=7; a=12° 113
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

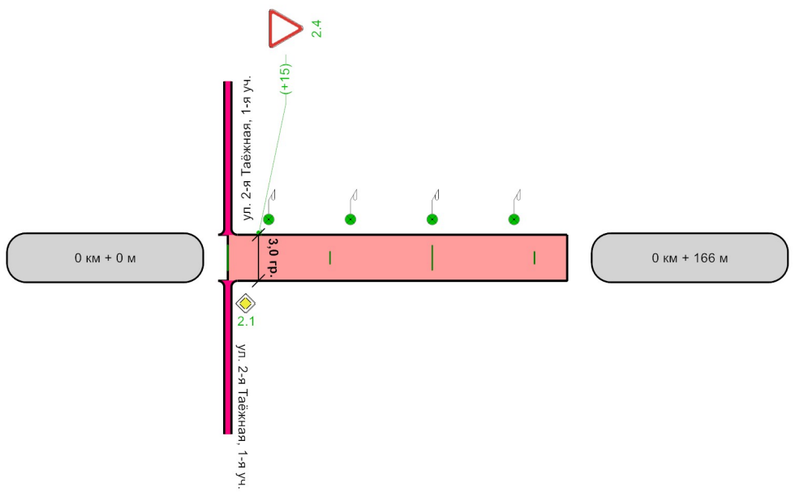

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+140	Населенный пункт	4/4	120	0	Слева
Итого:				**4/4**	**120**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	11 R=1879м 8 121
Кривые в плане	R=20м Р=0; а=54° 52 R=31м 65 Р=1; а=28° 95
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

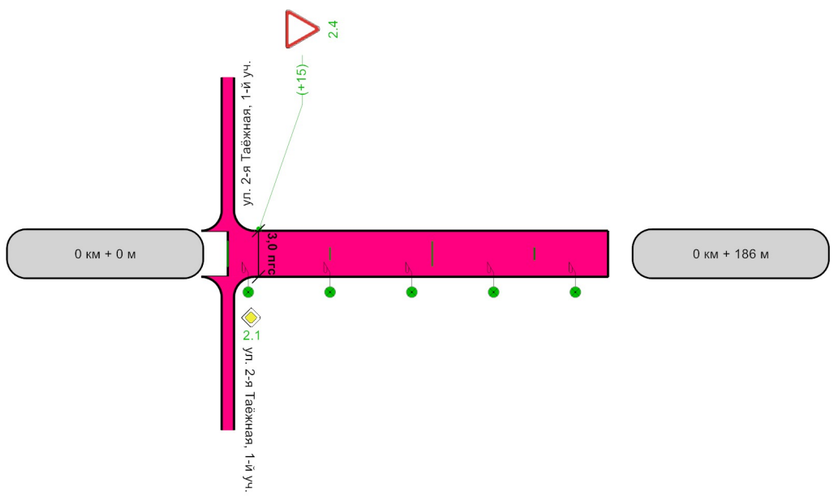

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+170	Населенный пункт	5/5	160	0	Справа
Итого:				**5/5**	**160**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Некрасова, д.14 до жилого дома по ул. Л. Толстова, д.51

1-й участок: км 0+000 - км 0+692
2-й участок: км 0+000 - км 0+599

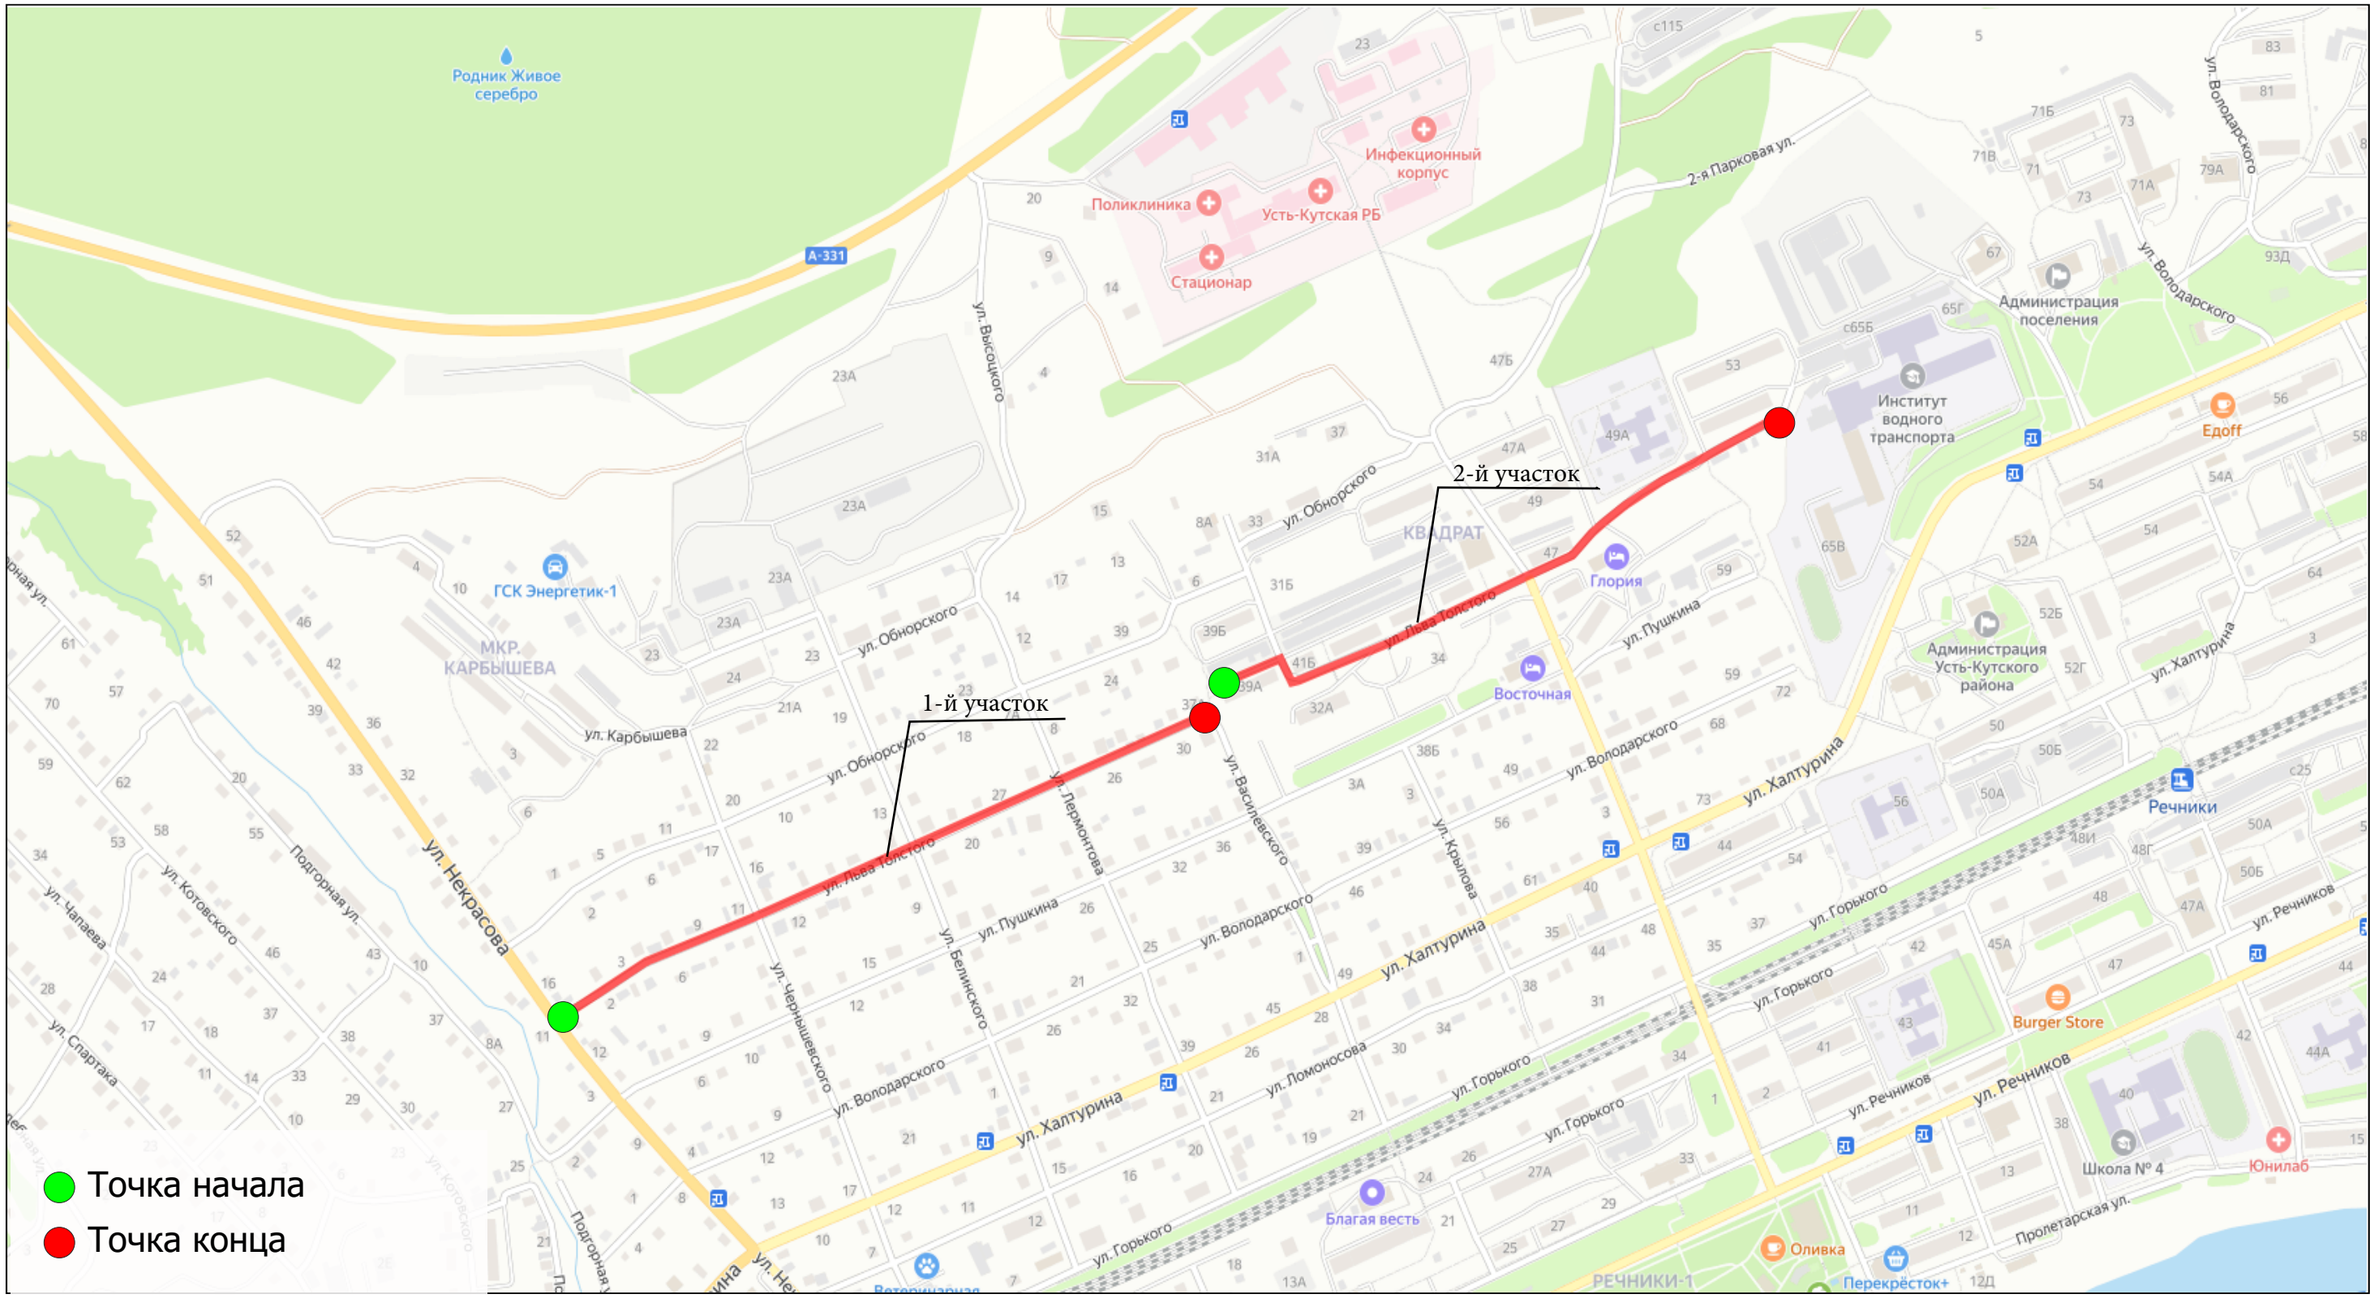

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 184 4 R=2044м 315 29 415 R=2410м 32 463 12 502 R=1414м 10 555 48 587 R=1554м 46 679 13
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

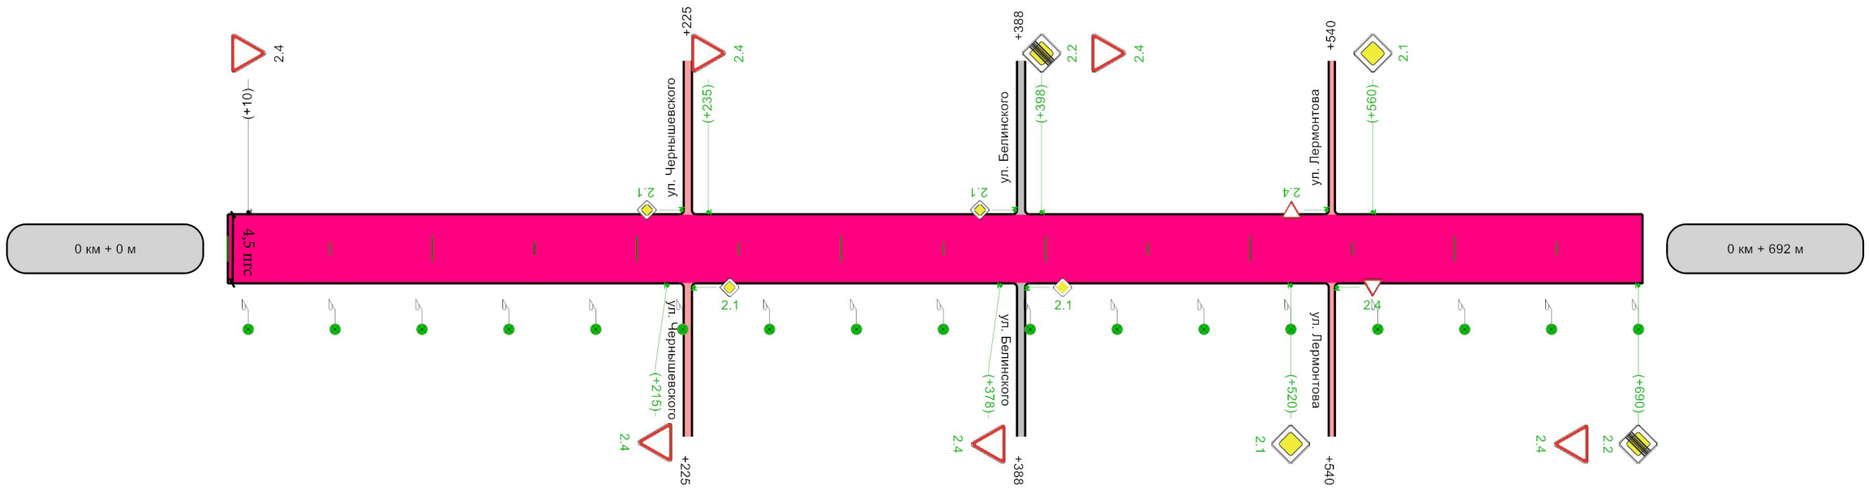

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+520	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+560	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+398	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+690	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+215	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+235	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+378	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+398	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+690	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+690	Населенный пункт	17/17	680	0	Справа
Итого:				**17/17**	**680**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 254 — R=4976м — 374 — 21 — 407 — 20 — R=8870м — 583 — 0
Кривые в плане	50 — 65 R=20м P=0; a=82° 95 — 352 — R=107м P=3; a=21° 391 — 431 — R=603м P=29; a=12° 471
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 63 - 599
Характеристики проезжей части	4,50 — 55 — 4,00 — 314 — 4,00 — 5,00

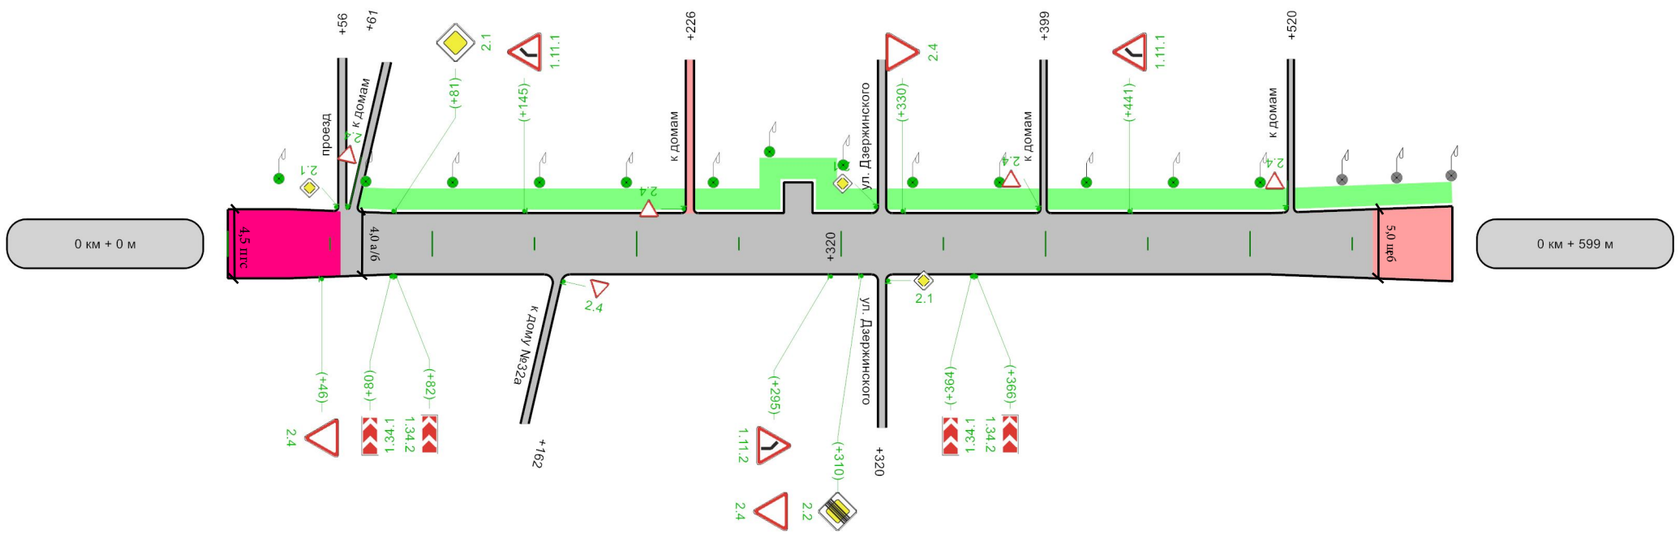

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+145	Требуется установить	1	слева
2	1.11.1	Опасный поворот			0+441	Требуется установить	1	слева
3	1.11.2	Опасный поворот			0+295	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+080	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+364	Требуется установить	1	справа
6	1.34.2	Направление поворота			0+082	Требуется установить	1	справа
7	1.34.2	Направление поворота			0+366	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+081	Требуется установить	1	слева
9	2.2	Конец главной дороги			0+310	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+046	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+310	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+330	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+505	Населённый пункт	13/13	480	0	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	0+545	0+599	Населённый пункт	3/3	0	54	Слева
3	0+545	0+599	Населённый пункт	3/3	54	0	Слева
Итого:				**19/19**	**534**	**54**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+063	0+599	Жилая застройка	Слева	536	
Итого:					**536**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Черкасская, д. 13 до жилого дома по ул. Черкасская, д. 2

км 0+000 - км 0+175

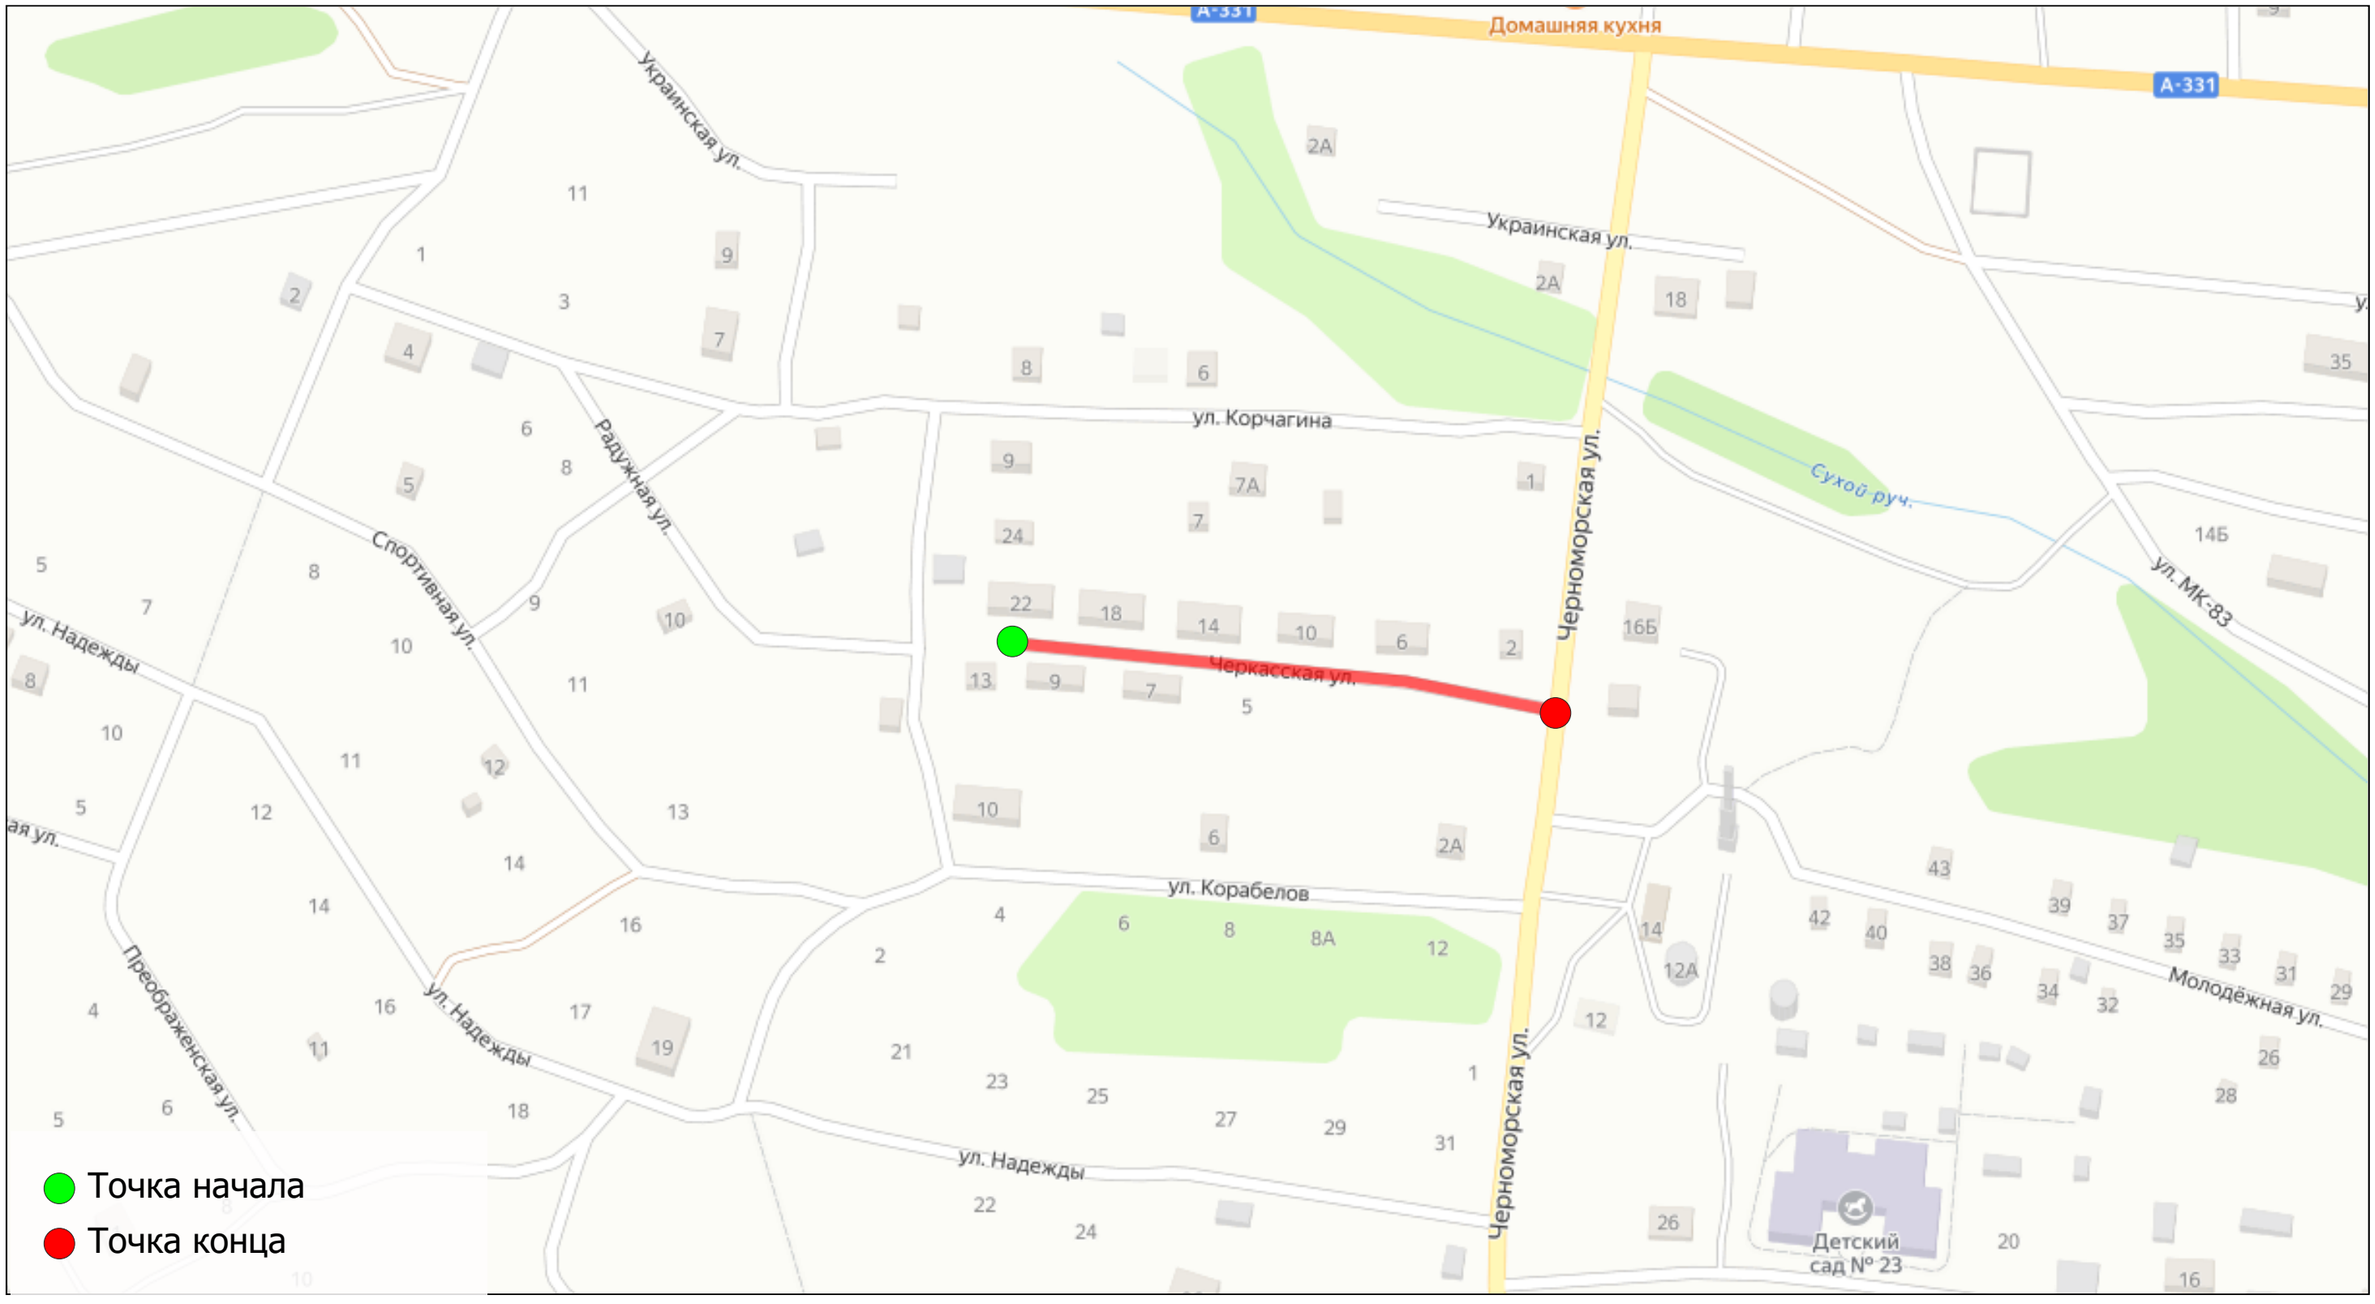

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 67 2 R=2698м 3
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

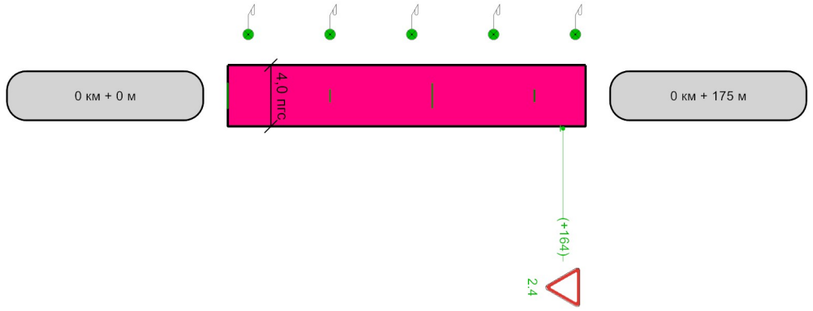

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+164	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+170	Населенный пункт	5/5	160	0	Слева
Итого:				**5/5**	**160**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Ломоносова, д. 10 до жилого дома по ул. Чернышевского, д. 21
км 0+000 - км 0+576

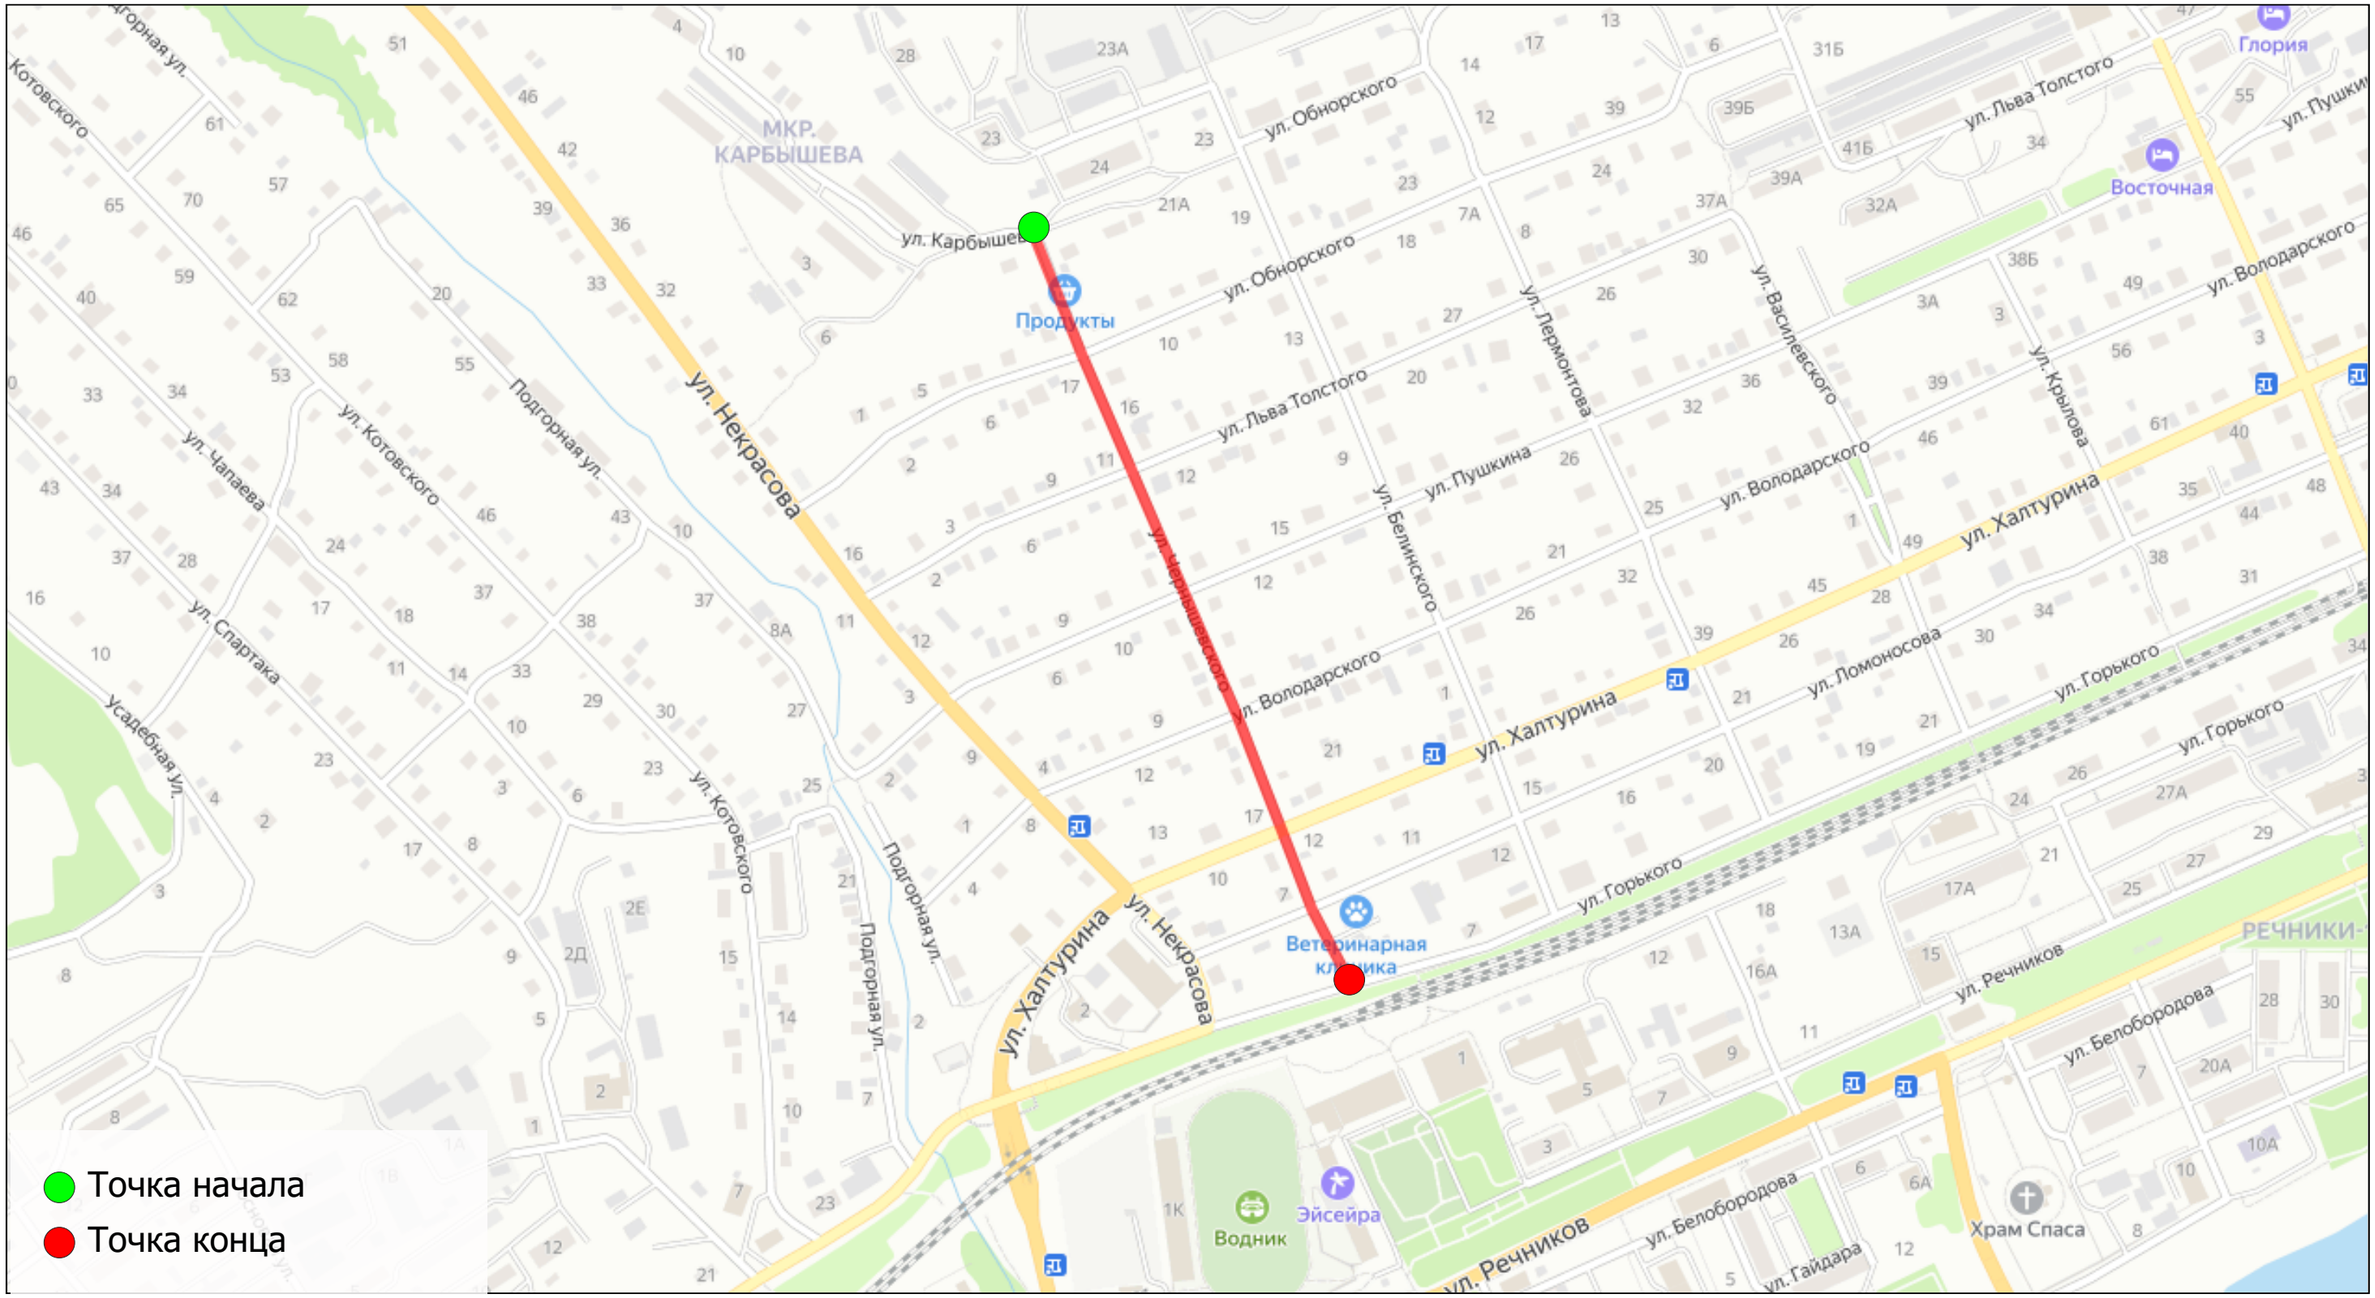

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 17 R=1744м 96 139 93 183 R=5207м 75 279 72 335 R=2863м 94 398 95 435 R=3633м 60 561
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00 6,00 5,00

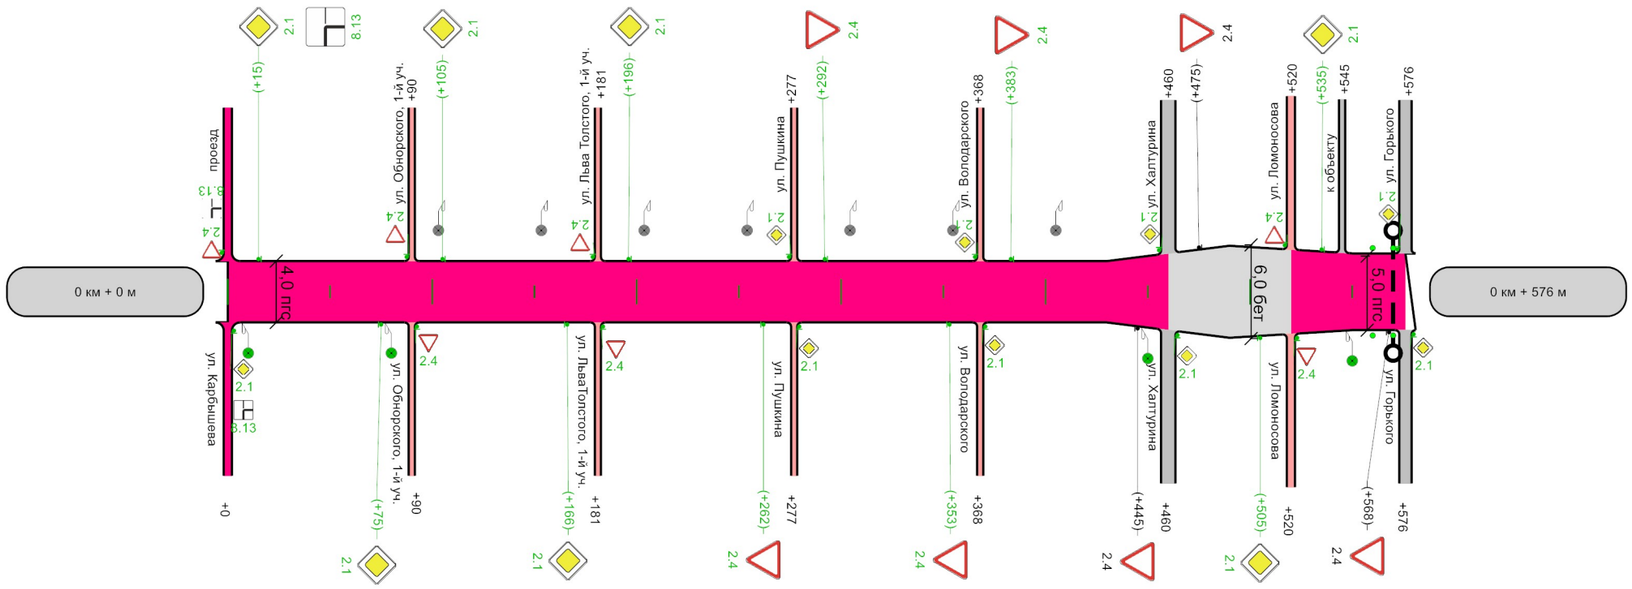

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+166	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+196	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+535	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+262	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+292	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+353	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+383	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+445	Установлено	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+475	Установлено	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу			0+568	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**14**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.13	Направление главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**15**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+560	0+570	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+560	0+570	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+080	Населенный пункт	2/2	70	0	Справа
2	0+103	0+405	Населенный пункт	7/7	0	302	Слева
3	0+450	0+550	Населенный пункт	2/2	100	0	Справа
Итого:				**11/11**	**170**	**302**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Чернышева от земельного участка по пер. 2-й Энергетический, 1 до жилого дома по ул. Балахня, д. 17
км 0+000 - км 0+354

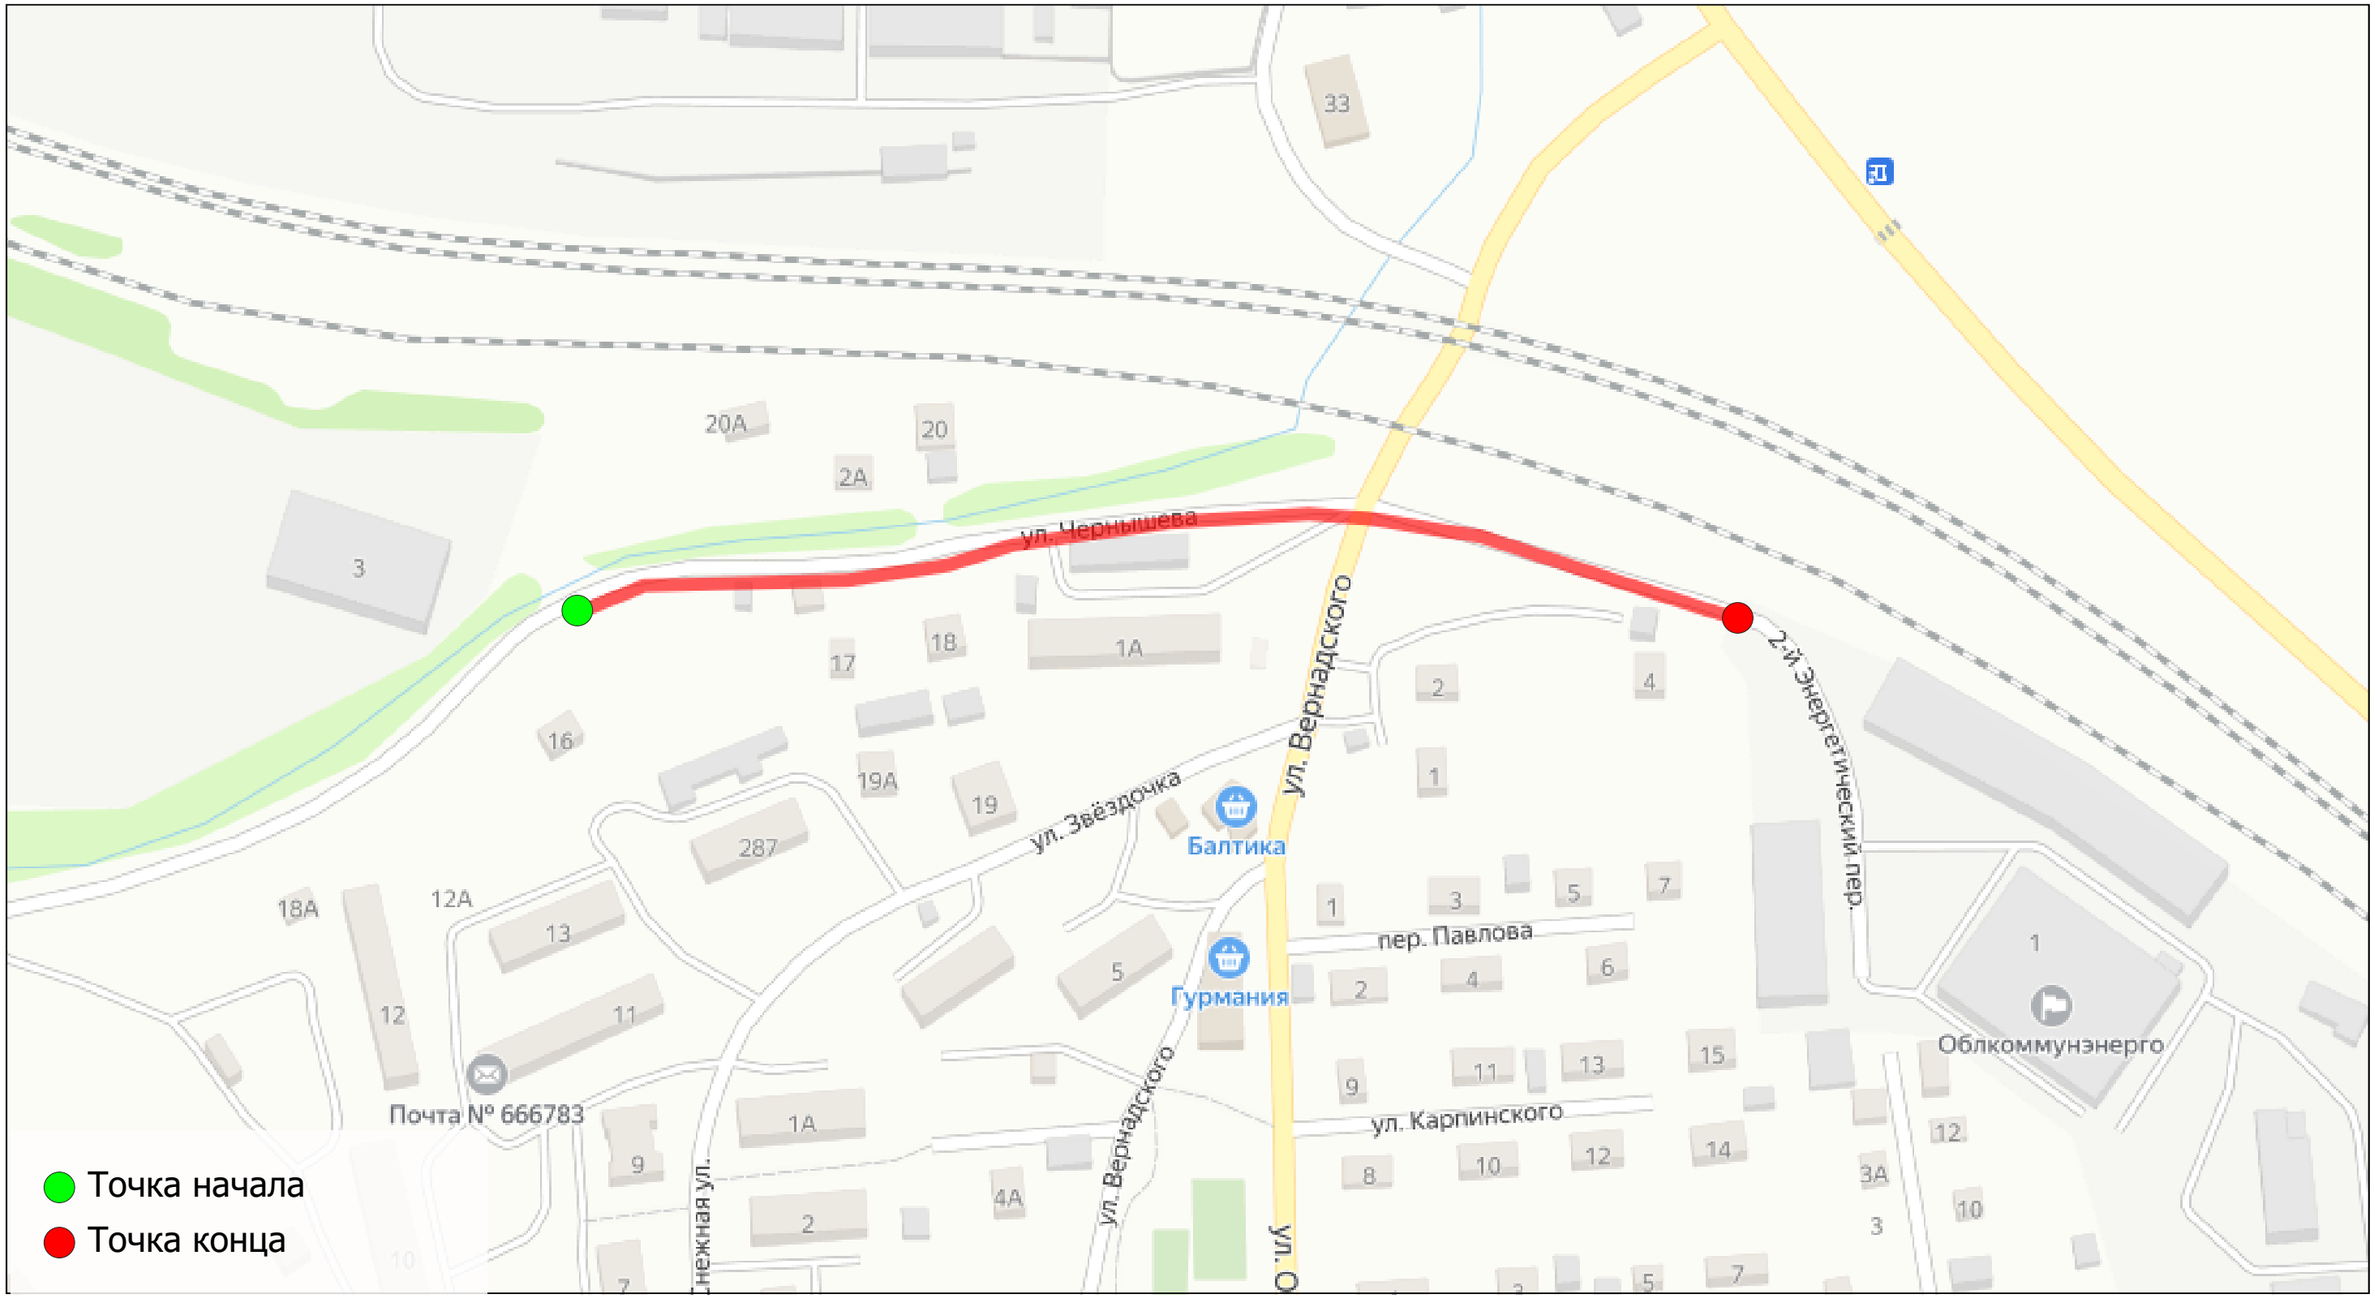

М 1:3000

Проектируемая дорожная разметка	1-ая от осевой	1.2 246 - 354
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	1 2 8 R=3698м 183 38 227 37 R=4271м 331 14	
Кривые в плане	R=75м P=4; a=12° 48 192 R=388м P=13; a=17° 301	
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 354	
Характеристики проезжей части	0 7,00	245 7,00

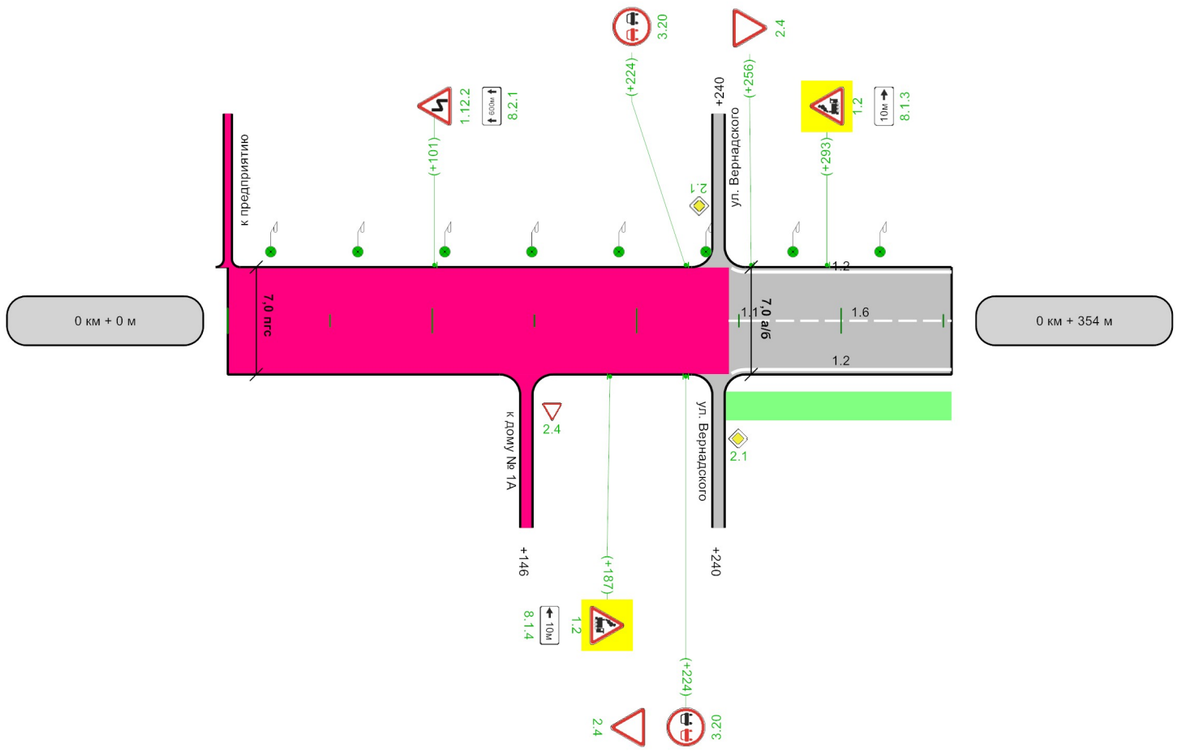

Проектируемая дорожная разметка	осевая	1.1 245 - 265	1.6 265 - 354
	1-ая от осевой	1.2 246 - 354	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа		н/д: ширина 2м, а/б, 240 - 354	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.6(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	20,000	216,000	89,000	30,275
ИТОГО	20,000	216,000	89,000	30,275
ЛИН.КМ	0,020	0,216	0,089	
ПРИВЕД.КМ	0,020	0,216	0,067	
ПЛОЩАДЬ	2,000	21,600	6,675	30,275

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+187	Требуется установить	1	справа
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+293	Требуется установить	1	слева
3	1.12.2	Опасные повороты			0+101	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.4	Уступите дорогу			0+137	Требуется установить	1	справа на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+224	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+256	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
7	3.20	Обгон запрещен			0+224	Требуется установить	1	слева
8	3.20	Обгон запрещен			0+224	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.1.3	Расстояние до объекта			0+293	Требуется установить	1	слева
10	8.1.4	Расстояние до объекта			0+187	Требуется установить	1	справа
11	8.2.1	Зона действия			0+101	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021	0+319	Населенный пункт	8/8	298	0	Слева
Итого:				**8/8**	**298**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+240	0+354	Жилая застройка	Справа	114	
Итого:					**114**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от земельного участка по ул. 405 городок, 11а до жилого дома по ул. 405 городок, 34

1-й участок: км 0+000 - км 0+086
2-й участок: км 0+000 - км 0+211
3-й участок: км 0+000 - км 0+244
4-й участок: км 0+000 - км 0+263

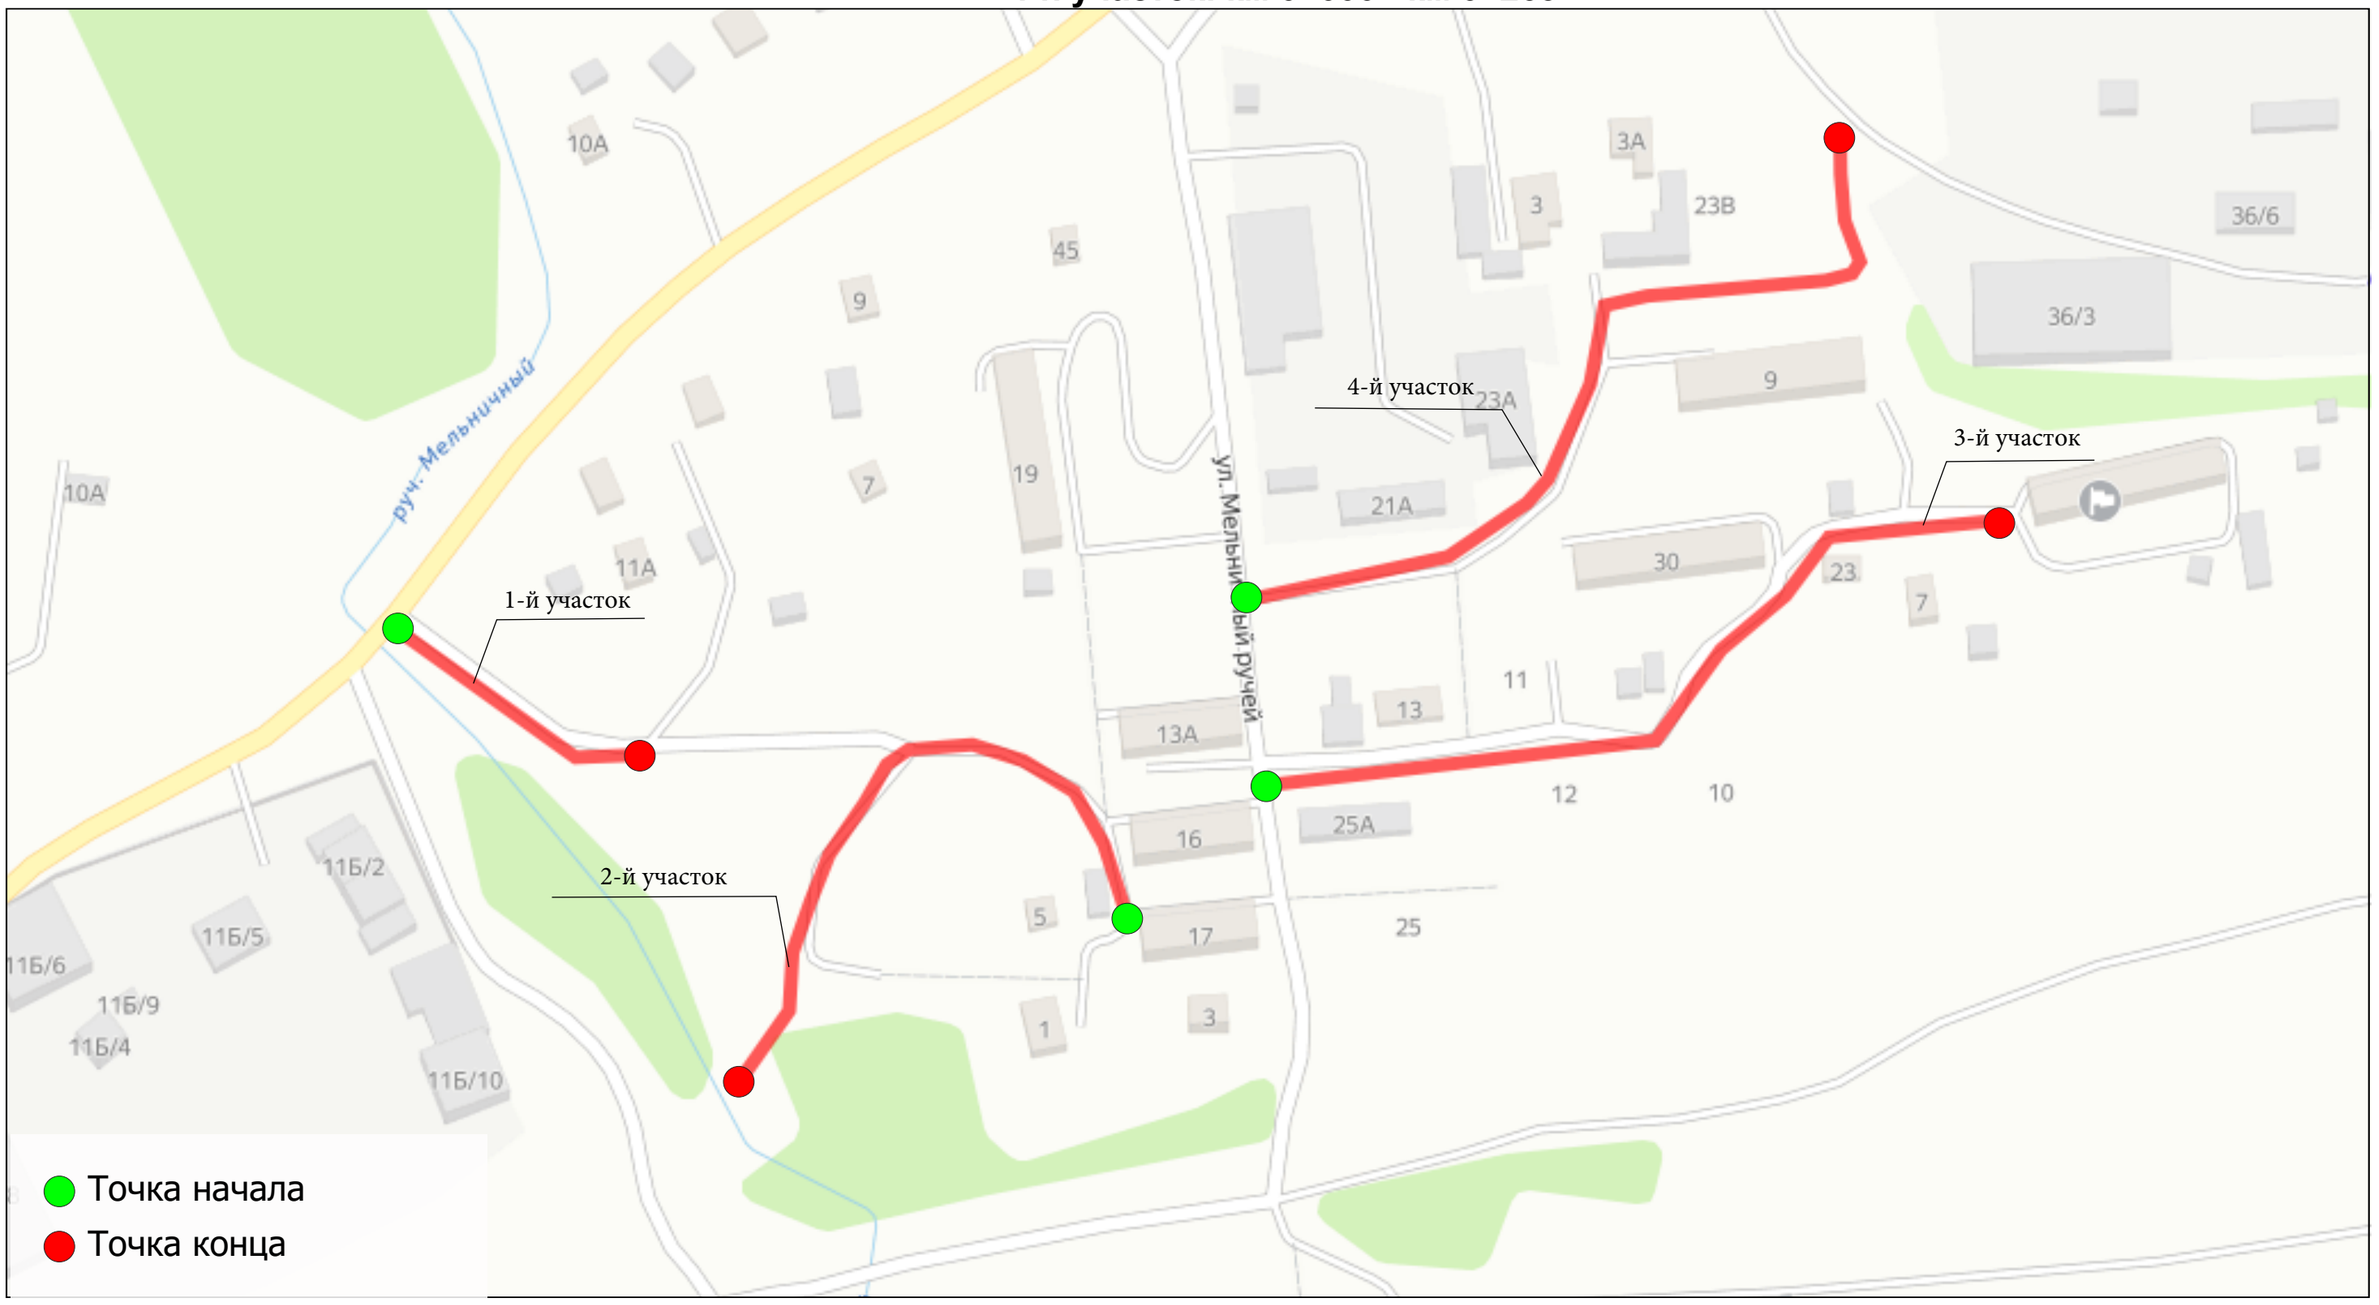

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 141 2 R=762м
Кривые в плане	40 R=111м P=5; a=13°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

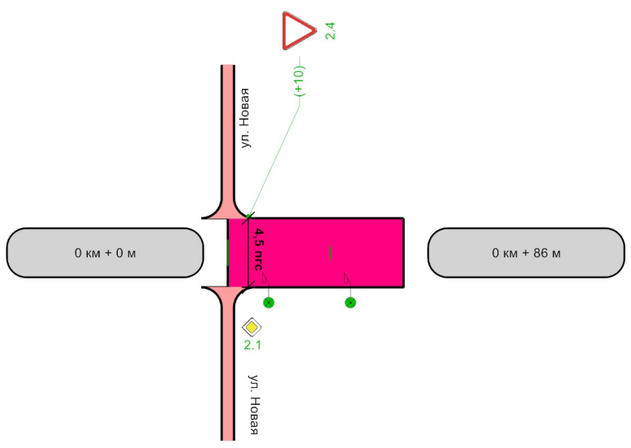

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+060	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**2/2**	**40**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	79 2 R=827м 90 28
Кривые в плане	22 R=48м P=0; a=165°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

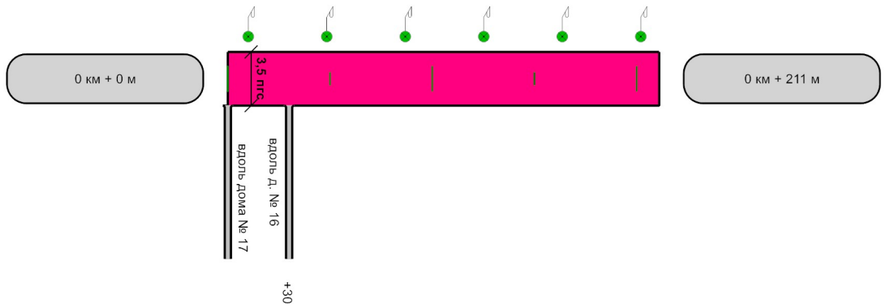

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+202	Населенный пункт	6/6	192	0	Слева
Итого:				**6/6**	**192**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	66 77 54 R=2539м 139 78 172 76 R=1777м 244,32
Кривые в плане	96 R=12м P=0; a=46° 130 R=32м P=0; a=44° 166 200
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00

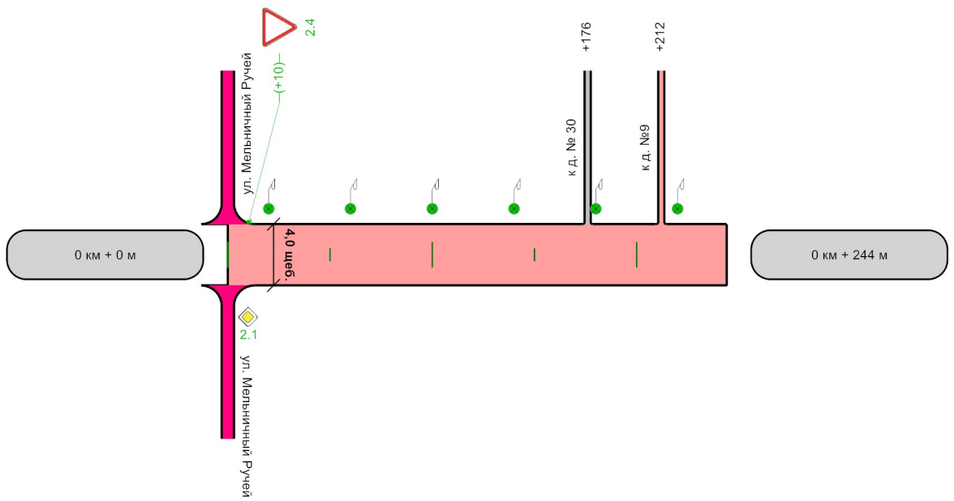

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+220	Населенный пункт	6/6	200	0	Слева
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	83
Кривые в плане	56 R=101м P=1; a=50° 86 R=42м 145 P=1; a=44° 170 200 214
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

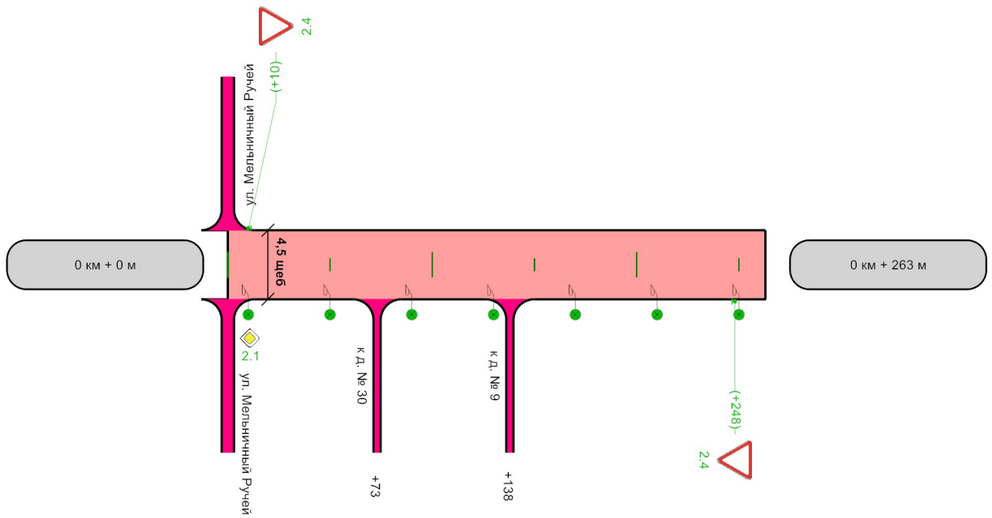

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+248	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+250	Населенный пункт	7/7	240	0	Справа
Итого:				**7/7**	**240**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Степана Разина, д. 2 до жилого дома по ул. Степана Разина, д 32

км 0+000 - км 0+491

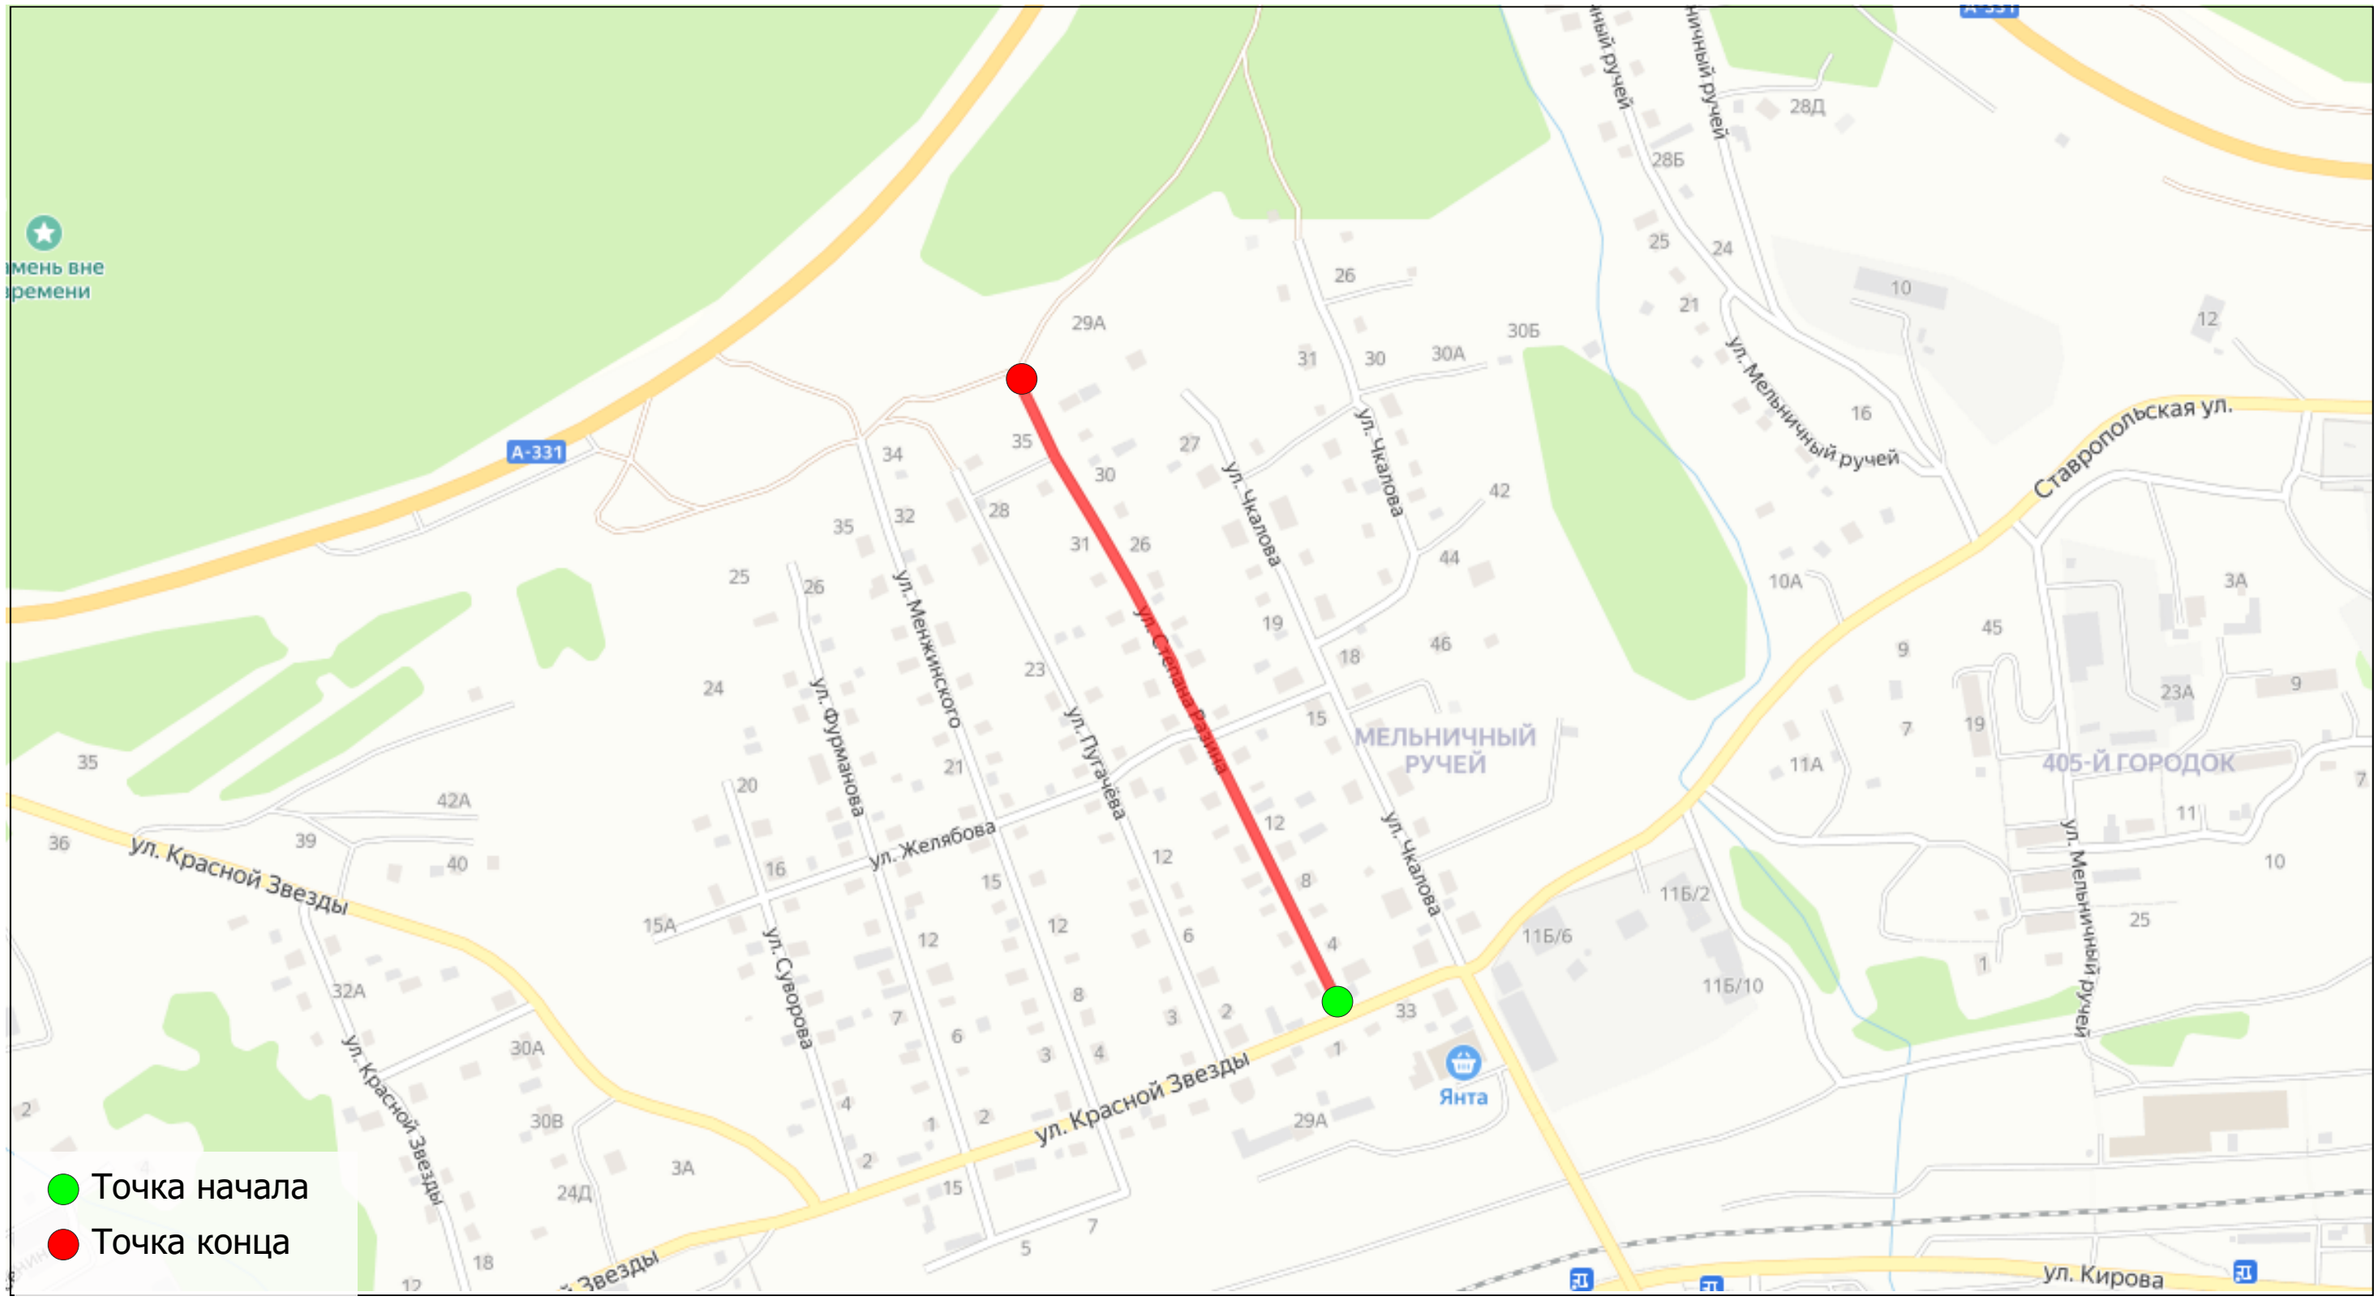

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	121 119 89 89 116 111 22 R=4126м 143 181 R=3144м 264 384 R=2680м
Кривые в плане	R=66м 422 P=1; a=61° 45
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 5,20 205 3,00

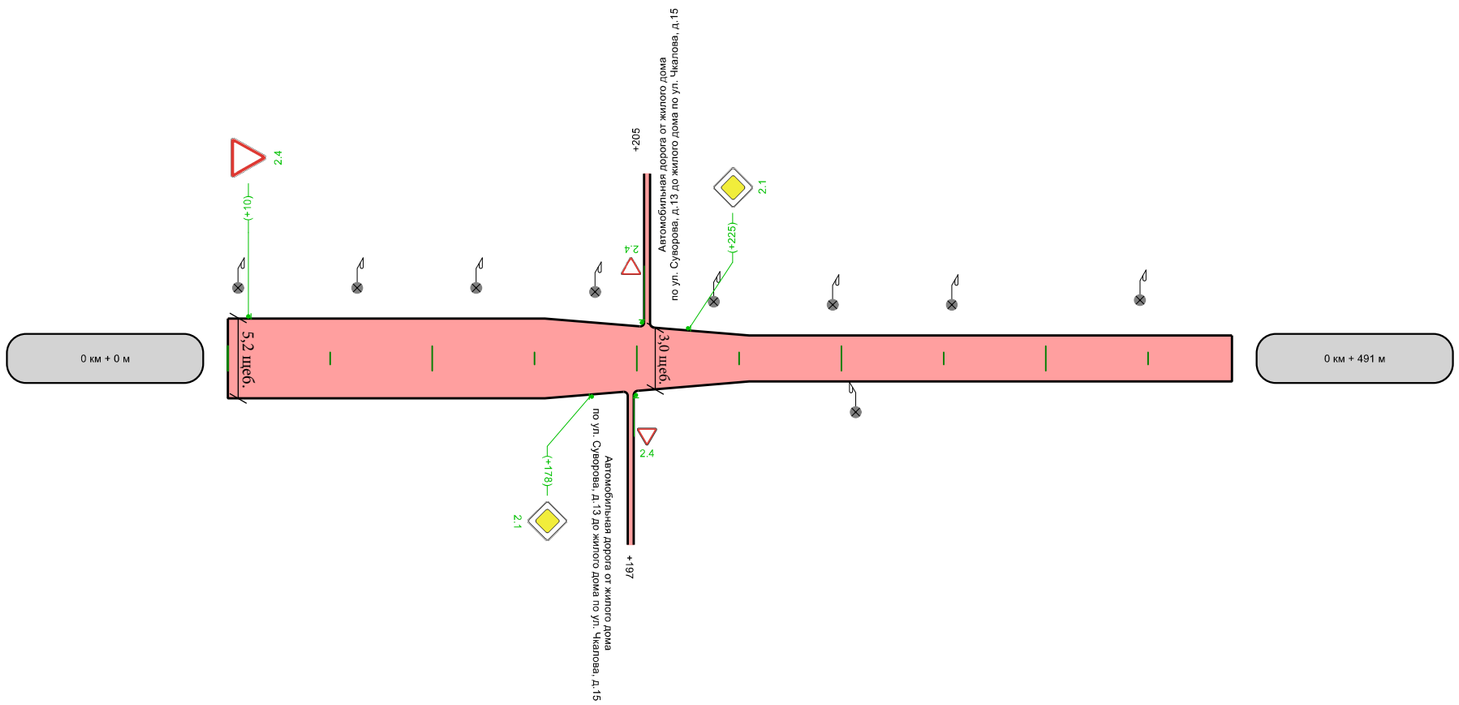

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+178	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+225	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+354	Населенный пункт	7/7	0	349	Слева
2	0+307	0+307	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+446	0+446	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**9/9**	**0**	**349**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по пер. Флотский, д. 1 до жилого дома по пер. Флотский, д.2
км 0+000 - км 0+271

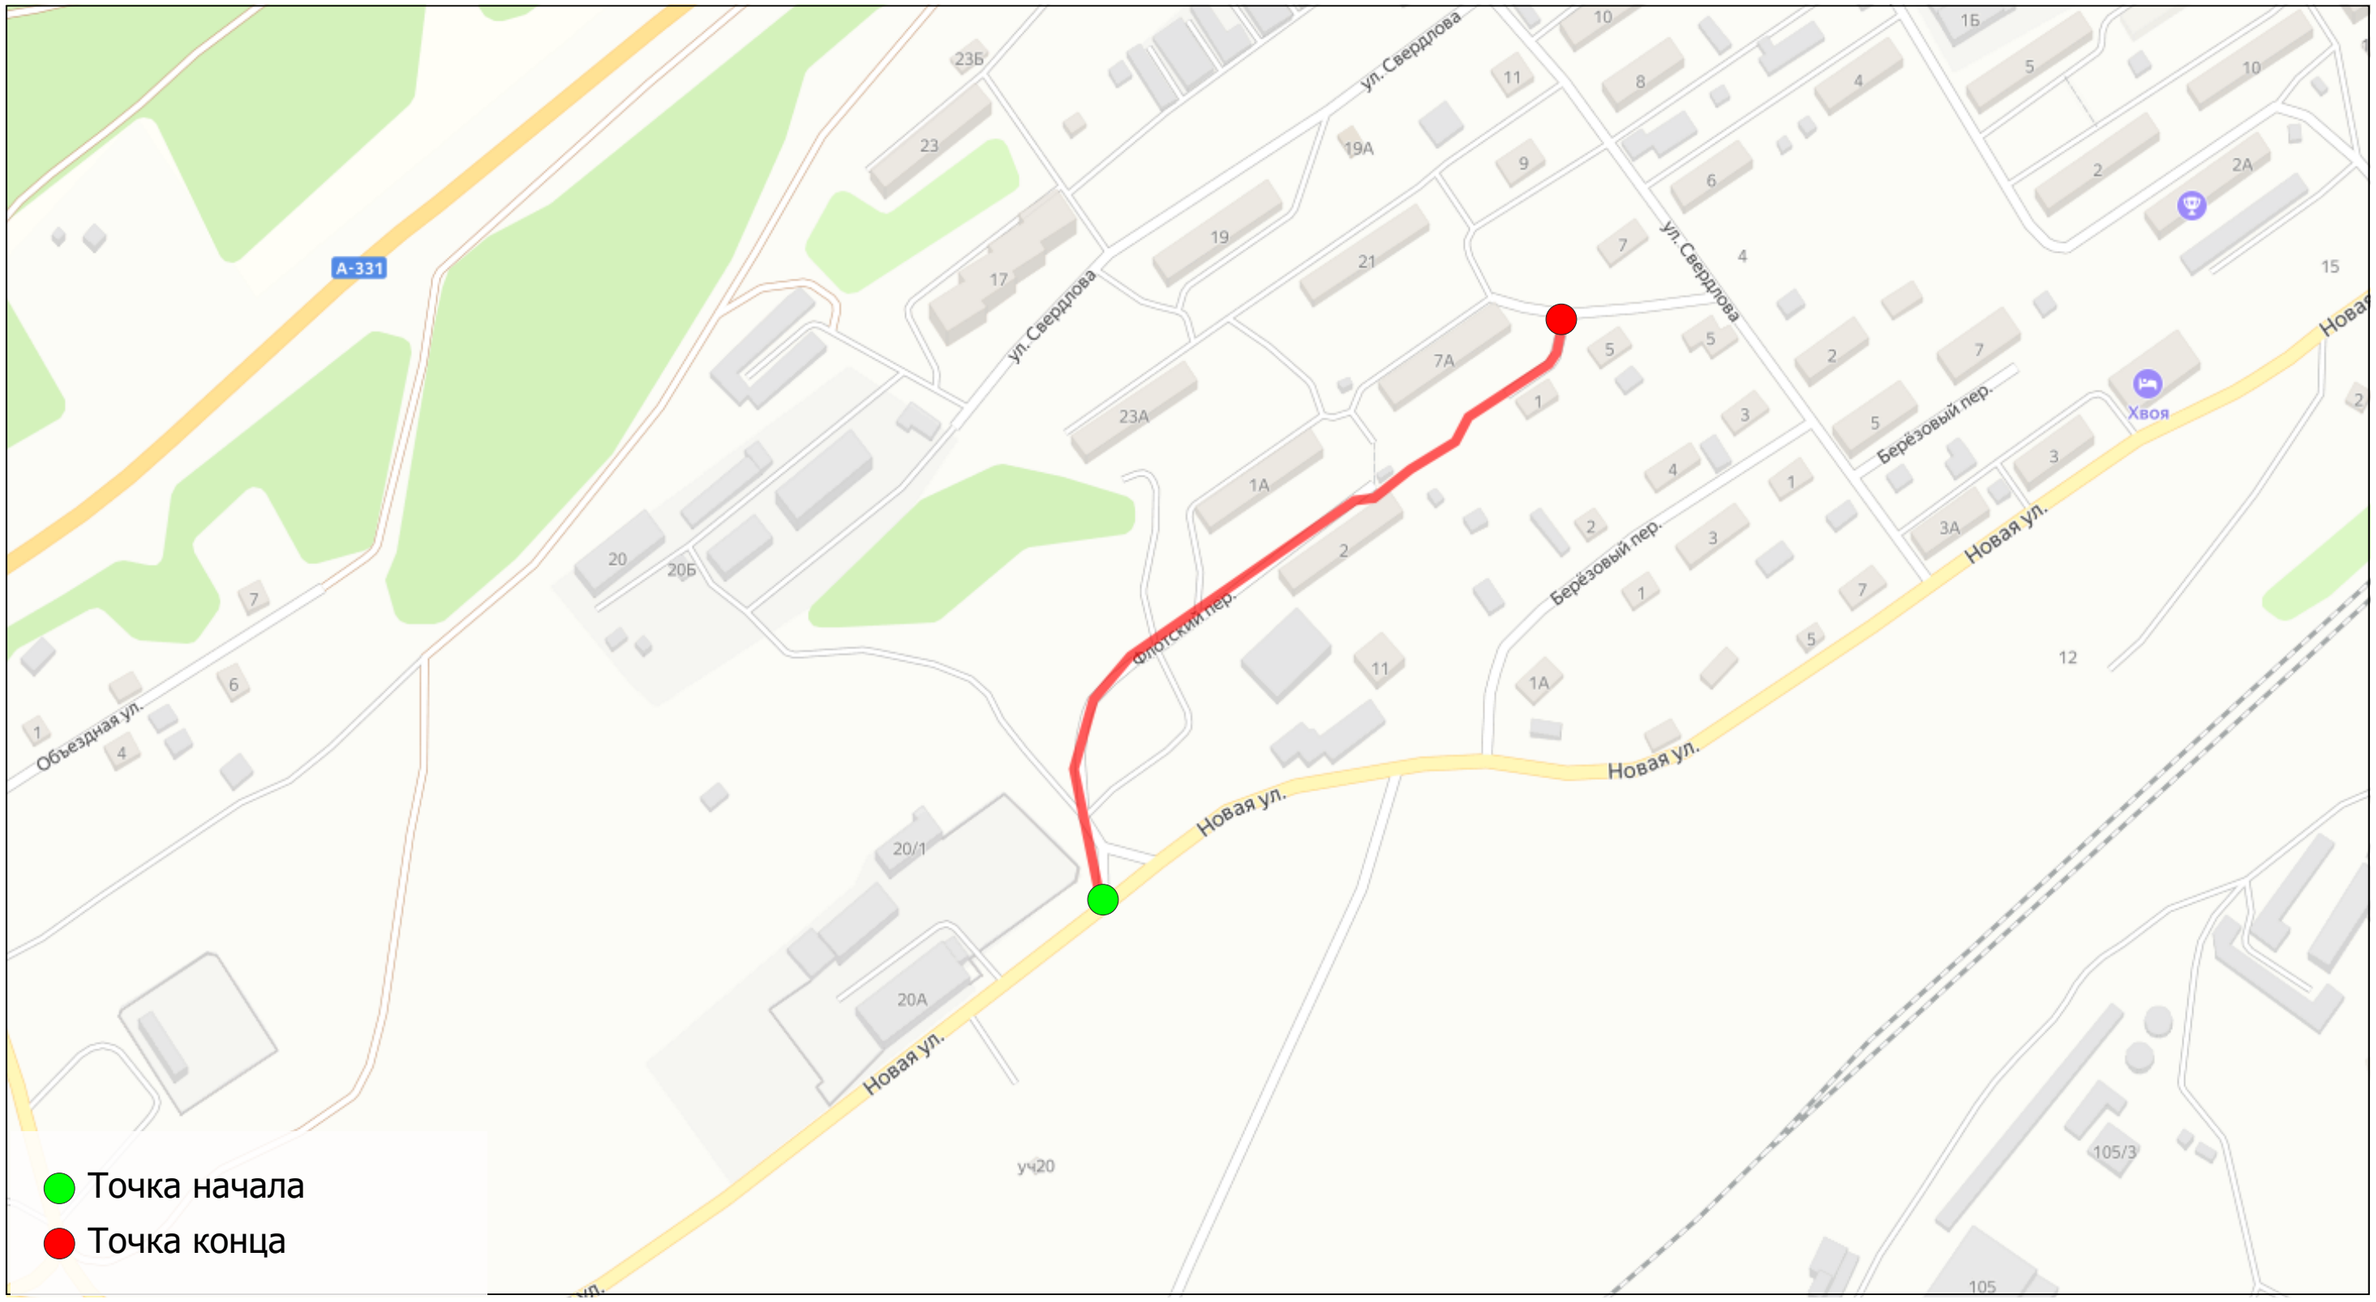

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 / 2 / R=3058м / 91 / 15
Кривые в плане	R=58м P=3; a=12° / 103
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 / 4,50 / 107 / 3,20 / 3,50

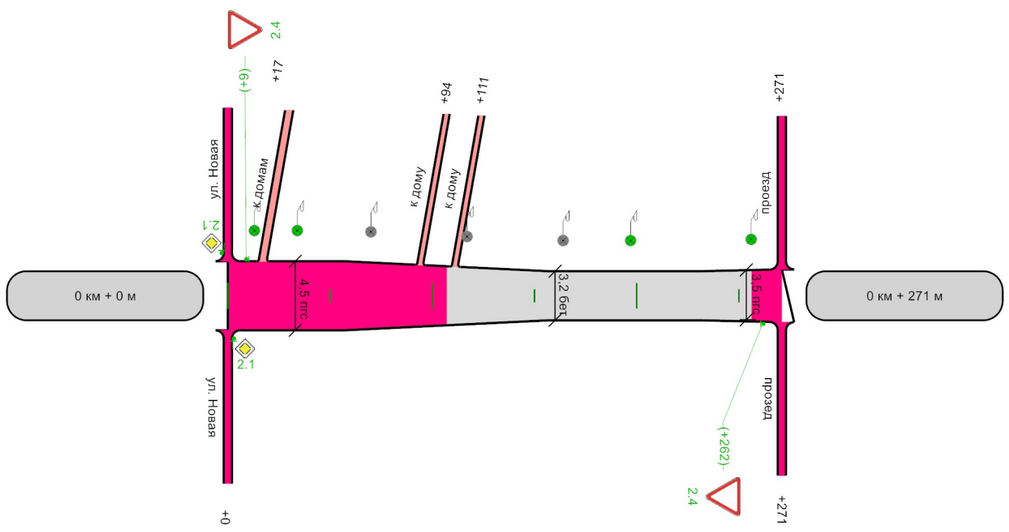

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+262	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+013	0+034	Населенный пункт	2/2	21	0	Слева
2	0+070	0+164	Населенный пункт	3/3	0	94	Слева
3	0+197	0+256	Населенный пункт	2/2	59	0	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				7/7	80	94	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Фрунзе, д. 3 до жилого дома по ул. Фрунзе, д. 91


1-й участок: км 0+000 - км 1+749
2-й участок: км 0+000 - км 0+090
3-й участок: км 0+000 - км 0+080

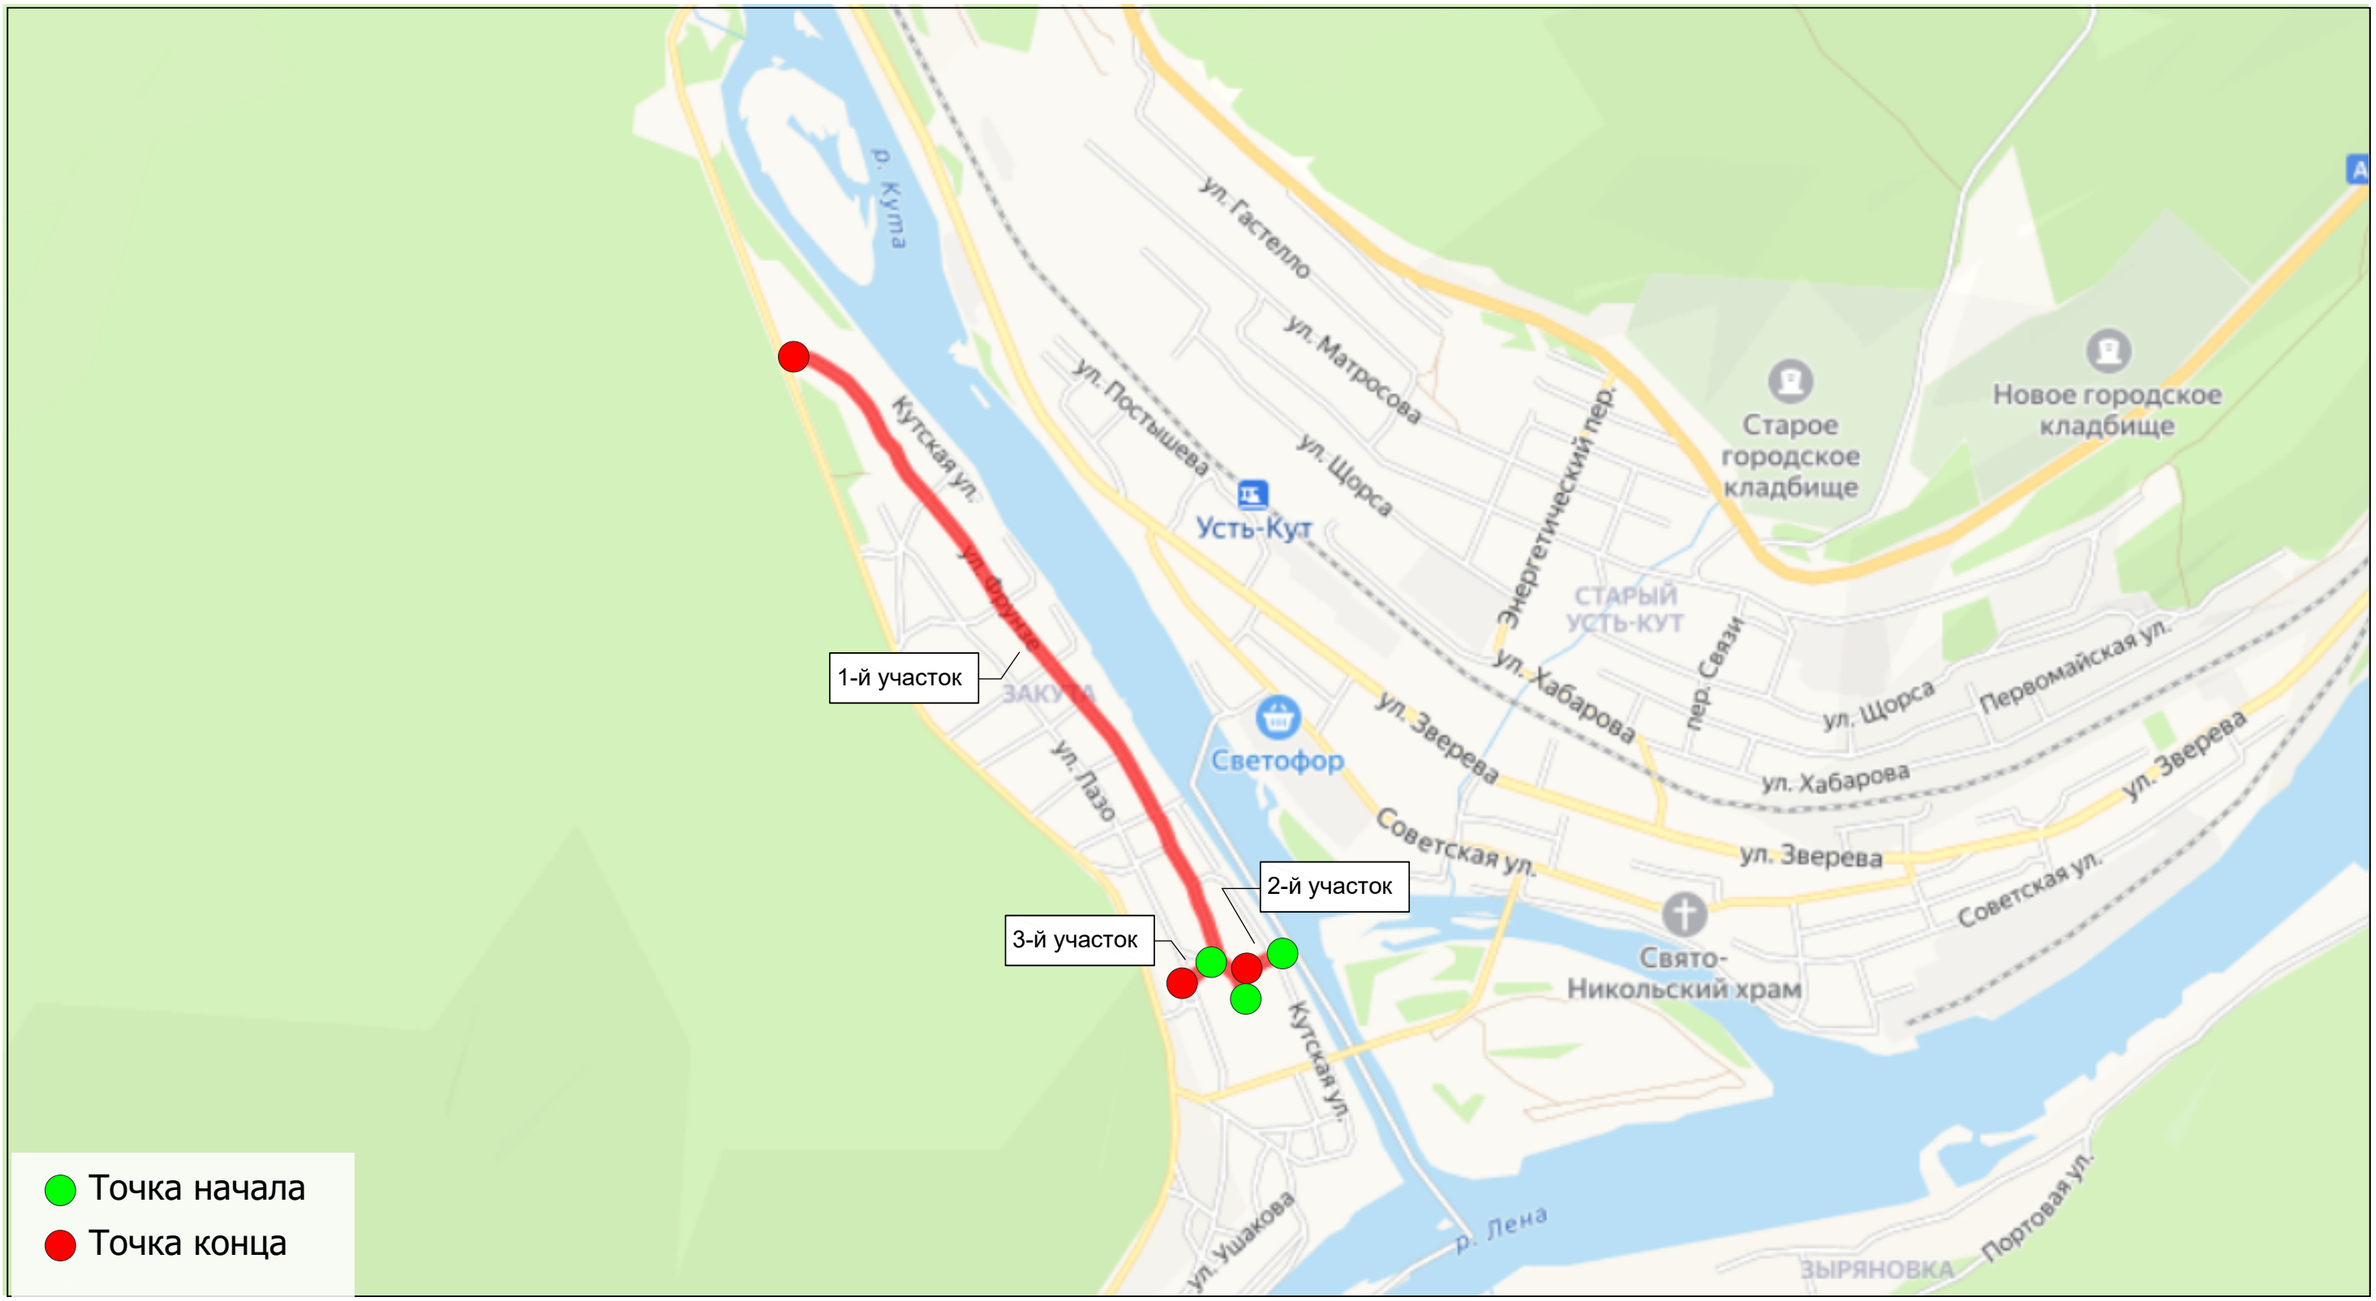

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Фрунзе, д. 3 до жилого дома по ул. Фрунзе, д . 91 (1-й участок)

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13 — 28 — 64 — R=1888м — 33 — 182 — 33 — 215 — R=1387м — 15 — 284 — 21 — 403 — R=3502м — 12 — 520 — 13 — 568 — R=3452м — 3 — 624 — 9 — 783 — R=3153м — 14 — 859
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 98 — 3,50 — 267 — 3,50

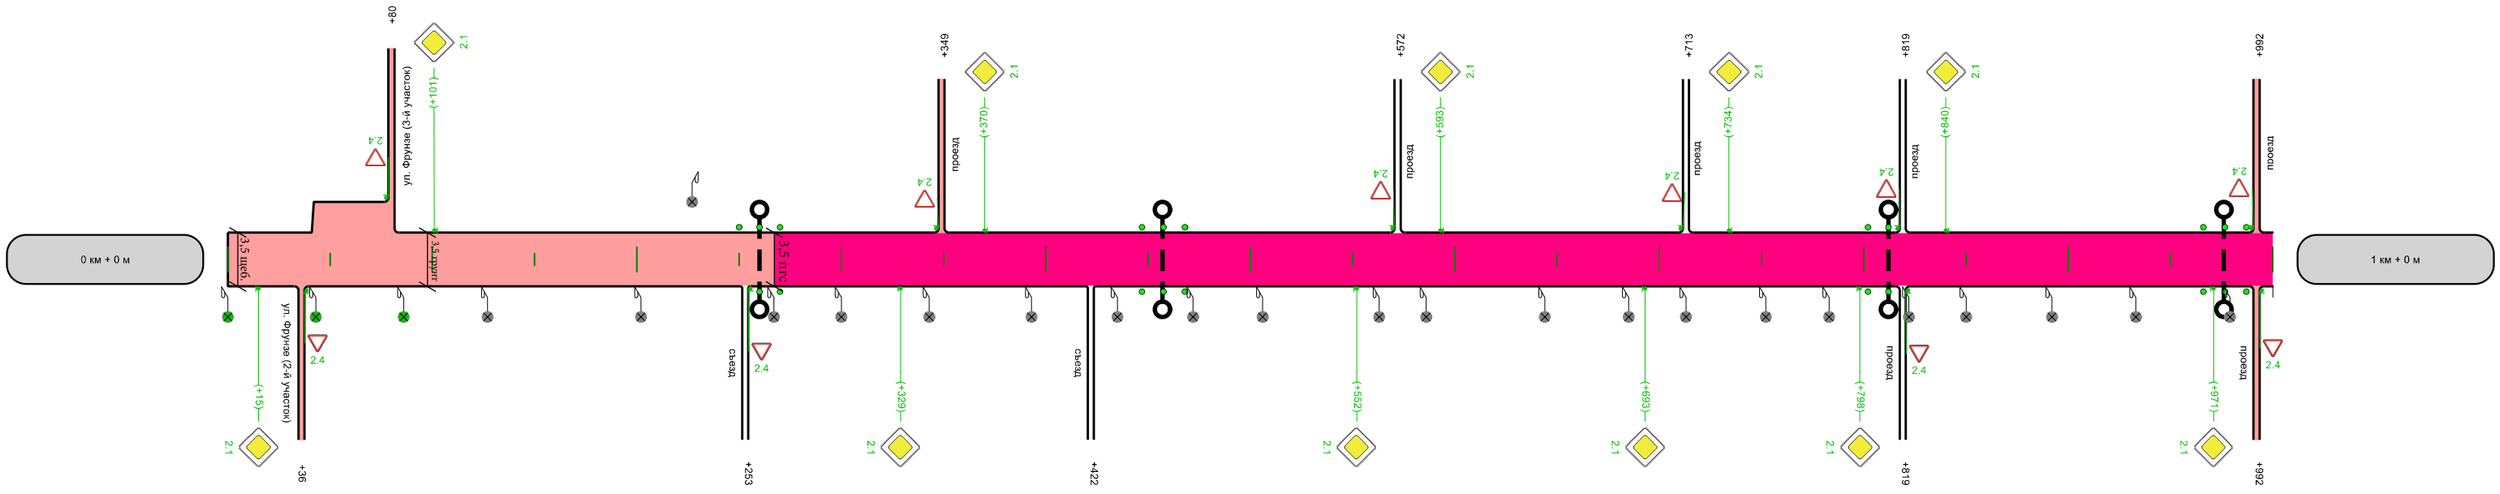


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Фрунзе, д. 3 до жилого дома по ул. Фрунзе, д . 91 (1-й участок)

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	14 16 13 R=3194м 8 82 8 115 R=2888м 12 175 13 395 R=2686м 5 447 6 490 R=2723м
Кривые в плане	578 R=189м P=30; a=4° 644
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

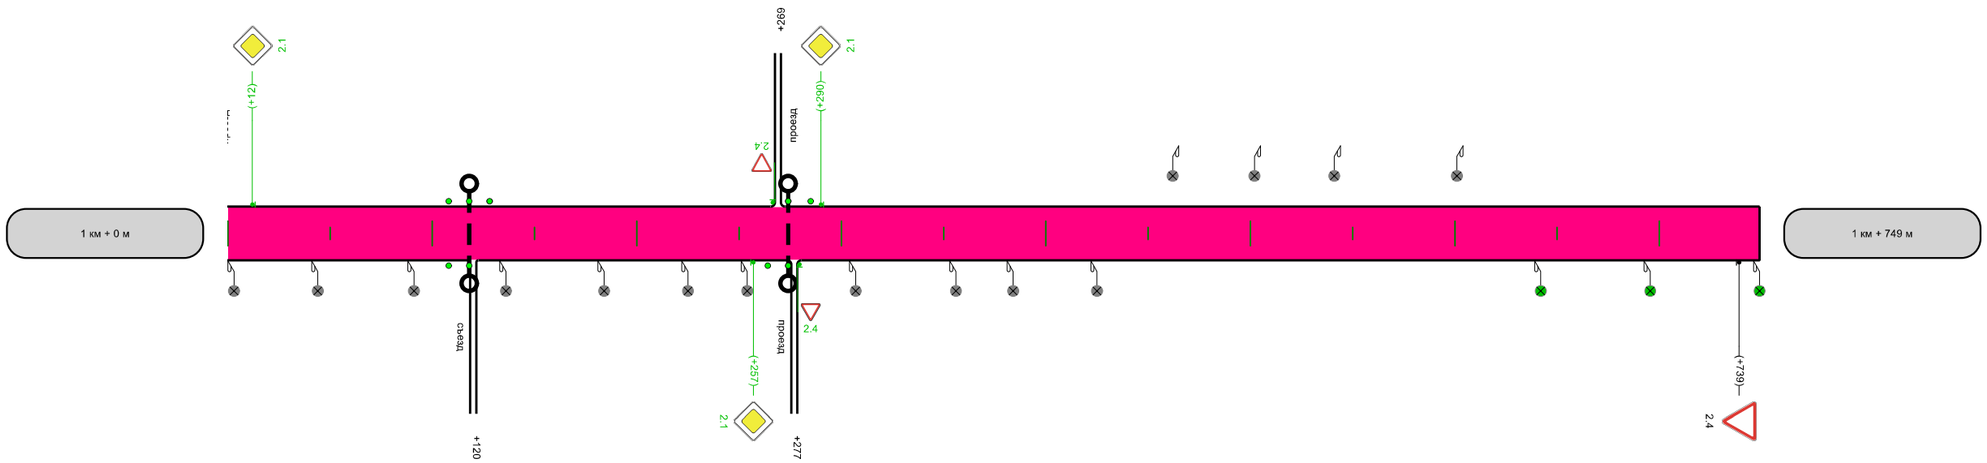

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+101	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+329	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+370	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+552	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+593	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+693	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+734	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+798	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+840	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+971	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			1+012	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			1+257	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1+290	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			1+739	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**15**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**15**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+250	0+270	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+260	0+270	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+447	0+468	21/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+447	0+468	21/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+802	0+812	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+802	0+812	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
7	0+966	0+987	21/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
8	0+966	0+987	21/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
9	1+108	1+118	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба


1	2	3	4	5	6	7	8
10	1+108	1+128	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
11	1+264	1+274	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
12	1+274	1+285	11/1		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**185/29**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+086	Населенный пункт	3/3	86	0	Справа
2	0+127	0+127	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+202	0+202	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+227	0+227	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+267	0+267	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
6	0+300	0+300	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
7	0+343	0+343	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
8	0+393	0+393	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
9	0+435	0+435	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
10	0+472	0+472	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
11	0+506	0+506	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
12	0+563	0+563	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
13	0+586	0+586	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
14	0+644	0+644	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
15	0+685	0+685	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
16	0+713	0+713	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
17	0+752	0+752	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
18	0+783	0+783	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
19	0+822	0+822	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
20	0+850	0+850	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
21	0+892	0+892	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
22	0+933	0+933	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
23	0+979	0+979	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
24	1+003	1+003	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
25	1+044	1+044	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
26	1+091	1+091	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
27	1+136	1+136	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
28	1+184	1+184	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
29	1+225	1+225	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
30	1+254	1+254	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
31	1+307	1+307	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
32	1+356	1+356	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
33	1+384	1+384	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
34	1+425	1+425	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
35	1+462	1+462	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
36	1+502	1+502	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
37	1+541	1+541	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
38	1+601	1+601	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
39	1+642	1+749	Населенный пункт	3/3	107	0	Справа
Итого:				**43/43**	**193**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	> 3,00

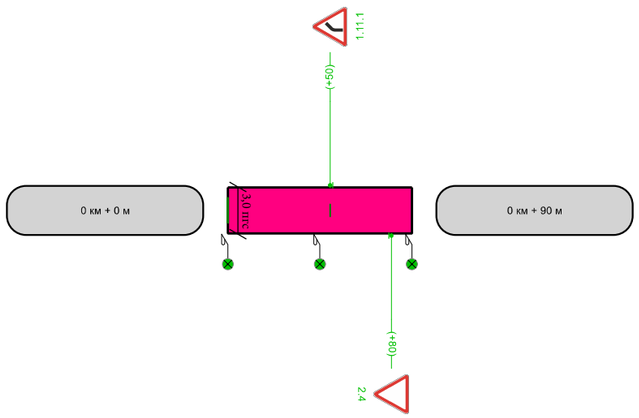

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+050	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.4	Уступите дорогу			0+080	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+090	Населенный пункт	3/3	90	0	Справа
Итого:				**3/3**	**90**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	> 3,00

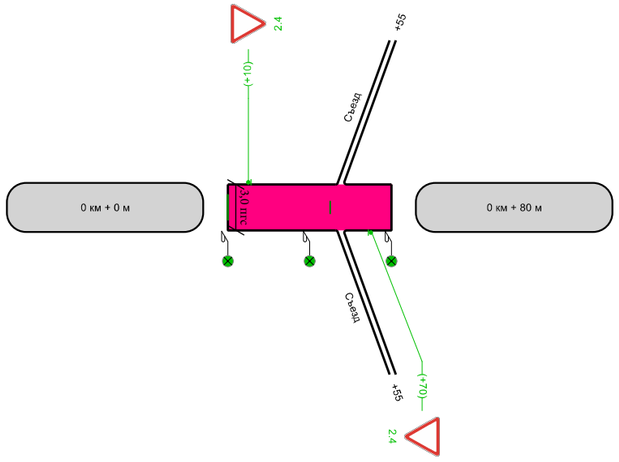

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+070	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+080	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Фурманова, д.1 до жилого дома по ул. Фурманова, д. 25

км 0+000 - км 0+524

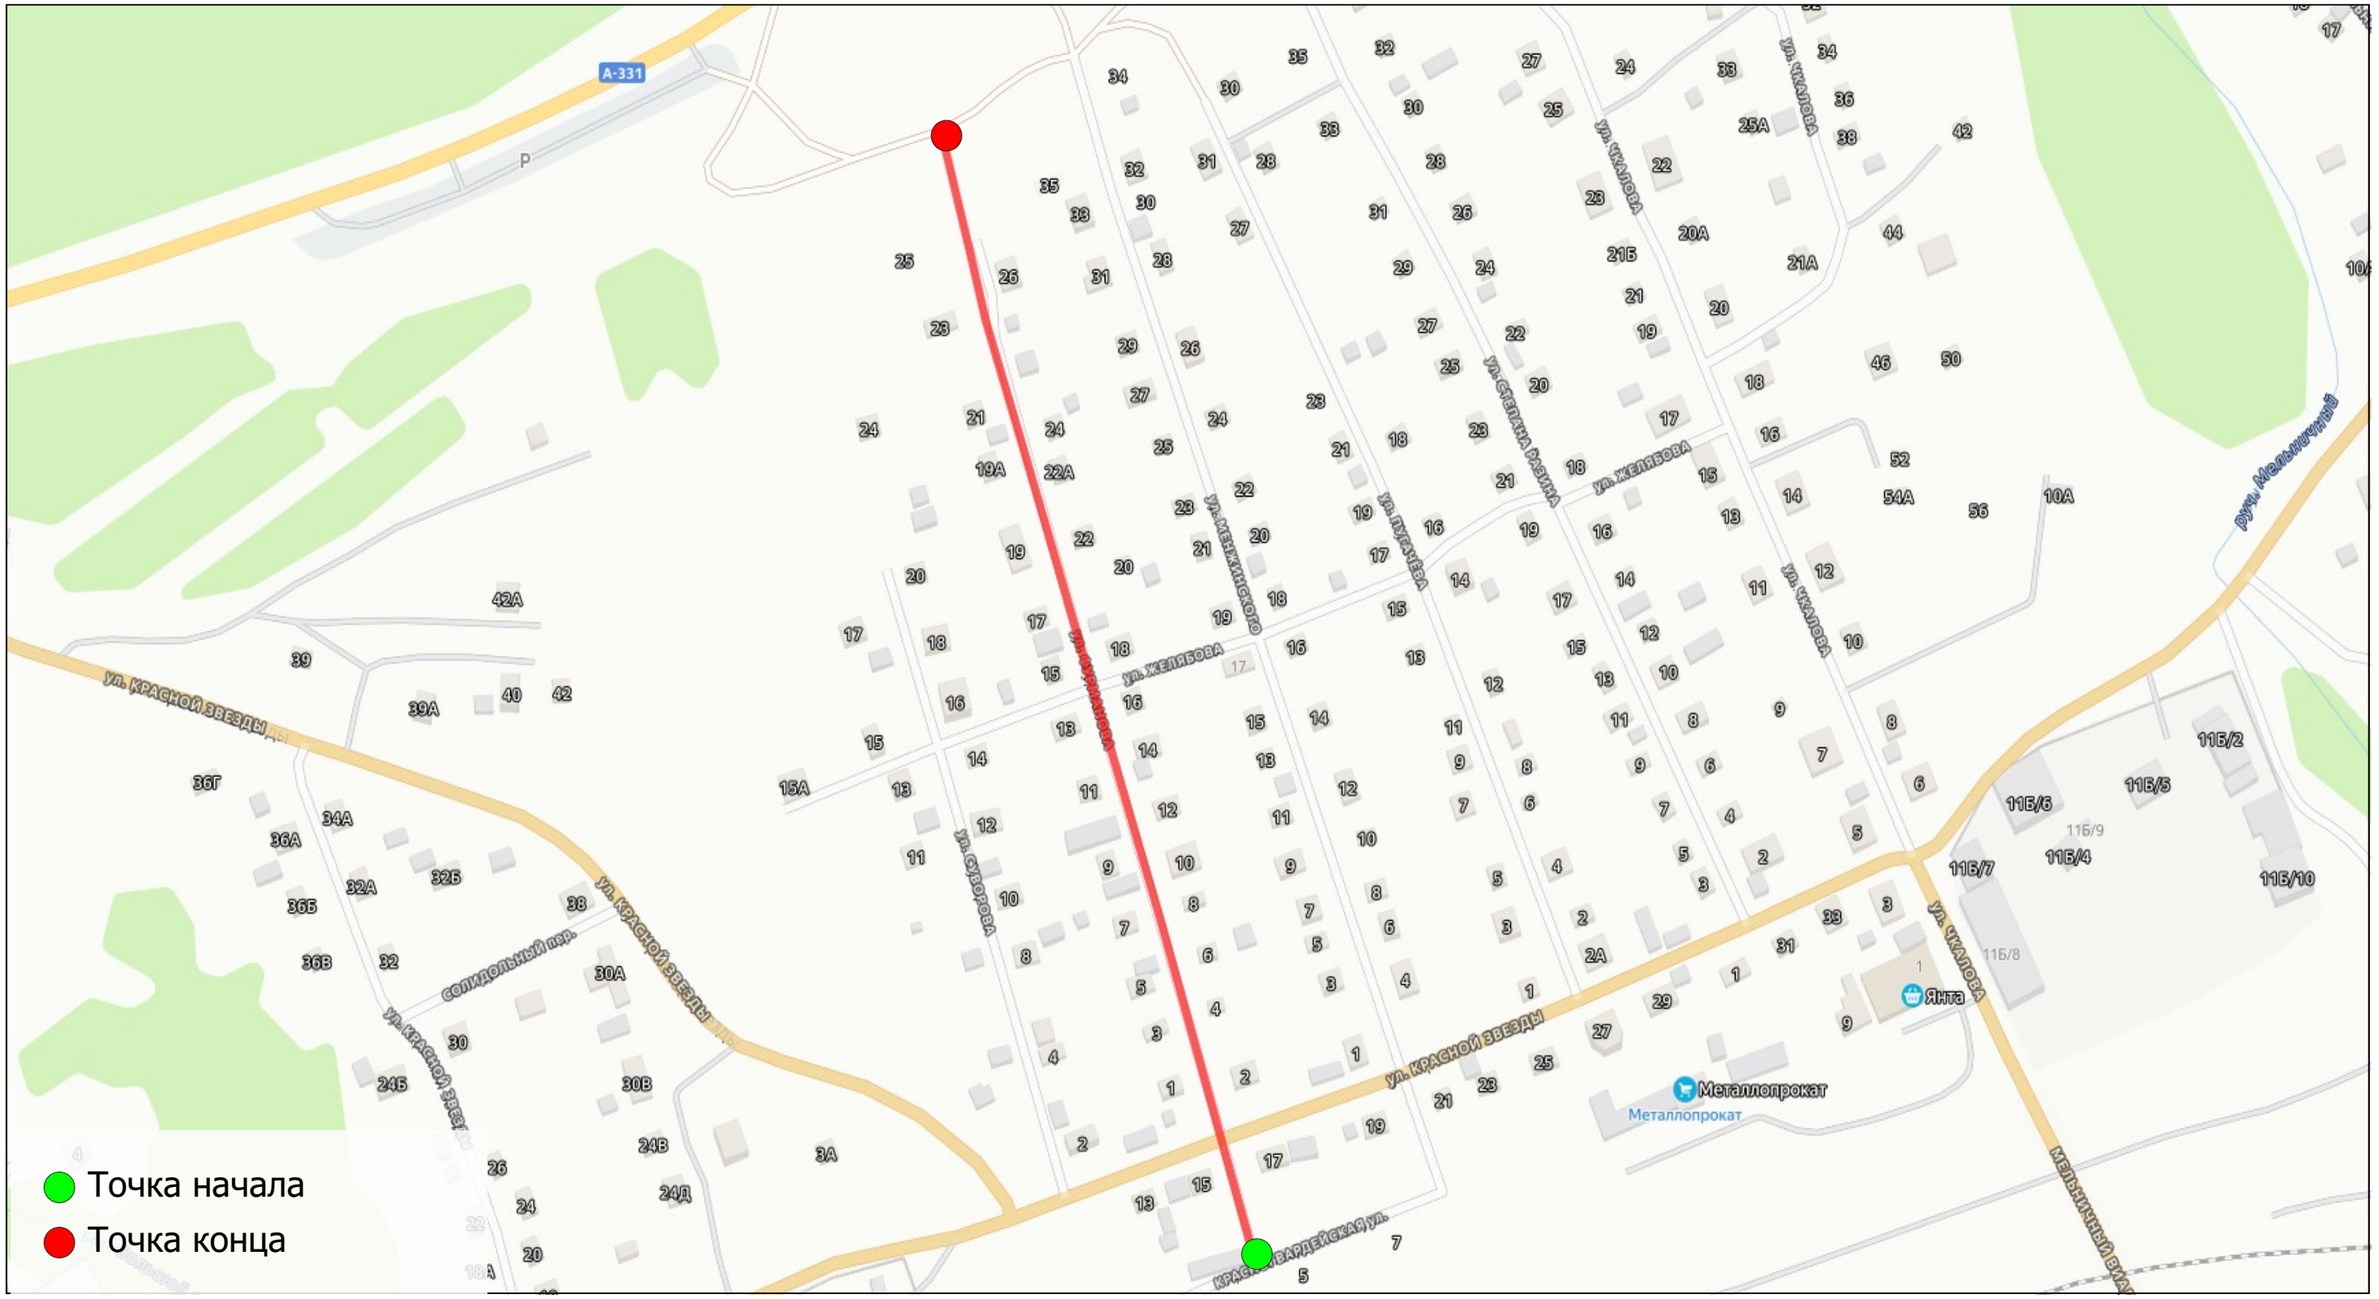

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	117 — 109 (62, R=5230м) — 125 (142) — 124 (174, R=3438м) — 99 (257) — 100 (300, R=6281м) — 119 (418)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 3,00 (82) — 4,50 — 311 — 3,50

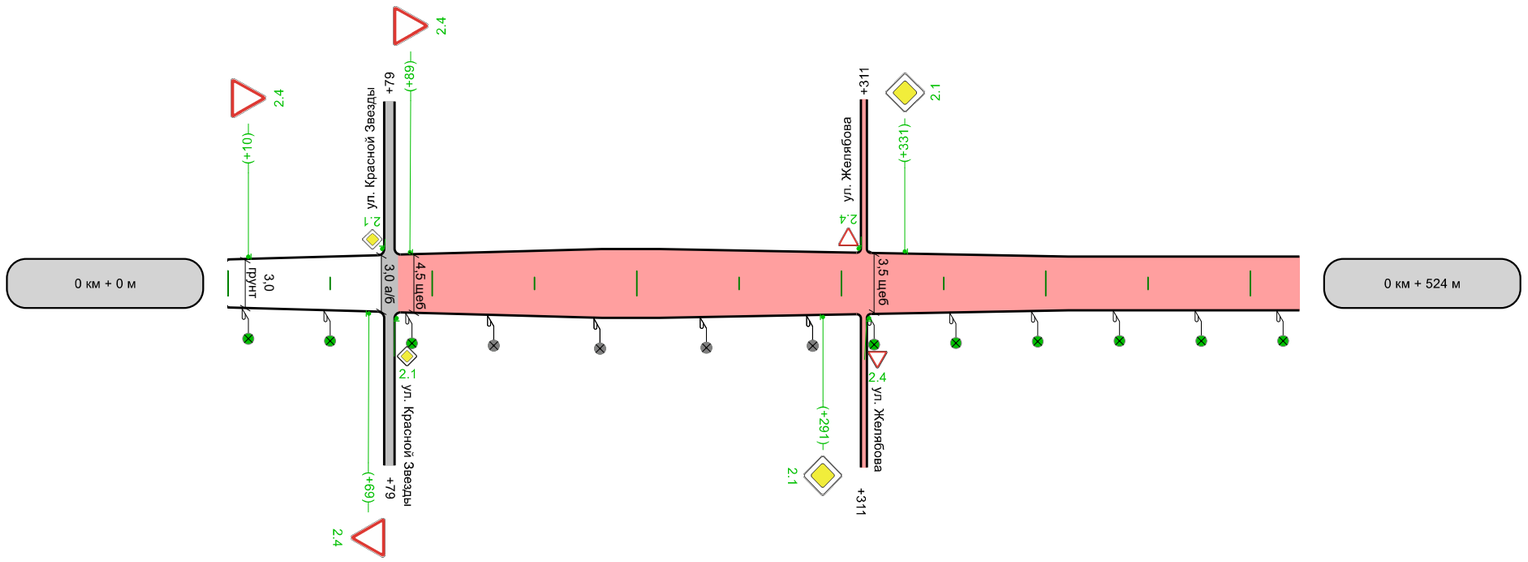

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+291	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+331	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+069	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+089	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+090	Жилая застройка	3/3	80	0	Справа
2	0+130	0+286	Жилая застройка	4/4	0	156	Справа
3	0+130	0+286	Жилая застройка	4/4	156	0	Справа
4	0+316	0+516	Жилая застройка	6/6	200	0	Справа
Итого:				**17/17**	**436**	**156**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по пер. Цветочный от автодороги по ул. Герцена до автодороги ул. Ковпака

км 0+000 - км 0+199

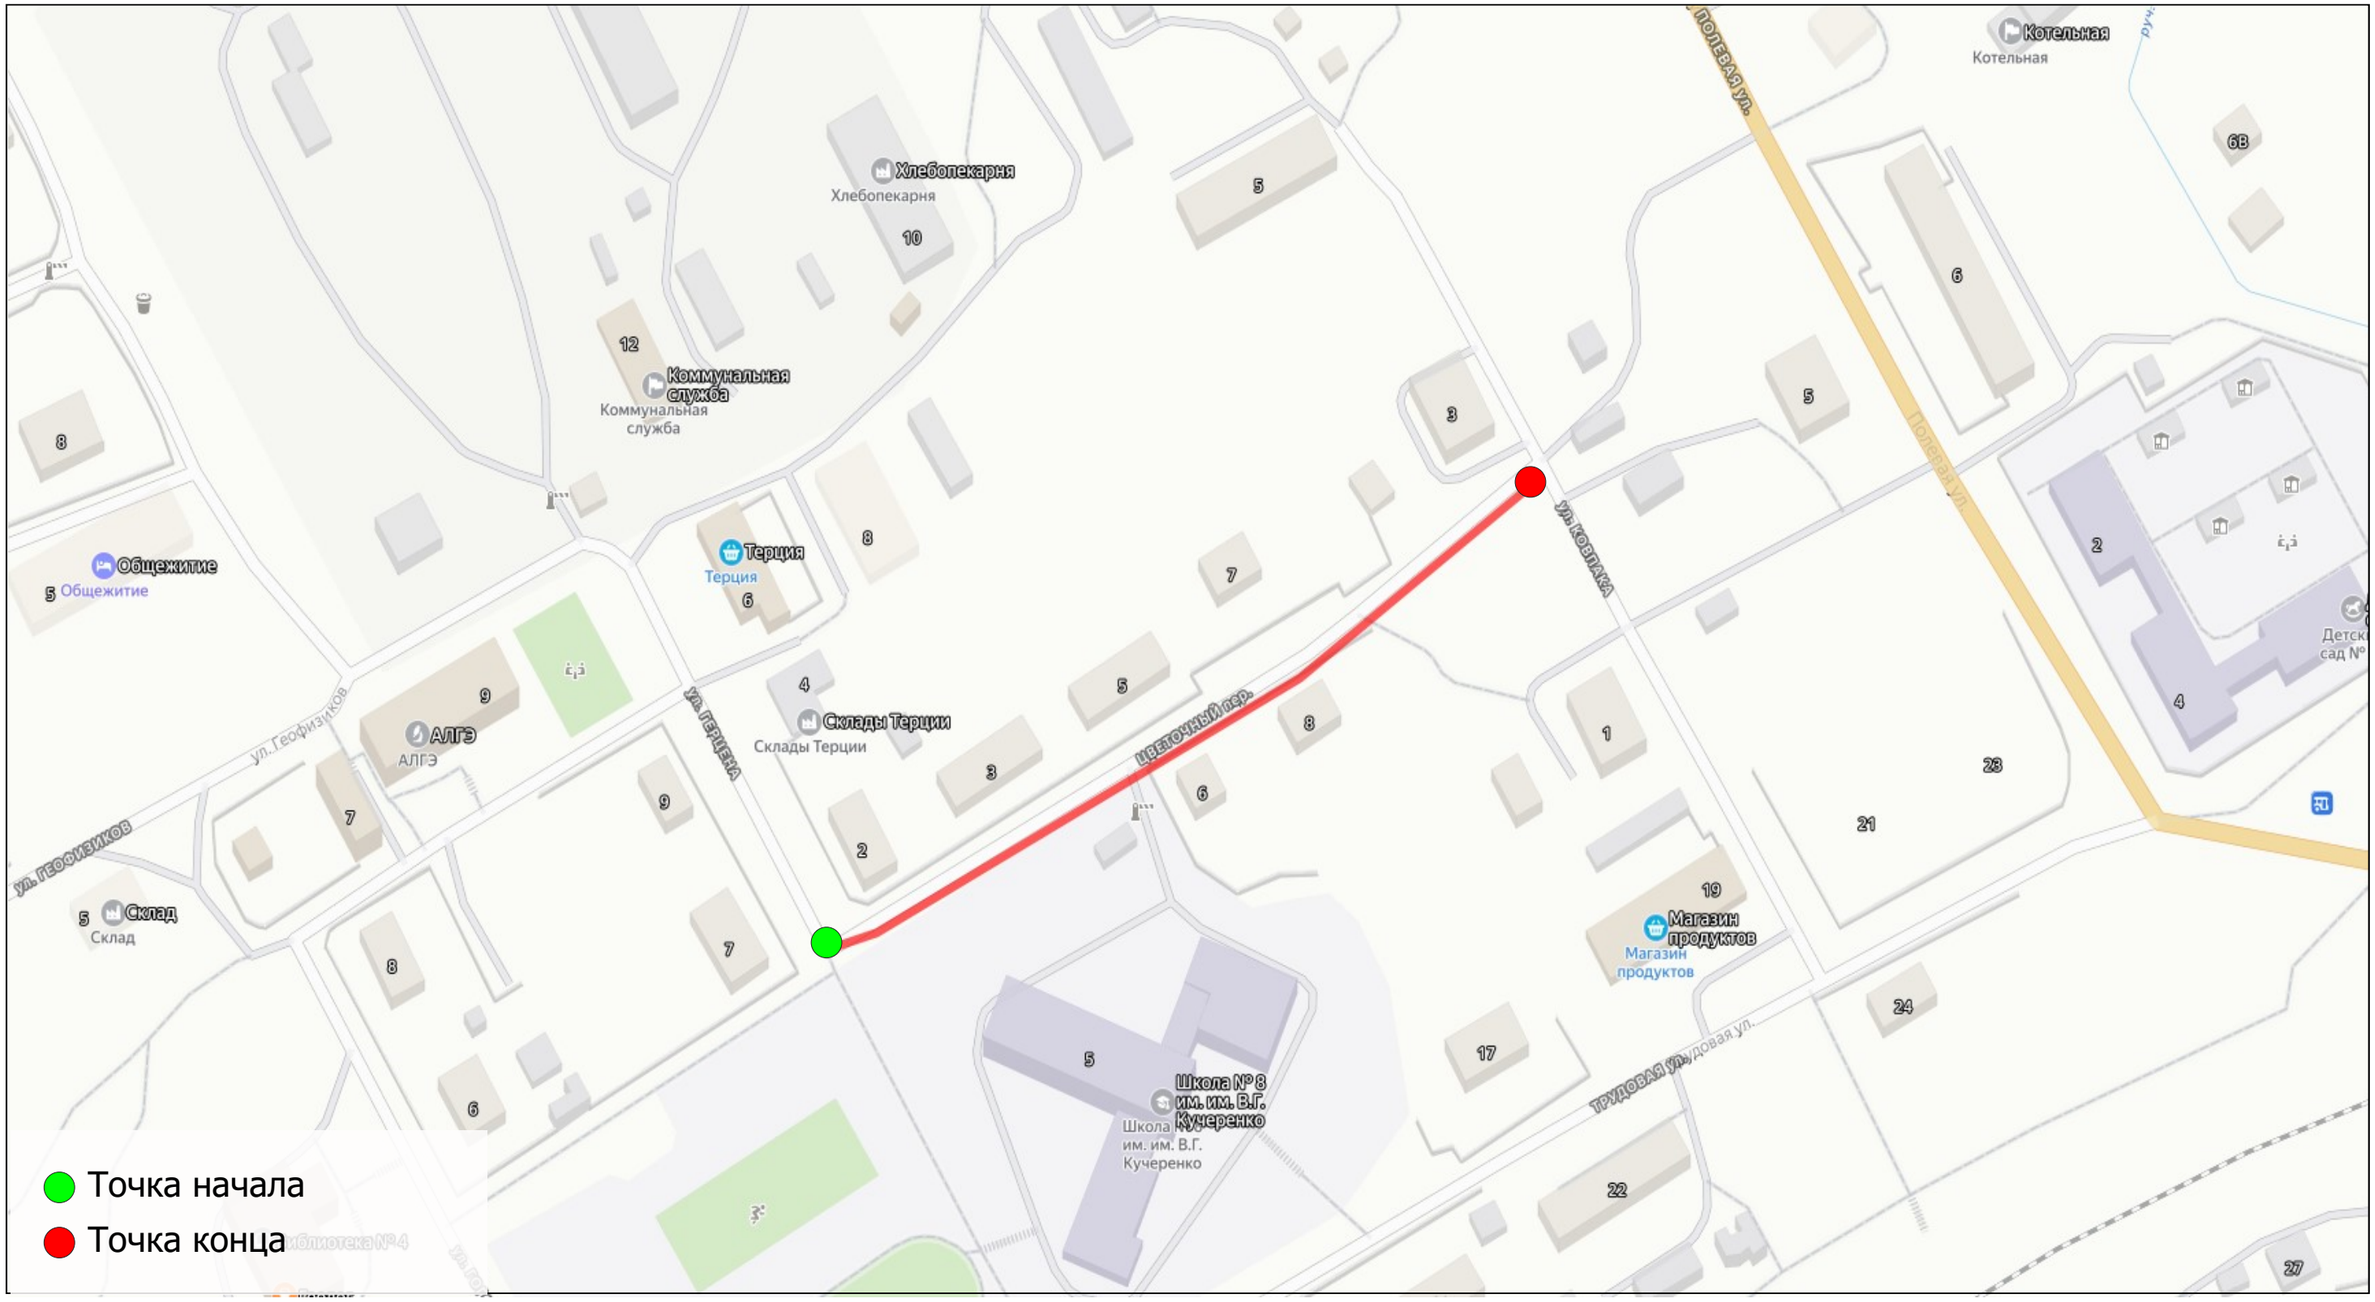

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	76 | 76 | 45 15 R=5547м 189
Кривые в плане	2 R=252м P=11; a=13° 60
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 199
Характеристики проезжей части	4,30

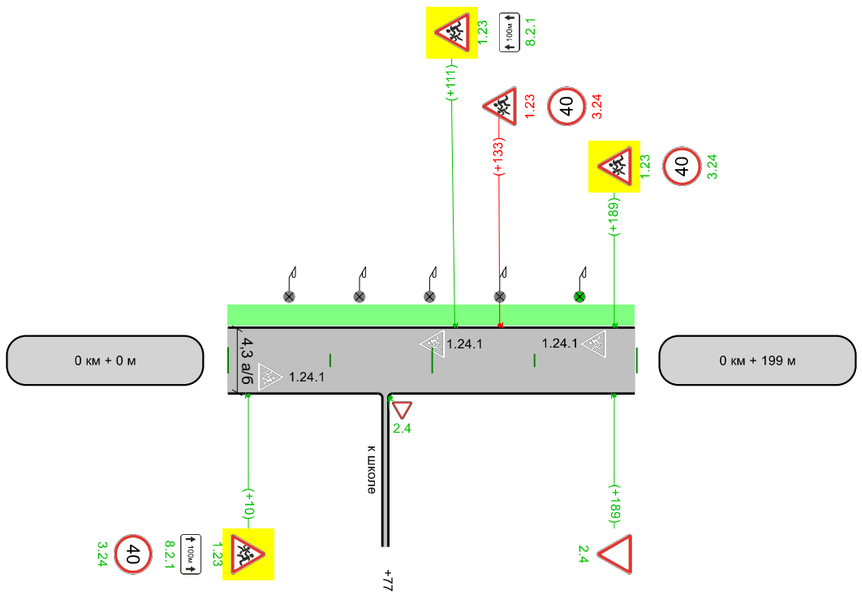

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки

№ км	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.550	
Ширина, м	1.00	
1	2	
0 - 1	3,000	
ИТОГО	3,000	
ЛИН.КМ	0,003	
ПРИВЕД.КМ	0,005	
ПЛОЩАДЬ	4,650	4,650

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+010	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+111	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети			0+133	Демонтировать	1	слева
4	1.23	Дети			0+189	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу			0+189	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
6	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+010	Требуется установить	1	справа
7	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+133	Демонтировать	1	слева
8	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+189	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.2.1	Зона действия			0+010	Требуется установить	1	справа
10	8.2.1	Зона действия			0+111	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+133	Жилая застройка	4/4	0	103	Слева
2	0+172	0+172	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
Итого:				**5/5**	**0**	**103**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+199	Жилая застройка	Слева	199	
Итого:					**199**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Сибирская, д.23 до жилого дома по ул. Совхозная, д. 19

км 0+000 - км 0+599



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0; 488 (17); 581 (12); R=2977м
Кривые в плане	90; R=114м P=2; a=43°; 182; 496; R=19м P=0; a=133°; 576
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0; 3,30; 138; 5,20; 523; 3,00

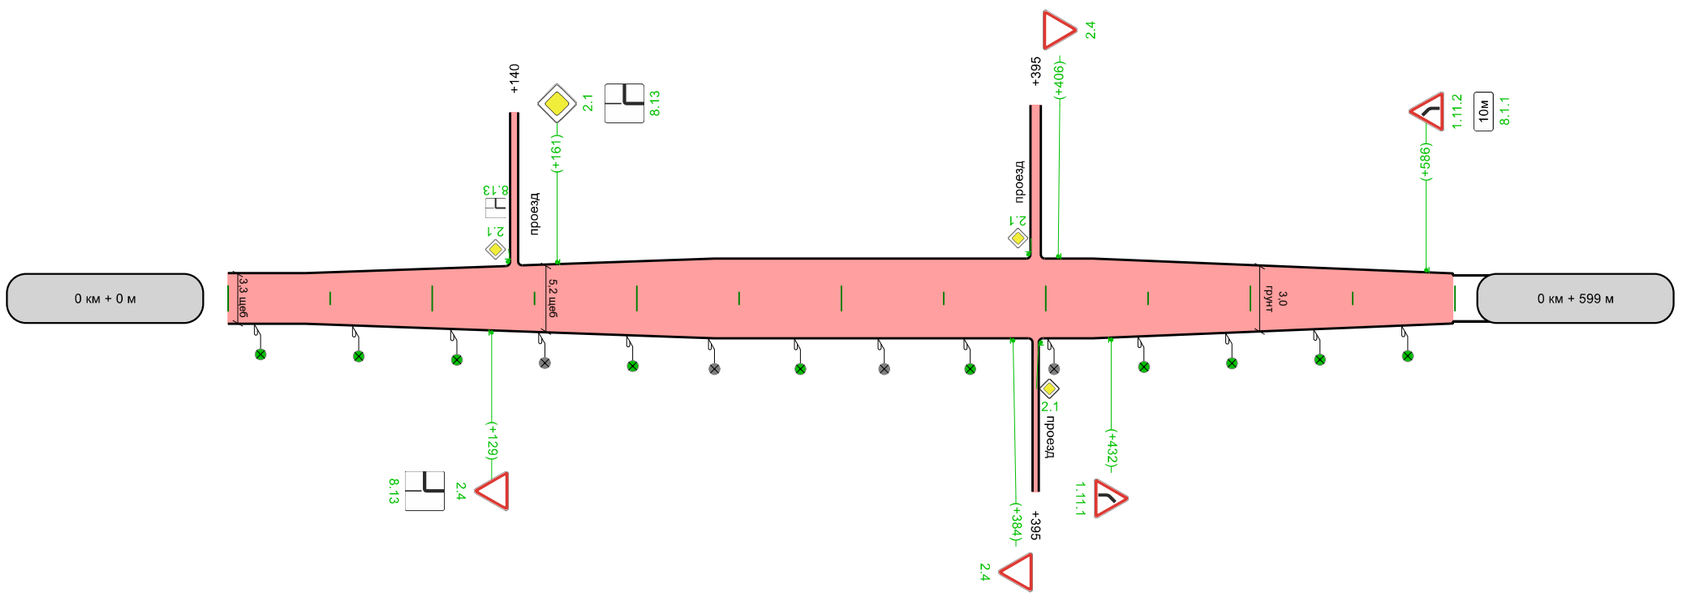

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+432	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+586	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+161	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+129	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+384	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+406	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.1.1	Расстояние до объекта			0+586	Требуется установить	1	слева
8	8.13	Направление главной дороги			0+161	Требуется установить	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги			0+129	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**9**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+016	0+112	Жилая застройка	3/3	96	0	Справа
2	0+155	0+404	Жилая застройка	4/4	0	249	Справа
3	0+198	0+364	Жилая застройка	1/1	166	0	Справа
4	0+280	0+280	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
5	0+363	0+363	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
6	0+448	0+577	Жилая застройка	4/4	129	0	Справа
Итого:				**14/14**	**391**	**249**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ул. Жилого дома по 40 лет Победы, д. 1 до жилого дома по ул. 40 лет Победы, д. 16

км 0+000 - км 0+491

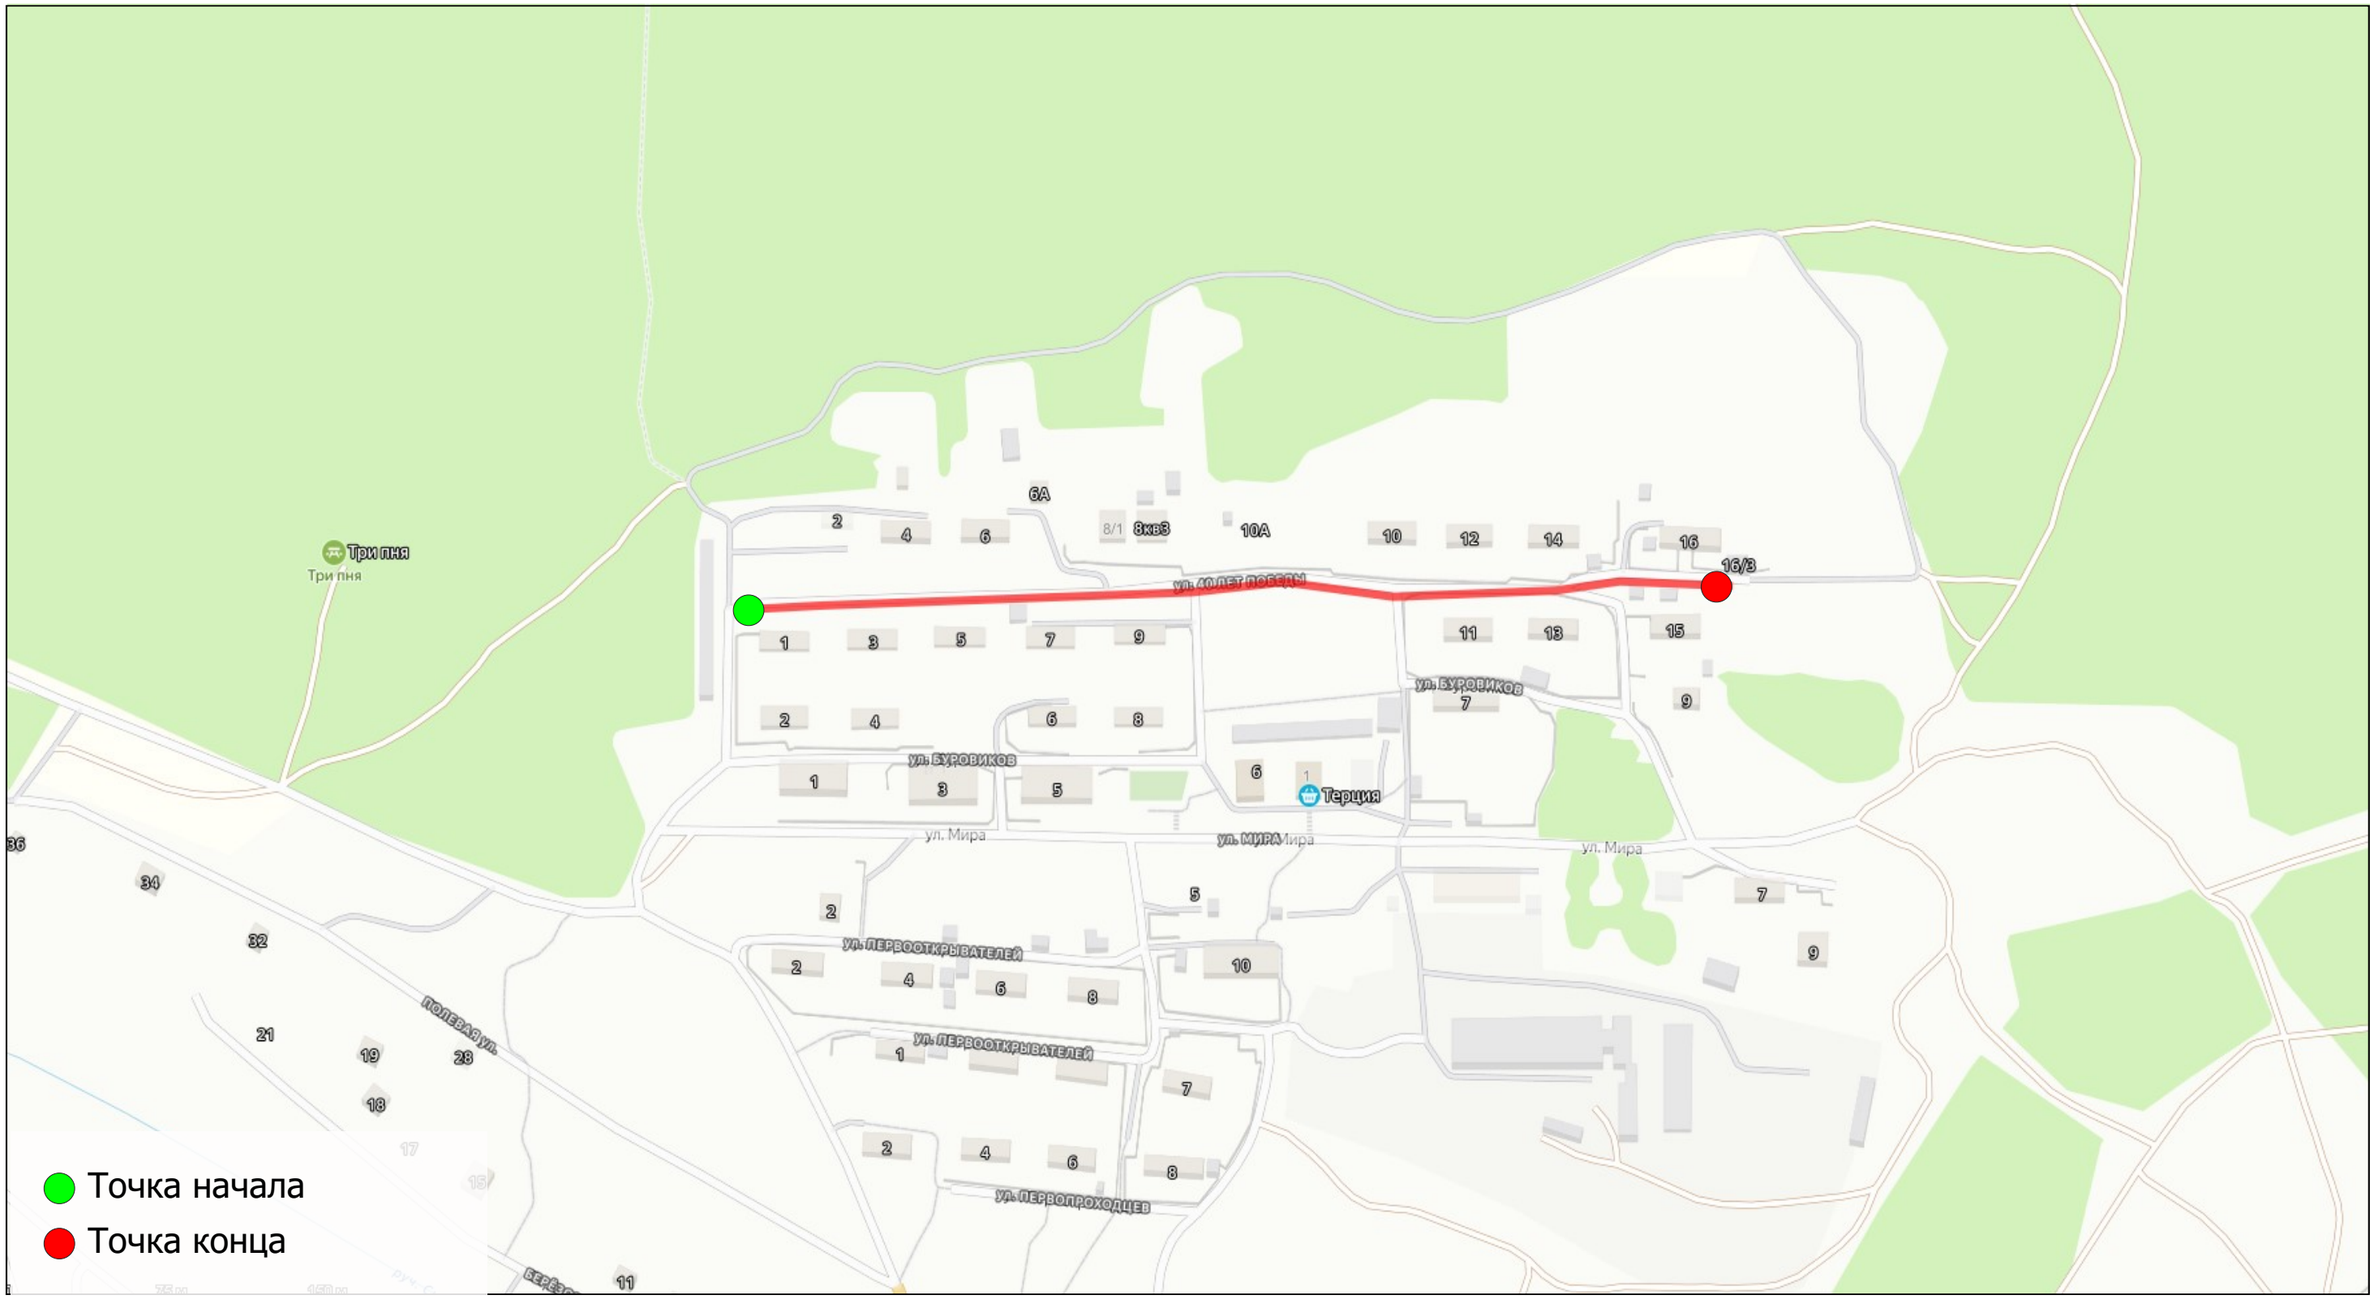

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	46 47 11 R=3876м 173 5 222 5 R=5440м 306 11 348 10 R=4030м 416 6
Кривые в плане	283 R=476м P=41; a=7° 338
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00 263 5,70

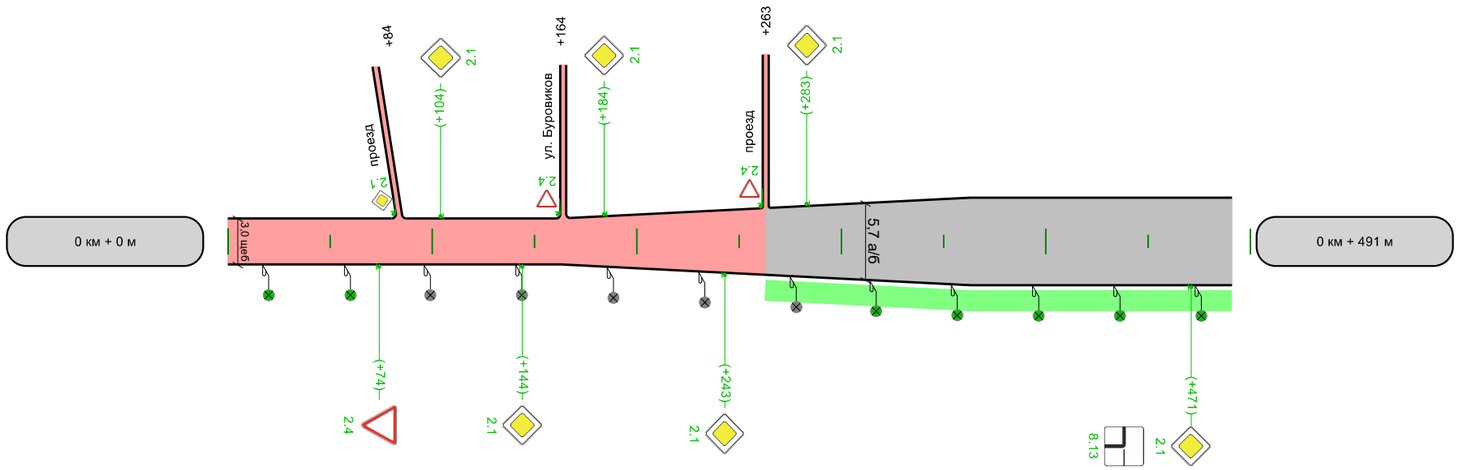

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 263 - 491

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+104	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+144	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+184	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+243	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+283	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+471	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+074	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.13	Направление главной дороги			0+471	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+060	Жилая застройка	2/2	40	0	Справа
2	0+099	0+278	Жилая застройка	5/5	0	179	Справа
3	0+317	0+476	Жилая застройка	5/5	159	0	Справа
Итого:				**12/12**	**199**	**179**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+263	0+491	Жилая застройка	Справа	228	
Итого:					**228**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по пер. Транзитный от жилого дома по ул. Партизанская, д. 31 до жилого дома по ул. Советская, д. 133

км 0+000 - км 0+156

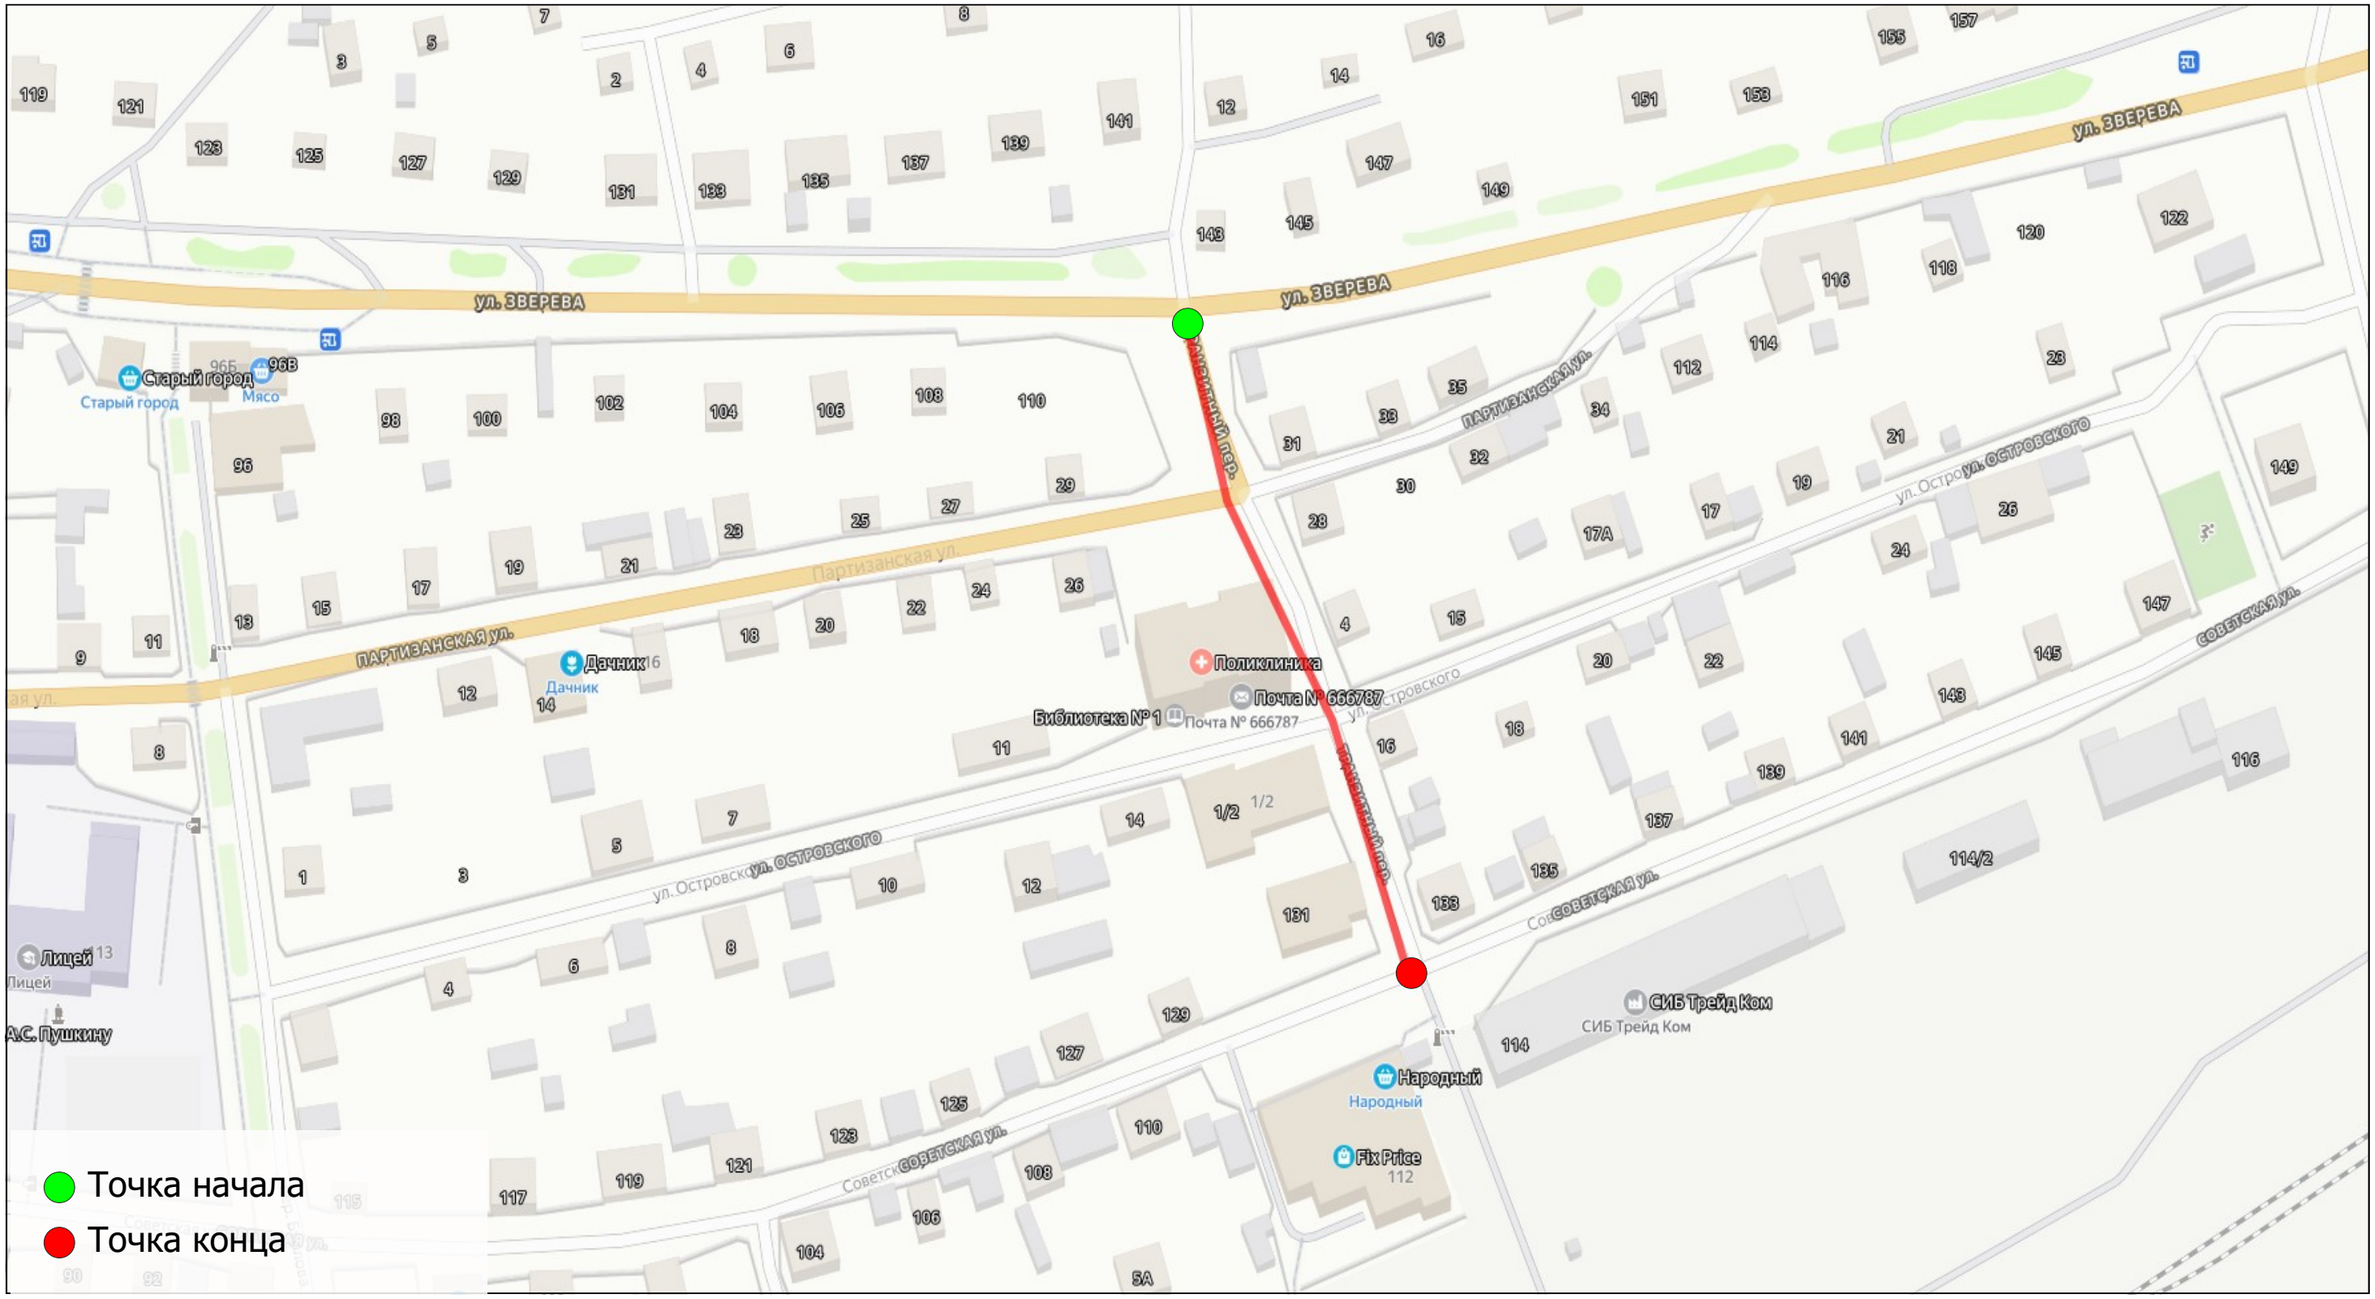

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка справа	1-ая от осевой	1.2 0 - 39	1.13 39 - 48	1.2 48 - 90	1.13 90 - 99	1.2 99 - 156
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси						
Элементы дороги в продольном профиле		70 2		R=1431м		30 139
Кривые в плане						
Тротуары слева		н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 156				
Характеристики проезжей части		9,00	48	7,00		

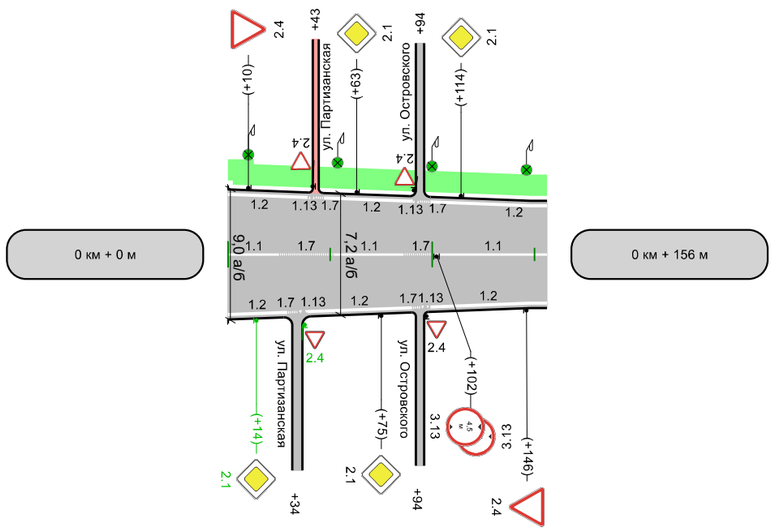

Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 0 - 25	1.7 25 - 52	1.1 52 - 86	1.7 86 - 103	1.1 103 - 156	
	1-ая от осевой	1.2 0 - 28	1.7 28 - 34	1.13 34 - 40	1.2 40 - 48	1.2 48 - 90	1.13 90 - 96	1.2 96 - 156
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа								

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0,250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	112,000	274,000	63,000	19,000	
ИТОГО	112,000	274,000	63,000	19,000	
ЛИН.КМ	0,112	0,274	0,063	0,019	
ПРИВЕД.КМ	0,112	0,274	0,032	0,005	
ПЛОЩАДЬ	11,200	27,400	3,150	2,850	44,600

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+014	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+063	Установлено	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+075	Установлено	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+114	Установлено	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+146	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					5	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					6	
		Запрещающие знаки						
7	3.13	Ограничение высоты			0+102	Установлено	1	по центру
8	3.13	Ограничение высоты			0+102	Установлено	1	по центру
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					2	
		Всего установлено:					7	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+146	Жилая застройка	4/4	136	0	Слева
Итого:				4/4	136	0	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+156	Жилая застройка	Слева	156	
Итого:					**156**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Зверева, д. 44 до жилого дома по ул. Советская, д. 45

км 0+000 - км 0+135

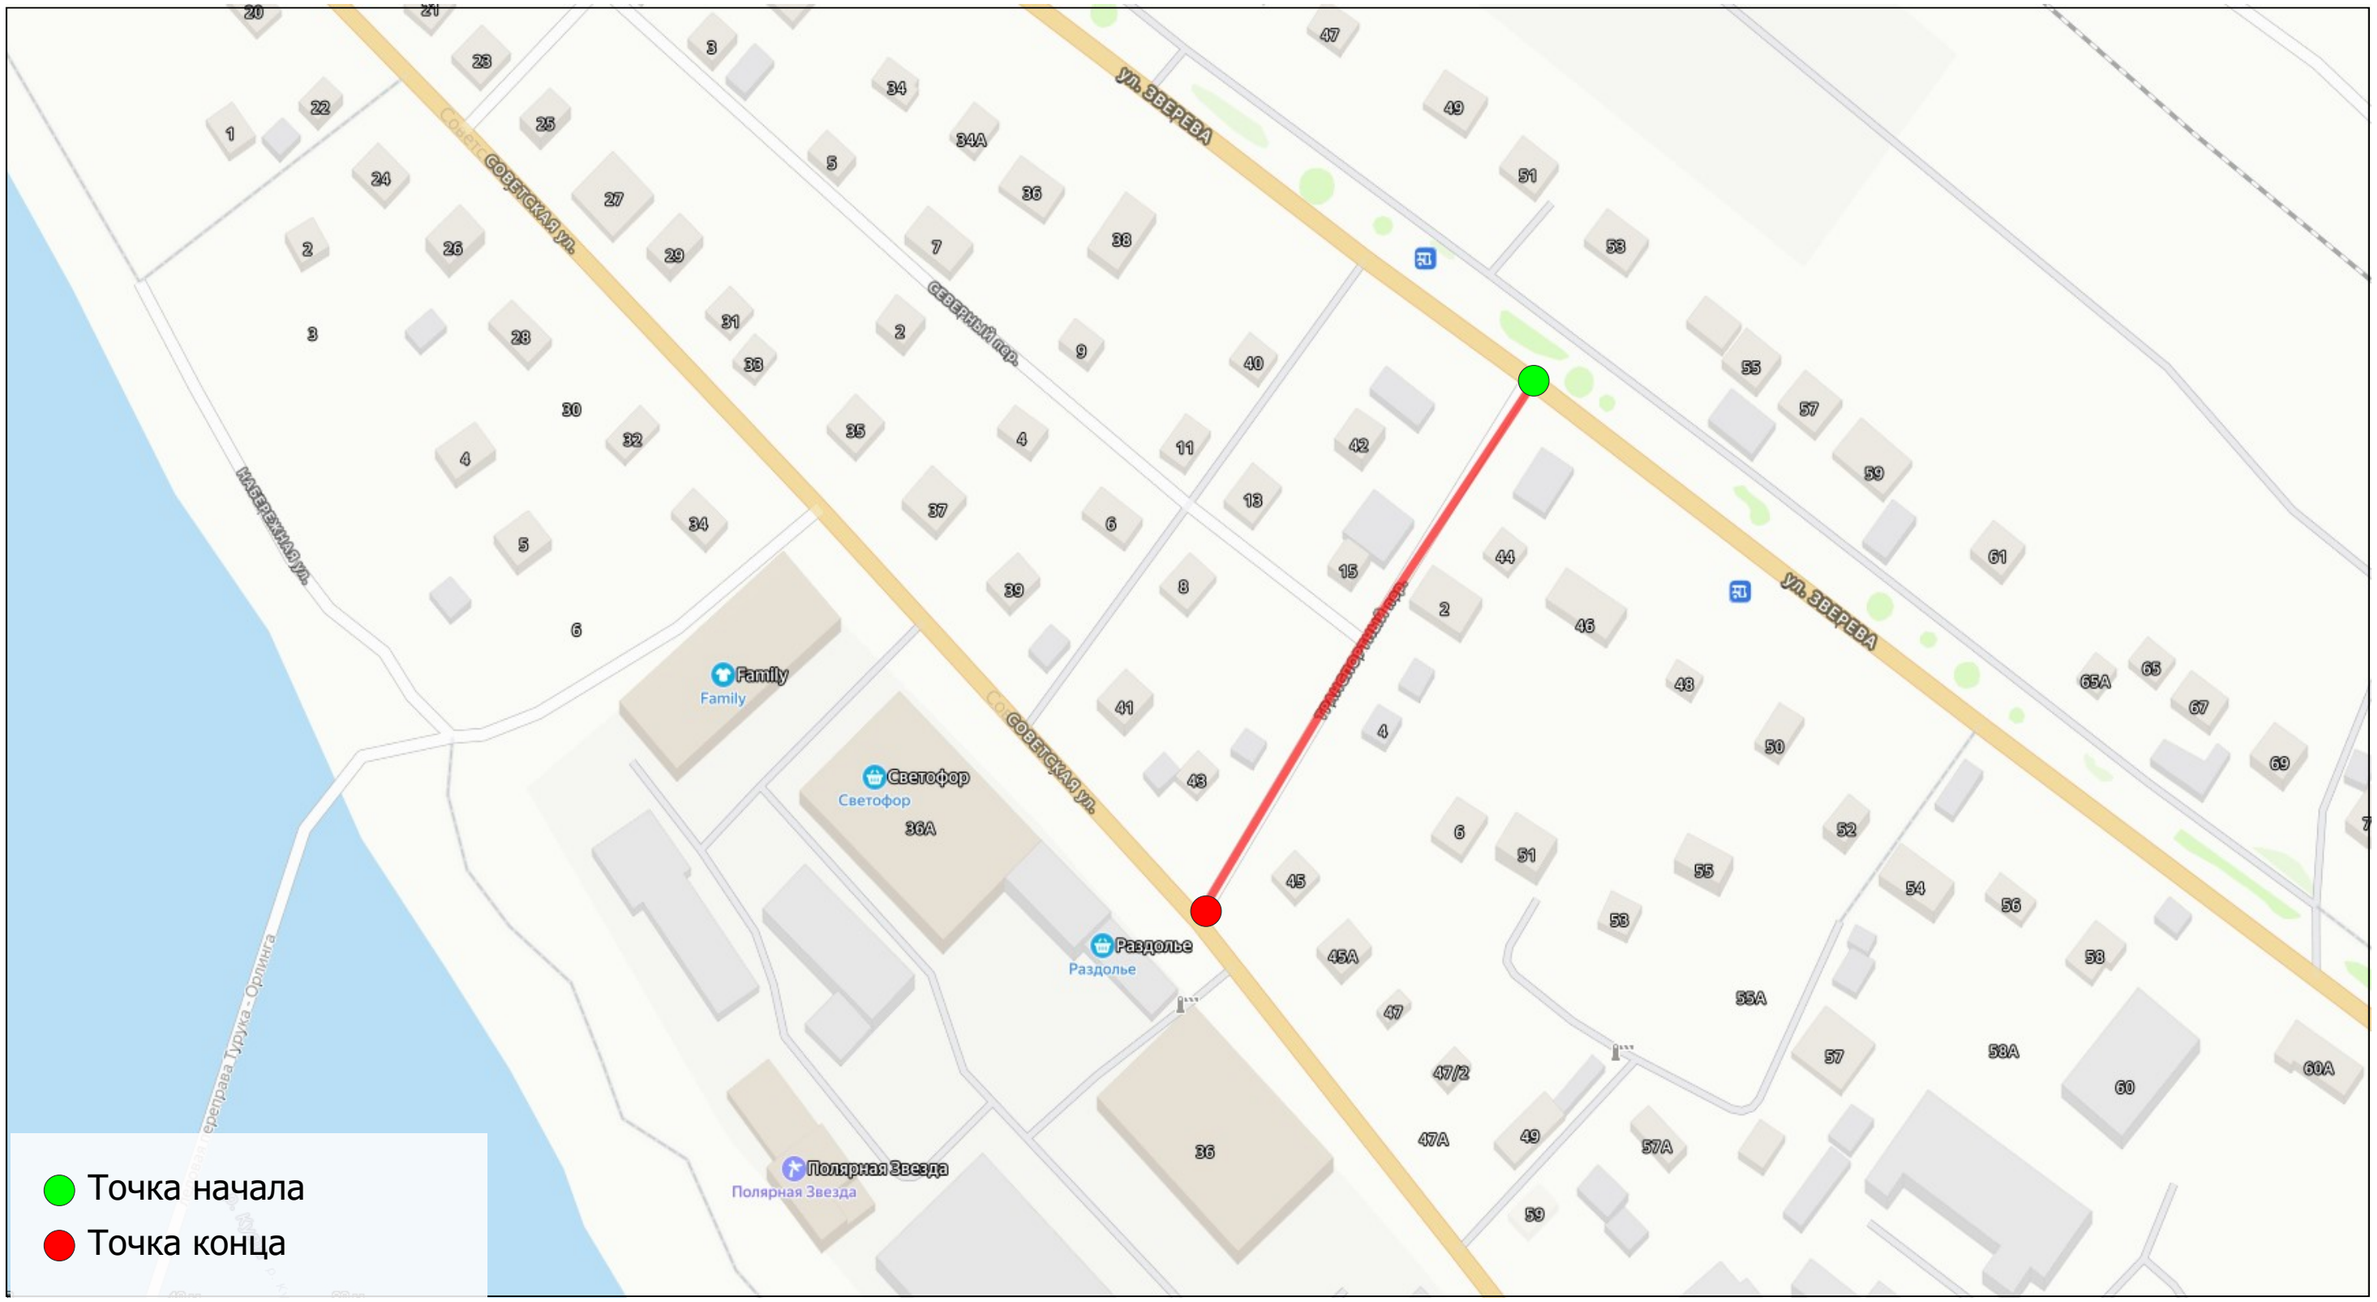

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 135
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	111 — 67 — 117 — R=2084м
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 135
Характеристики проезжей части	7,60

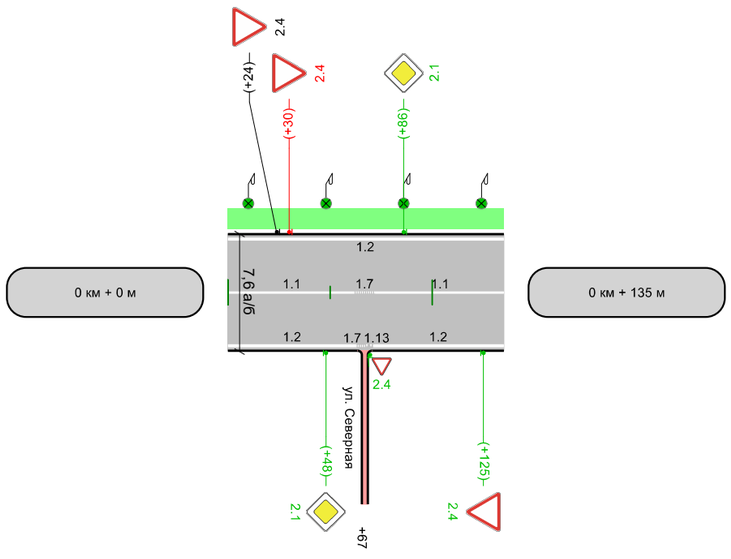

Горизонтальная разметка справа	осевая	1.1 0 - 62	1.7 62 - 72	1.1 72 - 135
	1-ая от осевой	1.2 0 - 63	0.1 63 - 71	1.2 71 - 135
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0,250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	125,000	262,000	14,000	4,000	
ИТОГО	**125,000**	**262,000**	**14,000**	**4,000**	
ЛИН.КМ	**0,125**	**0,262**	**0,014**	**0,004**	
ПРИВЕД.КМ	**0,125**	**0,262**	**0,007**	**0,001**	
ПЛОЩАДЬ	**12,500**	**26,200**	**0,700**	**0,600**	**40,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+048	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+086	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+024	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+030	Демонтировать	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+125	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+124	Жилая застройка	4/4	114	0	Слева
Итого:				**4/4**	**114**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+135	Жилая застройка	Слева	135	
Итого:					**135**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Бирюсинская, д. 25 до территории по ул. Транспортных строителей участок, д. 1

км 0+000 - км 0+491

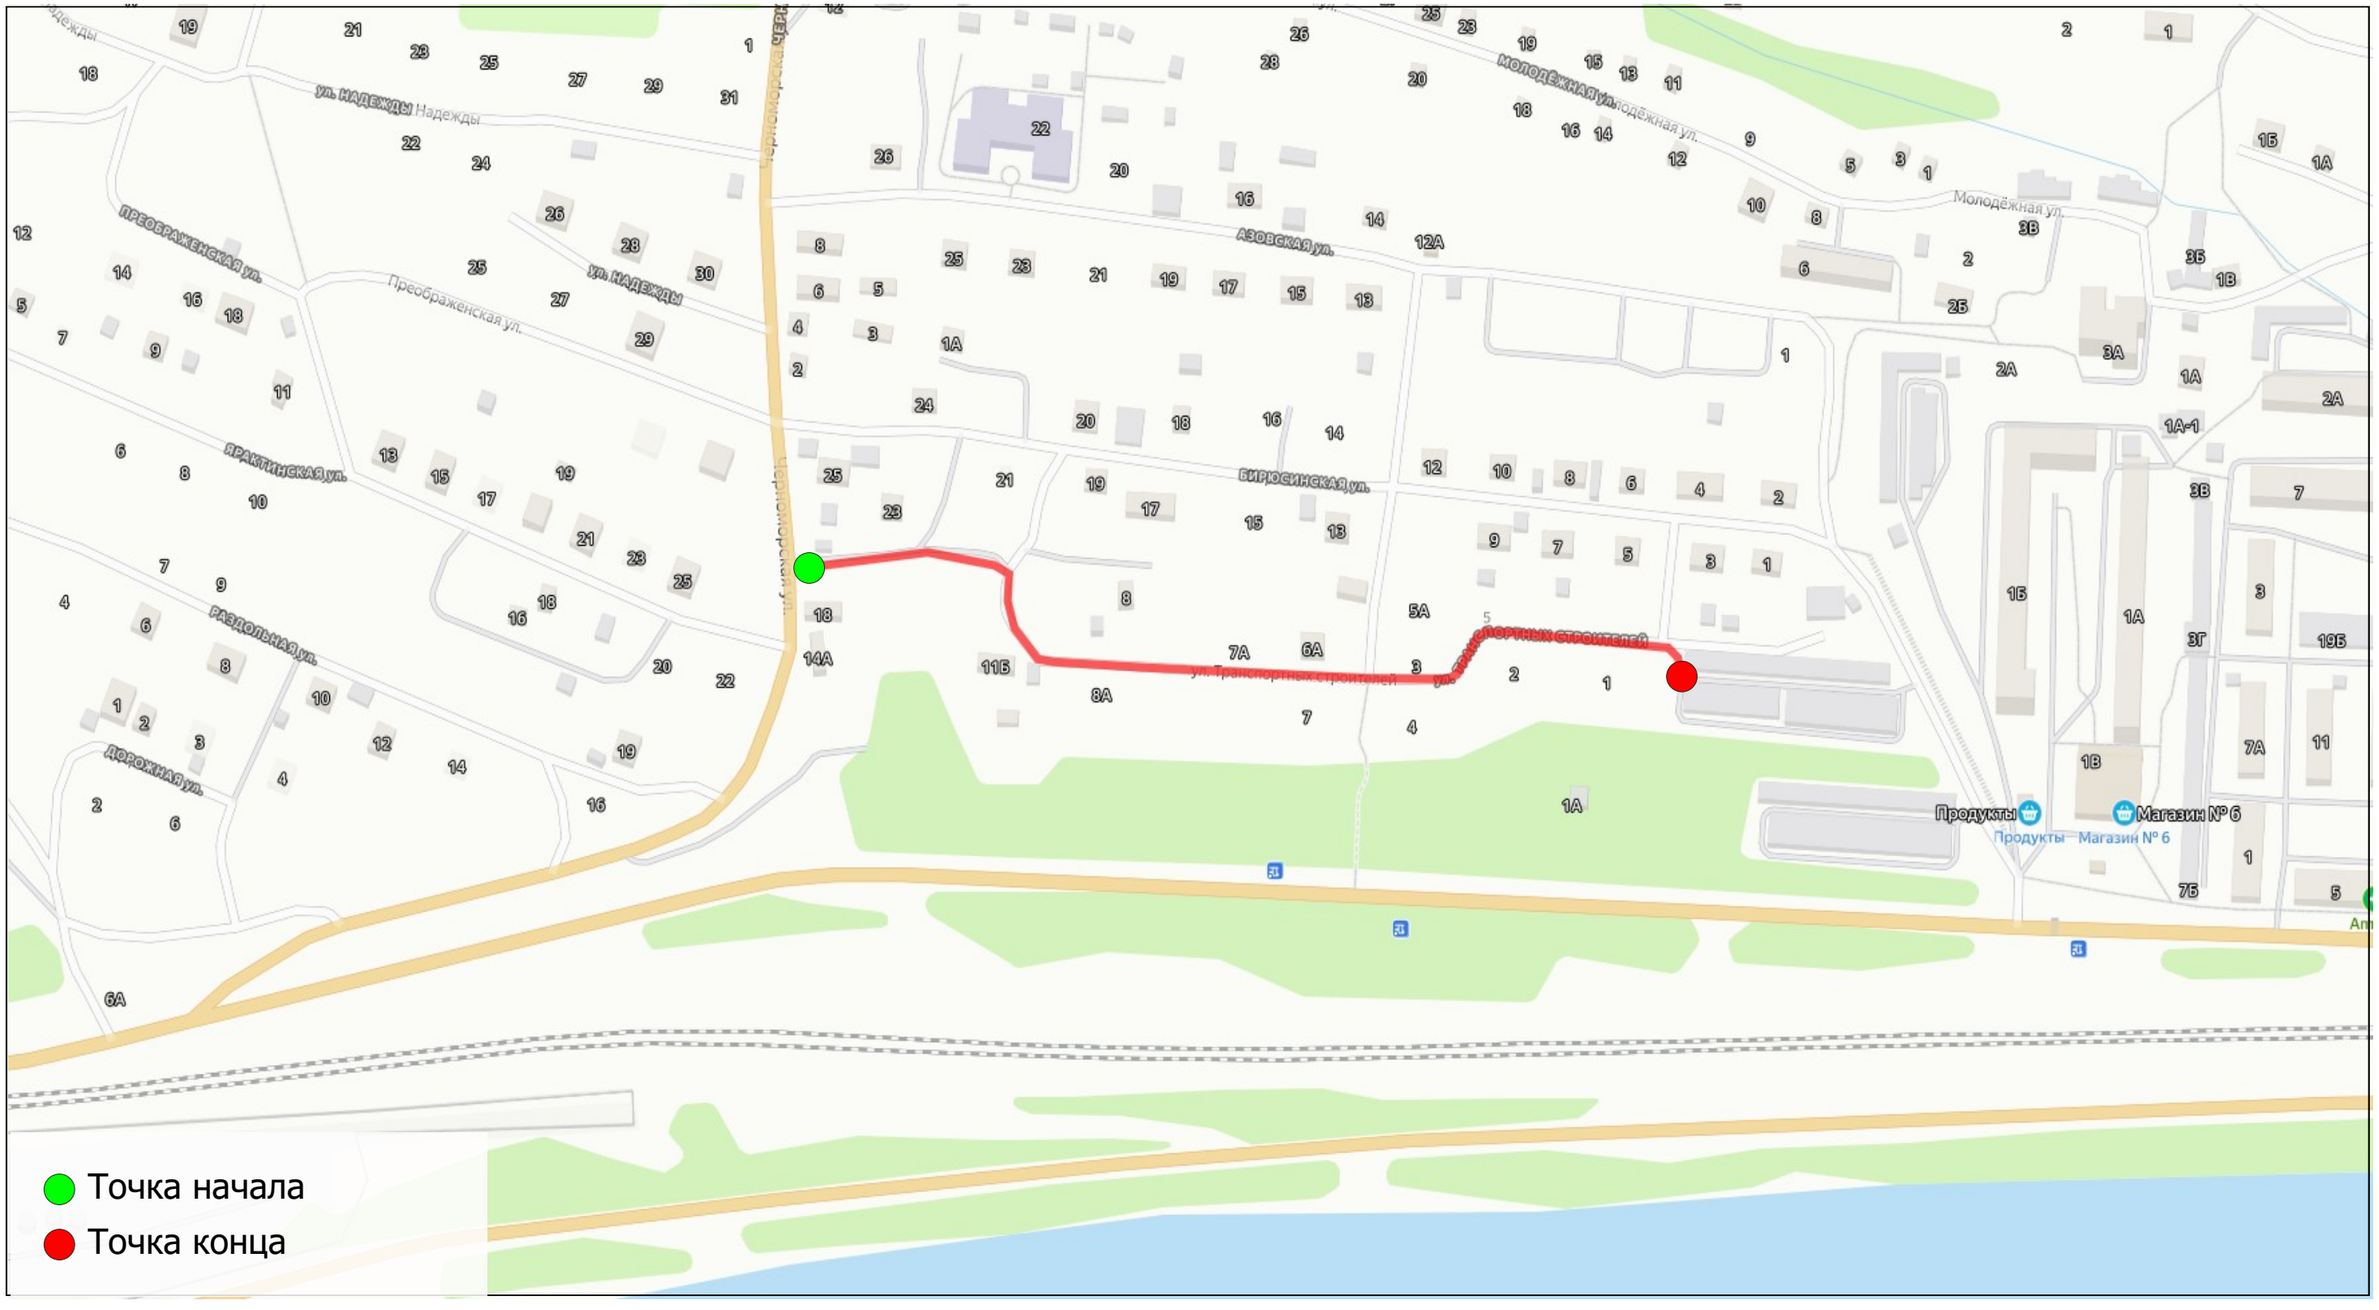

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 R=1951м 44 112 41 136 R=4301м 278 4 368 5 R=5476м
Кривые в плане	71 R=611м 107 121 134 307 R=604м 329 R=607м 352
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 2,50 — 304 — 3,00 — 3,00

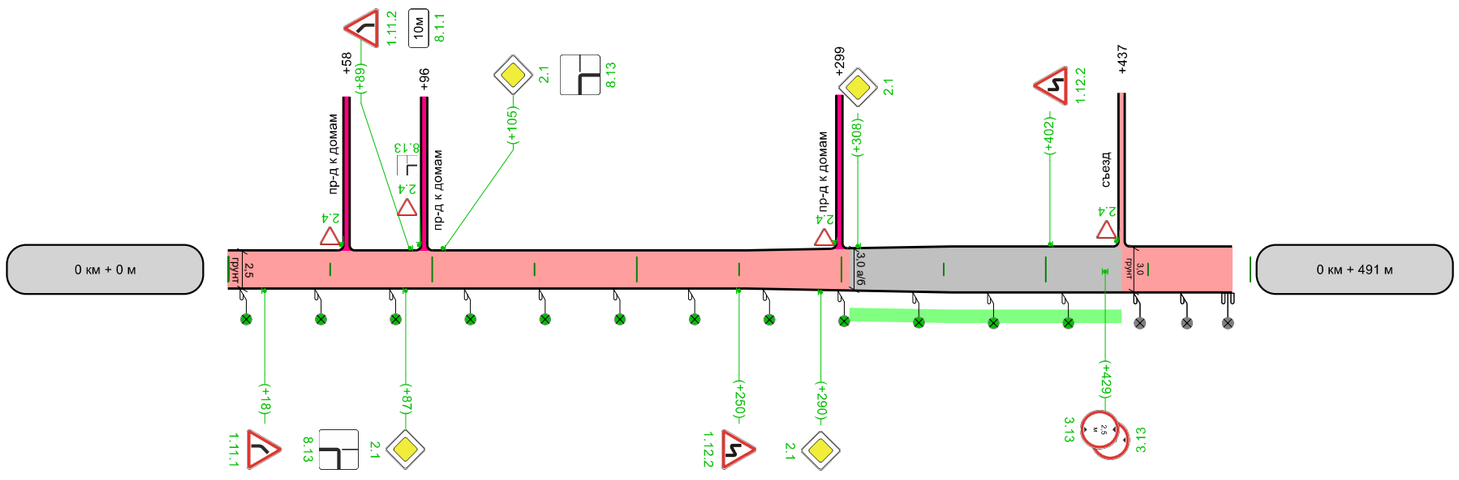

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 304 - 437

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+018	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+089	Требуется установить	1	слева
3	1.12.2	Опасные повороты			0+250	Требуется установить	1	справа
4	1.12.2	Опасные повороты			0+402	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+087	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+290	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+308	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
9	3.13	Ограничение высоты			0+429	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.1.1	Расстояние до объекта			0+089	Требуется установить	1	слева
11	8.13	Направление главной дороги			0+105	Требуется установить	1	слева
12	8.13	Направление главной дороги			0+087	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**13**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+009	0+411		12/12	402	0	Справа
2	0+446	0+469		2/2	0	23	Справа
3	0+446	0+469		2/2	23	0	Справа
4	0+489	0+490		1/2	0	1	Справа
5	0+489	0+490		1/2	1	0	Справа
Итого:				**18/20**	**426**	**24**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+304	0+437		Справа	133	
Итого:					**133**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Донская, д. 9 до жилого дома по ул. Трудовая, д. 23


км 0+000 - км 0+758

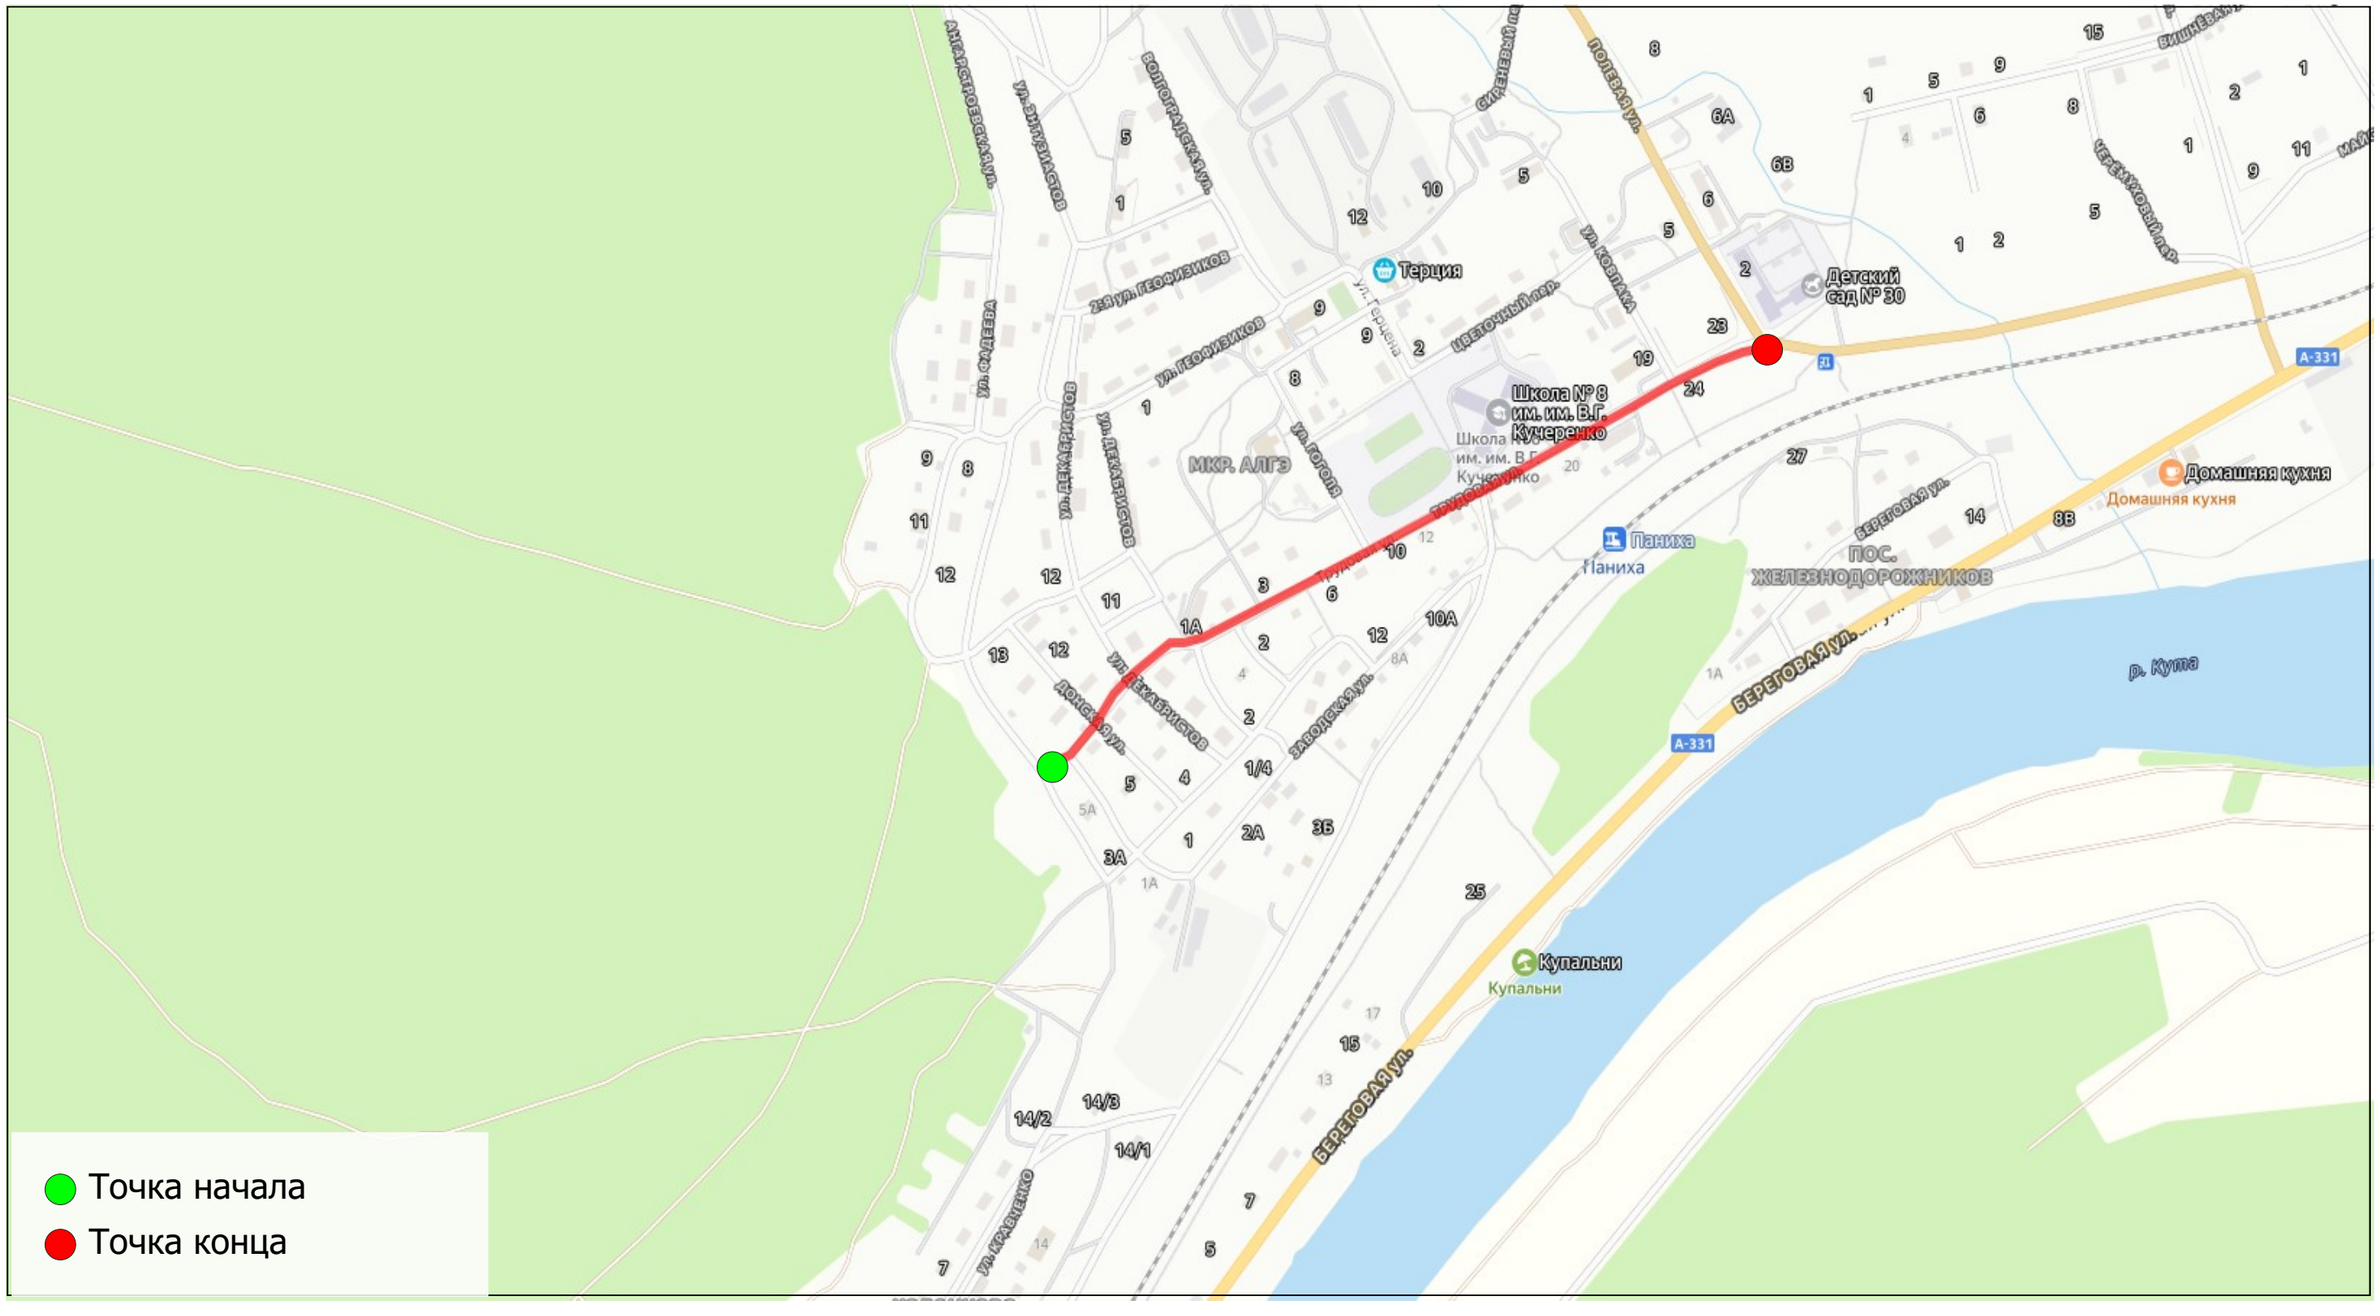

M 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Донская, д. 9 до жилого дома по ул. Трудовая, д. 23

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	31 — 40 — 57 — 35 — R=1939м — 192 — 104 — 223 — 103 — R=4551м — 616 — 17 — 647 — 17 — R=7026м
Кривые в плане	90 — R=102м P=5; a=11° — 136 — 558 — R=798м P=128; a=4° — 618 — 696 — R=835м P=28; a=17°
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 358 - 451 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 451 - 505 | ширина 1,5м, а/б, 505 - 557 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 557 - 758
Характеристики проезжей части	0 — 4,20 — 3,70 — 115 — 3,50 — 176 — 4,50 — 476 — 6,00

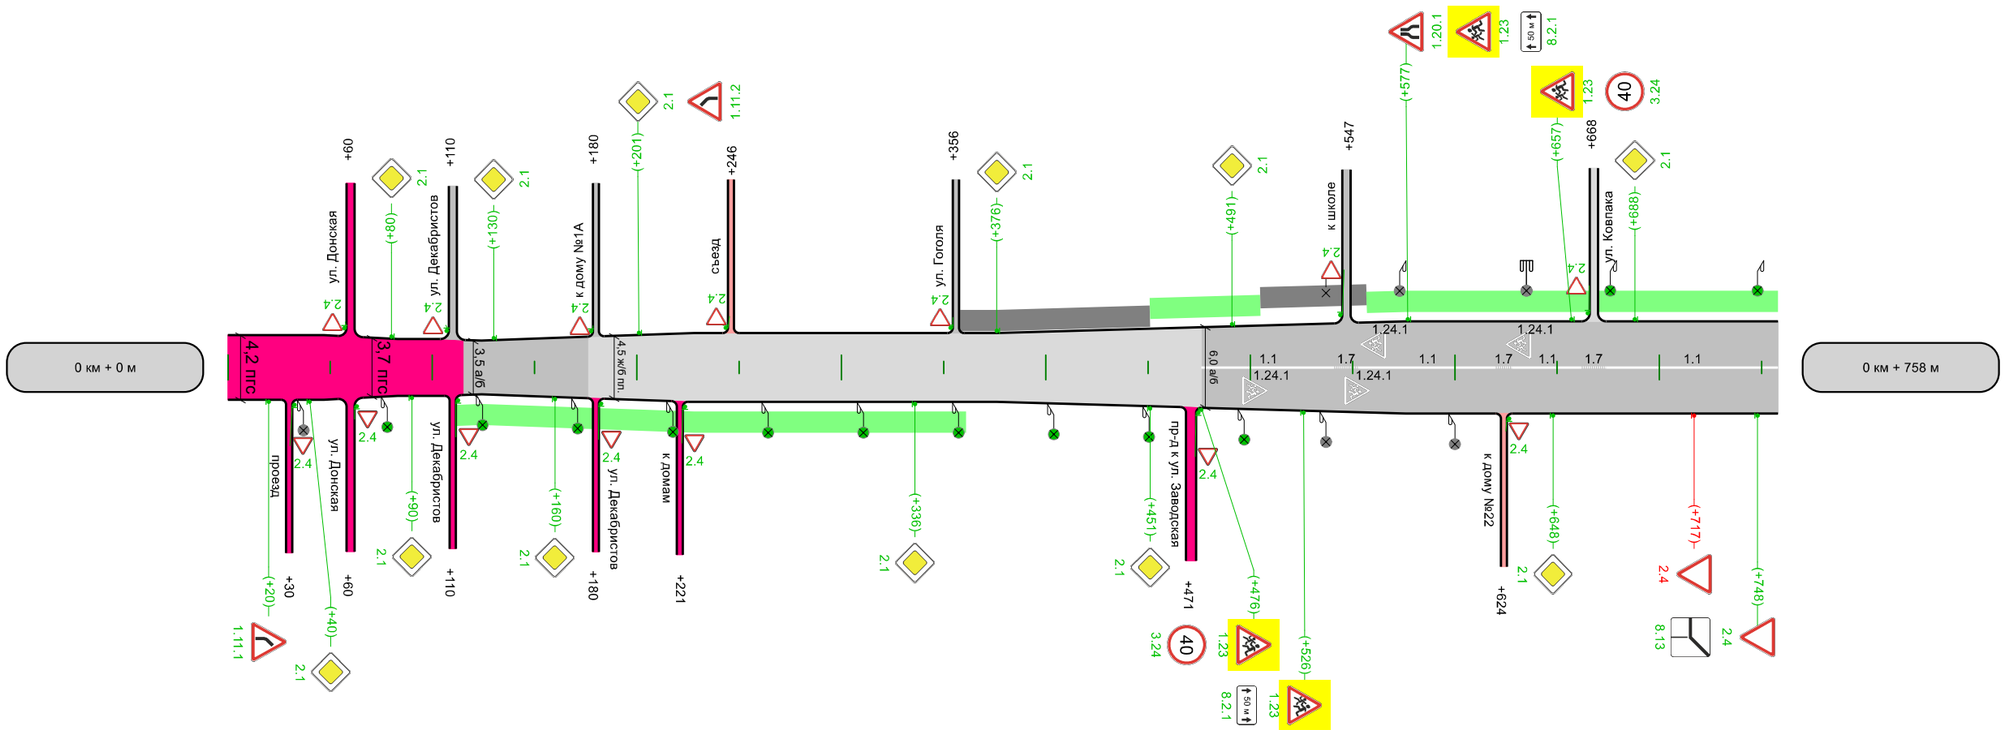

	осевая		1.1 476 - 541	1.7 541 - 553	1.1 553 - 620	1.7 620 - 628	1.1 628 - 662	1.7 662 - 674	1.1 674 - 758	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 111 - 361								

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.7(м)	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	1.550	
Ширина, м	0.10	0.10	1.00	
1	2	3	4	5
0 - 1	250,000	32,000	4,000	
ИТОГО	250,000	32,000	4,000	
ЛИН.КМ	0,250	0,032	0,004	
ПРИВЕД.КМ	0,250	0,016	0,006	
ПЛОЩАДЬ	25,000	1,600	6,200	32,800

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+020	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+201	Требуется установить	1	слева
3	1.20.1	Сужение дороги			0+577	Требуется установить	1	слева
4	1.23	Дети			0+476	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети			0+526	Требуется установить	1	справа
6	1.23	Дети			0+577	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети			0+657	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+080	Требуется установить	1	слева
10	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	слева
12	2.1	Главная дорога			0+160	Требуется установить	1	справа
13	2.1	Главная дорога			0+201	Требуется установить	1	слева
14	2.1	Главная дорога			0+336	Требуется установить	1	справа
15	2.1	Главная дорога			0+376	Требуется установить	1	слева
16	2.1	Главная дорога			0+451	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+491	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+648	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+688	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу			0+717	Демонтировать	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу			0+748	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
22	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+476	Требуется установить	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+657	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
24	8.2.1	Зона действия			0+526	Требуется установить	1	справа
25	8.2.1	Зона действия			0+577	Требуется установить	1	слева
26	8.13	Направление главной дороги			0+748	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**25**	
		Всего:					**25**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+037	0+038	Жилая застройка	1/1	0	1	Справа
2	0+078	0+497	Жилая застройка	10/10	419	0	Справа
3	0+537	0+538	Жилая застройка	1/1	0	1	Справа
4	0+537	0+573	Жилая застройка	2/2	0	36	Слева
5	0+600	0+601	Жилая застройка	1/1	0	1	Справа
6	0+635	0+636	Жилая застройка	1/2	0	1	Слева
7	0+635	0+636	Жилая застройка	1/2	1	0	Слева
8	0+676	0+748	Жилая застройка	2/2	72	0	Слева
Итого:				**19/21**	**492**	**40**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+111	0+361	Жилая застройка	Справа	250	
2	0+358	0+451	Жилая застройка	Слева		93
3	0+451	0+505	Жилая застройка	Слева	54	
4	0+505	0+557	Жилая застройка	Слева		52
5	0+557	0+758	Жилая застройка	Слева	201	
Итого:					**505**	**145**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от земельного участка по ул. Пришвина до жилого дома по ул. Седова, д. 15а

1-й участок: км 0+000 - км 0+346
2-й участок: км 0+000 - км 0+331

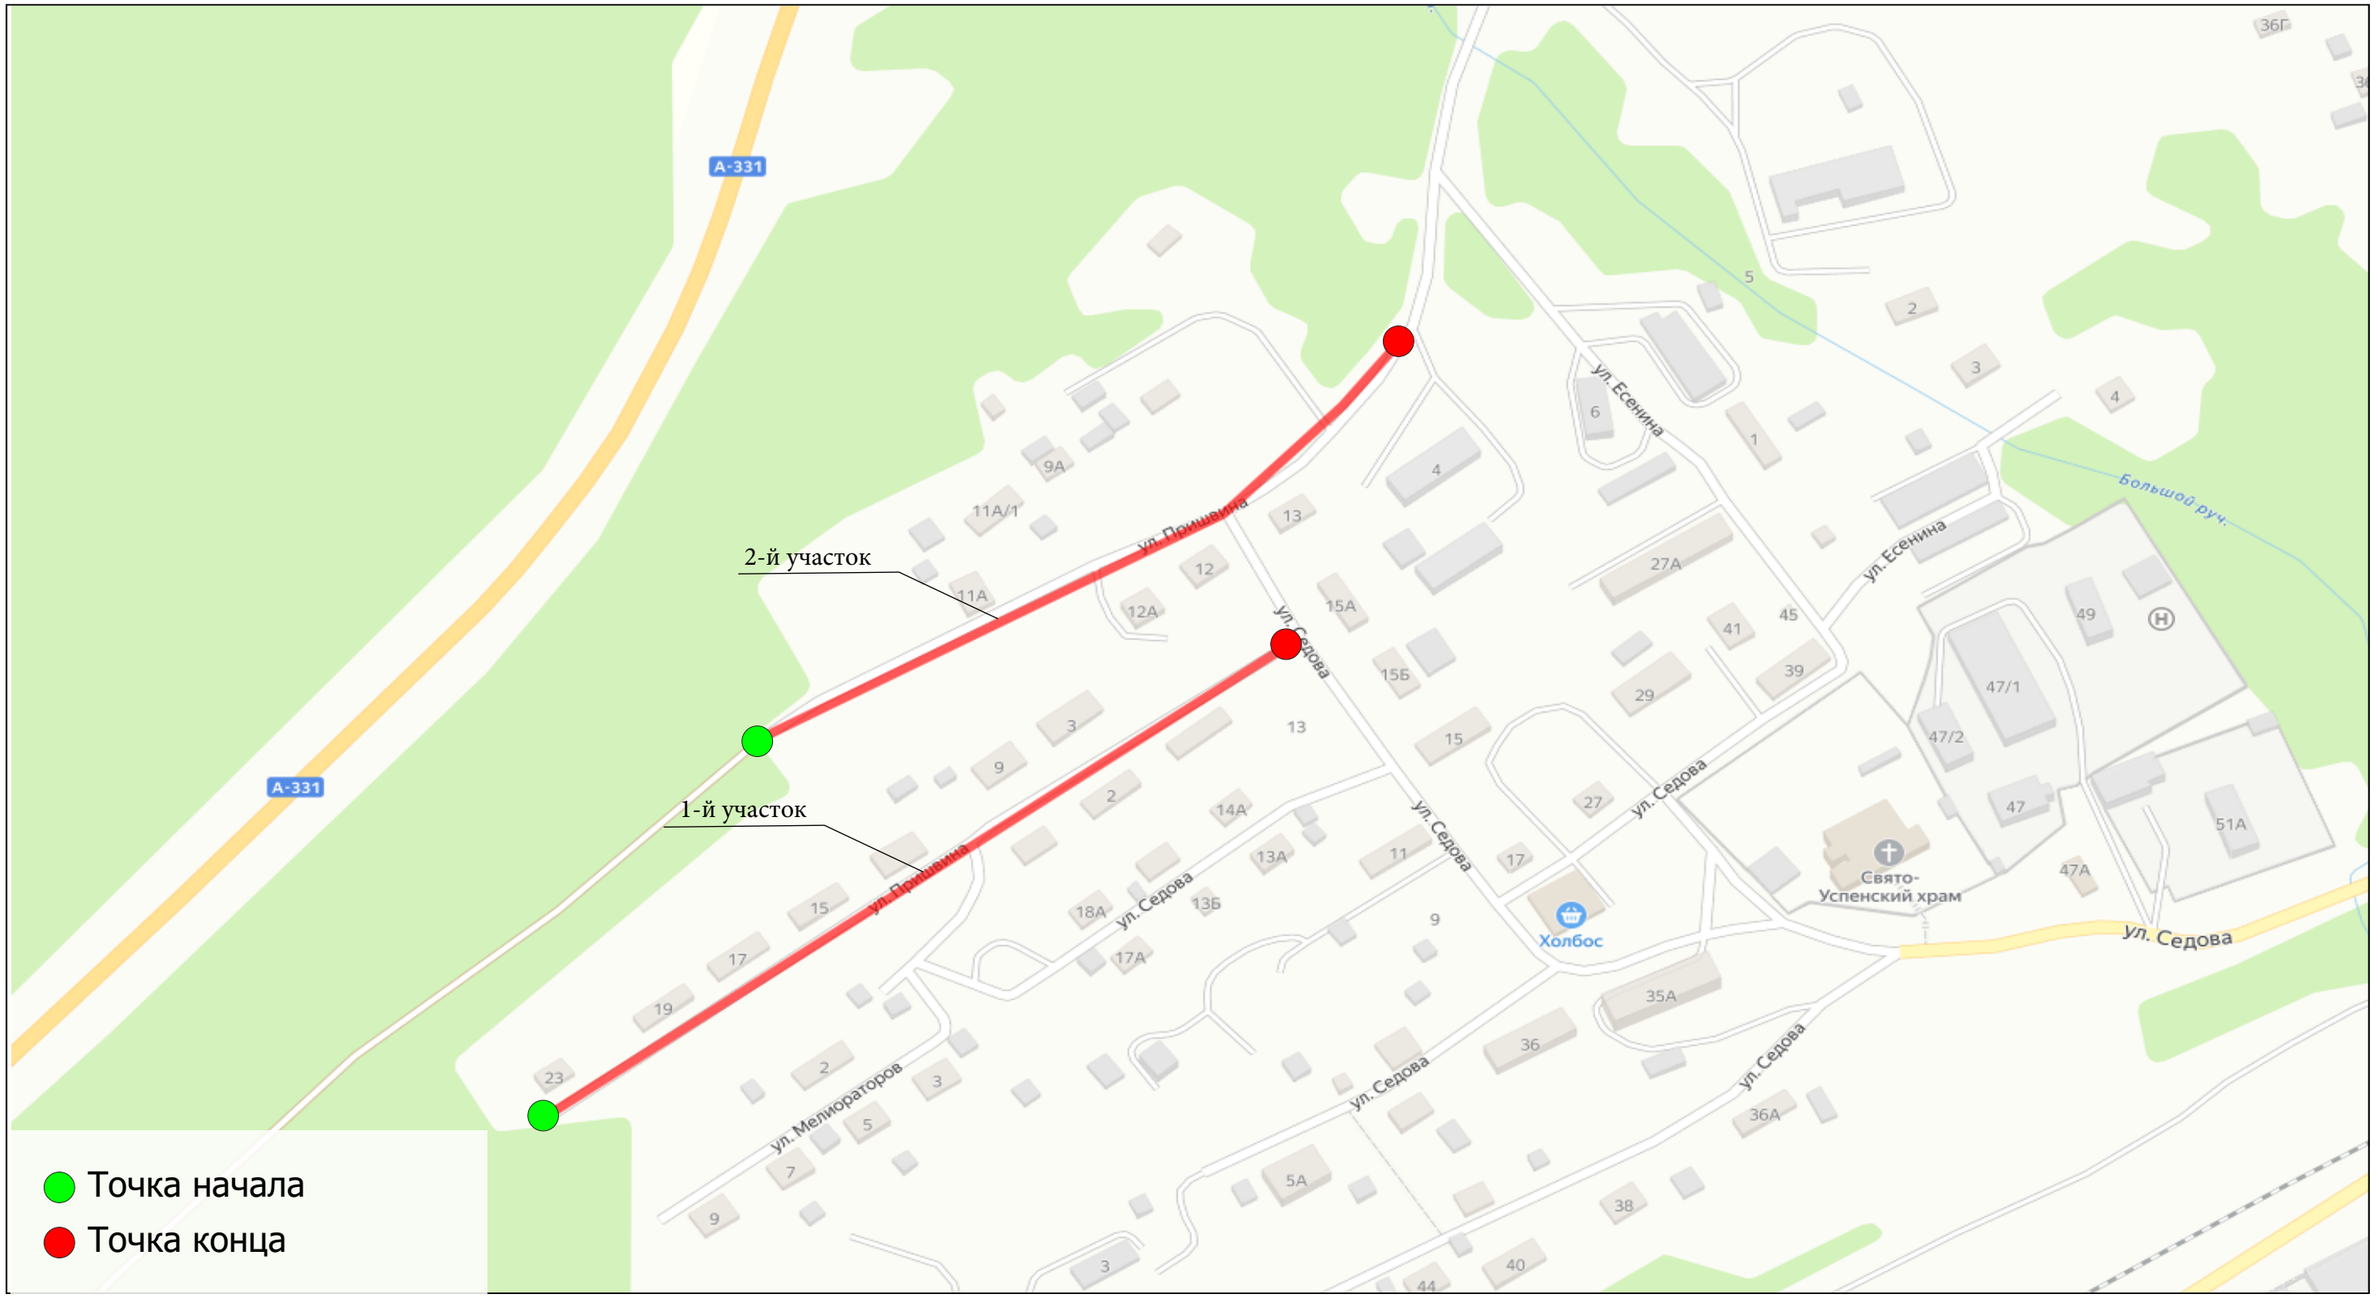

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	45 — 264 — 45 — R=3961м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 175 — 3,00

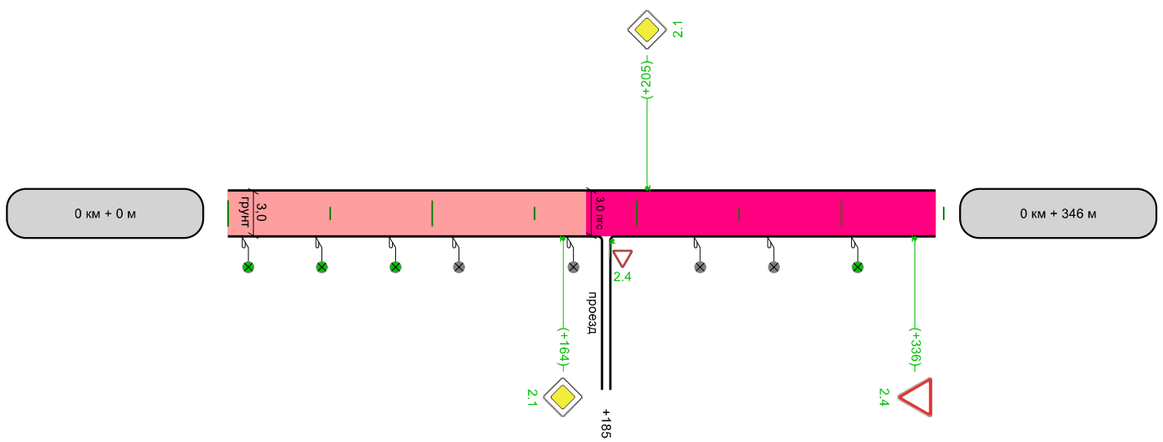

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+164	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+205	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+336	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+082	Жилая застройка	3/3	72	0	Справа
2	0+113	0+169	Жилая застройка	2/2	0	56	Справа
3	0+231	0+267	Жилая застройка	2/2	0	36	Справа
4	0+308	0+308	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
Итого:				**8/8**	**72**	**92**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 — 43 — 74 — 73 — 40 — 40 — 61 — 61 — 304 2 — R=2545м — 82 — 103 — R=2081м — 172 — 194 — R=2720м — 251 — 274 — R=3278м
Кривые в плане	R=926м 107 R=72; a=71 136 — 160 — R=873м P=11; a=47° — 304
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, 146 - 331
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 146 — 3,50

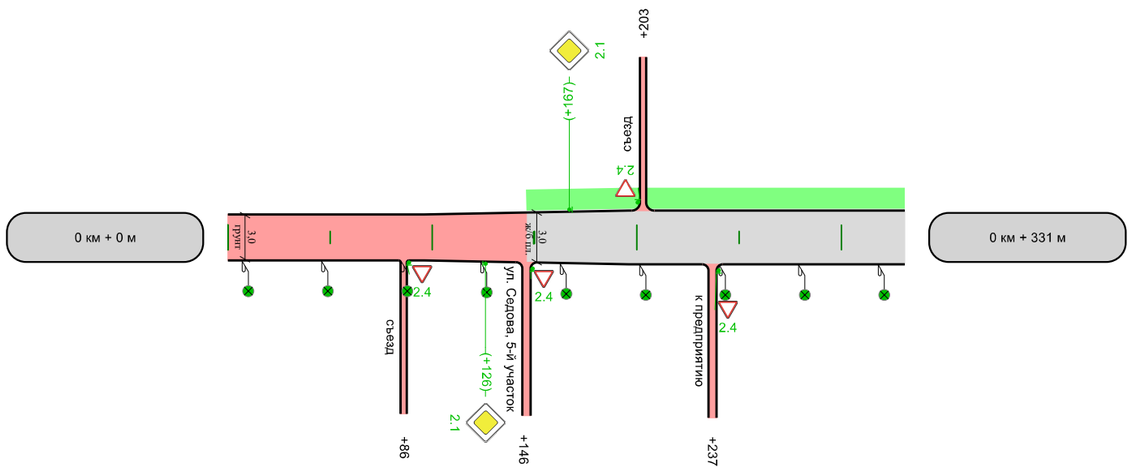

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+126	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+167	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+321	Жилая застройка	9/9	311	0	Справа
Итого:				**9/9**	**311**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+146	0+331	Жилая застройка	Слева	185	
Итого:					**185**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Пугачева, д. 30 до жилого дома по ул. Пугачева, д. 1
км 0+000 - км 0+492

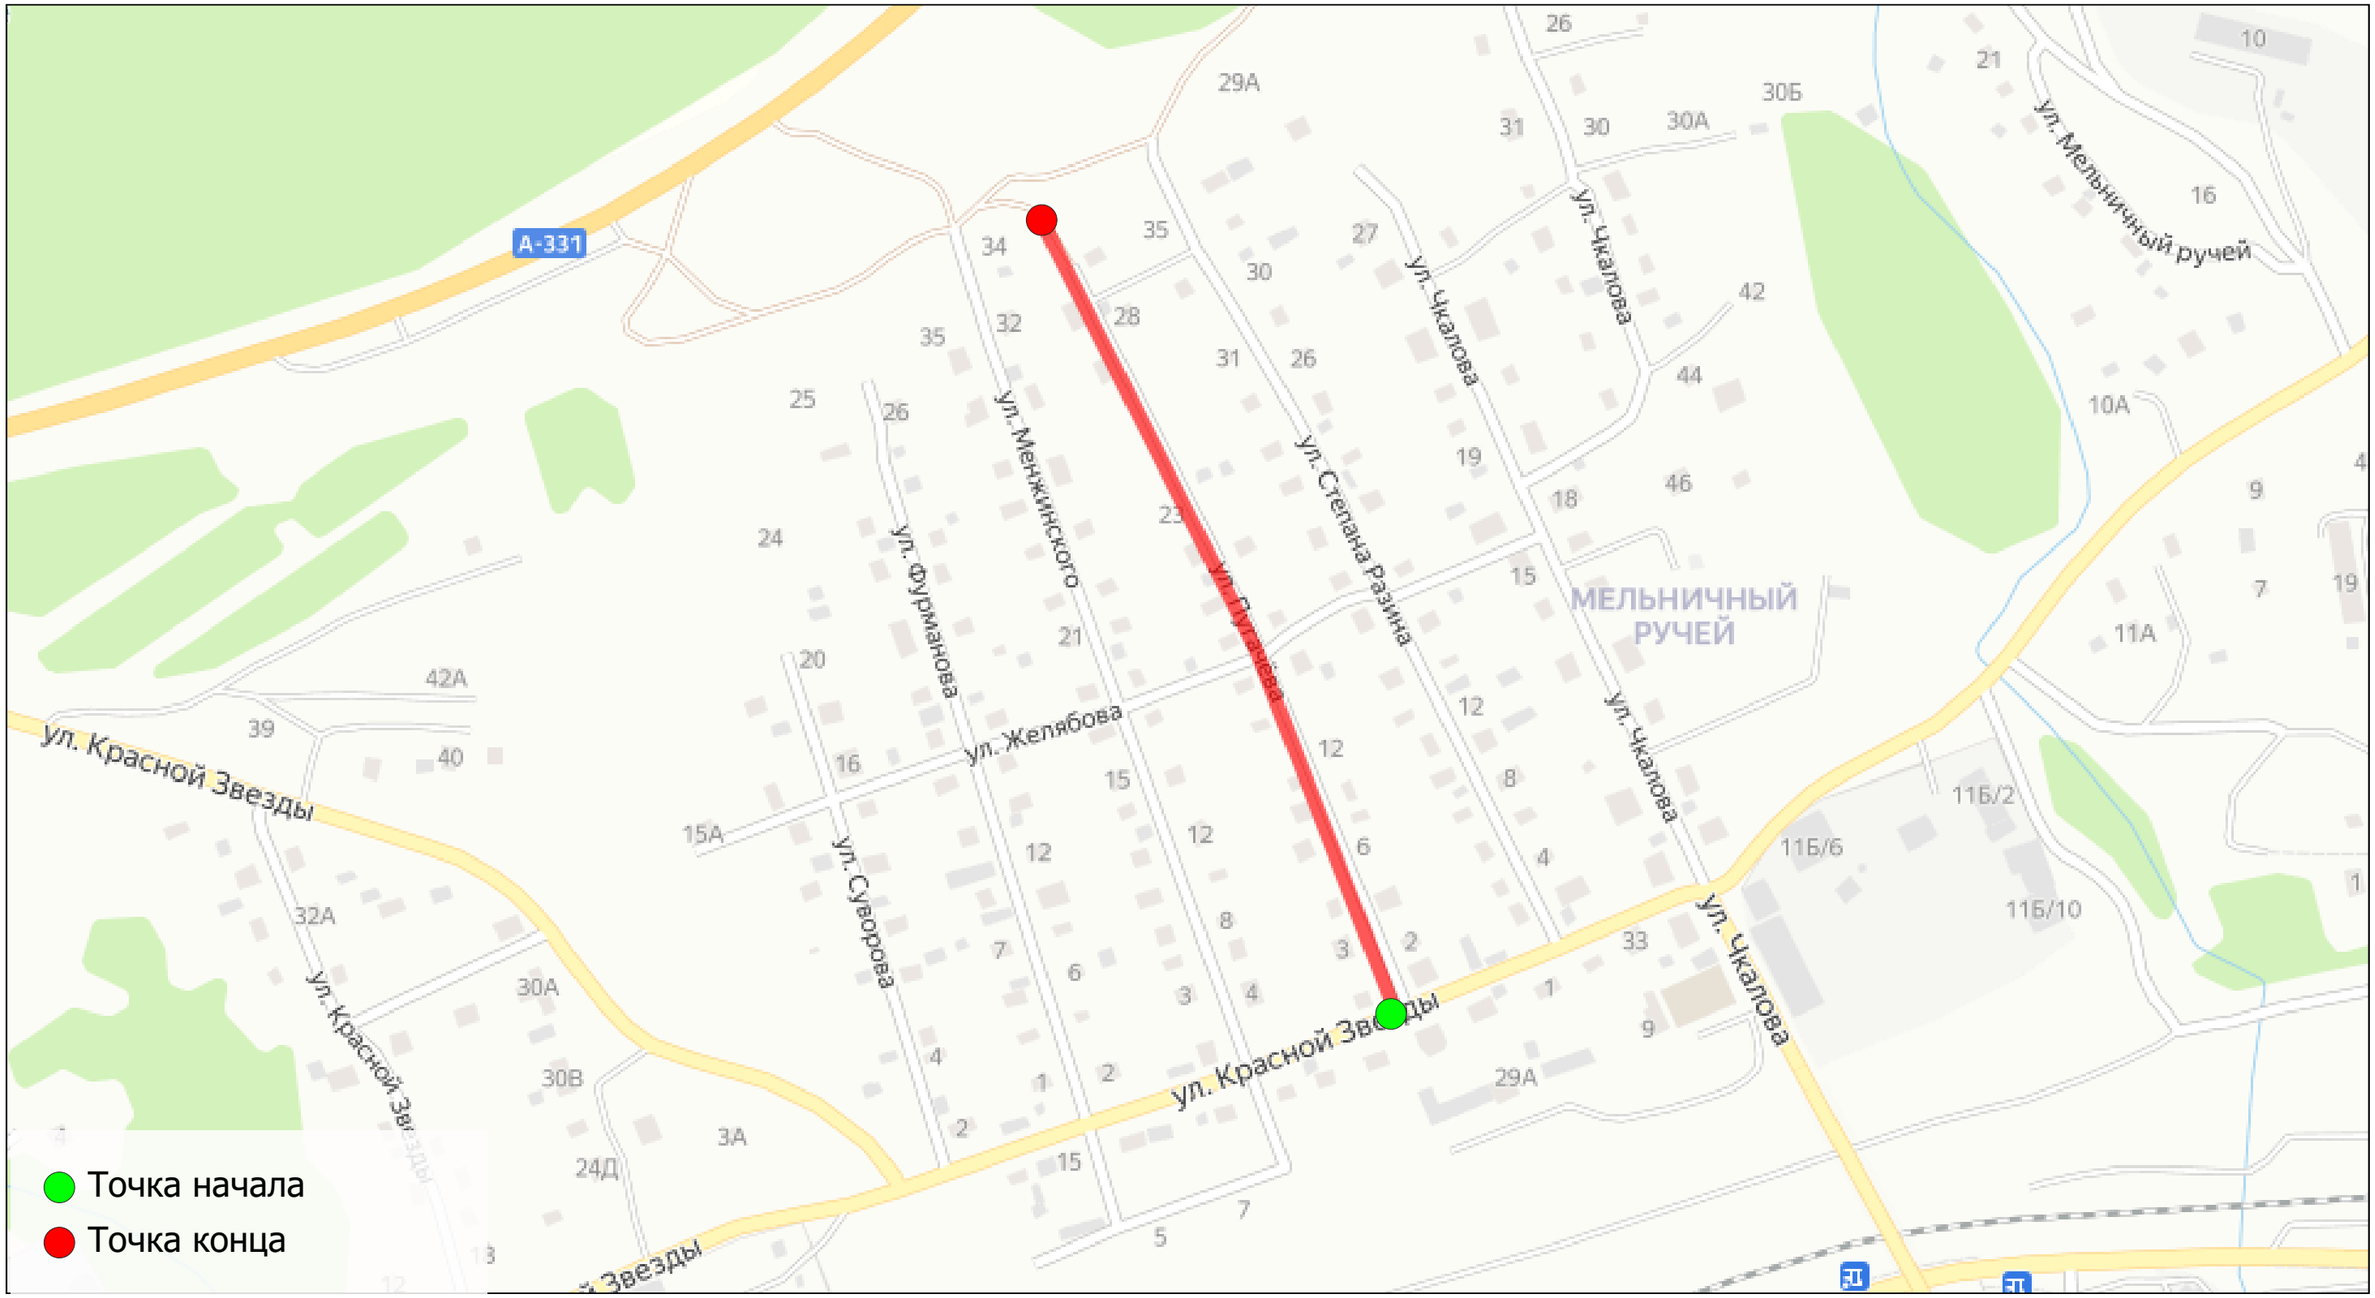

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	145 — 153 (73) — R=3745м — 105 (249)
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,50 — 333 — 3,00

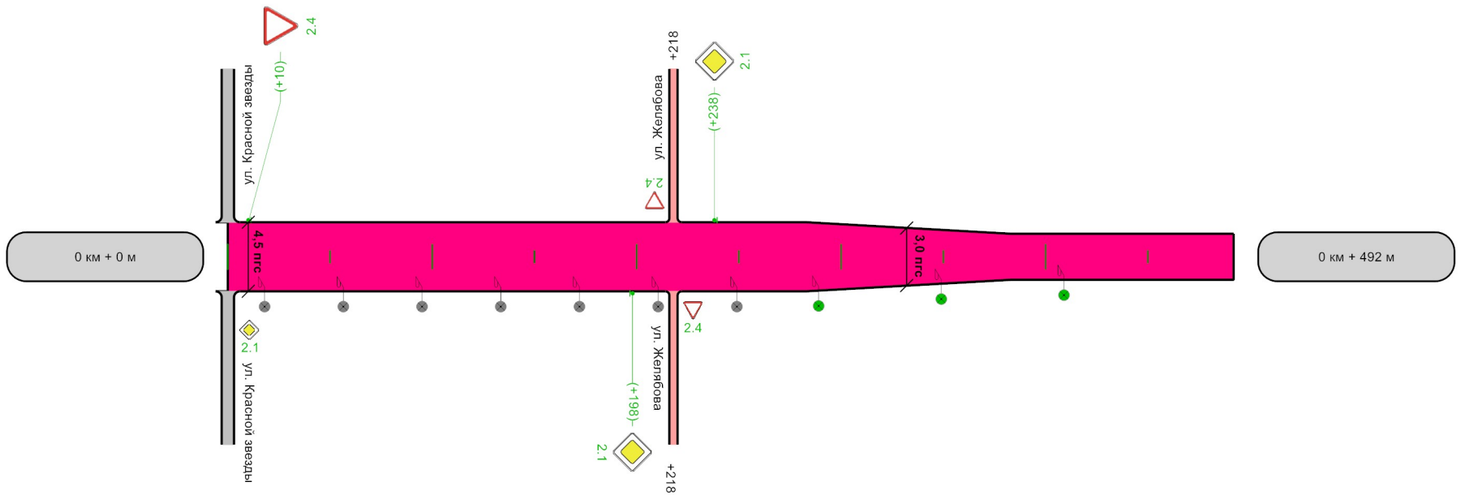

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+198	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+238	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+218	Требуется установить	1	слева на пересечении
5	2.4	Уступите дорогу			0+218	Требуется установить	1	справа на пересечении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+018	0+249	Населенный пункт	7/7	0	231	Справа
2	0+289	0+409	Населенный пункт	3/3	120	0	Справа
Итого:				**10/10**	**120**	**231**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Суворова, д. 20 до жилого дома по ул. Суворова, д.2
км 0+000 - км 0+313

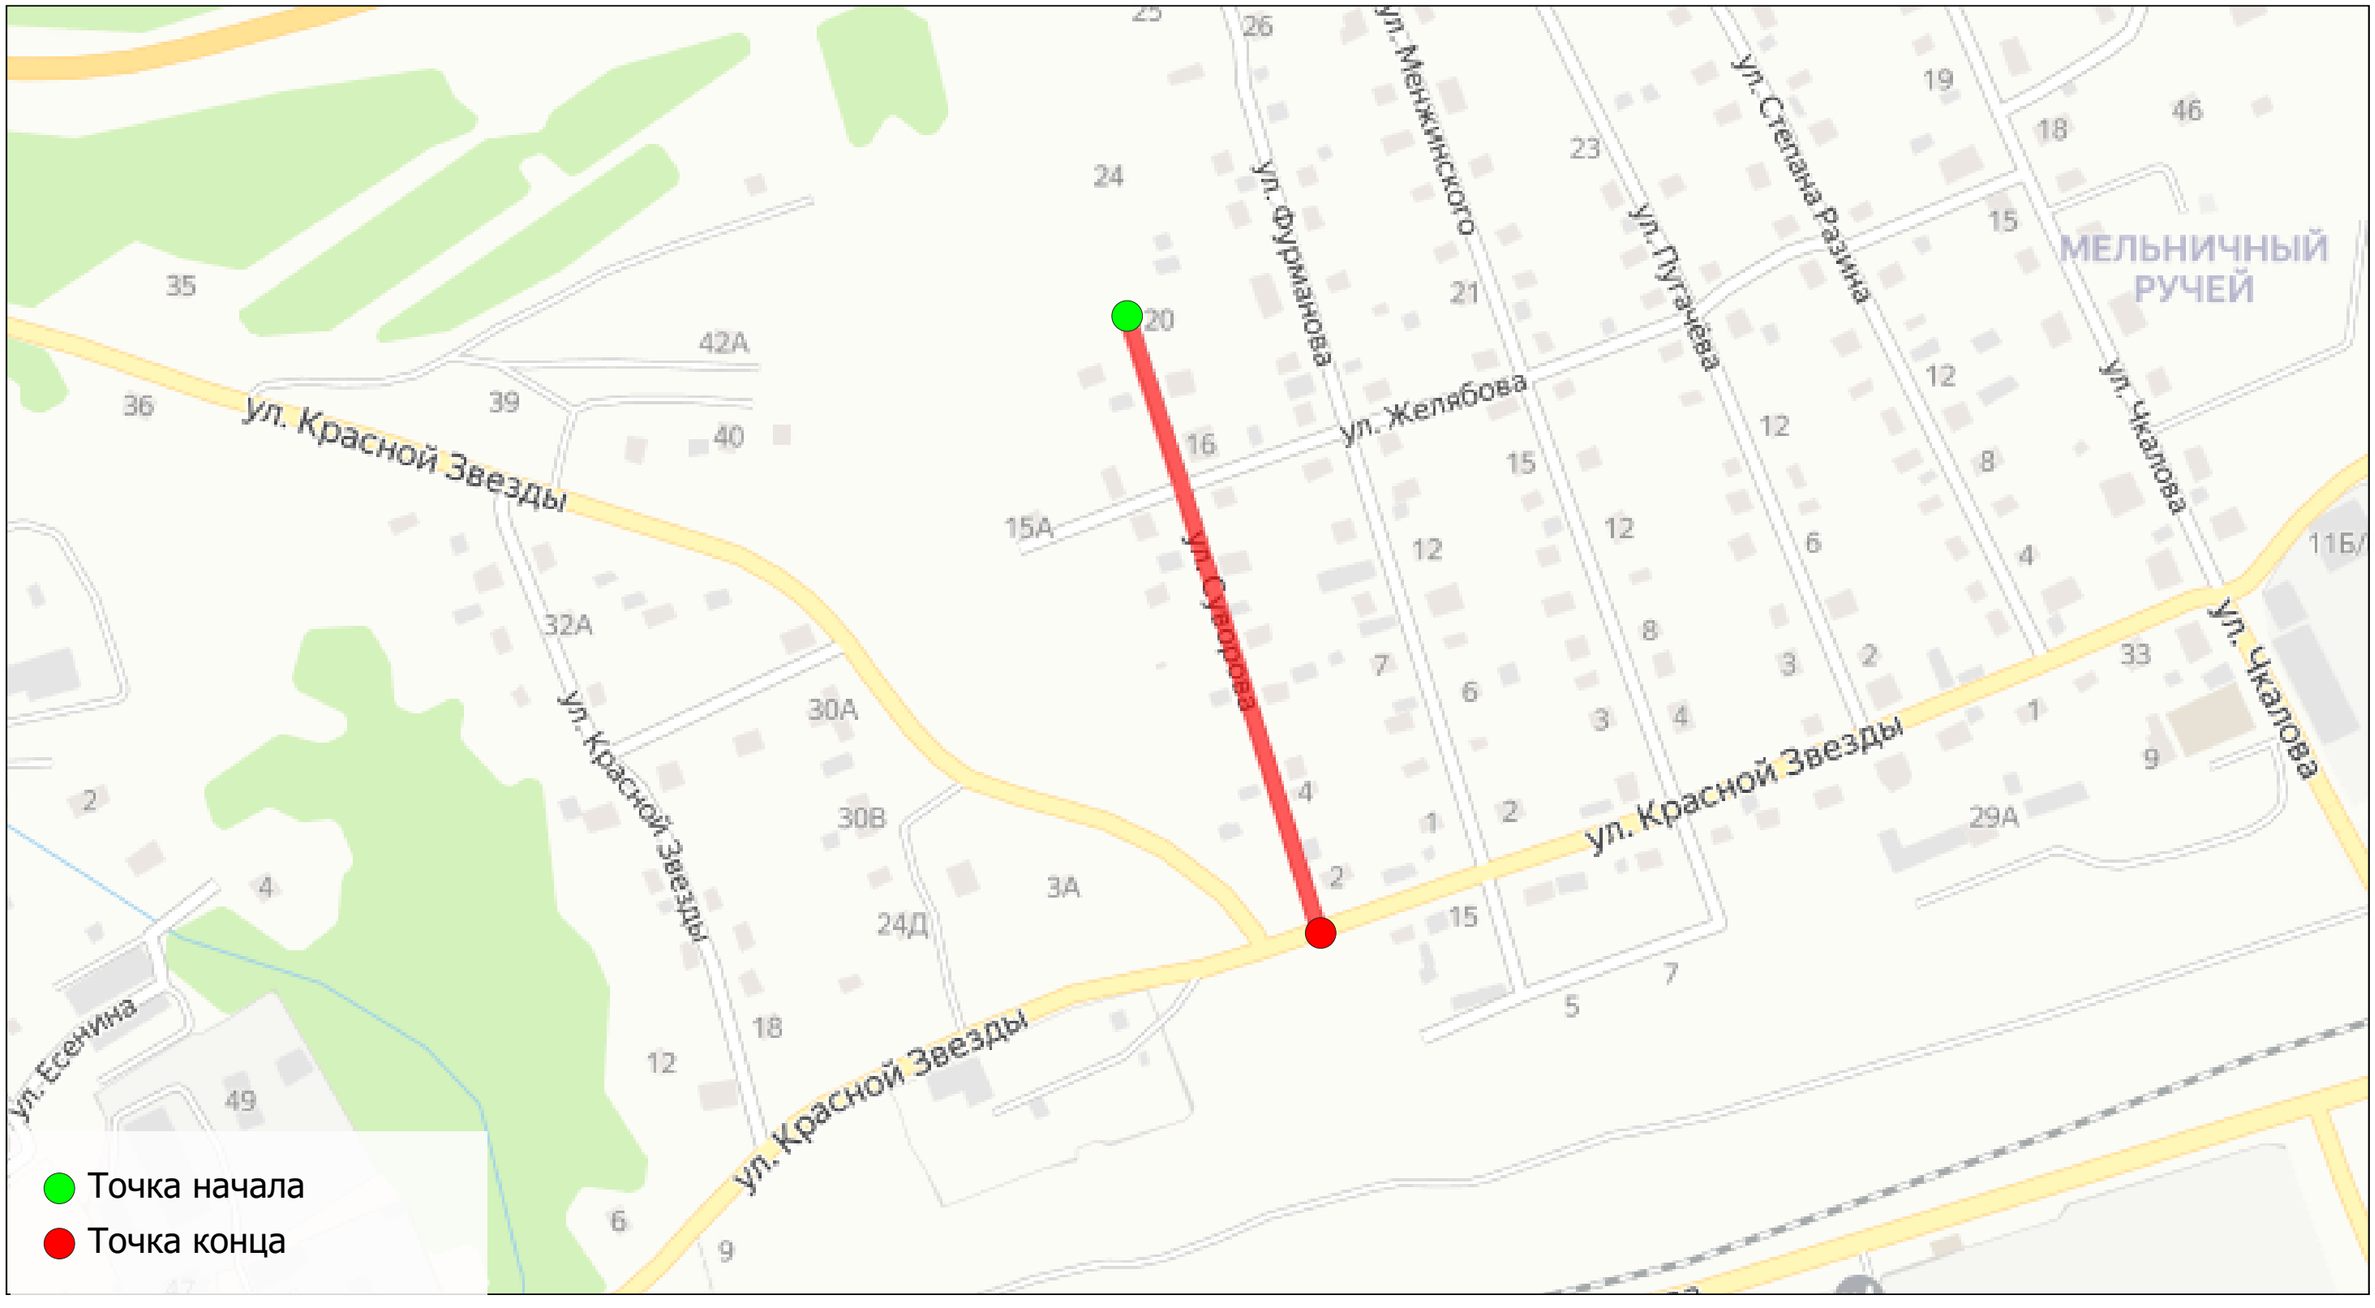

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле	126				
Кривые в плане					
Тротуары слева					
Характеристики проезжей части	0	3,00	97	4,00	

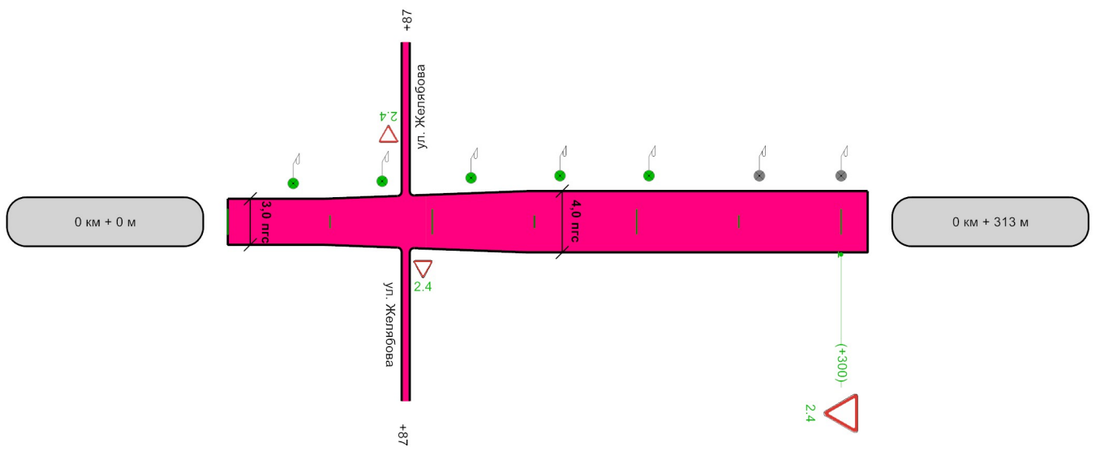

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+300	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+032	0+206	Населенный пункт	5/5	174	0	Слева
2	0+260	0+300	Населенный пункт	2/2	0	40	Слева
Итого:				**7/7**	**174**	**40**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. СУ-81 от автодороги ул. Зелёная до автодороги ул. Коммунальная

1-й участок: км 0+000 - км 0+191
2-й участок: км 0+000 - км 0+097

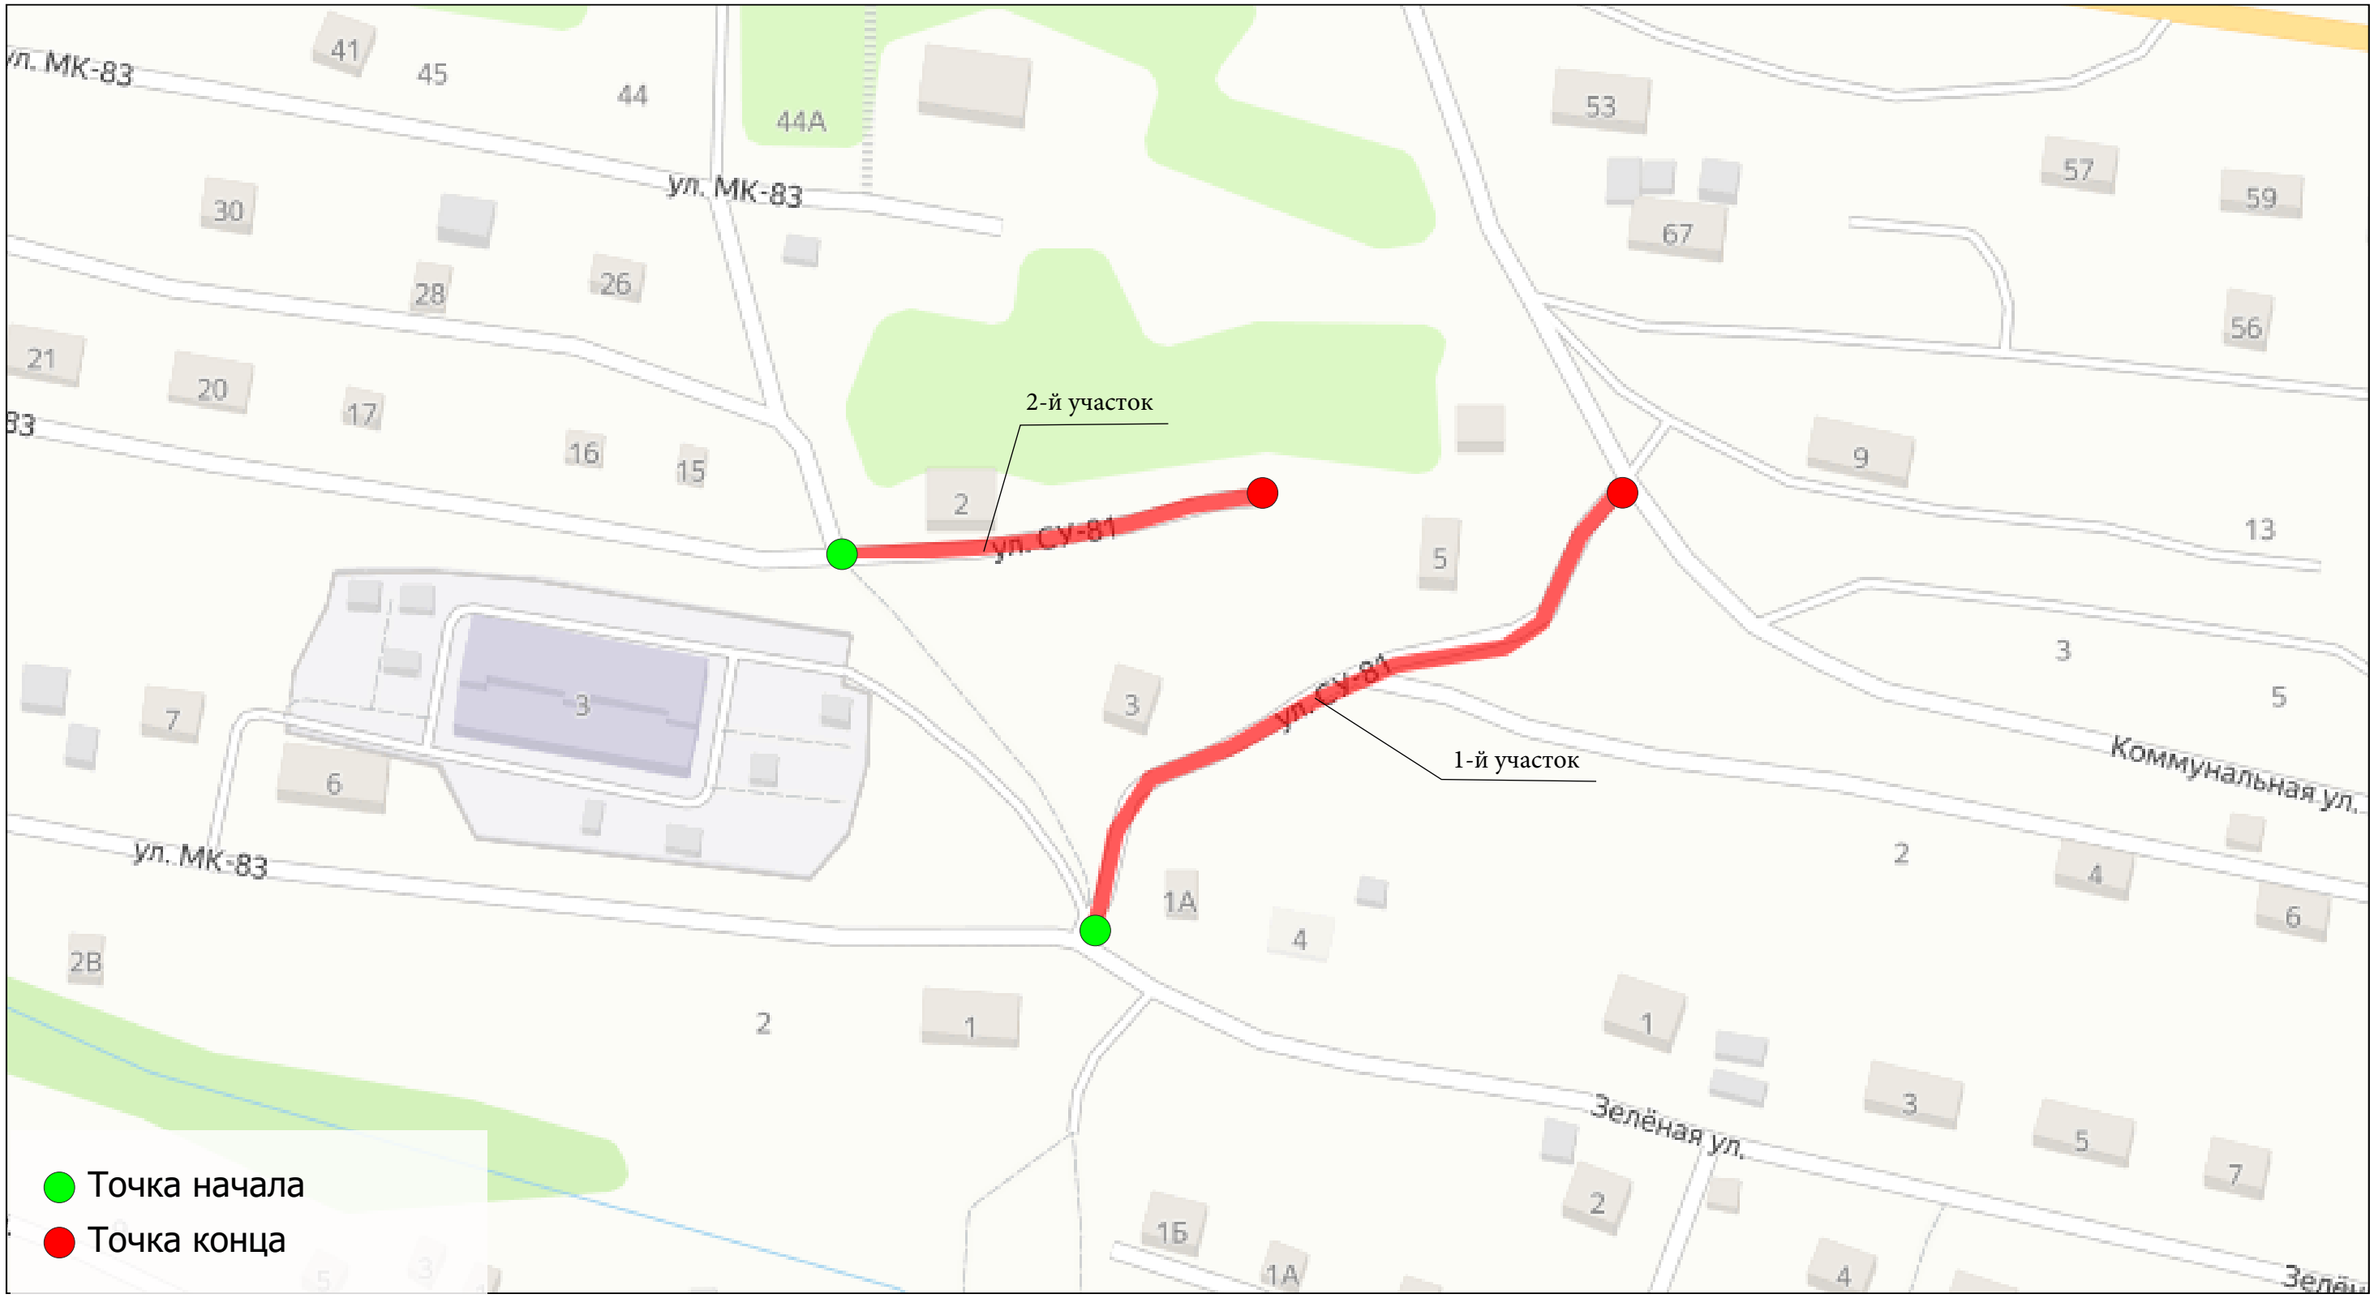

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 135 R=1605м 85 83 105 84 R=1924м 125 184
Кривые в плане	R=10м 26 46 135 155
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

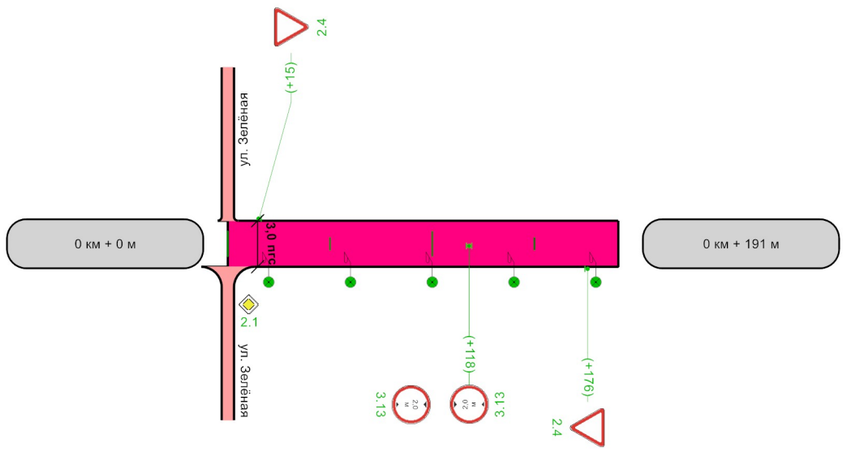

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+176	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.13	Ограничение высоты			0+118	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+180	Населенный пункт	5/5	160	0	Справа
Итого:				**5/5**	**160**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	57
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

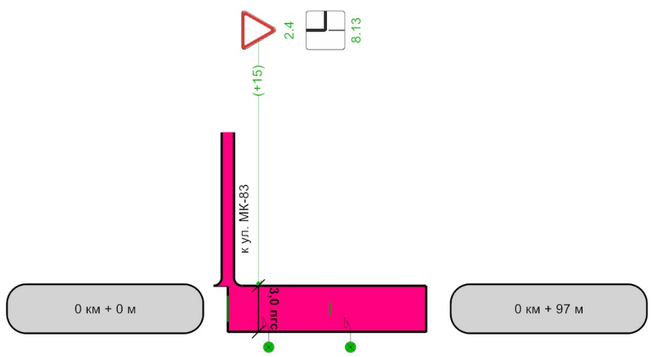

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
2	8.13	Направление главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+060	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**2/2**	**40**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Судостроительная от территории МОУ СОШ №10 д. №70 по ул. Пушкина до жилого дома по ул. Халтурина, д. 66

1-й участок: км 0+000 - км 0+183
2-й участок: км 0+000 - км 0+102

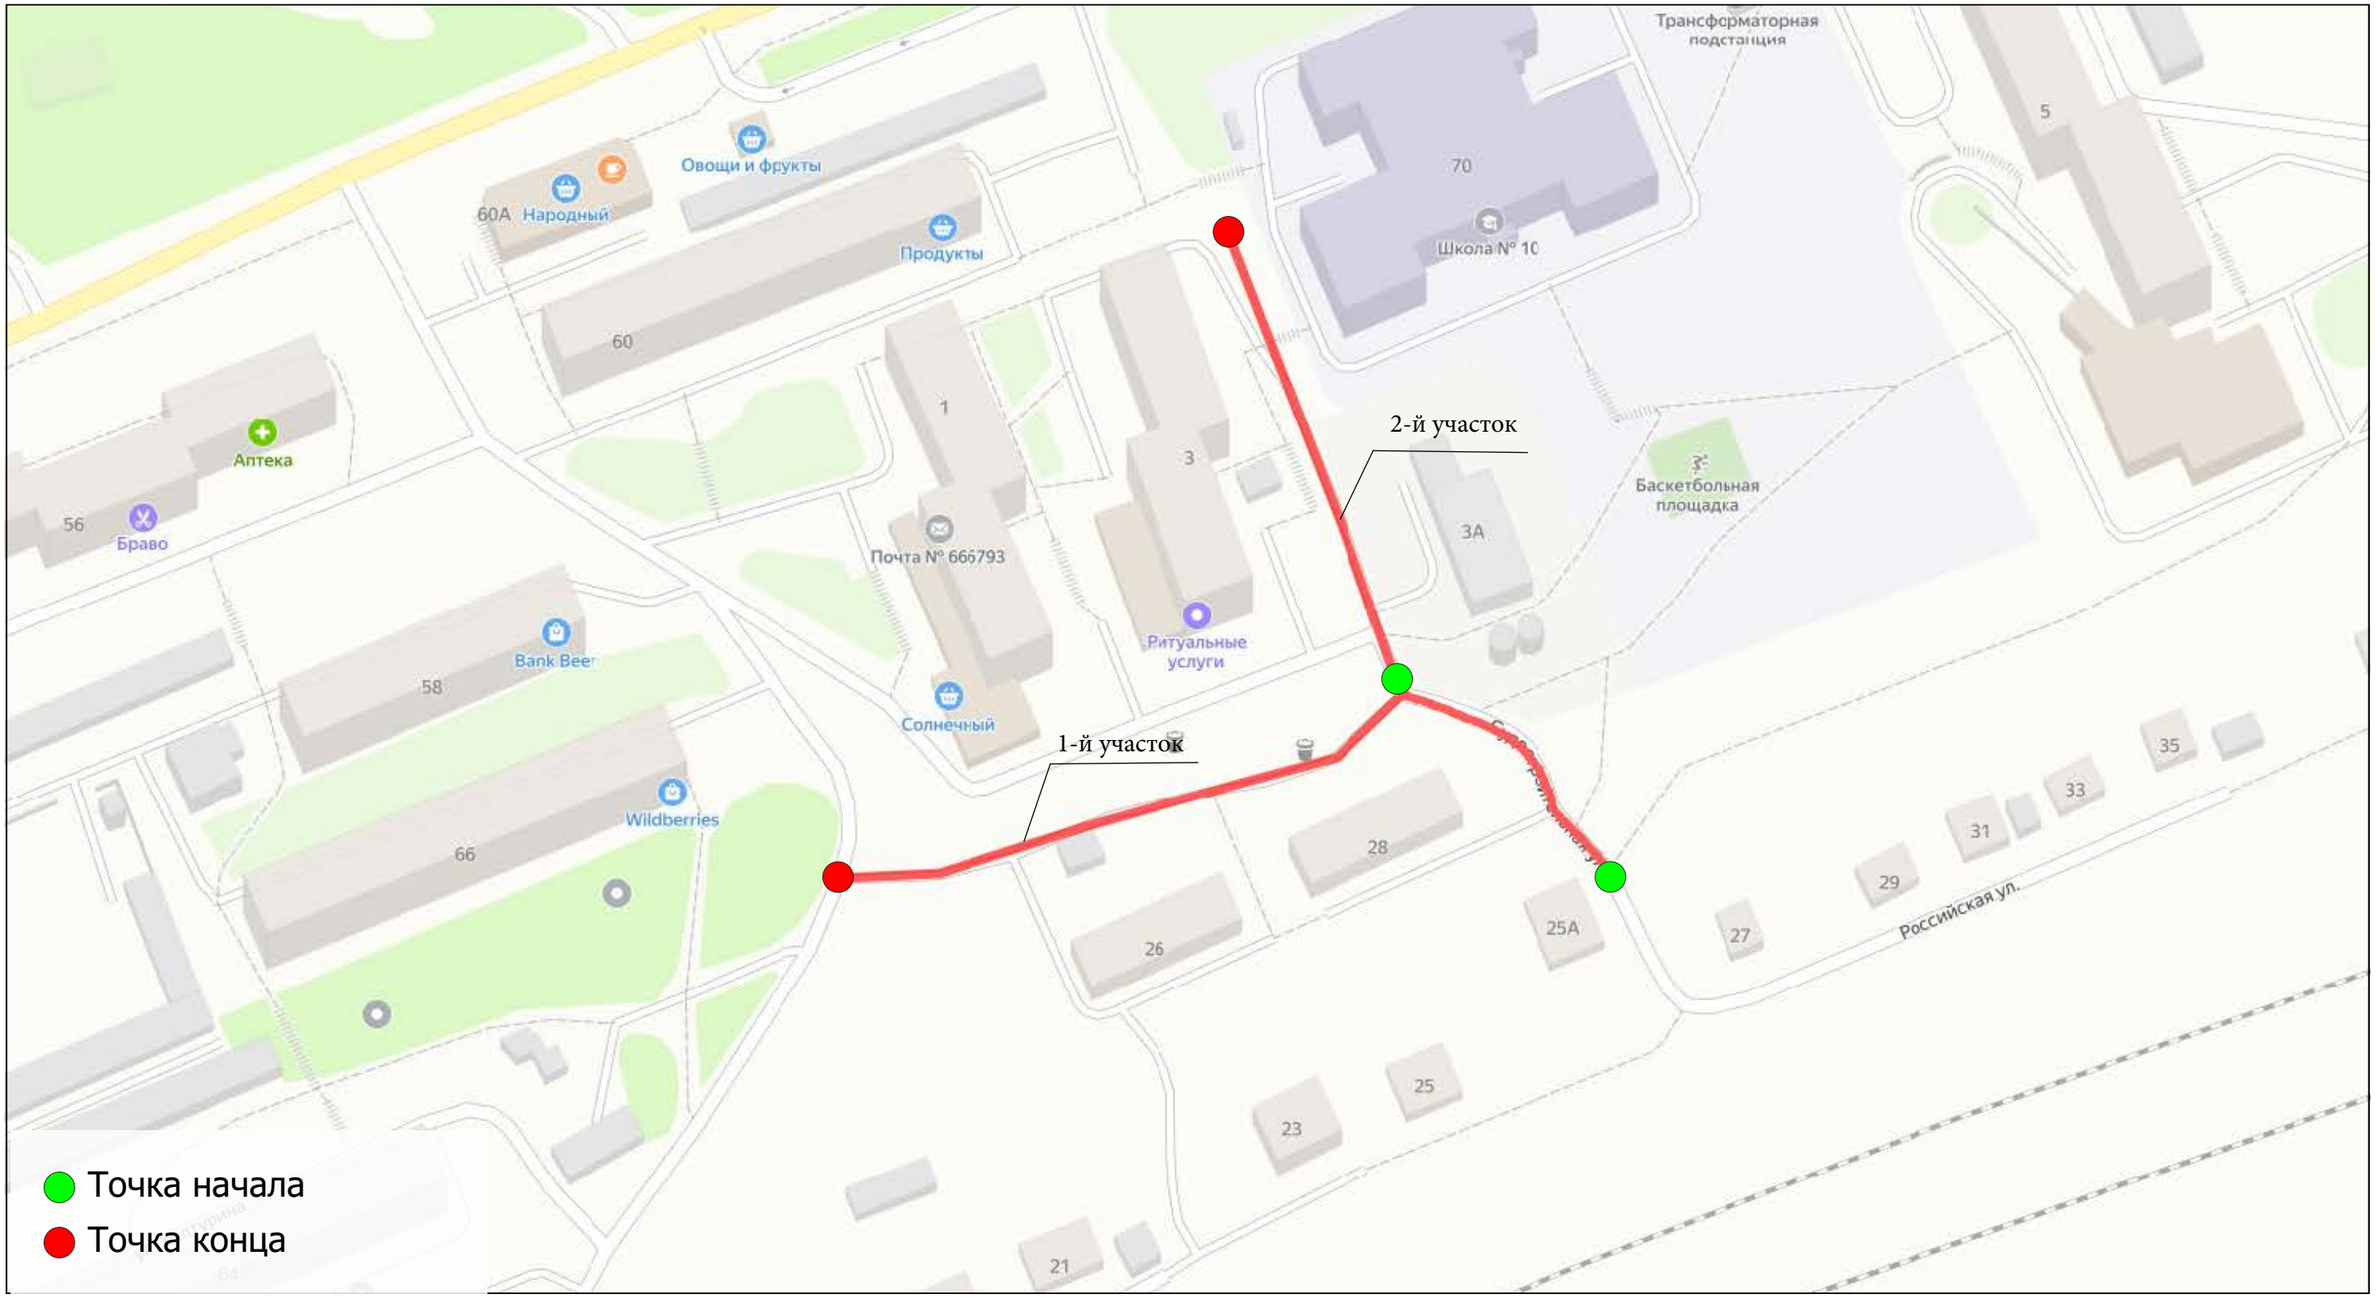

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	95 — 29 — 106 — R=1690м — 80 — 120
Кривые в плане	30 — R=27м — 60 — P=0; a=80°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,50

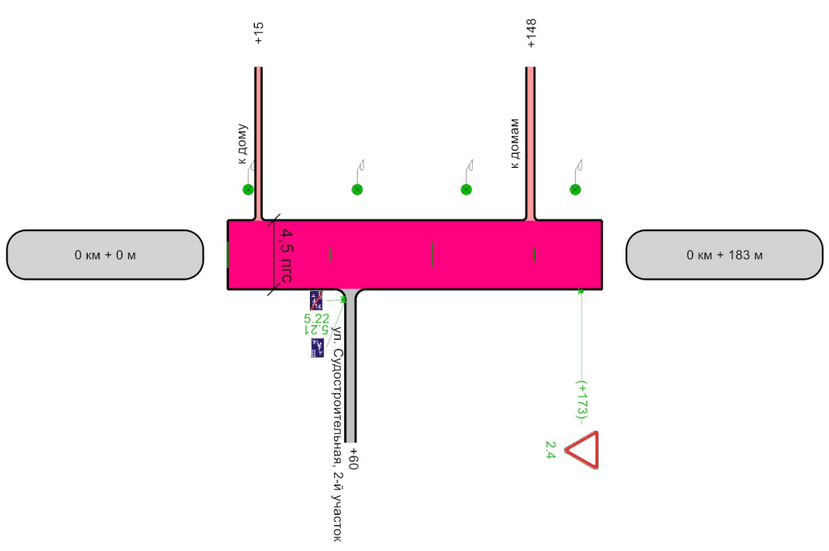

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+173	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+170	Населенный пункт	4/4	160	0	Слева
Итого:				**4/4**	**160**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 R=4010м 70 1 5
Кривые в плане	2 R=68м 32 P=2; a=25°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00

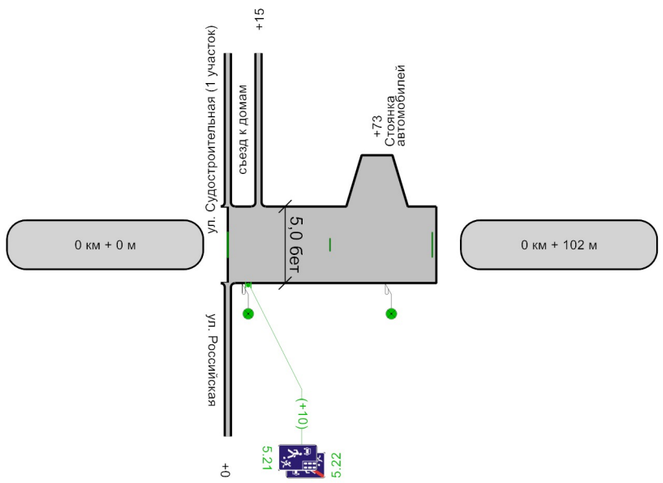

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки особых предписаний						
1	5.21	Жилая зона			0+010	Требуется установить	1	справа
2	5.22	Конец жилой зоны			0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+080	Населенный пункт	2/2	70	0	Справа
Итого:				**2/2**	**70**	**0**	

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
