394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 8, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога от жилого дома по ул. Жуковского, д. 85, по ул. Ленрабочих до жилого дома по ул. Коммунистическая, д.7а	6
5.	Автодорога от примыкания с автодорогой ул. Радищева до автодороги ул. Ленрабочих	12
6.	Автодорога от жилого дома по ул. Пролетарская № 1 до жилого дома № 16 по ул. Пролетарская	16
7.	Автодорога от жилого дома по ул. Российская, д. 3 до жилого дома по ул. Российская, д. 41	33
8.	Автодорога от нежилого здания по ул. Пролетарская, 1а (переулок Хорошилова) до нежилого здания по ул. Речников, 2А	42
9.	Автодорога от жилого дома по ул. Седова, д. 2в до примыкания с автодорогой ул. Красной звезды	46
10.	Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до жилого дома по ул. Чкалова, 5	64
11.	Автодорога от жилого дома по ул. Советская, д. 99, по ул. Партизанская до жилого дома по ул. Партизанская, д. 37	77
12.	Автодорога от жилого дома по ул. Первомайская, д. 71 до жилого дома по ул. Щорса, д. 32	83
13.	Автодорога от производственной базы по ул. Герцена, 12 до автодороги ул. Декабристов	88
14.	Автодорога от жилого дома по ул. 2-я Геофизиков д. 2 до жилого дома по ул. 2-я Геофизиков д. 8	92
15.	Автодорога от жилого дома по ул. Губкина д. 2 до жилого дома по ул. Губкина д. 14	95
16.	Автодорога от нежилого здания по ул. Снежная, 1 до здания магазина по ул. Вернадского, 7	98
17.	Автодорога от жилого дома ул. Карпинского, д. 9 до жилого дома ул. Карпинского, д. 14	102
18.	Автодорога от примыкания с автодорогой по ул. 2-я Ледорезная до пересечения с автодорогой по ул. Брагина	107
19.	Автодорога от жилого дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до примыкания с автодорогой по ул. 1-я Ледорезная	113
20.	Автодорога от жилого дома по ул. Октябрьская, д. 2 до жилого дома по ул. Октябрьская, д. 44	118
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Снежная, д.13 до жилого дома по ул. Снежная, д. 3	123
22.	Автодорога от жилого дома по ул. Ферсмана, д. 1 до жилого дома по ул. Ферсмана, д. 7	130
23.	Автодорога от жилого дома по ул. Чайковского, д. 4 до жилого дома по ул. Чайковского, д. 66	133
24.	Автодорога от жилого дома по ул. Чехова д. 1а до жилого дома по ул. Чехова д. 63	138
25.	Автодорога от земельного участка по ул. Ярактинская, 3 до жилого дома по ул. Ярактинская, д. 25	143
26.	Автодорога от жилого дома по ул. Нахимова, д. 19 до жилого дома по ул. Радищева, д. 22	146
27.	Автодорога от жилого дома по ул. Озерная, №1 до жилого дома по ул. Озерная, № 9	149
28.	Автодорога от жилого дома по ул. Маяковского, д. 53 до территории МОУ СОШ № 6 по ул. Шерстянникова, 3	152
29.	Автодорога от земельного участка по ул. Кутузова, 2 до жилого дома по пер. Речников,17а	155
30.	Обосновывающая часть ПОДД	160

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги

Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Жуковского, д. 85, по ул. Ленрабочих до жилого дома по ул. Коммунистическая, д.7а

км 0+000 - км 0+664



Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Жуковского, д. 85, по ул. Ленрабочих до жилого дома по ул. Коммунистическая, д.7а

М 1:3000

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)	1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	16.000	1.540	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	4.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 - 1	430,000	1124,000	70,000	100,000	262,000	6,000	2,000	2,000	12,000	**194,442**
ИТОГО	**430,000**	**1124,000**	**70,000**	**100,000**	**262,000**	**6,000**	**2,000**	**2,000**	**12,000**	**194,442**
ЛИН.КМ	**0,430**	**1,124**	**0,070**	**0,100**	**0,262**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,430**	**1,124**	**0,018**	**0,075**	**0,131**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**43,000**	**112,400**	**1,750**	**7,500**	**13,100**	**9,600**	**3,080**	**3,820**	**0,192**	**194,442**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+065	Демонтировать	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+644	Демонтировать	1	слева
3	1.12.1	Опасные повороты			0+015	Требуется установить	1	справа
4	1.12.1	Опасные повороты			0+280	Демонтировать	1	слева
5	1.12.2	Опасные повороты			0+659	Требуется установить	1	слева
6	1.17	Искусственная неровность			0+015	Установлено	1	справа
7	1.17	Искусственная неровность			0+150	Установлено	1	слева
8	1.22	Пешеходный переход			0+015	Требуется установить	1	справа
9	1.22	Пешеходный переход			0+150	Требуется установить	1	слева
10	1.34.1	Направление поворота			0+003	Требуется установить	1	справа
11	1.34.1	Направление поворота			0+023	Требуется установить	1	справа
12	1.34.1	Направление поворота			0+043	Требуется установить	1	справа
13	1.34.1	Направление поворота			0+118	Требуется установить	1	слева
14	1.34.1	Направление поворота			0+138	Требуется установить	1	слева
15	1.34.1	Направление поворота			0+158	Требуется установить	1	слева
16	1.34.1	Направление поворота			0+178	Требуется установить	1	слева
17	1.34.1	Направление поворота			0+198	Требуется установить	1	слева
18	1.34.1	Направление поворота			0+232	Требуется установить	1	справа
19	1.34.1	Направление поворота			0+515	Требуется установить	1	слева
20	1.34.2	Направление поворота			0+003	Требуется установить	1	справа
21	1.34.2	Направление поворота			0+023	Требуется установить	1	справа
22	1.34.2	Направление поворота			0+043	Требуется установить	1	справа
23	1.34.2	Направление поворота			0+118	Требуется установить	1	слева
24	1.34.2	Направление поворота			0+138	Требуется установить	1	слева
25	1.34.2	Направление поворота			0+158	Требуется установить	1	слева
26	1.34.2	Направление поворота			0+178	Требуется установить	1	слева
27	1.34.2	Направление поворота			0+198	Требуется установить	1	слева
28	1.34.2	Направление поворота			0+227	Требуется установить	1	справа
29	1.34.2	Направление поворота			0+510	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**24**	
		Итого:					**26**	
		Знаки приоритета						
30	2.1	Главная дорога			0+115	Требуется установить	1	слева
31	2.1	Главная дорога			0+280	Требуется установить	1	справа
32	2.1	Главная дорога			0+304	Требуется установить	1	слева
33	2.1	Главная дорога			0+659	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
34	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+070	Требуется установить	1	слева
35	3.20	Обгон запрещен			0+070	Требуется установить	1	слева
36	3.20	Обгон запрещен			0+080	Требуется установить	1	справа
37	3.20	Обгон запрещен			0+085	Требуется установить	1	слева
38	3.20	Обгон запрещен			0+115	Требуется установить	1	слева
39	3.20	Обгон запрещен			0+115	Требуется установить	1	справа
40	3.20	Обгон запрещен			0+280	Требуется установить	1	слева
41	3.20	Обгон запрещен			0+280	Требуется установить	1	справа
42	3.20	Обгон запрещен			0+401	Демонтировать	1	слева
43	3.20	Обгон запрещен			0+490	Требуется установить	1	слева
44	3.20	Обгон запрещен			0+490	Требуется установить	1	справа
45	3.20	Обгон запрещен			0+644	Демонтировать	1	слева
46	3.20	Обгон запрещен			0+659	Требуется установить	1	слева
47	3.20	Обгон запрещен			0+659	Требуется установить	1	справа
48	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+490	Требуется установить	1	слева
49	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+070	Требуется установить	1	слева
50	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+080	Требуется установить	1	справа
51	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+085	Требуется установить	1	слева
52	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+115	Требуется установить	1	справа
53	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+280	Демонтировать	1	слева
54	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+280	Требуется установить	1	слева
55	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+397	Демонтировать	1	справа
56	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+545	Демонтировать	1	слева
57	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+659	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**5**	
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**19**	
		Знаки особых предписаний						
57	5.19.1	Пешеходный переход			0+080	Требуется установить	1	справа
58	5.19.1	Пешеходный переход			0+085	Требуется установить	1	слева
59	5.19.2	Пешеходный переход			0+080	Требуется установить	1	справа
60	5.19.2	Пешеходный переход			0+085	Требуется установить	1	слева
61	5.20	Искусственная неровность			0+080	Требуется установить	1	справа
62	5.20	Искусственная неровность			0+085	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
63	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей			0+150	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
64	8.2.1	Зона действия			0+015	Требуется установить	1	справа
65	8.2.1	Зона действия			0+397	Демонтировать	1	справа
66	8.2.1	Зона действия			0+545	Демонтировать	1	слева
67	8.2.1	Зона действия			0+659	Требуется установить	1	слева
68	8.13	Направление главной дороги			0+659	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**10**	
		Всего требуется установить:					**54**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					58	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+021	0+304	Населенный пункт	8/8	283	0	Справа
2	0+341	0+406	Населенный пункт	2/2	0	65	Справа
3	0+446	0+646	Населенный пункт	6/6	200	0	Справа
4	0+555	0+556	Населенный пункт	1/1	0	1	Слева
5	0+555	0+556	Населенный пункт	1/1	1	0	Слева
Итого:				**18/18**	**484**	**66**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+081	0+085	Пешеходный переход	Справа		4
2	0+081	0+085	Пешеходный переход	Слева		4
3	0+186	0+346	Жилая застройка	Справа		160
4	0+490	0+664	Жилая застройка	Справа	174	
5	0+500	0+664	Жилая застройка	Справа	164	
Итого:					**338**	**168**


Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+079	5,00	6,00	0,07	2,10	Без изменений

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от примыкания с автодорогой ул. Радищева до автодороги ул. Ленрабочих

км 0+000 - км 0+554

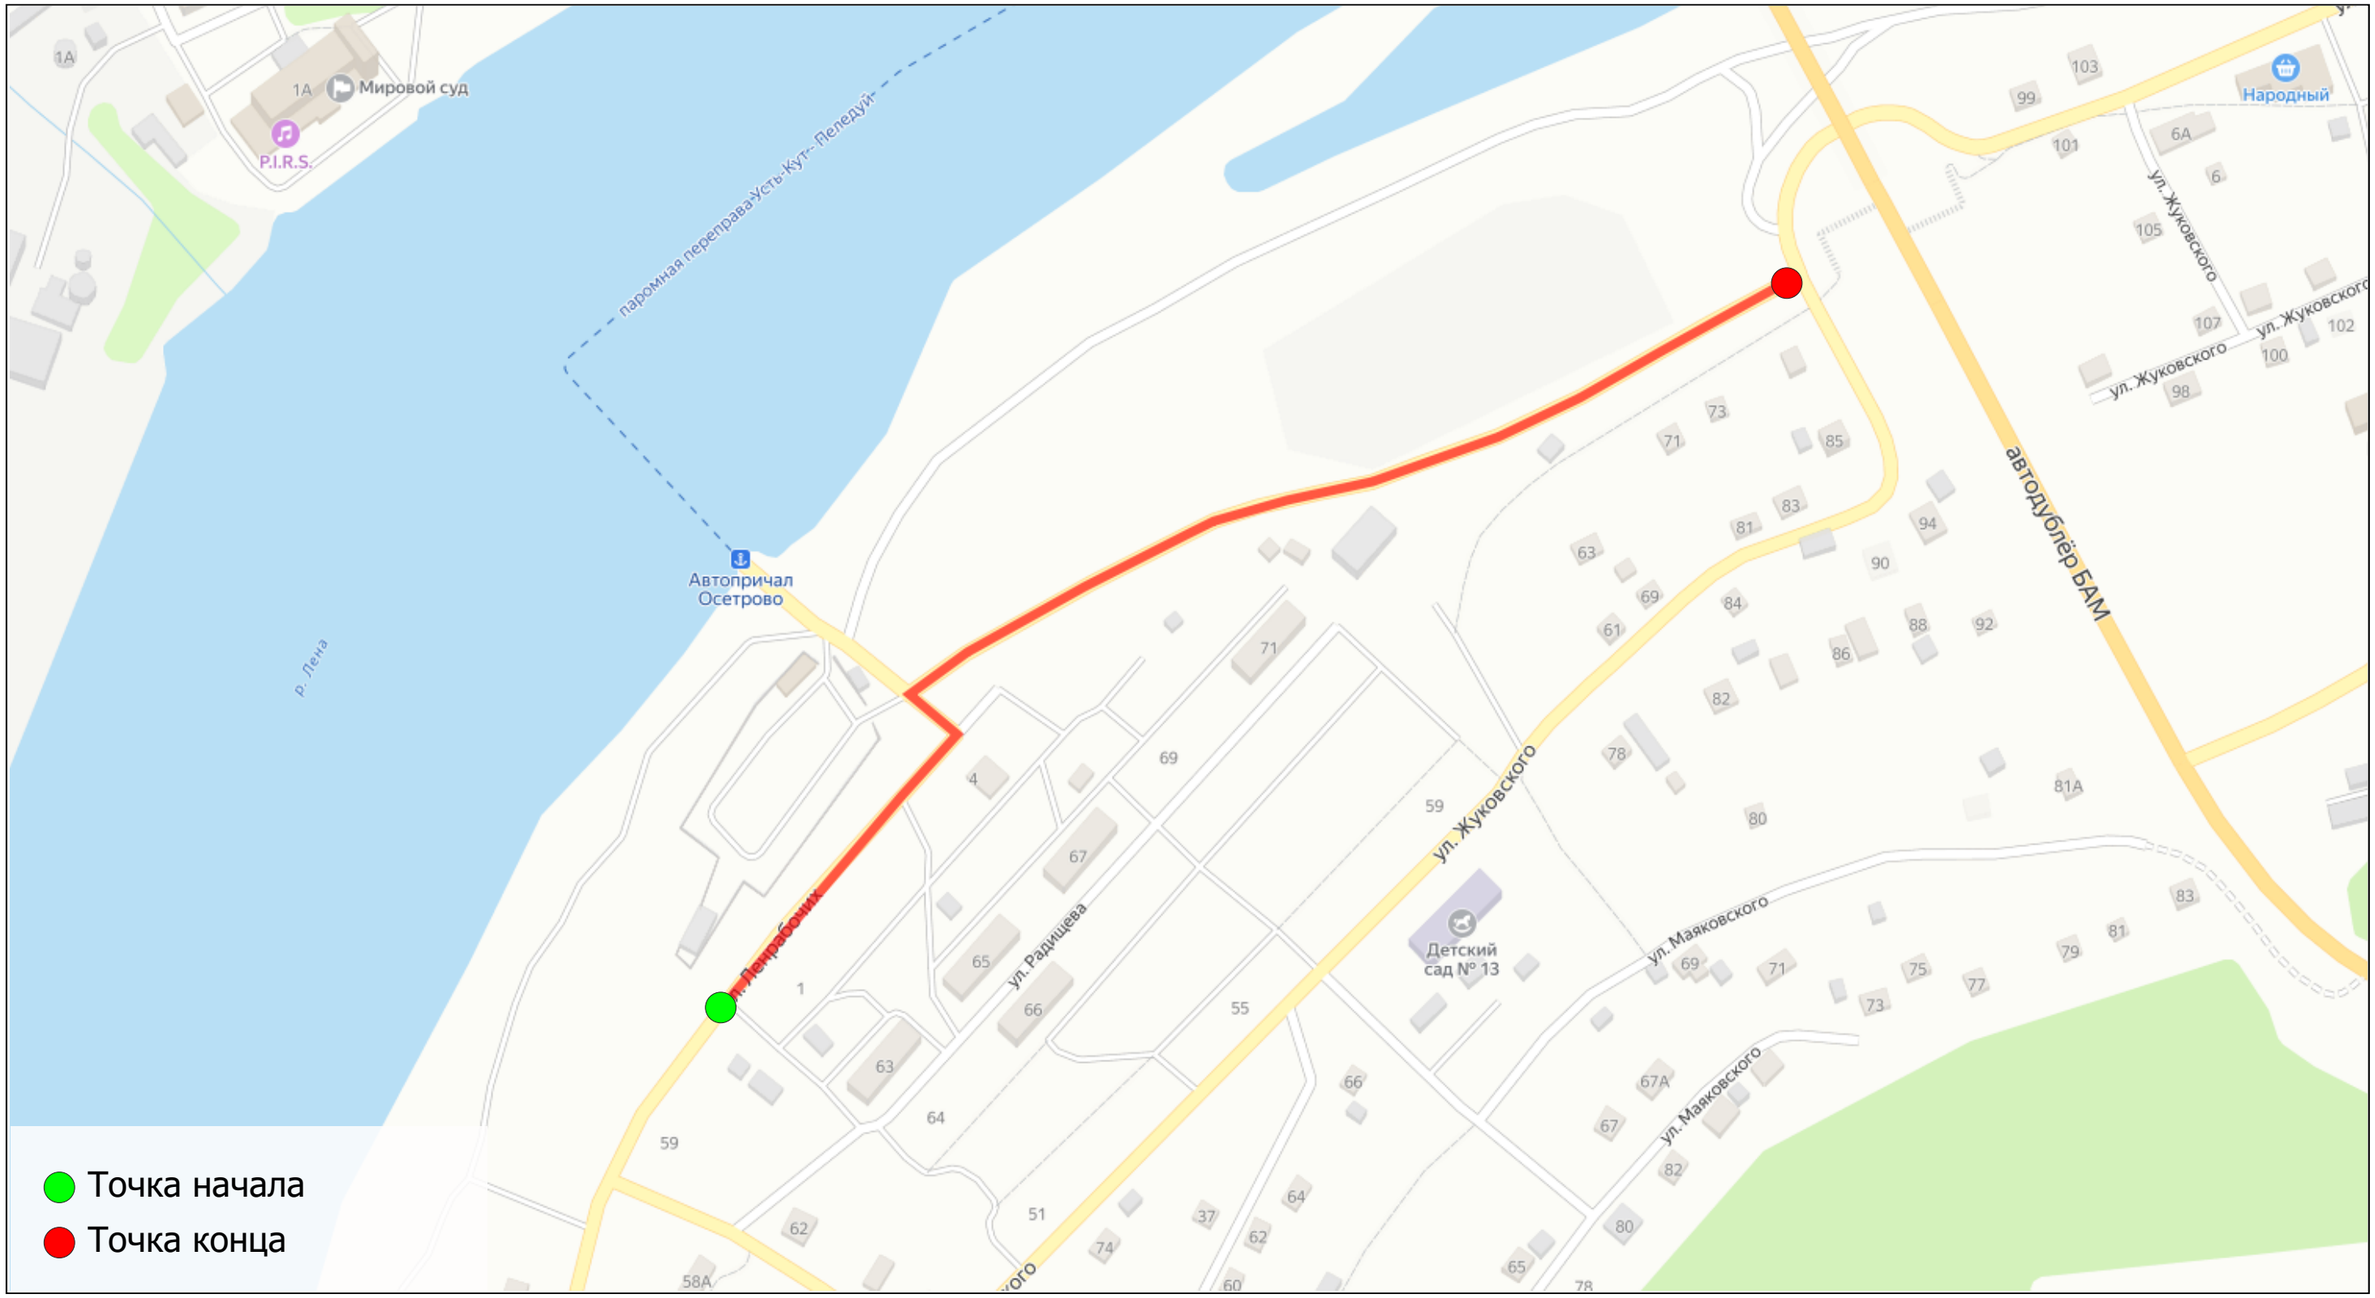

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 125 — 6 — R=6578м — 230 — 9 — 448 — 10 — R=7877м
Кривые в плане	82 — R=331м P=13; a=14° — 132 — 136 — R=110м P=2; a=36° — 205 — 264 — R=257м P=11; a=13° — 323 — R=538м P=35; a=9° — 406 — R=736м P=83; a=5° — 471
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 7,00 — 355 — 6,00

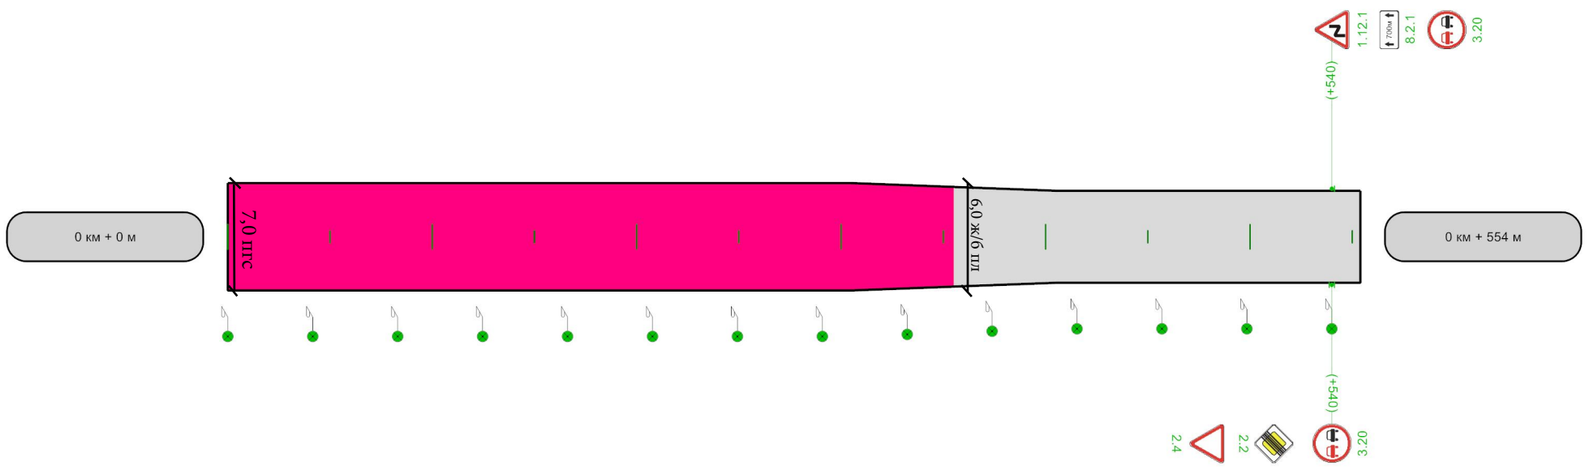

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+540	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.2	Конец главной дороги			0+540	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+540	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
4	3.20	Обгон запрещен			0+540	Требуется установить	1	слева
5	3.20	Обгон запрещен			0+540	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.2.1	Зона действия			0+540	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+540	Населенный пункт	14/14	540	0	Справа
Итого:				**14/14**	**540**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Пролетарская № 1 до жилого дома № 16 по ул. Пролетарская

1-й участок: км 0+000 - км 0+376 3-й участок: км 0+000 - км 0+650
2-й участок: км 0+000 - км 0+590 4-й участок: км 0+000 - км 0+105
5-й участок: км 0+000 - км 0+120

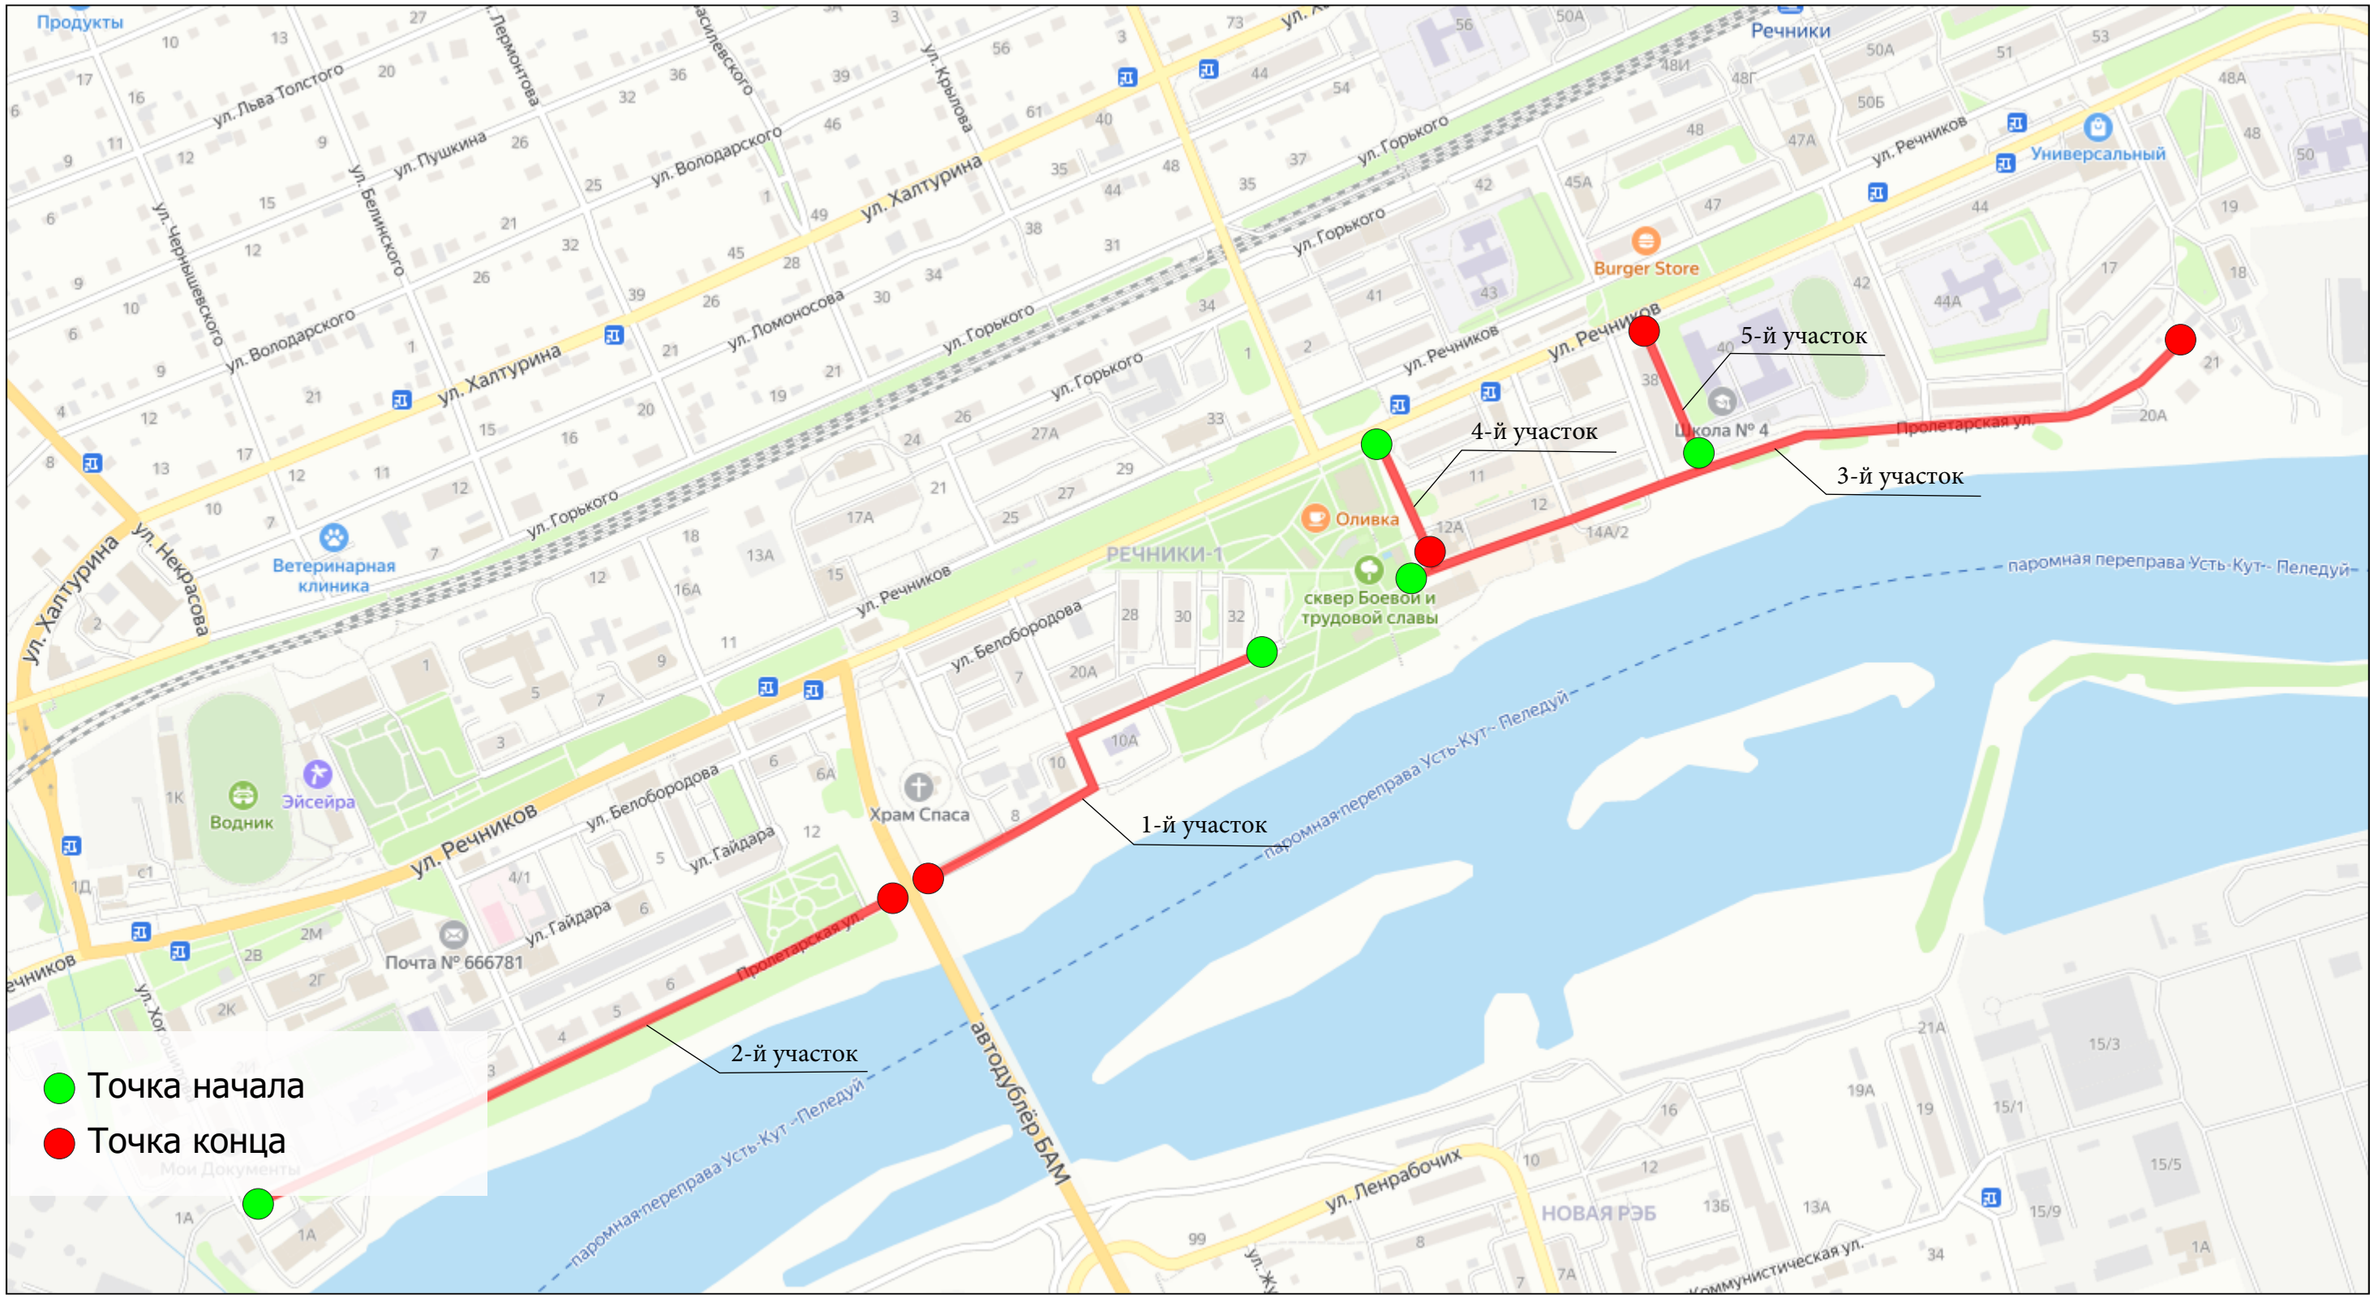

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	32 15 31 R=5120м 10 221
Кривые в плане	161 R=16м P=0; a=88° 186 205 R=18м P=0; a=72° 230
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 5,60

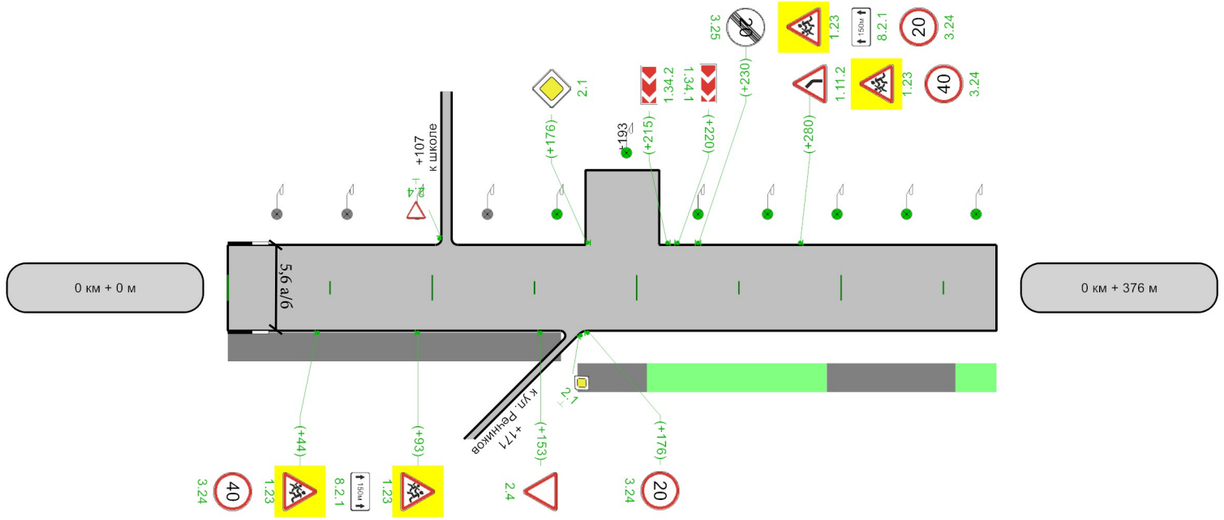

Горизонтальная дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа	ширина 2м, а/б, 0 - 163	ширина 2м, а/б, 171 - 205	н/д: ширина 2м, а/б, 205 - 293	ширина 2м, а/б, 293 - 356	ширина 2м, а/б, 356 - 376

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+280	Требуется установить	1	слева
2	1.23	Дети			0+044	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+093	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+230	Требуется установить	1	слева
5	1.23	Дети			0+280	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			0+220	Требуется установить	1	слева
7	1.34.2	Направление поворота			0+215	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+176	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+153	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
10	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+044	Требуется установить	1	справа
11	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+176	Требуется установить	1	справа
12	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+230	Требуется установить	1	слева
13	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+280	Требуется установить	1	слева
14	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+230	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.2.1	Зона действия			0+093	Требуется установить	1	справа
16	8.2.1	Зона действия			0+230	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+024	0+127	Населенный пункт	4/4	0	103	Слева
2	0+161	0+195	Населенный пункт	2/2	34	0	Слева
3	0+230	0+366	Населенный пункт	5/5	136	0	Слева
Итого:				**11/11**	**170**	**103**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+163	Жилая застройка	Справа		163
2	0+171	0+205	Жилая застройка	Справа		34
3	0+205	0+293	Жилая застройка	Справа	88	
4	0+293	0+356	Жилая застройка	Справа		63
5	0+356	0+376	Жилая застройка	Справа	20	
Итого:					**108**	**260**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 4 — R=9200м — 141 — 19 — 238 — 20 — R=8710м — 412 — 1 — 455 — 1 — R=10674м
Кривые в плане	15
Тротуары слева	ширина 2м, бет, 0 - 259 | ширина 2м, а/б, 263 - 340 | н/д: ширина 2м, а/б, 340 - 460 | ширина 2м, а/б, 464 - 541 | н/д: ширина 2м, а/б, 545 - 590
Характеристики проезжей части	5,60

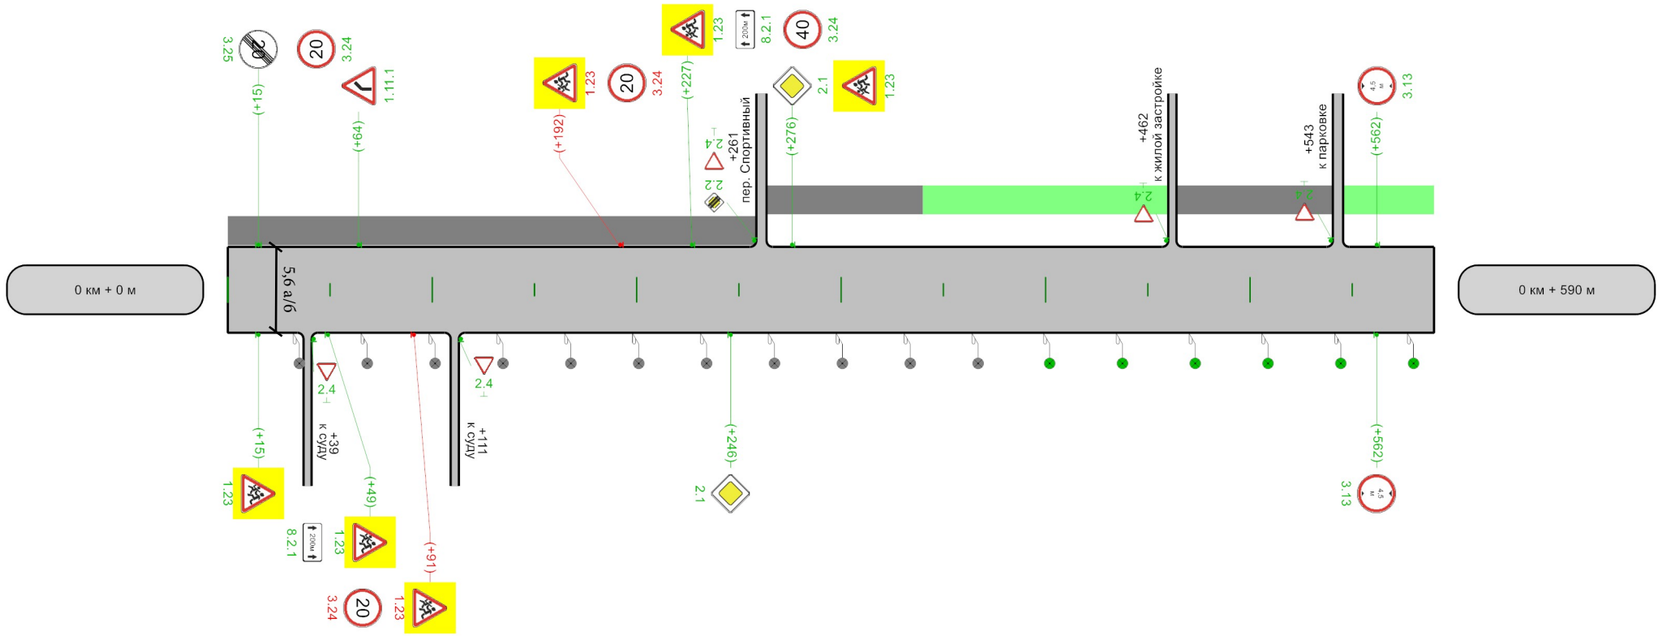

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+064	Требуется установить	1	слева
2	1.23	Дети			0+015	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+049	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+091	Демонтировать	1	справа
5	1.23	Дети			0+192	Демонтировать	1	слева
6	1.23	Дети			0+227	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети			0+276	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки приоритета						
8	2.1	Главная дорога			0+246	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+276	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
10	3.13	Ограничение высоты			0+562	Требуется установить	1	слева
11	3.13	Ограничение высоты			0+562	Требуется установить	1	справа
12	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+015	Требуется установить	1	слева
13	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+091	Демонтировать	1	справа
14	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+192	Демонтировать	1	слева
15	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+227	Требуется установить	1	слева
16	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
17	8.2.1	Зона действия			0+049	Требуется установить	1	справа
18	8.2.1	Зона действия			0+227	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+367	Населенный пункт	11/11	0	332	Справа
2	0+402	0+580	Населенный пункт	6/6	178	0	Справа
Итого:				**17/17**	**178**	**332**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+259	Жилая застройка	Слева		259
2	0+263	0+340	Жилая застройка	Слева		77
3	0+340	0+460	Жилая застройка	Слева	120	
4	0+464	0+541	Жилая застройка	Слева		77
5	0+545	0+590	Жилая застройка	Слева	45	
Итого:					**165**	**413**

М 1:3000

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	1.550	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	1.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 1	153,000	931,000	194,000	150,000	126,000	22,000	4,000	**137,550**
ИТОГО	**153,000**	**931,000**	**194,000**	**150,000**	**126,000**	**22,000**	**4,000**	**137,550**
ЛИН.КМ	**0,153**	**0,931**	**0,194**	**0,150**	**0,126**	**0,022**	**0,000**	
ПРИВЕД.КМ	**0,153**	**0,931**	**0,049**	**0,113**	**0,063**	**0,005**	**0,000**	
ПЛОЩАДЬ	**15,300**	**93,100**	**4,850**	**11,250**	**6,300**	**0,550**	**6,200**	**137,550**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+412	Требуется установить	1	слева
2	1.20.1	Сужение дороги			0+483	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети			0+163	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+212	Требуется установить	1	справа
5	1.23	Дети			0+412	Требуется установить	1	слева
6	1.23	Дети			0+462	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+330	Требуется установить	1	слева
8	1.34.2	Направление поворота			0+004	Требуется установить	1	справа
9	1.34.2	Направление поворота			0+311	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Знаки приоритета						
10	2.1	Главная дорога			0+227	Требуется установить	1	справа
11	2.1	Главная дорога			0+254	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
12	3.13	Ограничение высоты			0+046	Требуется установить	1	слева
13	3.13	Ограничение высоты			0+046	Требуется установить	1	справа
14	3.13	Ограничение высоты			0+212	Требуется установить	1	слева
15	3.13	Ограничение высоты			0+212	Требуется установить	1	справа
16	3.13	Ограничение высоты			0+528	Требуется установить	1	слева
17	3.13	Ограничение высоты			0+528	Требуется установить	1	справа
18	3.20	Обгон запрещен			0+030	Требуется установить	1	слева
19	3.20	Обгон запрещен			0+030	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	3.20	Обгон запрещен			0+254	Требуется установить	1	слева
21	3.20	Обгон запрещен			0+254	Требуется установить	1	справа
22	3.20	Обгон запрещен			0+371	Требуется установить	1	слева
23	3.20	Обгон запрещен			0+371	Требуется установить	1	справа
24	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+371	Требуется установить	1	слева
25	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+030	Требуется установить	1	слева
26	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+079	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+254	Требуется установить	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+462	Требуется установить	1	слева
29	3.31	Конец всех ограничений			0+030	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**18**	
		Итого:					**18**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
30	8.2.1	Зона действия			0+212	Требуется установить	1	справа
31	8.2.1	Зона действия			0+412	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**31**	
		Всего:					**31**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+645	Населенный пункт	19/19	630	0	Слева
Итого:				**19/19**	**630**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+007	0+121	Жилая застройка	Слева		114
2	0+127	0+199	Жилая застройка	Слева		72
3	0+205	0+236	Жилая застройка	Слева		31
4	0+243	0+343	Жилая застройка	Слева		100
5	0+347	0+420	Жилая застройка	Слева		73
6	0+424	0+533	Жилая застройка	Слева		109
7	0+537	0+542	Жилая застройка	Слева		5
8	0+542	0+650	Жилая застройка	Слева		108
Итого:					**0**	**612**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	48
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 2м, в/б, 9 - 45 / ширина 2м, в/б, 48 - 80
Характеристики проезжей части	0 0,05-6,00-0,05

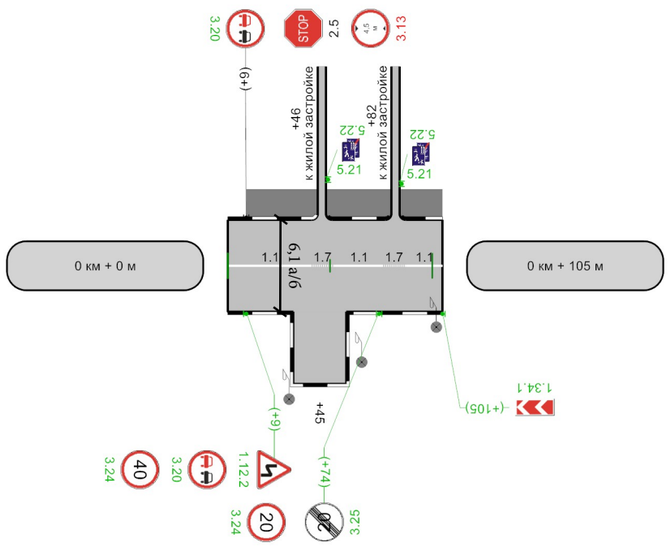

	осевая	1.1 0 - 41	1.7 41 - 52	1.1 52 - 76	1.7 76 - 87	1.1 87 - 105
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	83,000	22,000	**9,400**
ИТОГО	**83,000**	**22,000**	**9,400**
ЛИН.КМ	**0,083**	**0,022**	
ПРИВЕД.КМ	**0,083**	**0,011**	
ПЛОЩАДЬ	**8,300**	**1,100**	**9,400**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+009	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+105	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.5	Движение без остановки запрещено			0+009	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
4	3.13	Ограничение высоты			0+009	Демонтировать	1	слева
5	3.20	Обгон запрещен			0+009	Требуется установить	1	слева
6	3.20	Обгон запрещен			0+009	Требуется установить	1	справа
7	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+009	Требуется установить	1	справа
8	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+074	Требуется установить	1	справа
9	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+074	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					7	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+102	Населенный пункт	3/3	0	72	Справа
Итого:				**3/3**	**0**	**72**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+009	0+045	Жилая застройка	Слева		36
2	0+048	0+080	Жилая застройка	Слева		32
3	0+084	0+105	Жилая застройка	Слева		21
Итого:					**0**	**89**

М 1:3000

Горизонтальная разметка справа	1-ая от осевой	1.2 0 - 120
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		
Кривые в плане		
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		0,10-6,00-0,10

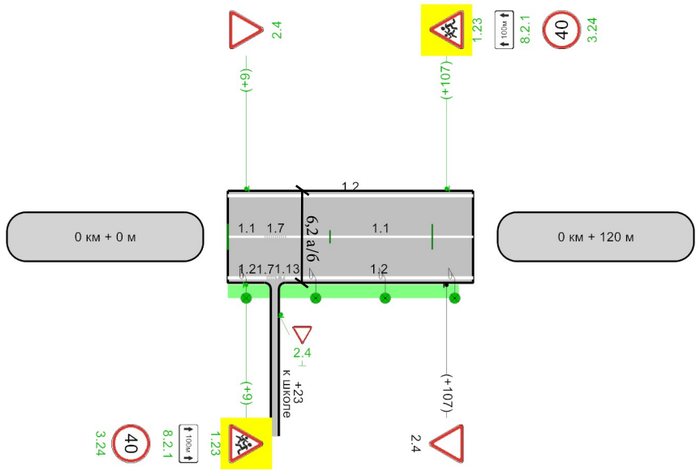

Горизонтальная разметка справа	осевая	1.1 0 - 18	1.7 18 - 29	1.1 29 - 120
	1-ая от осевой	1.2 0 - 19	1.3 19 - 28	1.2 28 - 120
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				н/д: ширина 1м, а/б, 25 - 113

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	109,000	231,000	15,000	5,000	**34,875**
ИТОГО	**109,000**	**231,000**	**15,000**	**5,000**	**34,875**
ЛИН.КМ	**0,109**	**0,231**	**0,015**	**0,005**	
ПРИВЕД.КМ	**0,109**	**0,231**	**0,008**	**0,001**	
ПЛОЩАДЬ	**10,900**	**23,100**	**0,750**	**0,125**	**34,875**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+009	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+107	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+107	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
5	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+009	Требуется установить	1	справа
6	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+107	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.2.1	Зона действия			0+009	Требуется установить	1	справа
8	8.2.1	Зона действия			0+107	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+009	0+111	Населенный пункт	4/4	102	0	Справа
Итого:				**4/4**	**102**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+021	Жилая застройка	Справа	21	
2	0+025	0+113	Жилая застройка	Справа	88	
Итого:					**109**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Российская, д. 3 до жилого дома по ул. Российская, д. 41

1-й участок: км 0+000 - км 0+412
2-й участок: км 0+000 - км 0+101
3-й участок: км 0+000 - км 0+253

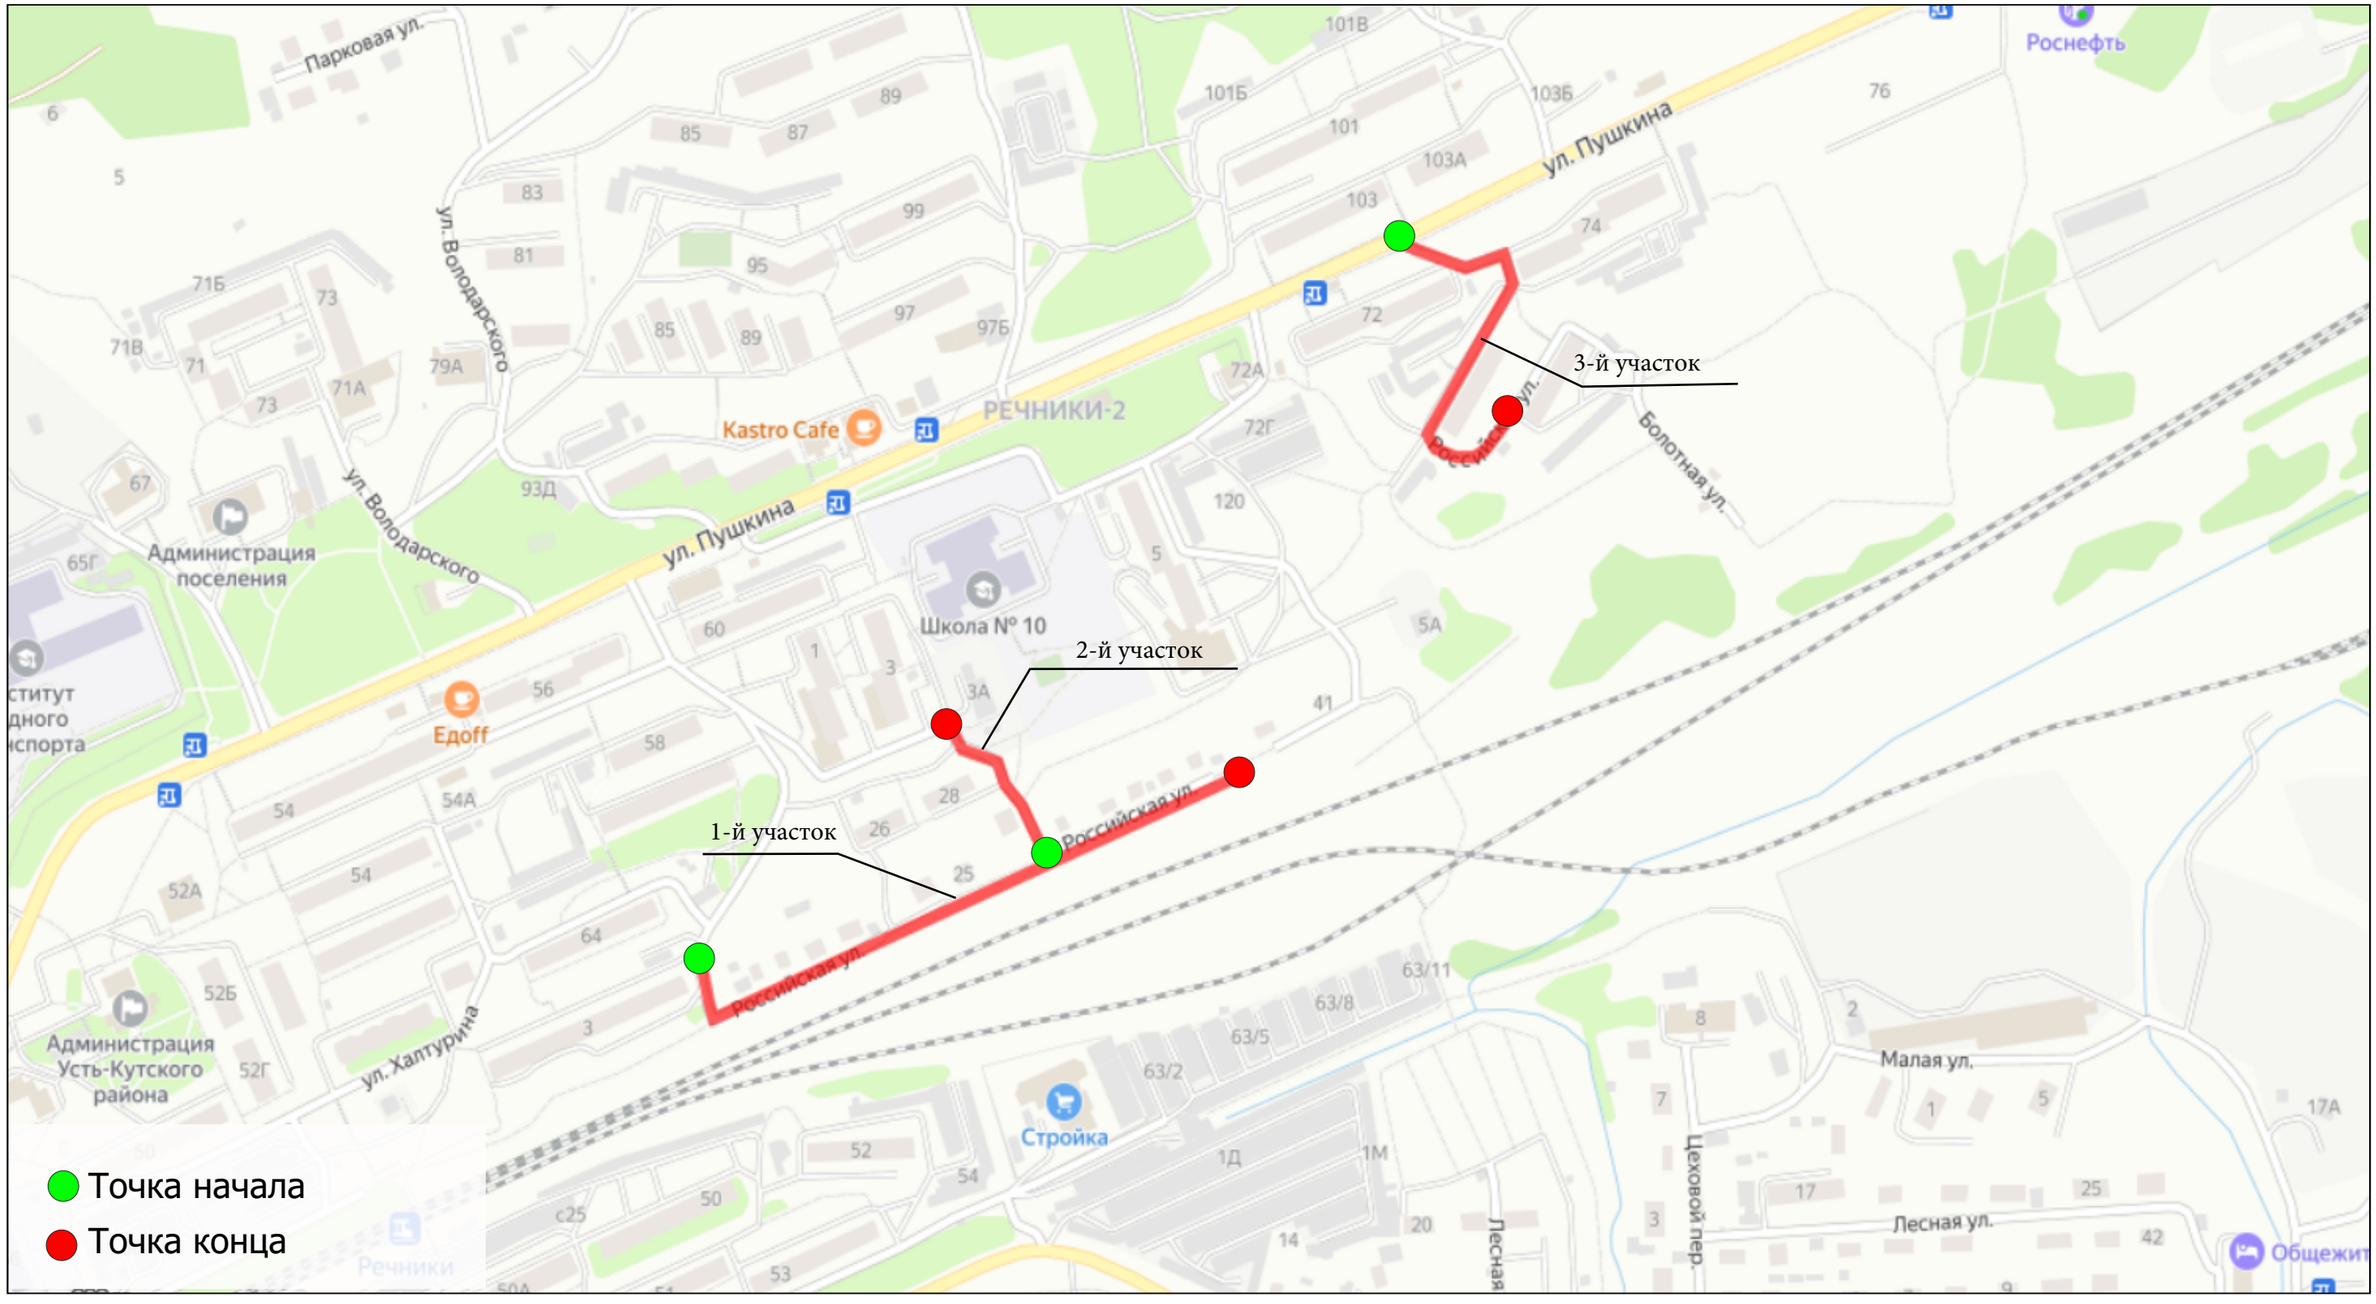

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 2 47 R=2258м 166 25 227 26 R=2464м 360 28
Кривые в плане	22 R=611м 49 P=5; a=72°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00 | 50 | 4,00 | 3,00 | 290 | 4,00 | 3,00

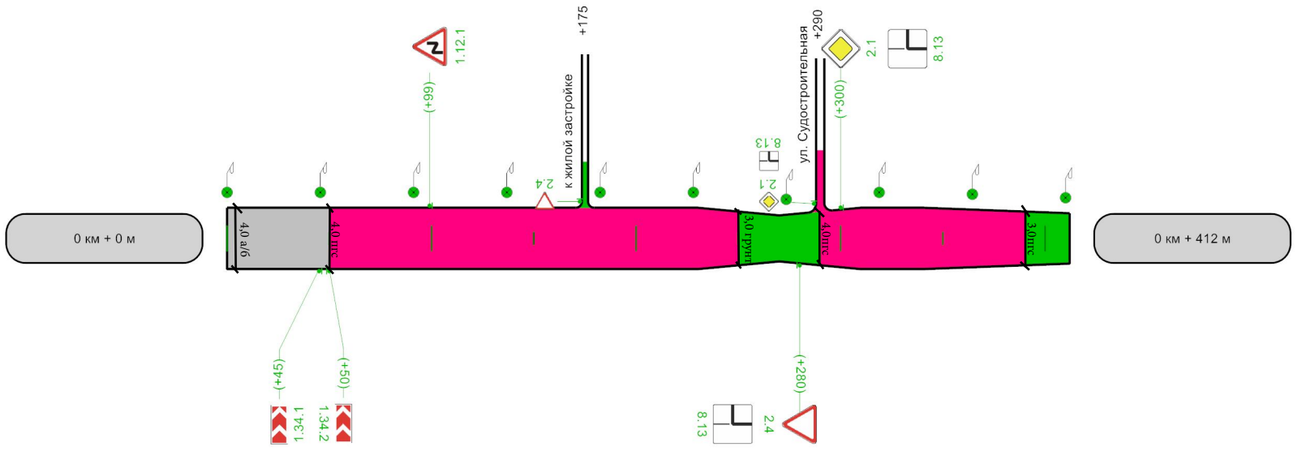

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+099	Требуется установить	1	слева
2	1.34.1	Направление поворота			0+045	Требуется установить	1	справа
3	1.34.2	Направление поворота			0+050	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.1	Главная дорога			0+300	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+280	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.13	Направление главной дороги			0+300	Требуется установить	1	слева
7	8.13	Направление главной дороги			0+280	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+410	Населенный пункт	10/10	410	0	Слева
Итого:				**10/10**	**410**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	112 — 93
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

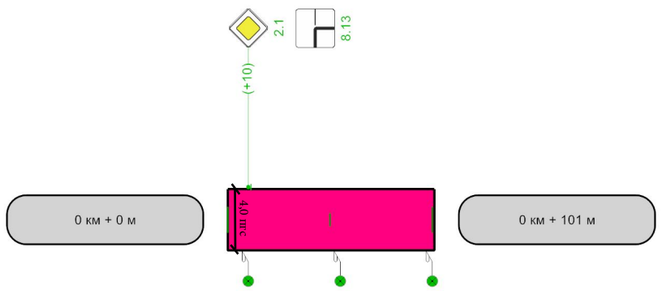

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
2	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+100	Населенный пункт	3/3	90	0	Справа
Итого:				**3/3**	**90**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	28 R=650м 48 60 R=650м 72 83 R=650м 93 186 R=650м 207 222 R=650м 244
Тротуары слева	ширина 1м, а/б, 125 - 180
Характеристики проезжей части	4,00

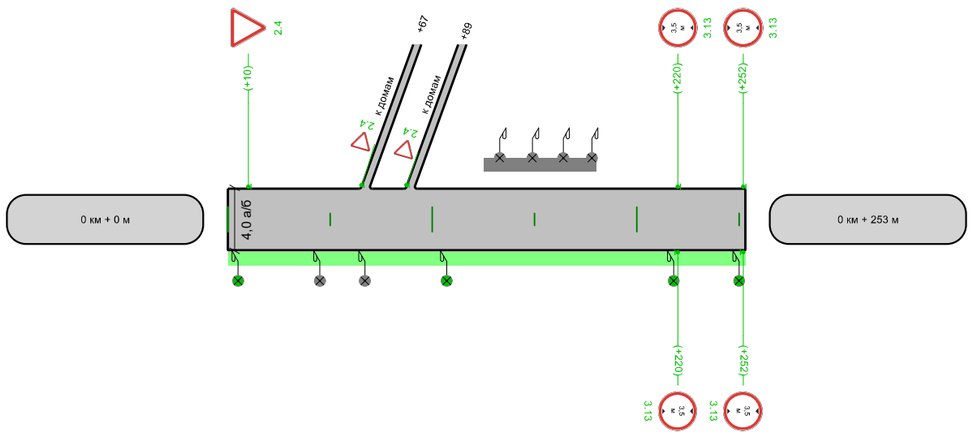

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 253

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+220	Требуется установить	1	слева
3	3.13	Ограничение высоты			0+220	Требуется установить	1	справа
4	3.13	Ограничение высоты			0+252	Требуется установить	1	слева
5	3.13	Ограничение высоты			0+252	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+005	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
2	0+045	0+045	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
3	0+067	0+067	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
4	0+107	0+107	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
5	0+133	0+133	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
6	0+149	0+149	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
7	0+164	0+164	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
8	0+178	0+178	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
9	0+218	0+218	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
10	0+250	0+250	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
Итого:				**10/10**	**0**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+253	Жилая застройка	Справа	253	
2	0+125	0+180	Жилая застройка	Слева		55
Итого:					**253**	**55**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от нежилого здания по ул. Пролетарская, 1а (переулок Хорошилова) до нежилого здания по ул. Речников, 2А

км 0+000 - км 0+199

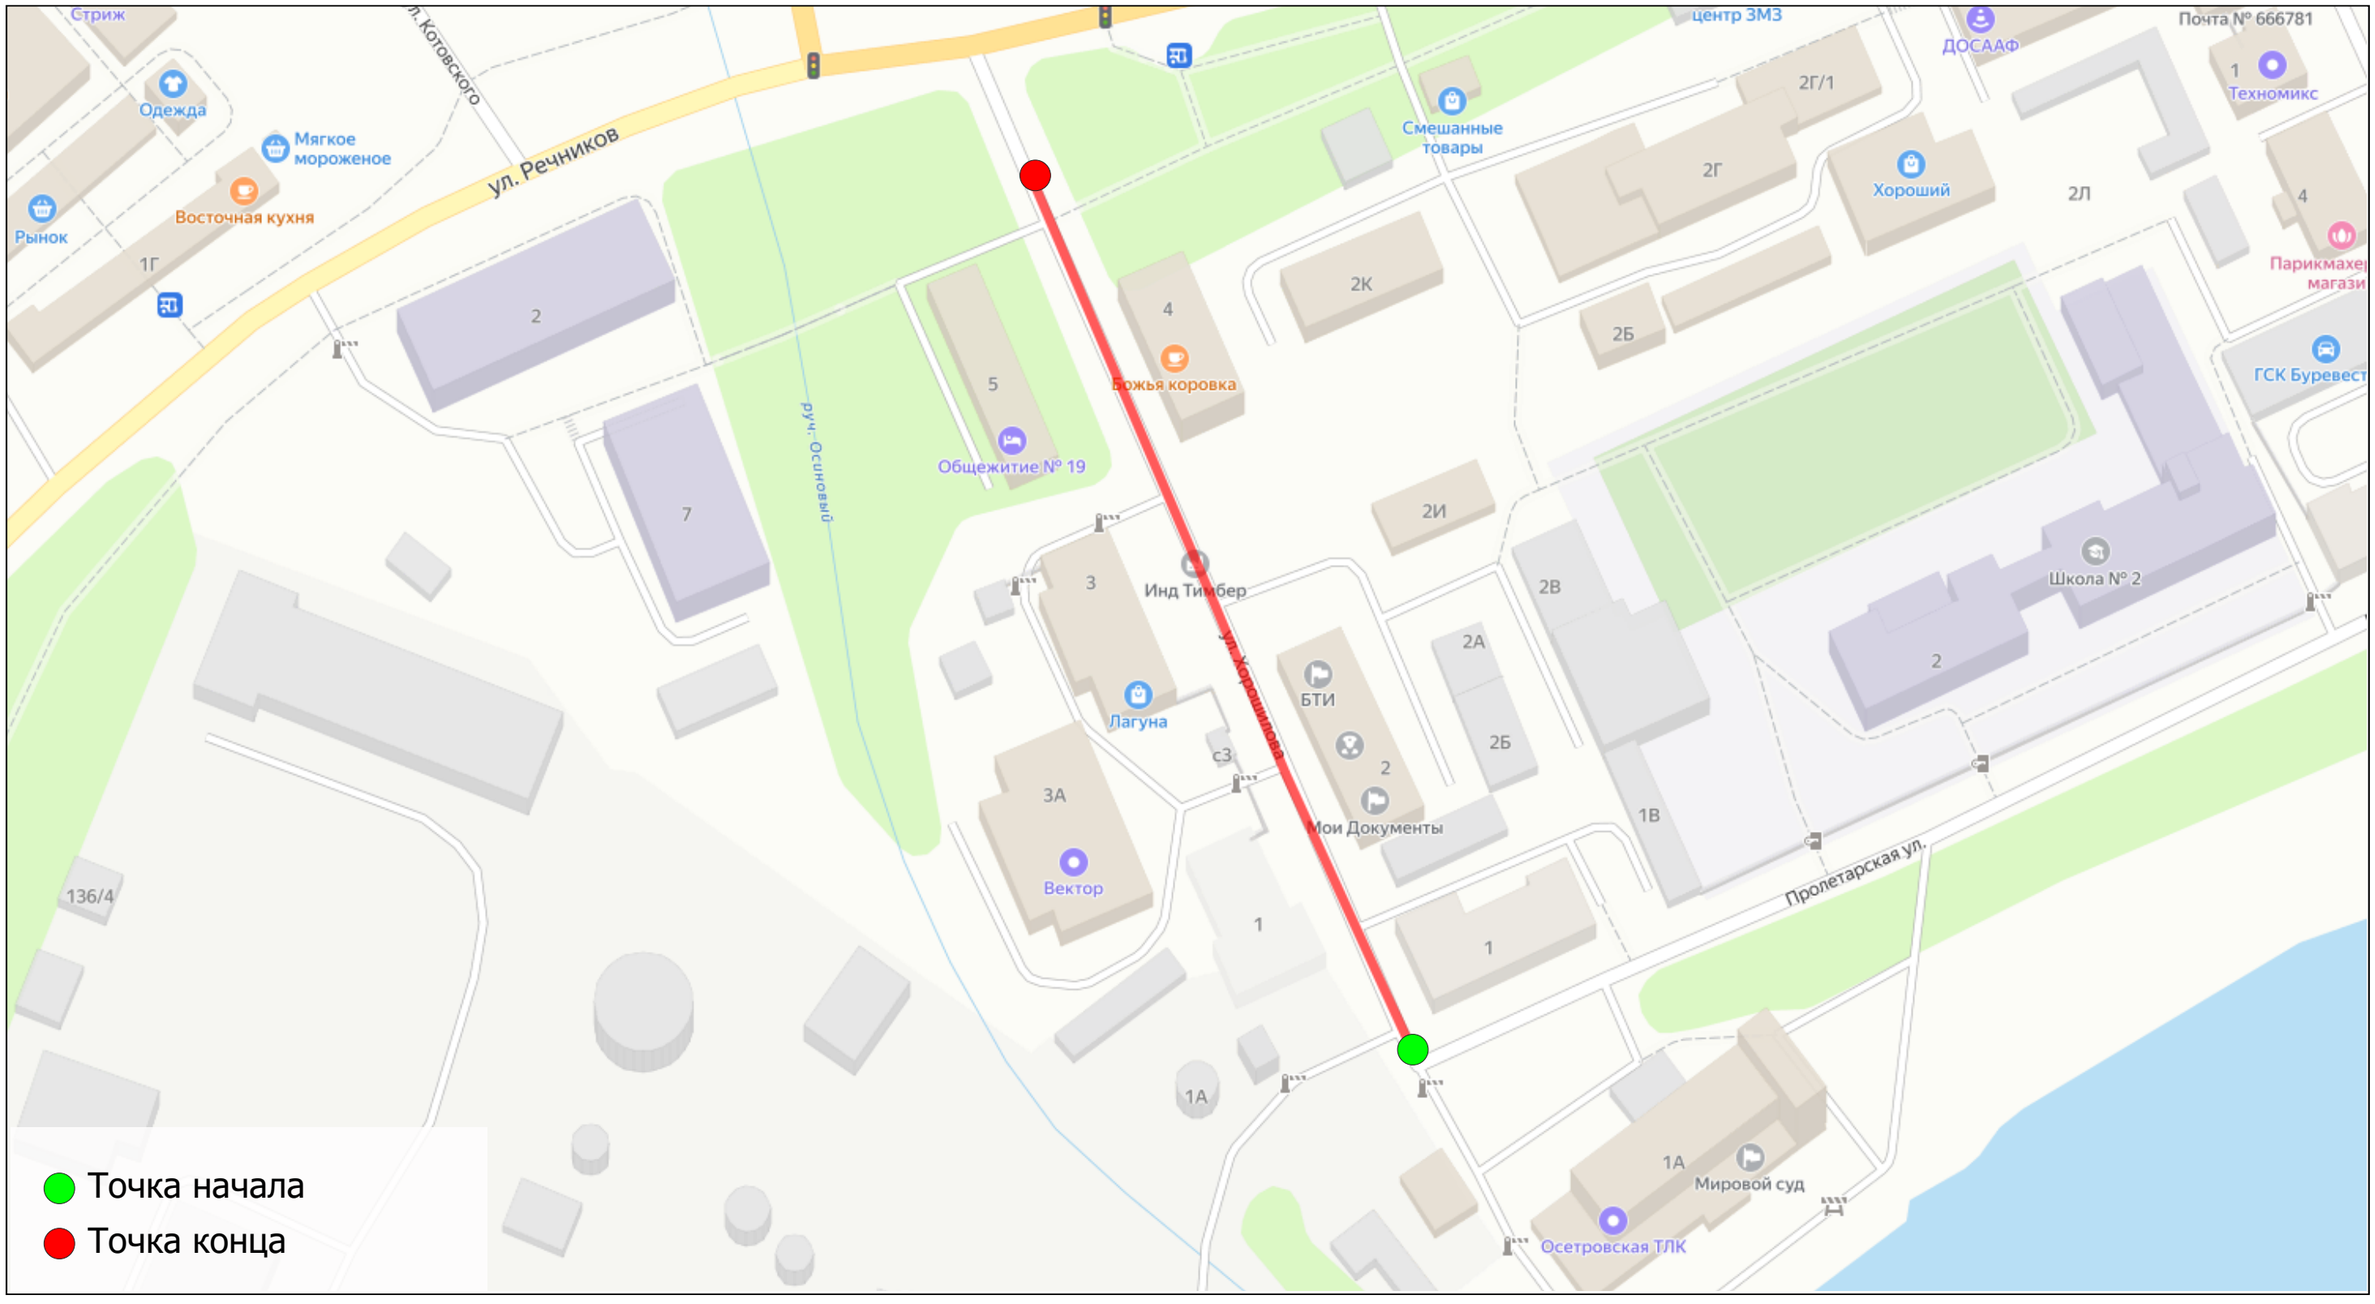

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4 107 92 129 R=4314м
Кривые в плане	R=4314 L=15
Тротуары слева	ширина 2м, бет, 65 - 124 / ширина 2м, а/б, 128 - 199
Характеристики проезжей части	5,50

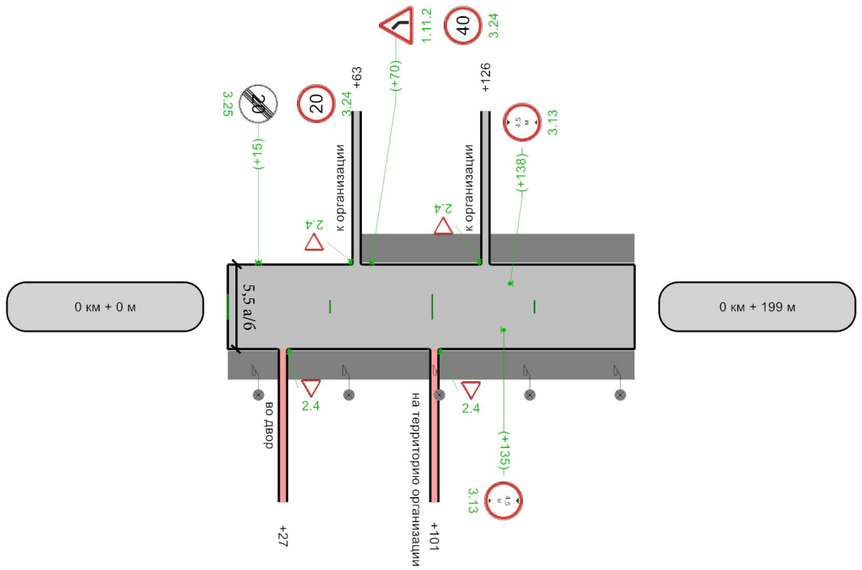

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 2м, бет, 29 - 99 / ширина 2м, бет, 103 - 199

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+070	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+135	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
3	3.13	Ограничение высоты			0+138	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
4	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+015	Требуется установить	1	слева
5	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+070	Требуется установить	1	слева
6	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+192	Населенный пункт	5/5	0	177	Справа
Итого:				**5/5**	**0**	**177**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+025	Жилая застройка	Справа		25
2	0+029	0+099	Жилая застройка	Справа		70
3	0+065	0+124	Жилая застройка	Слева		59
4	0+103	0+199	Жилая застройка	Справа		96
5	0+128	0+199	Жилая застройка	Слева		71
Итого:					**0**	**321**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Седова, д. 2в до примыкания с автодорогой ул. Красной звезды


1-й участок: км 0+000 - км 1+058 3-й участок: км 0+000 - км 0+174
2-й участок: км 0+000 - км 0+143 4-й участок: км 0+000 - км 0+226
5-й участок: км 0+000 - км 0+394
6-й участок: км 0+000 - км 0+236



М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Седова, д. 2в до примыкания с автодорогой ул. Красной звезды уч. №1


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	26 — 33 — 62 — R=4018м — 20 — 277 — 20 — 310 — R=1987м — 60 — 470 — 60 — 502 — R=4480м — 4 — 794
Кривые в плане	239 R=676м P=42; a=9° 283 — 324 R=650м P=20; a=19° 374 — 425 R=667м P=13; a=30° 460 R=661м P=12; a=33° 496 — 738 R=662м P=22; a=18° 789 — R=706м P=9; a=43° 870 — 915 R=70м P=1; a=33° 956 R=78м P=1; a=36°
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 821 - 879 — н/д: ширина 1м, а/б, 879 - 946 — н/д: ширина 1м, а/б, 956 - 1000
Характеристики проезжей части	0 — 4,00 — 840 — 6,00

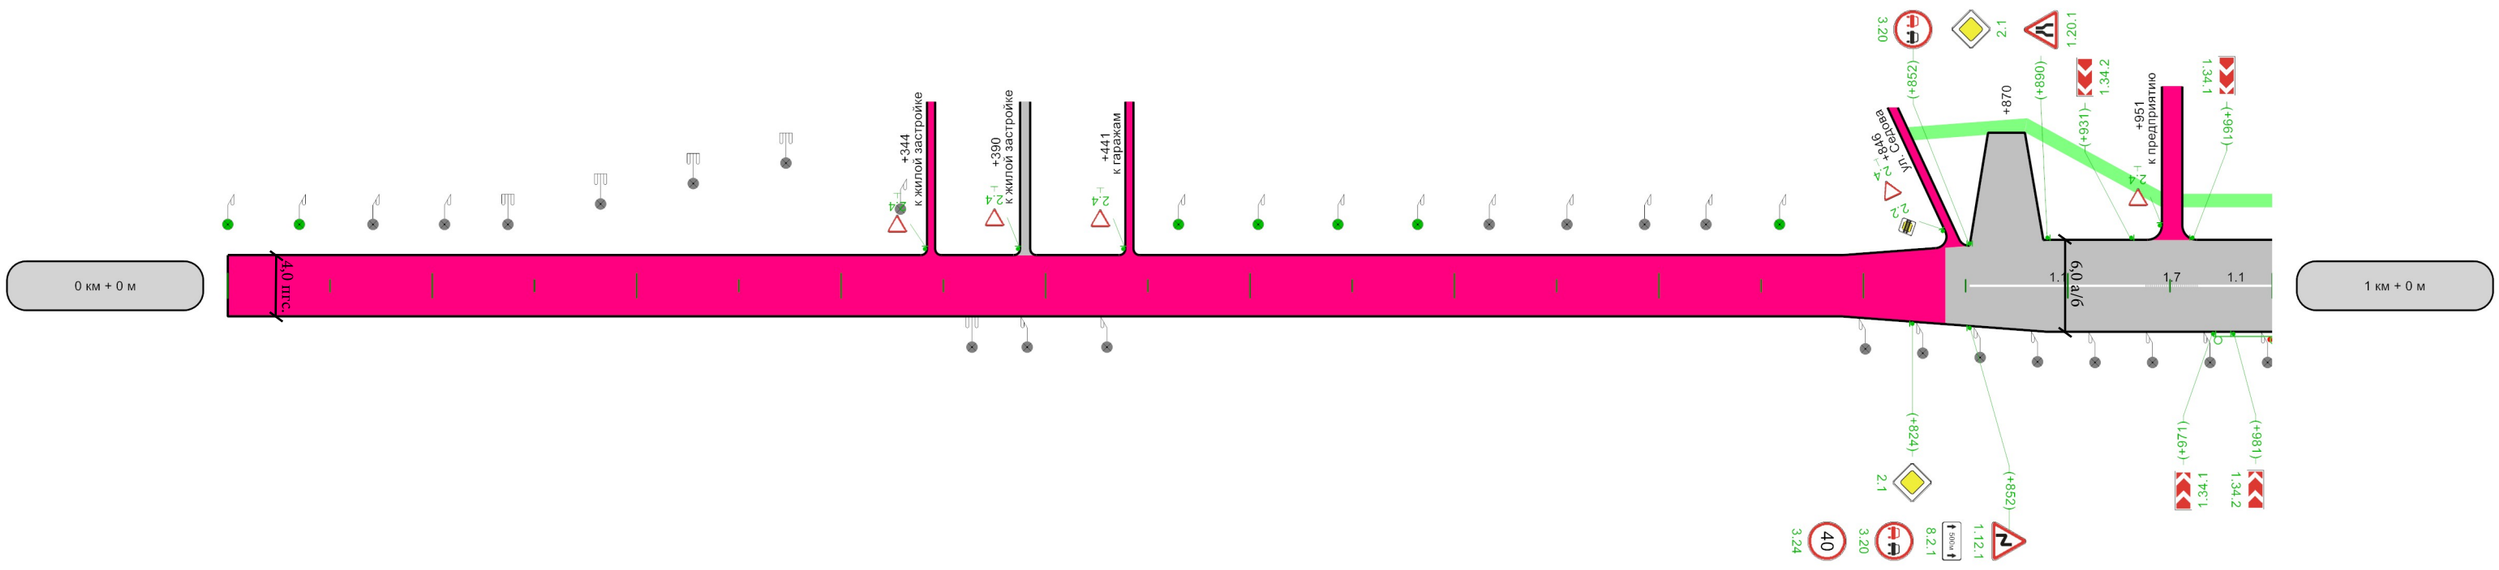

	осевая	1.1 852 - 938	1.7 938 - 964	1.1 964 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа				

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4
Кривые в плане	6
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 58
Характеристики проезжей части	6,00



осевая	1.1 0 - 58
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	нж: 11.ДО4Ж; Оцинкованный металл; 0 - 58
	17дм.; Железобетон; 0 - 58
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	122,000	26,000	**13,500**
1 - 2	58,000	0,000	**5,800**
ИТОГО	**180,000**	**26,000**	**19,300**
ЛИН.КМ	**0,180**	**0,026**	
ПРИВЕД.КМ	**0,180**	**0,013**	
ПЛОЩАДЬ	**18,000**	**1,300**	**19,300**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+852	Требуется установить	1	справа
2	1.20.1	Сужение дороги			0+890	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+961	Требуется установить	1	слева
4	1.34.1	Направление поворота			0+971	Требуется установить	1	справа
5	1.34.2	Направление поворота			0+931	Требуется установить	1	слева
6	1.34.2	Направление поворота			0+981	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+824	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+852	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
9	3.20	Обгон запрещен			0+852	Требуется установить	1	слева
10	3.20	Обгон запрещен			0+852	Требуется установить	1	справа
11	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+852	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
12	8.2.1	Зона действия			0+852	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+971	1+058	87			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Обочина
Итого:			**87**							

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+999	1+058			58/19	Справа	Железобетон	Обочина
2	1+032	1+052	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/3**		**58/19**			

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+035	Населенный пункт	2/2	35	0	Слева
2	0+071	0+106	Населенный пункт	2/2	0	35	Слева
3	0+137	0+273	Населенный пункт	4/8	0	136	Слева
4	0+329	0+329	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+364	0+364	Населенный пункт	1/2	0	0	Справа
6	0+391	0+430	Населенный пункт	2/2	0	39	Справа
7	0+465	0+582	Населенный пункт	4/4	117	0	Слева
8	0+617	0+693	Населенный пункт	3/3	0	76	Слева
9	0+723	0+723	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
10	0+759	0+759	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
11	0+801	1+054	Населенный пункт	10/10	0	253	Справа
Итого:				**31/36**	**152**	**539**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+821	0+879	Жилая застройка	Слева	58	
2	0+879	0+946	Жилая застройка	Слева	67	
3	0+956	1+058	Жилая застройка	Слева	102	
Итого:					**227**	**0**

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+812	0+869	Жилая застройка	Слева	57	
2	0+869	0+935	Жилая застройка	Слева	66	
3	0+945	1+046	Жилая застройка	Слева	101	
Итого:					**224**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 2 36 R=2598м
Кривые в плане	33 R=611м P=22; a=16° 126
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 143
Характеристики проезжей части	3,00

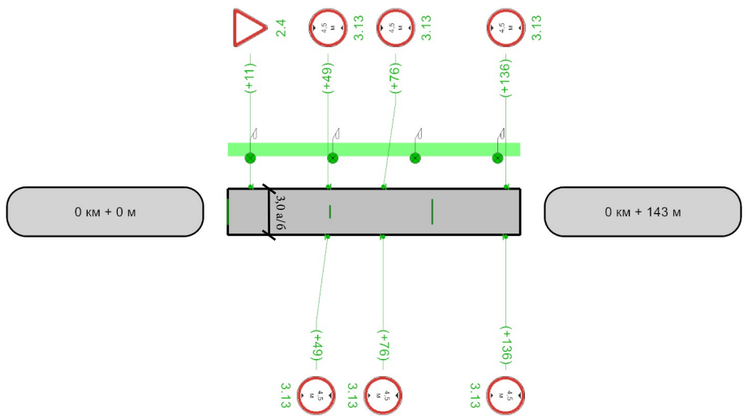

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+049	Требуется установить	1	слева
3	3.13	Ограничение высоты			0+049	Требуется установить	1	справа
4	3.13	Ограничение высоты			0+076	Требуется установить	1	слева
5	3.13	Ограничение высоты			0+076	Требуется установить	1	справа
6	3.13	Ограничение высоты			0+136	Требуется установить	1	слева
7	3.13	Ограничение высоты			0+136	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+132	Населенный пункт	4/4	121	0	Слева
Итого:				**4/4**	**121**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+143	Жилая застройка	Слева	143	
Итого:					**143**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 14 10 R=1097м
Кривые в плане	86 R=13м 107 β=0; α=83°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

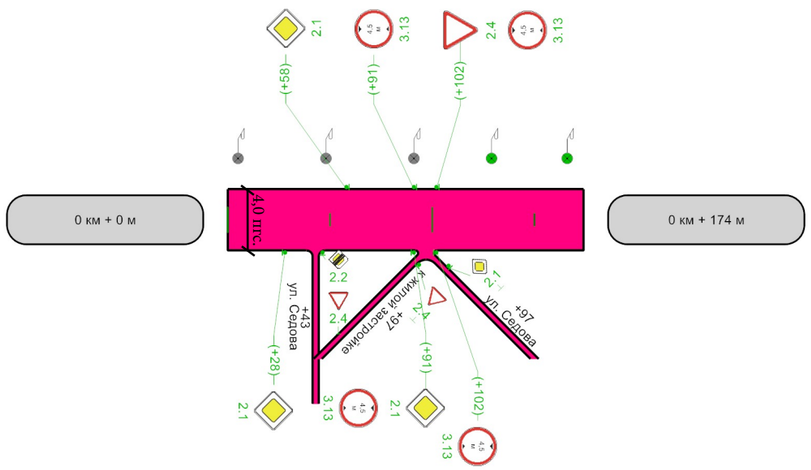

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+028	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+058	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+091	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+102	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
5	3.13	Ограничение высоты			0+091	Требуется установить	1	слева
6	3.13	Ограничение высоты			0+091	Требуется установить	1	справа
7	3.13	Ограничение высоты			0+102	Требуется установить	1	слева
8	3.13	Ограничение высоты			0+102	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+091	Населенный пункт	3/3	0	86	Слева
2	0+19	0+166	Населенный пункт	2/2	37	0	Слева
Итого:				**5/5**	**37**	**86**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	75
Кривые в плане	11 R=641м P=5; a=69° 63 158 R=627м P=20; a=18° 201
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,20

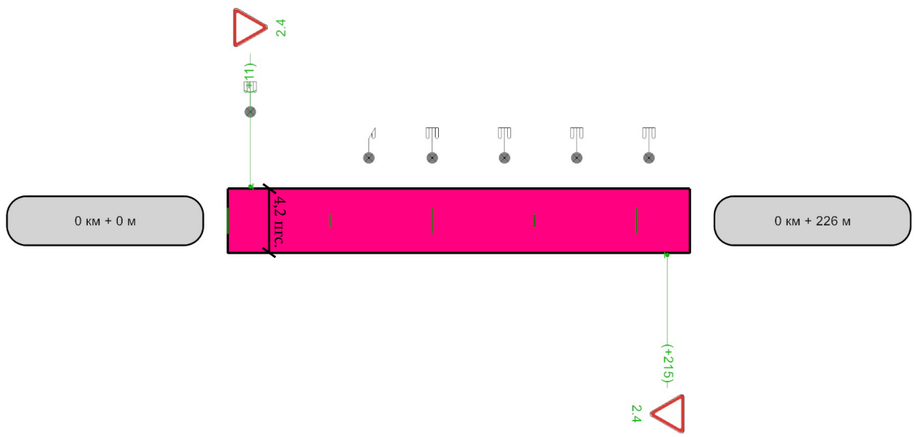

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+215	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+011	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
2	0+069	0+069	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+100	0+206	Населенный пункт	4/8	0	106	Слева
Итого:				**6/11**	**0**	**106**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	133; 113; 201; R=5536м; 144; 372
Кривые в плане	21; R=684м P=10; a=41°; 83; 93; R=655м P=5; a=78°; 170
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00

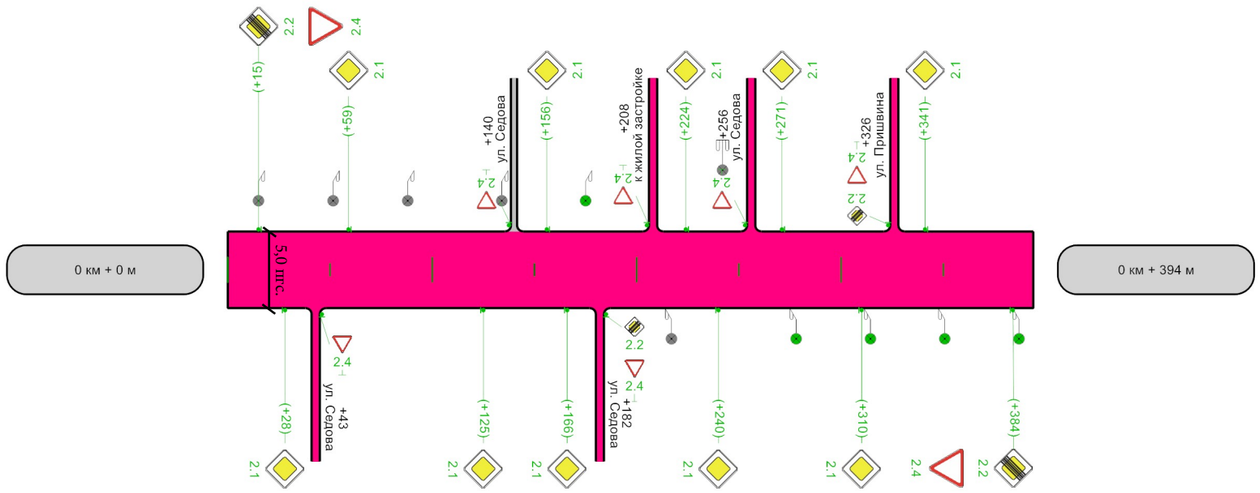

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+028	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+059	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+125	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+156	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+166	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+224	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+271	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+310	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+341	Требуется установить	1	слева
11	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
12	2.2	Конец главной дороги			0+384	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу			0+384	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+088	Населенный пункт	3/3	0	73	Слева
2	0+134	0+134	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+175	0+175	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+217	0+217	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+242	0+242	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
6	0+278	0+387	Населенный пункт	4/4	109	0	Справа
Итого:				**11/12**	**109**	**73**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	31
Кривые в плане	21 R=615м 47 P=4; a=94 / 84 R=632м P=4; a=99 11 / 190 R=625м P=4; a=99 211
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,80 | 37 | 3,00

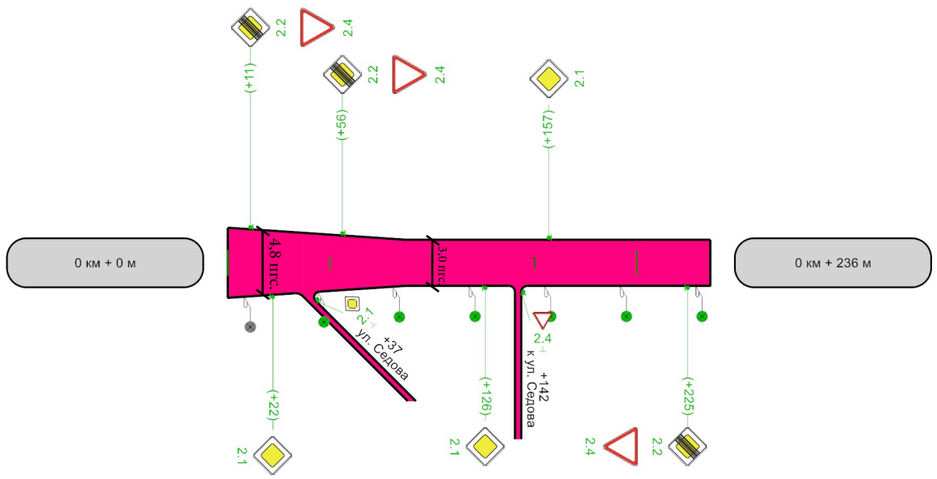

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+022	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+126	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+157	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+011	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+056	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			0+225	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+056	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+225	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**9**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+011	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+047	0+232	Населенный пункт	6/6	185	0	Справа
Итого:				**7/7**	**185**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до жилого дома по ул. Чкалова, 5


1-й участок: км 0+000 - км 0+766
2-й участок: км 0+000 - км 0+964
3-й участок: км 0+000 - км 0+378
4-й участок: км 0+000 - км 0+132

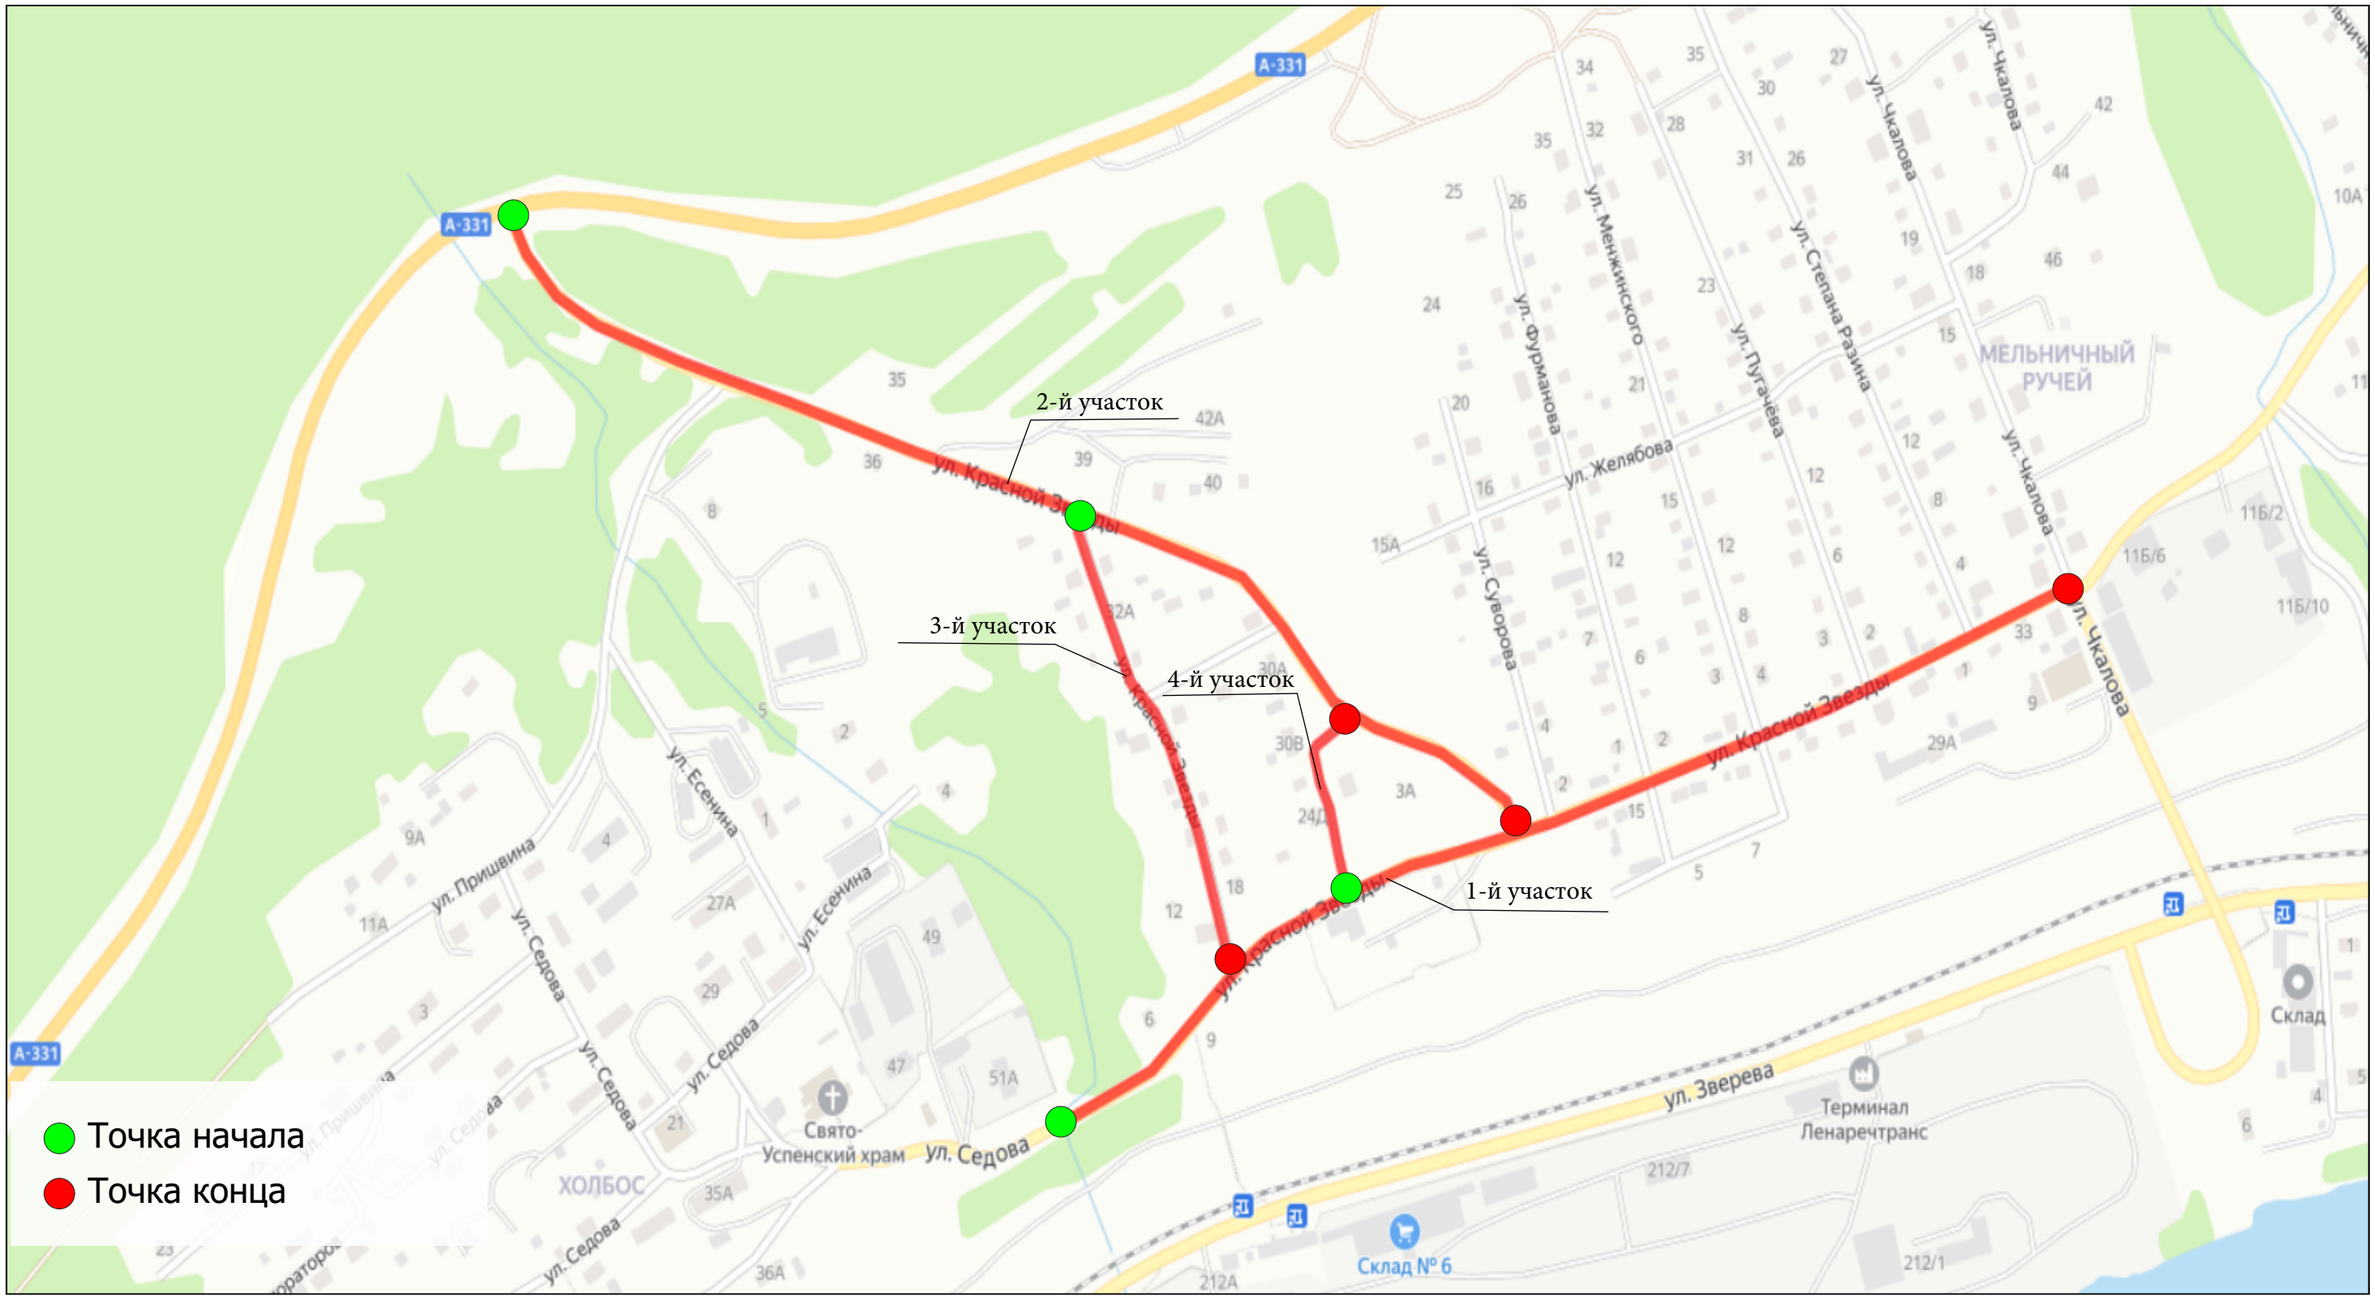

М 1:3000

Автомобильная дорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до жилого дома по ул. Чкалова, 5 уч. №1

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 12 — R=2587м — 111 — 59 — 145 — 59 — R=4973м — 496 — 19 — 526 — 19 — R=3116м — 639 — 21 — 667 — 21 — R=2717м
Кривые в плане	32 — R=204м P=6; a=20° — 95 — 131 — R=316м P=6; a=32° — 292
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 135 | н/д: ширина 1м, а/б, 137 - 229 | н/д: ширина 1м, а/б, 232 - 351 | н/д: ширина 1м, а/б, 382 - 451 | н/д: ширина 1м, а/б, 455 - 532 | н/д: ширина 1м, а/б, 536 - 616 | н/д: ширина 1м, а/б, 620 - 694 | н/д: ширина 1м, а/б, 699 - 766
Характеристики проезжей части	6,00

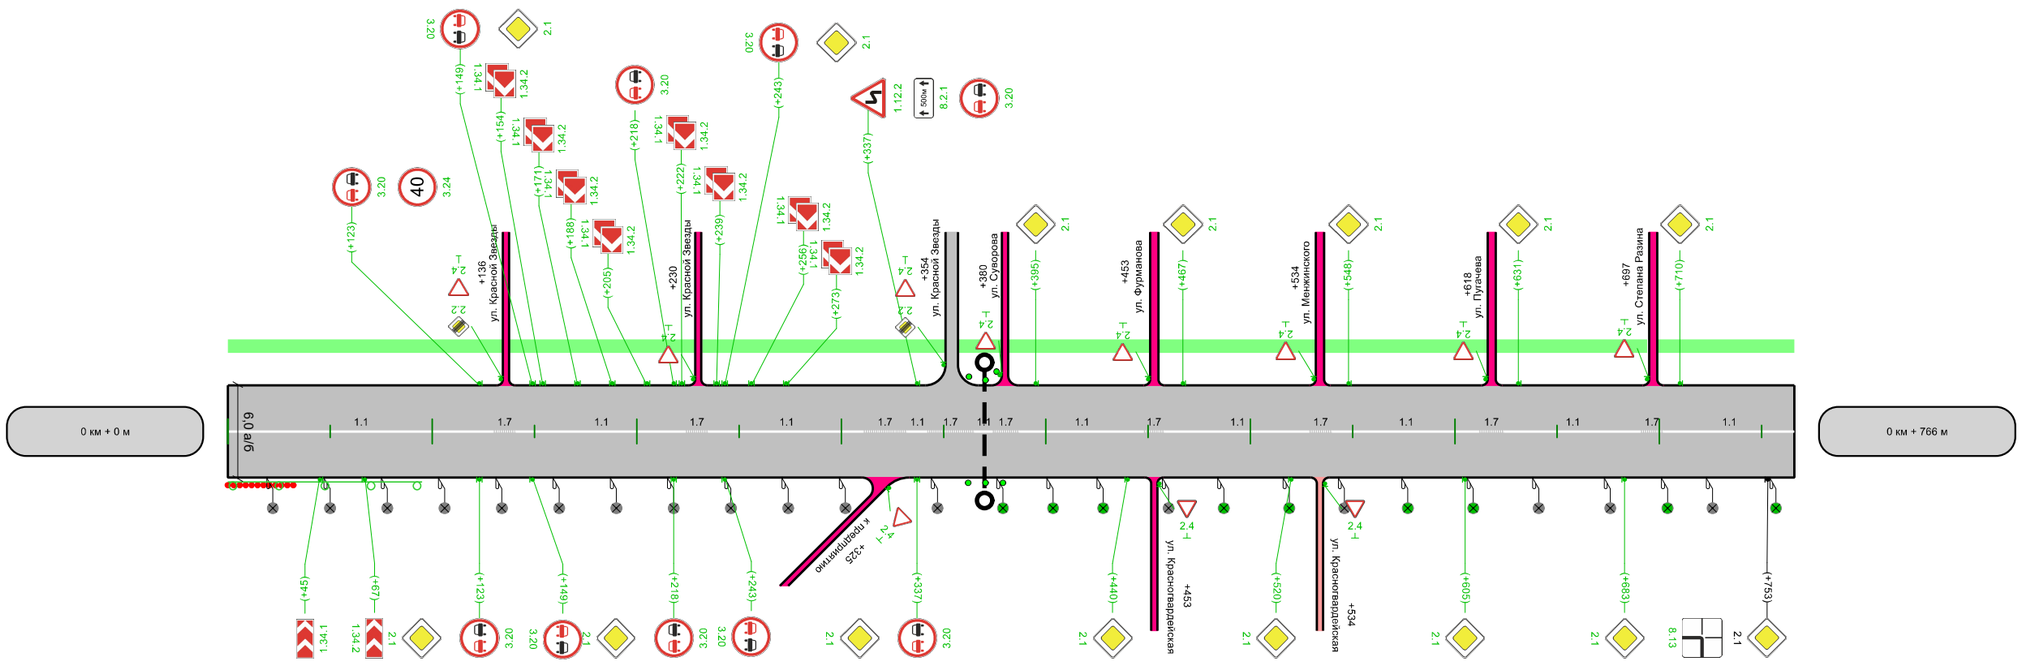

осевая	1.1 0 - 130 | 1.7 130 - 141 | 1.1 141 - 224 | 1.7 224 - 235 | 1.1 235 - 311 | 1.7 311 - 332 | 1.1 332 - 342 | 1.7 342 - 365 | 1.1 365 - 374 | 1.7 374 - 387 | 1.1 387 - 448 | 1.7 448 - 458 | 1.1 458 - 529 | 1.7 529 - 540 | 1.1 540 - 612 | 1.7 612 - 624 | 1.1 624 - 691 | 1.7 691 - 702 | 1.1 702 - 766
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	12дн. Железобетон. С 32 н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 95
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость дорожной разметки

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	643,000	123,000	
ИТОГО	**643,000**	**123,000**	
ЛИН.КМ	**0,643**	**0,123**	
ПРИВЕД.КМ	**0,643**	**0,062**	
ПЛОЩАДЬ	**64,300**	**6,150**	**70,450**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+337	Требуется установить	1	слева
2	1.34.1	Направление поворота			0+045	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+154	Требуется установить	1	слева
4	1.34.1	Направление поворота			0+171	Требуется установить	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота			0+188	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			0+205	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
8	1.34.1	Направление поворота			0+239	Требуется установить	1	слева
9	1.34.1	Направление поворота			0+256	Требуется установить	1	слева
10	1.34.1	Направление поворота			0+273	Требуется установить	1	слева
11	1.34.2	Направление поворота			0+067	Требуется установить	1	справа
12	1.34.2	Направление поворота			0+154	Требуется установить	1	слева
13	1.34.2	Направление поворота			0+171	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			0+188	Требуется установить	1	слева
15	1.34.2	Направление поворота			0+205	Требуется установить	1	слева
16	1.34.2	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
17	1.34.2	Направление поворота			0+239	Требуется установить	1	слева
18	1.34.2	Направление поворота			0+256	Требуется установить	1	слева
19	1.34.2	Направление поворота			0+273	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**19**	
		Итого:					**19**	
		Знаки приоритета						
20	2.1	Главная дорога			0+123	Требуется установить	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+149	Требуется установить	1	слева
22	2.1	Главная дорога			0+218	Требуется установить	1	справа
23	2.1	Главная дорога			0+243	Требуется установить	1	слева
24	2.1	Главная дорога			0+337	Требуется установить	1	справа
25	2.1	Главная дорога			0+395	Требуется установить	1	слева
26	2.1	Главная дорога			0+440	Требуется установить	1	справа
27	2.1	Главная дорога			0+467	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога			0+520	Требуется установить	1	справа
29	2.1	Главная дорога			0+548	Требуется установить	1	слева
30	2.1	Главная дорога			0+605	Требуется установить	1	справа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	2.1	Главная дорога			0+631	Требуется установить	1	слева
32	2.1	Главная дорога			0+683	Требуется установить	1	справа
33	2.1	Главная дорога			0+710	Требуется установить	1	слева
34	2.1	Главная дорога			0+753	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**15**	
		Запрещающие знаки						
35	3.20	Обгон запрещен			0+123	Требуется установить	1	слева
36	3.20	Обгон запрещен			0+123	Требуется установить	1	справа
37	3.20	Обгон запрещен			0+149	Требуется установить	1	слева
38	3.20	Обгон запрещен			0+149	Требуется установить	1	справа
39	3.20	Обгон запрещен			0+218	Требуется установить	1	слева
40	3.20	Обгон запрещен			0+218	Требуется установить	1	справа
41	3.20	Обгон запрещен			0+243	Требуется установить	1	слева
42	3.20	Обгон запрещен			0+243	Требуется установить	1	справа
43	3.20	Обгон запрещен			0+337	Требуется установить	1	слева
44	3.20	Обгон запрещен			0+337	Требуется установить	1	справа
45	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+123	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
46	8.2.1	Зона действия			0+337	Требуется установить	1	слева
47	8.13	Направление главной дороги			0+753	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**46**	
		Всего:					**47**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+000	0+095	95				Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	Оцинкованный металл	У - 1	0,80	Обочина
Итого:			**95**									

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000	0+032			32/9	Справа	Железобетон	Обочина


1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0+362	0+379	17/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+362	0+379	17/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**34/4**		**32/9**			

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+022	0+302	Населенный пункт	11/11	0	280	Справа
2	0+347	0+347	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+379	0+428	Населенный пункт	3/3	49	0	Справа
4	0+460	0+460	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+487	0+519	Населенный пункт	2/2	32	0	Справа
6	0+546	0+546	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
7	0+577	0+609	Населенный пункт	2/2	32	0	Справа
8	0+641	0+641	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
9	0+676	0+676	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
10	0+704	0+704	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
11	0+726	0+726	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
12	0+757	0+757	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**26/26**	**113**	**280**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+135	Жилая застройка	Слева	135	
2	0+137	0+229	Жилая застройка	Слева	92	
3	0+232	0+351	Жилая застройка	Слева	119	
4	0+357	0+380	Жилая застройка	Слева	23	
5	0+382	0+451	Жилая застройка	Слева	69	
6	0+455	0+532	Жилая застройка	Слева	77	
7	0+536	0+616	Жилая застройка	Слева	80	
8	0+620	0+694	Жилая застройка	Слева	74	
9	0+699	0+766	Жилая застройка	Слева	67	
Итого:					**736**	**0**

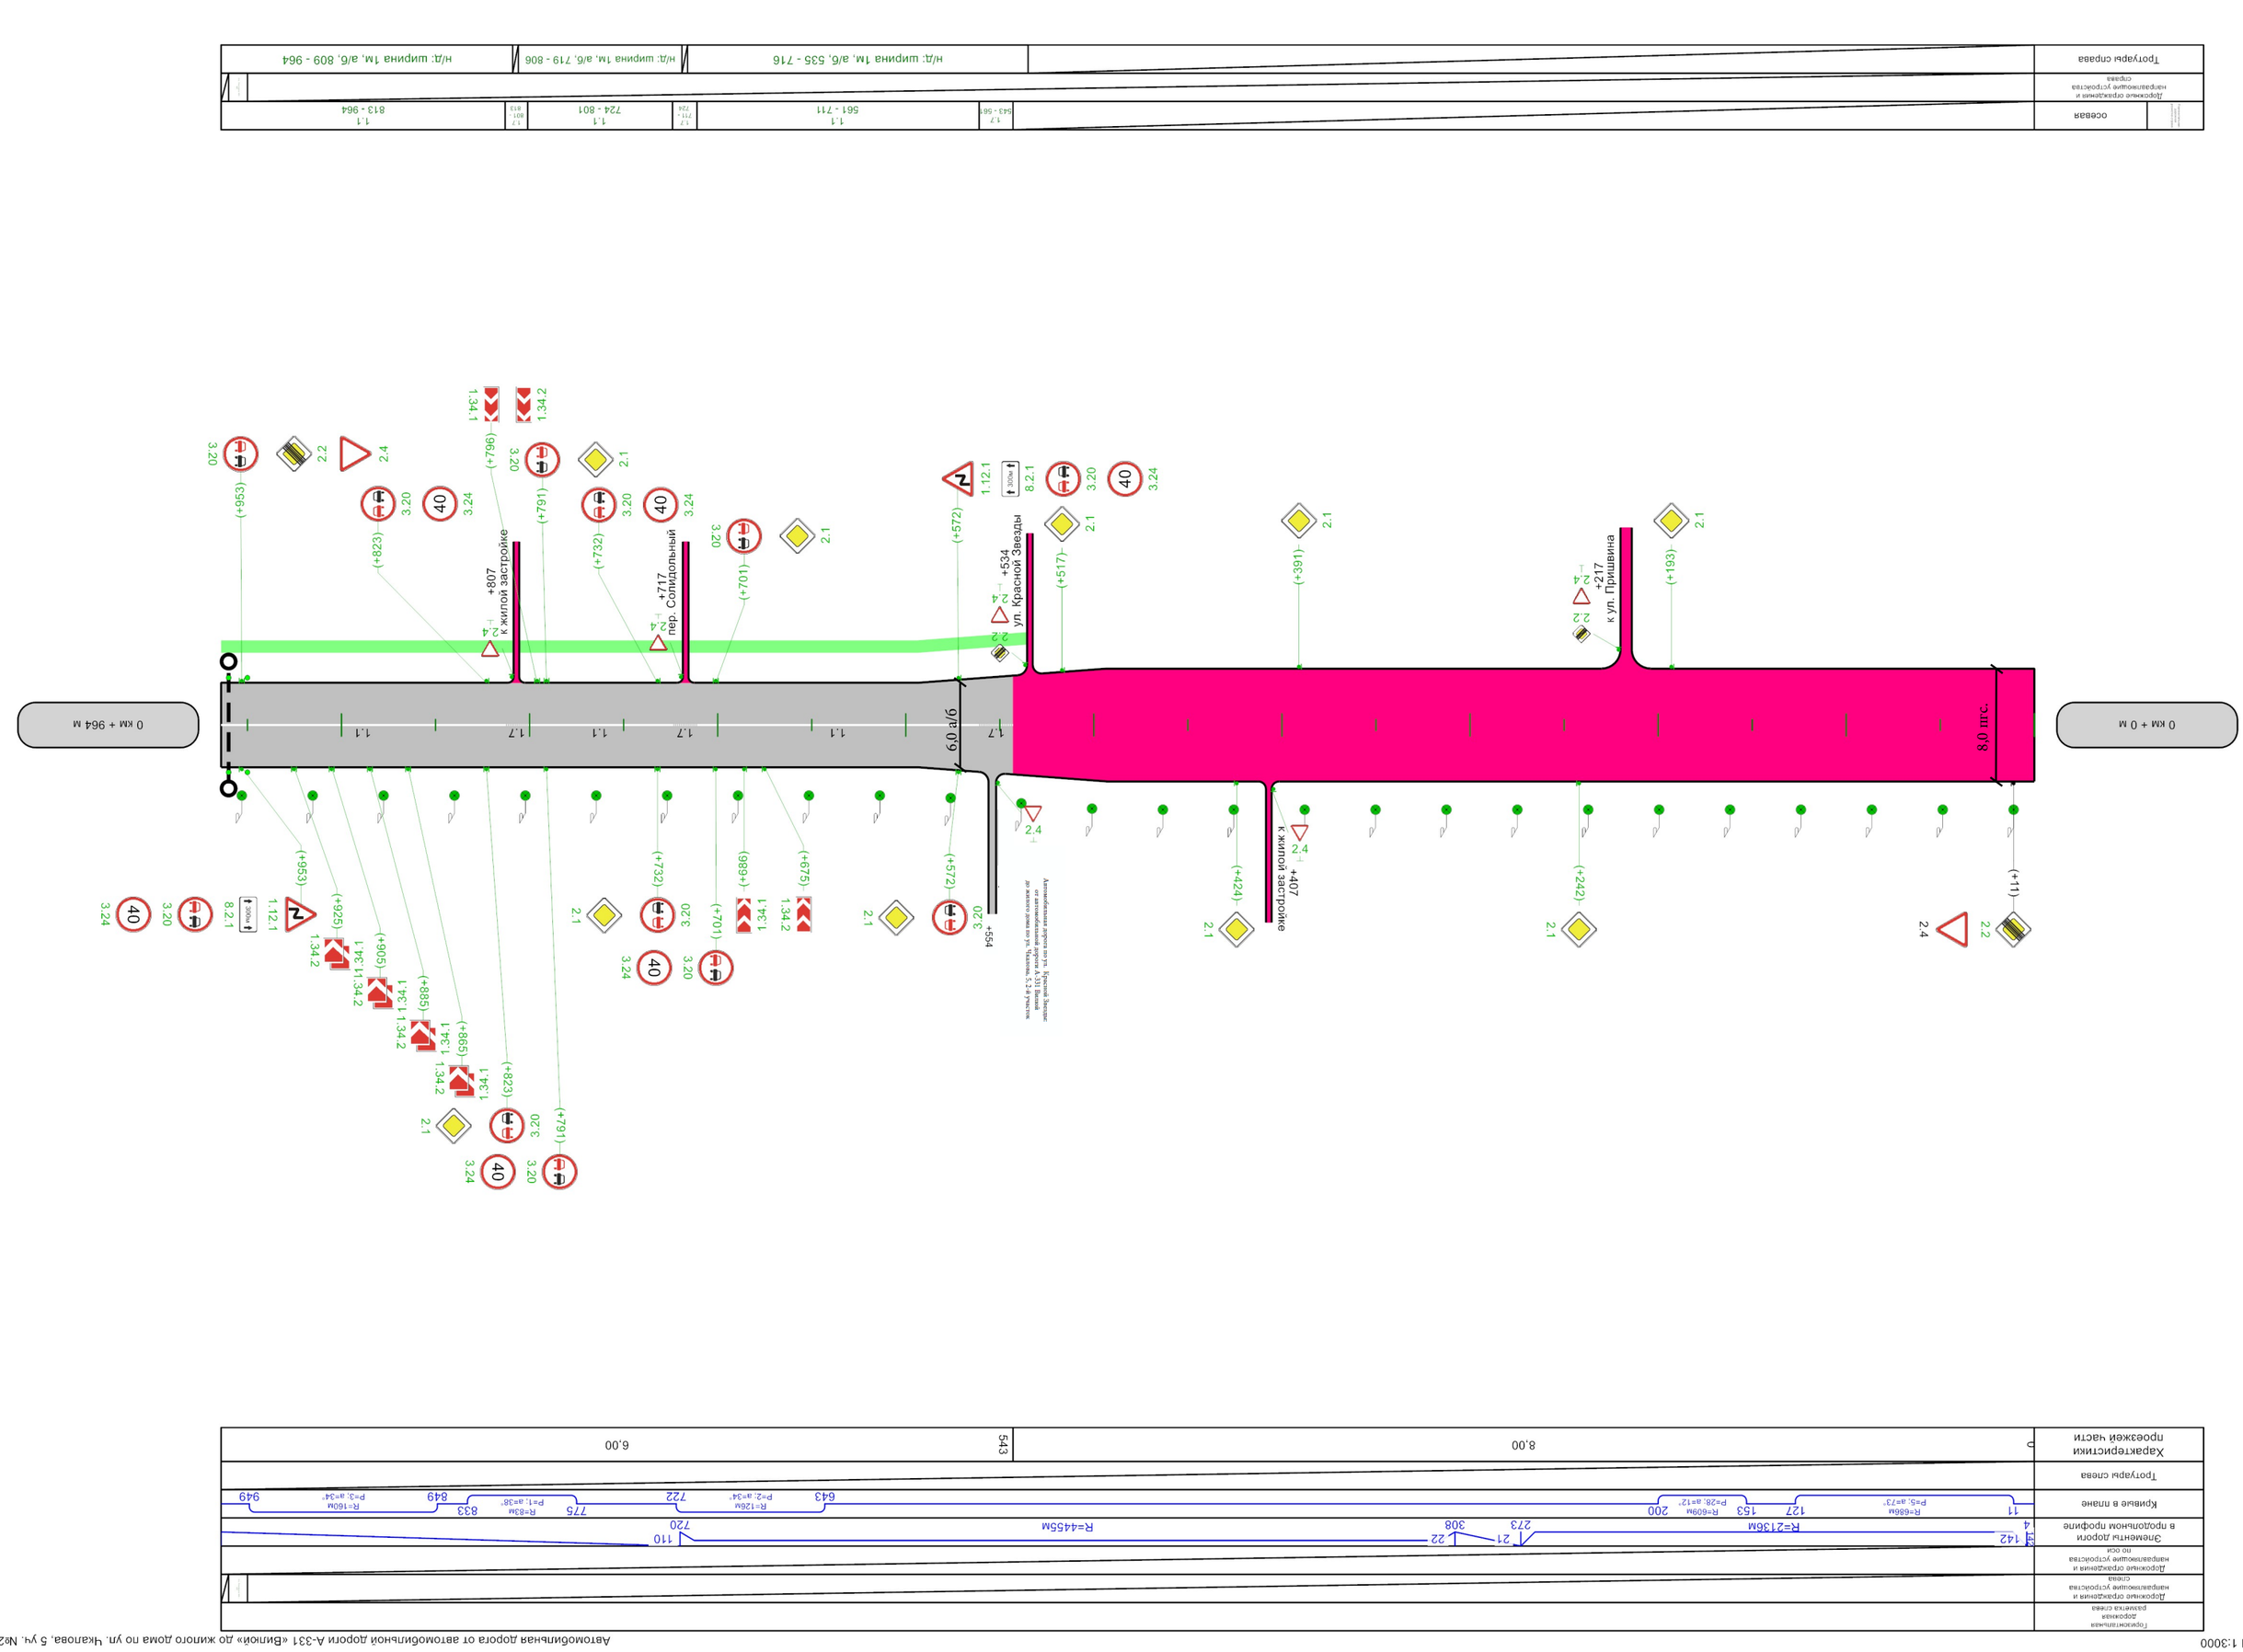

Горизонтальная разметка	1.1
Дорожная разметка	1.7
Дорожные ограждения и направляющие устройства	н/д: ширина 1м, а/б, 535 - 716
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	1.1 561 - 711
Элементы дороги в продольном профиле	1.7 543 - 561
Кривые в плане	1.1 724 - 801
Тротуары справа	1.1 813 - 964
Характеристики проезжей части	н/д: ширина 1м, а/б, 719 - 806
	1.1 807 813
	н/д: ширина 1м, а/б, 809 - 964
	1.7 711 724
	0
	8,00
	543
	6,00

Автомобильная дорога от автомобильной дороги А-331 «Виленский» до жилого дома по ул. Чкалова, 5 уч. №2

М 1:3000

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	378,000	43,000	**39,950**
ИТОГО	**378,000**	**43,000**	**39,950**
ЛИН.КМ	**0,378**	**0,043**	
ПРИВЕД.КМ	**0,378**	**0,022**	
ПЛОЩАДЬ	**37,800**	**2,150**	**39,950**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+572	Требуется установить	1	справа
2	1.12.1	Опасные повороты			0+953	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+686	Требуется установить	1	слева
4	1.34.1	Направление поворота			0+796	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+865	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			0+885	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+905	Требуется установить	1	слева
8	1.34.1	Направление поворота			0+925	Требуется установить	1	слева
9	1.34.2	Направление поворота			0+675	Требуется установить	1	слева
10	1.34.2	Направление поворота			0+796	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			0+865	Требуется установить	1	слева
12	1.34.2	Направление поворота			0+885	Требуется установить	1	слева
13	1.34.2	Направление поворота			0+905	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			0+925	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Знаки приоритета						
15	2.1	Главная дорога			0+193	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+242	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога			0+391	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+424	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+517	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+572	Требуется установить	1	слева
21	2.1	Главная дорога			0+701	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+732	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+791	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+823	Требуется установить	1	слева
25	2.2	Конец главной дороги			0+011	Требуется установить	1	слева
26	2.2	Конец главной дороги			0+953	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	2.4	Уступите дорогу			0+011	Установлено	1	слева
28	2.4	Уступите дорогу			0+953	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**14**	
		Запрещающие знаки						
29	3.20	Обгон запрещен			0+572	Требуется установить	1	слева
30	3.20	Обгон запрещен			0+572	Требуется установить	1	справа
31	3.20	Обгон запрещен			0+701	Требуется установить	1	слева
32	3.20	Обгон запрещен			0+701	Требуется установить	1	справа
33	3.20	Обгон запрещен			0+732	Требуется установить	1	слева
34	3.20	Обгон запрещен			0+732	Требуется установить	1	справа
35	3.20	Обгон запрещен			0+791	Требуется установить	1	слева
36	3.20	Обгон запрещен			0+791	Требуется установить	1	справа
37	3.20	Обгон запрещен			0+823	Требуется установить	1	слева
38	3.20	Обгон запрещен			0+823	Требуется установить	1	справа
39	3.20	Обгон запрещен			0+953	Требуется установить	1	слева
40	3.20	Обгон запрещен			0+953	Требуется установить	1	справа
41	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+572	Требуется установить	1	справа
42	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+701	Требуется установить	1	слева
43	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+732	Требуется установить	1	справа
44	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+791	Требуется установить	1	слева
45	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+823	Требуется установить	1	справа
46	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+953	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**18**	
		Итого:					**18**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
47	8.2.1	Зона действия			0+572	Требуется установить	1	справа
48	8.2.1	Зона действия			0+953	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**47**	
		Всего:					**48**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+950	0+960	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+950	0+960	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+011	0+953	Населенный пункт	26/26	942	0	Слева
Итого:				**26/26**	**942**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+535	0+716	Жилая застройка	Справа	181	
2	0+719	0+806	Жилая застройка	Справа	87	
3	0+809	0+964	Жилая застройка	Справа	155	
Итого:					**423**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	144 20 144 R=7366м 107 327
Кривые в плане	R=623м P=5; a=73° 35 138 R=664м P=17; a=22° 167 R=680м P=16; a=25° 207
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

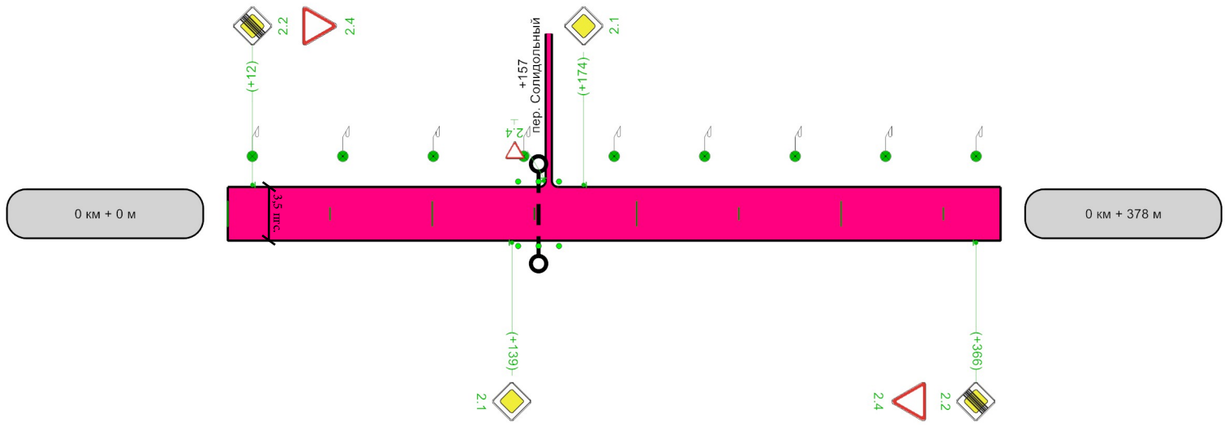

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+139	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+174	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+012	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+366	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+012	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+366	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+142	0+162	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+142	0+162	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012	0+366	Населенный пункт	9/9	354	0	Слева
Итого:				**9/9**	**354**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	82 R=650м 103
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

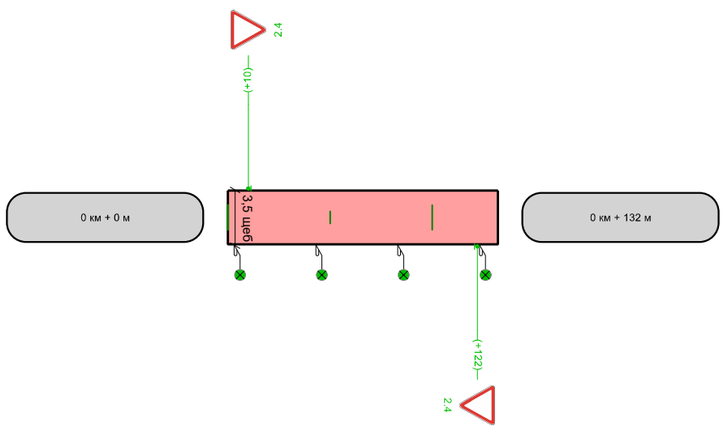

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+122	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006	0+126	Жилая застройка	4/4	120	0	Справа
Итого:				**4/4**	**120**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Советская, д. 99, по ул. Партизанская до жилого дома по ул. Партизанская, д. 37
км 0+000 - км 0+654

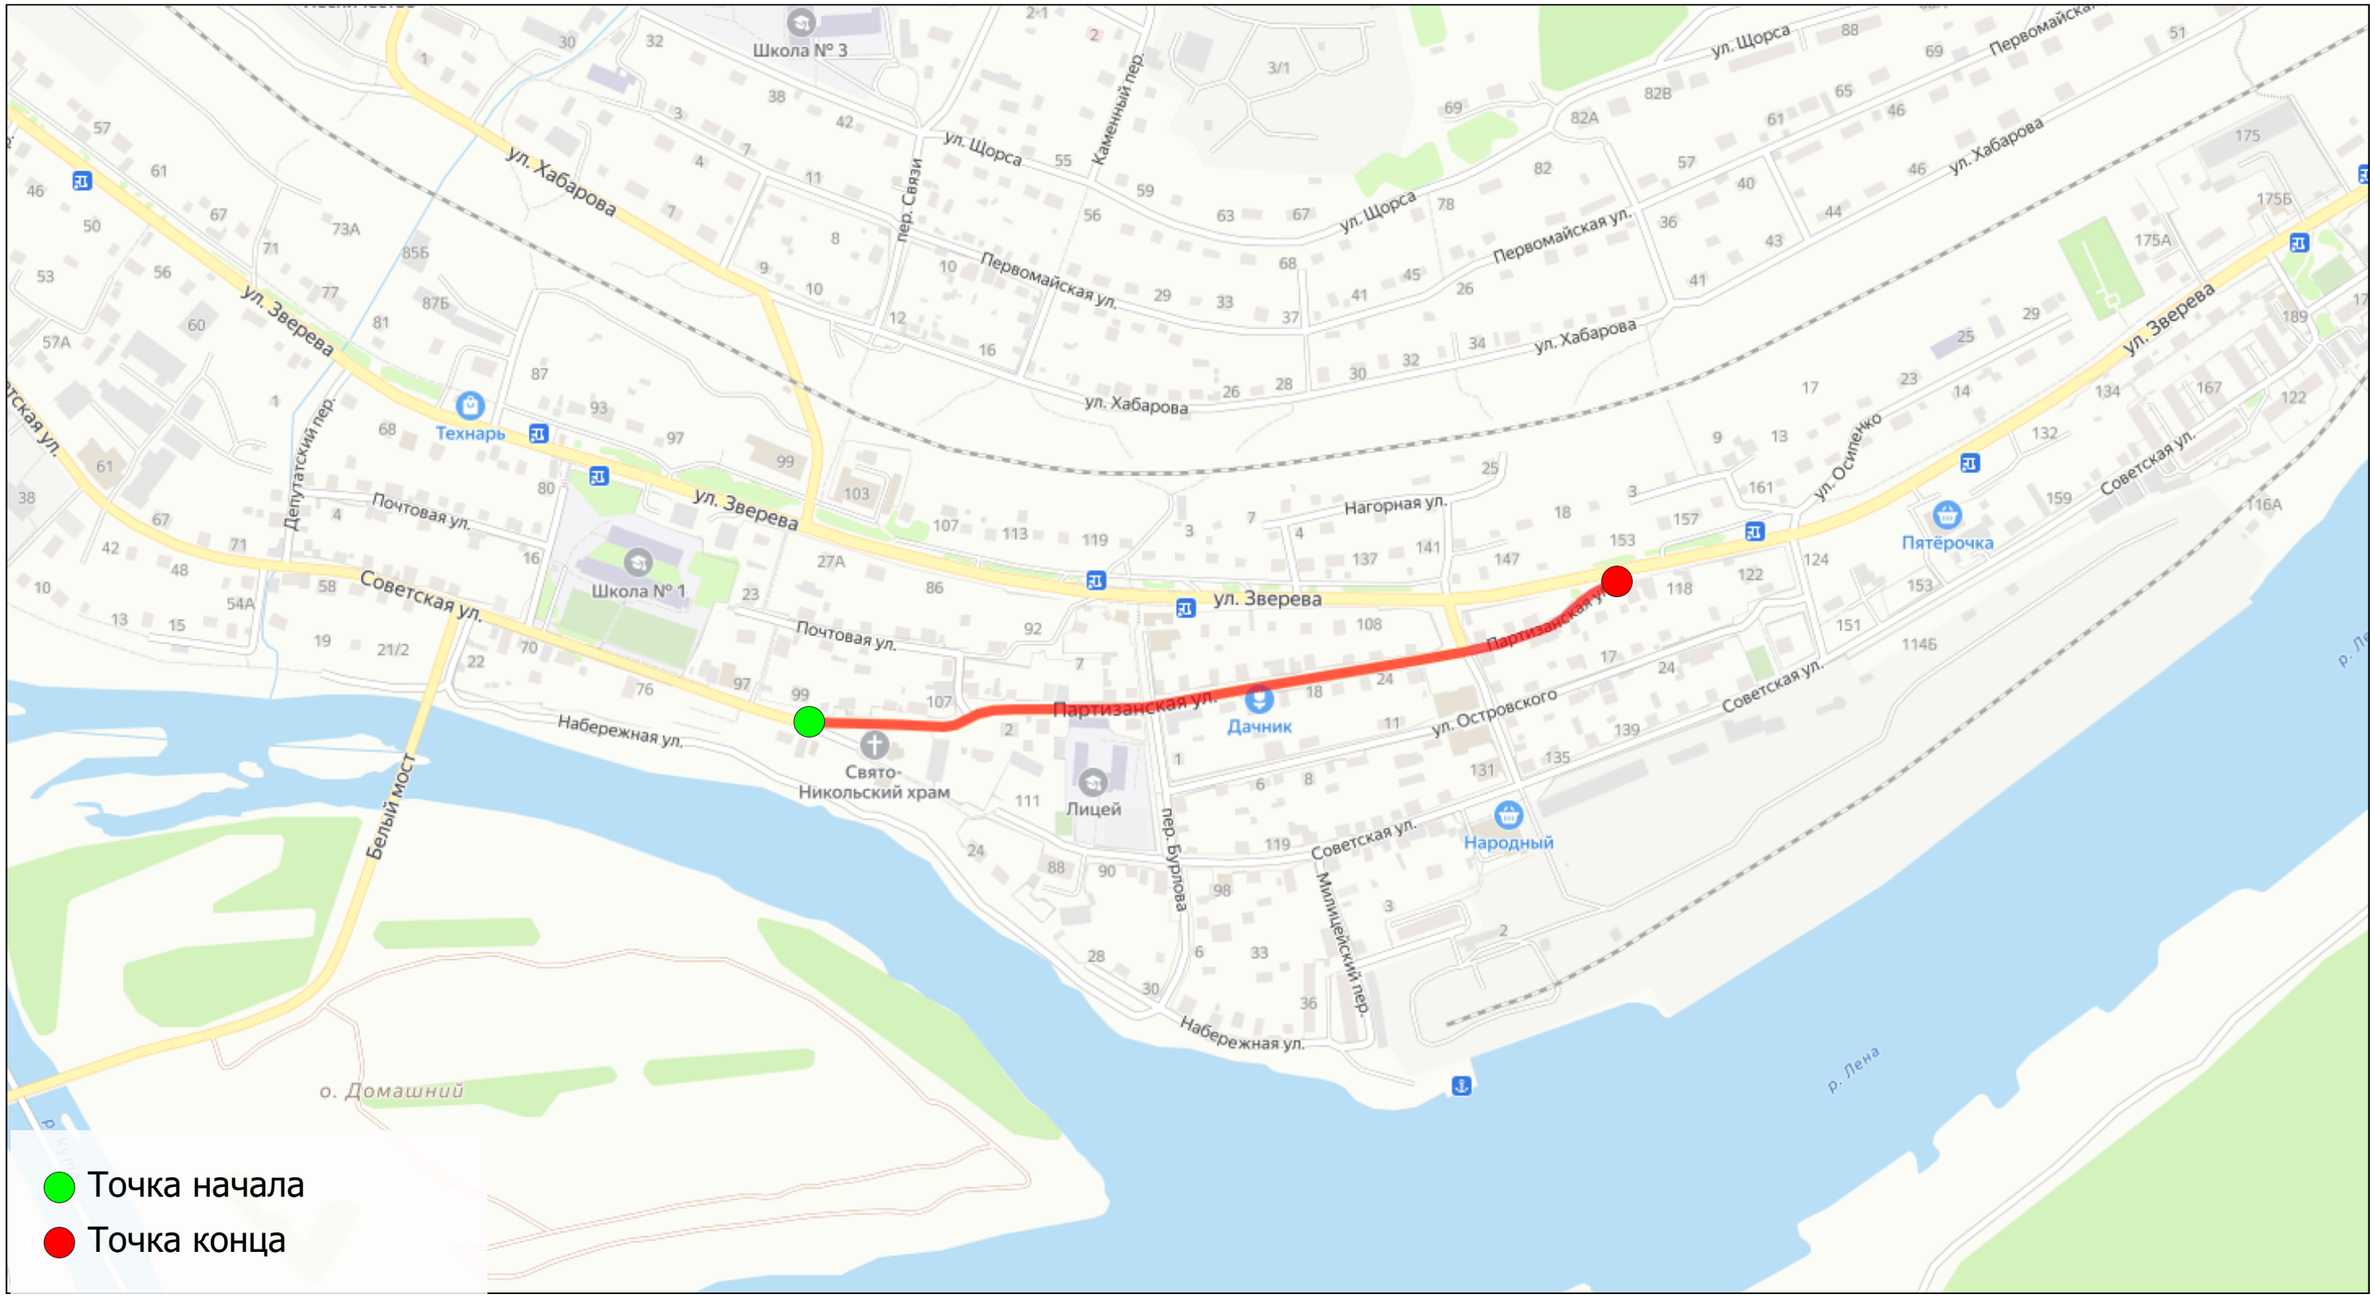

М 1:3000

Горизонтальная разметка различных типов	1-ая от осевой	1.2 0 - 105 | 1.2 116 - 501
	Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 199 - 249
	Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
	Элементы дороги в продольном профиле	10 | 1 R=2495м (482)
	Кривые в плане	72 R=117м P=3; a=24° 120 | R=124м P=3; a=21° 163 | 220 R=657м P=46; a=8° 297 | 462 R=735м P=80; a=5° 527 | 579 R=660м 627
	Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 109 | н/д: ширина 1м, а/б, 113 - 507
	Характеристики проезжей части	0 | 0,75-6,00-0,75 | 512 | 4,20 | 3,00

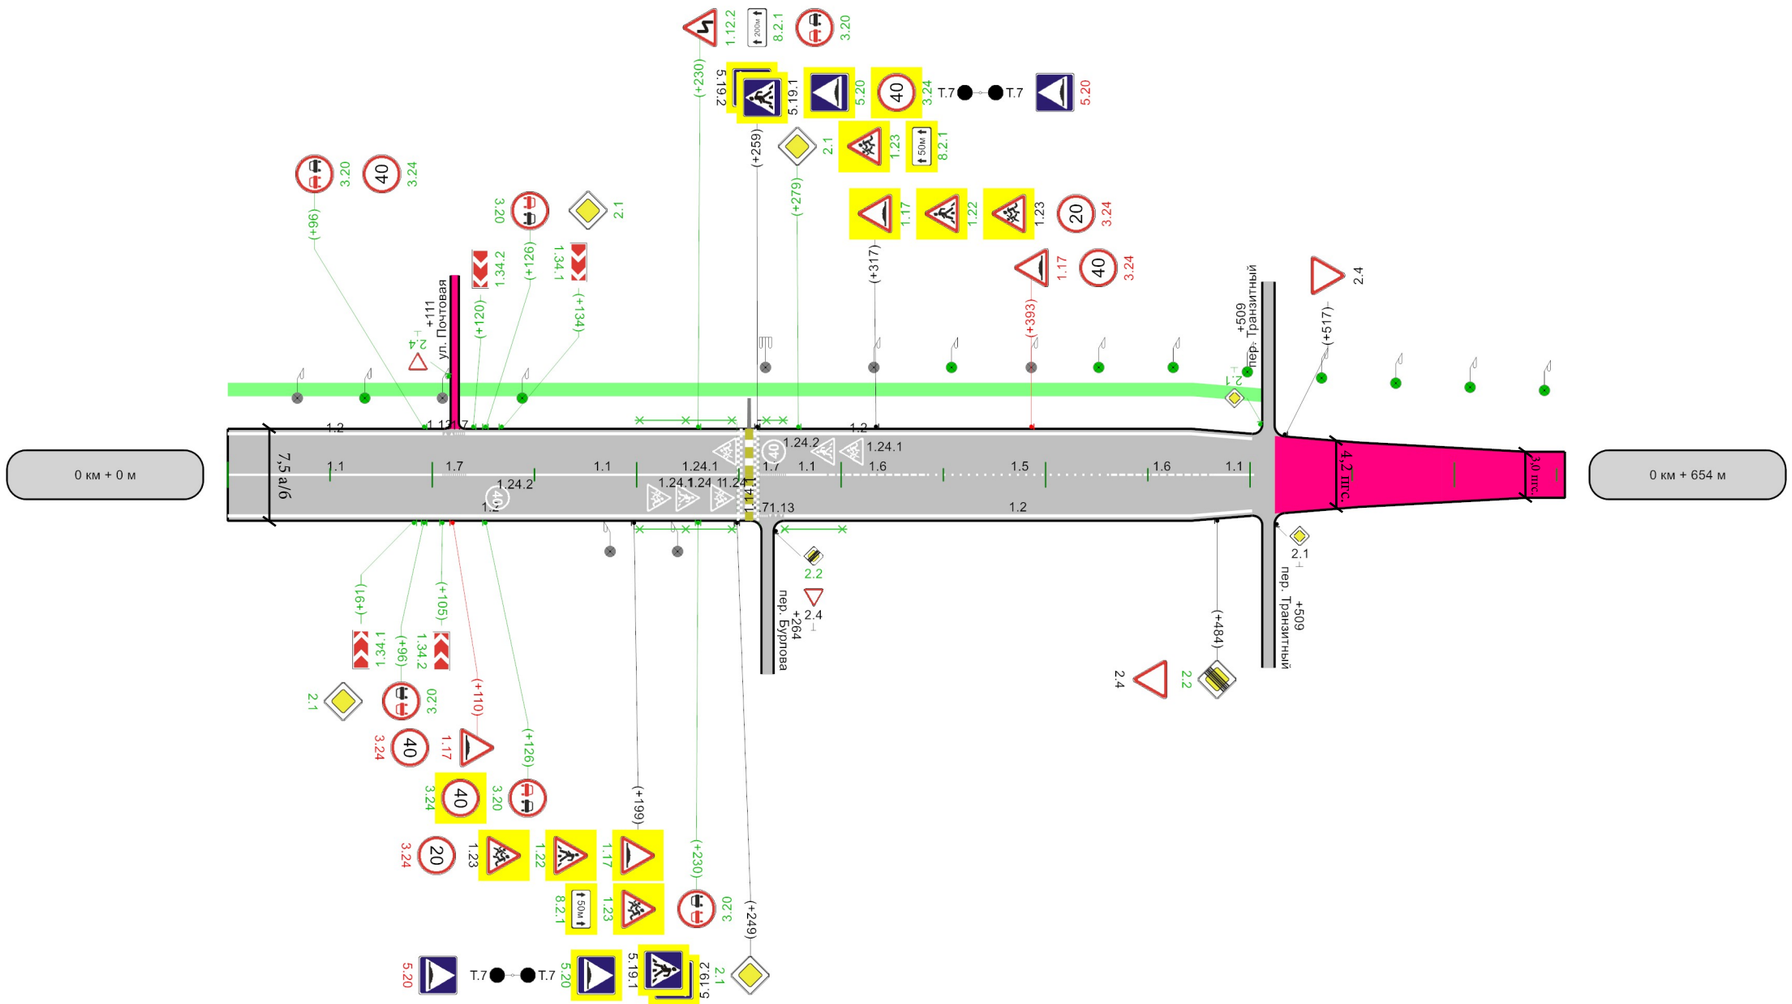

Горизонтальная разметка различных типов	осевая	1.1 0 - 105 | 1.7 105 - 117 | 1.1 117 - 249 | 1.7 255 - 273 | 1.1 273 - 293 | 1.6 293 - 343 | 1.5 343 - 432 | 1.6 432 - 482 | 1.1 482 - 502
	1-ая от осевой	1.2 0 - 257 | 1.11 257 - 264 | 1.13 264 - 272 | 1.2 272 - 501
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: Оцинкованный металл, 199 - 249 | н/д: Оцинкованный металл, 257 - 303
	Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.14.1(м)	1.24.1(шт)		1.24.2(шт)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	16.000	1.540	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 - 1	277,000	976,000	89,000	100,000	38,000	14,000	6,000	2,000	4,000	2,000	12,000	**160,167**
ИТОГО	**277,000**	**976,000**	**89,000**	**100,000**	**38,000**	**14,000**	**6,000**	**2,000**	**4,000**	**2,000**	**12,000**	160,167
ЛИН.КМ	**0,277**	**0,976**	**0,089**	**0,100**	**0,038**	**0,014**	**0,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,277**	**0,976**	**0,022**	**0,075**	**0,019**	**0,004**	**0,096**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**27,700**	**97,600**	**2,225**	**7,500**	**1,900**	**0,350**	**9,600**	**3,080**	**6,200**	**3,820**	**0,192**	**160,167**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+230	Требуется установить	1	слева
2	1.17	Искусственная неровность			0+110	Демонтировать	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность			0+199	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+317	Требуется установить	1	слева
5	1.17	Искусственная неровность			0+393	Демонтировать	1	слева
6	1.22	Пешеходный переход			0+199	Требуется установить	1	справа
7	1.22	Пешеходный переход			0+317	Требуется установить	1	слева
8	1.23	Дети			0+199	Установлено	1	справа
9	1.23	Дети			0+230	Требуется установить	1	справа
10	1.23	Дети			0+279	Требуется установить	1	слева
11	1.23	Дети			0+317	Установлено	1	слева
12	1.34.1	Направление поворота			0+091	Требуется установить	1	справа
13	1.34.1	Направление поворота			0+134	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			0+105	Требуется установить	1	справа
15	1.34.2	Направление поворота			0+120	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**11**	

		Итого:					**13**	
		Знаки приоритета						
16	2.1	Главная дорога			0+096	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			0+126	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+249	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+279	Требуется установить	1	слева
20	2.2	Конец главной дороги			0+484	Требуется установить	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу			0+484	Установлено	1	справа
22	2.4	Уступите дорогу			0+517	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**7**	
		Запрещающие знаки						
23	3.20	Обгон запрещен			0+096	Требуется установить	1	слева
24	3.20	Обгон запрещен			0+096	Требуется установить	1	справа
25	3.20	Обгон запрещен			0+126	Требуется установить	1	слева
26	3.20	Обгон запрещен			0+126	Требуется установить	1	справа
27	3.20	Обгон запрещен			0+230	Требуется установить	1	слева
28	3.20	Обгон запрещен			0+230	Требуется установить	1	справа
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+096	Требуется установить	1	слева
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+110	Демонтировать	1	справа
31	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+126	Требуется установить	1	справа
32	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+199	Демонтировать	1	справа
33	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+259	Требуется установить	1	слева
34	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+317	Демонтировать	1	слева
35	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+393	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Знаки особых предписаний						
36	5.19.1	Пешеходный переход			0+249	Установлено	1	справа

37	5.19.1	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	слева
38	5.19.2	Пешеходный переход			0+249	Установлено	1	справа
39	5.19.2	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	слева
40	5.20	Искусственная неровность			0+249	Демонтировать	1	справа
41	5.20	Искусственная неровность			0+249	Требуется установить	1	справа
42	5.20	Искусственная неровность			0+259	Демонтировать	1	слева
43	5.20	Искусственная неровность			0+259	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
44	8.2.1	Зона действия			0+230	Требуется установить	1	слева
45	8.2.1	Зона действия			0+230	Требуется установить	1	справа
46	8.2.1	Зона действия			0+279	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**8**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**8**	
		Всего требуется установить:					**30**	
		Всего:					**38**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+034	0+034	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+067	0+067	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+105	0+105	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+144	0+144	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+187	0+220	Населенный пункт	2/2	0	33	Справа
6	0+263	0+263	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
7	0+316	0+316	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
8	0+354	0+354	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
9	0+393	0+393	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
10	0+426	0+644	Населенный пункт	7/7	218	0	Слева
Итого:				**17/18**	**218**	**33**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+199	0+249	50				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	0+199	0+249	50				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
3	0+259	0+261		2			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
4	0+261	0+274	13				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
5	0+267	0+303	36				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**149**	**2**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+249	Пешеходный переход	2	0	-	Справа
2	0+259	Пешеходный переход	2	0	-	Слева
Итого:			**4**	**0**		

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Первомайская, д. 71 до жилого дома по ул. Щорса, д. 32
км 0+000 - км 1+282

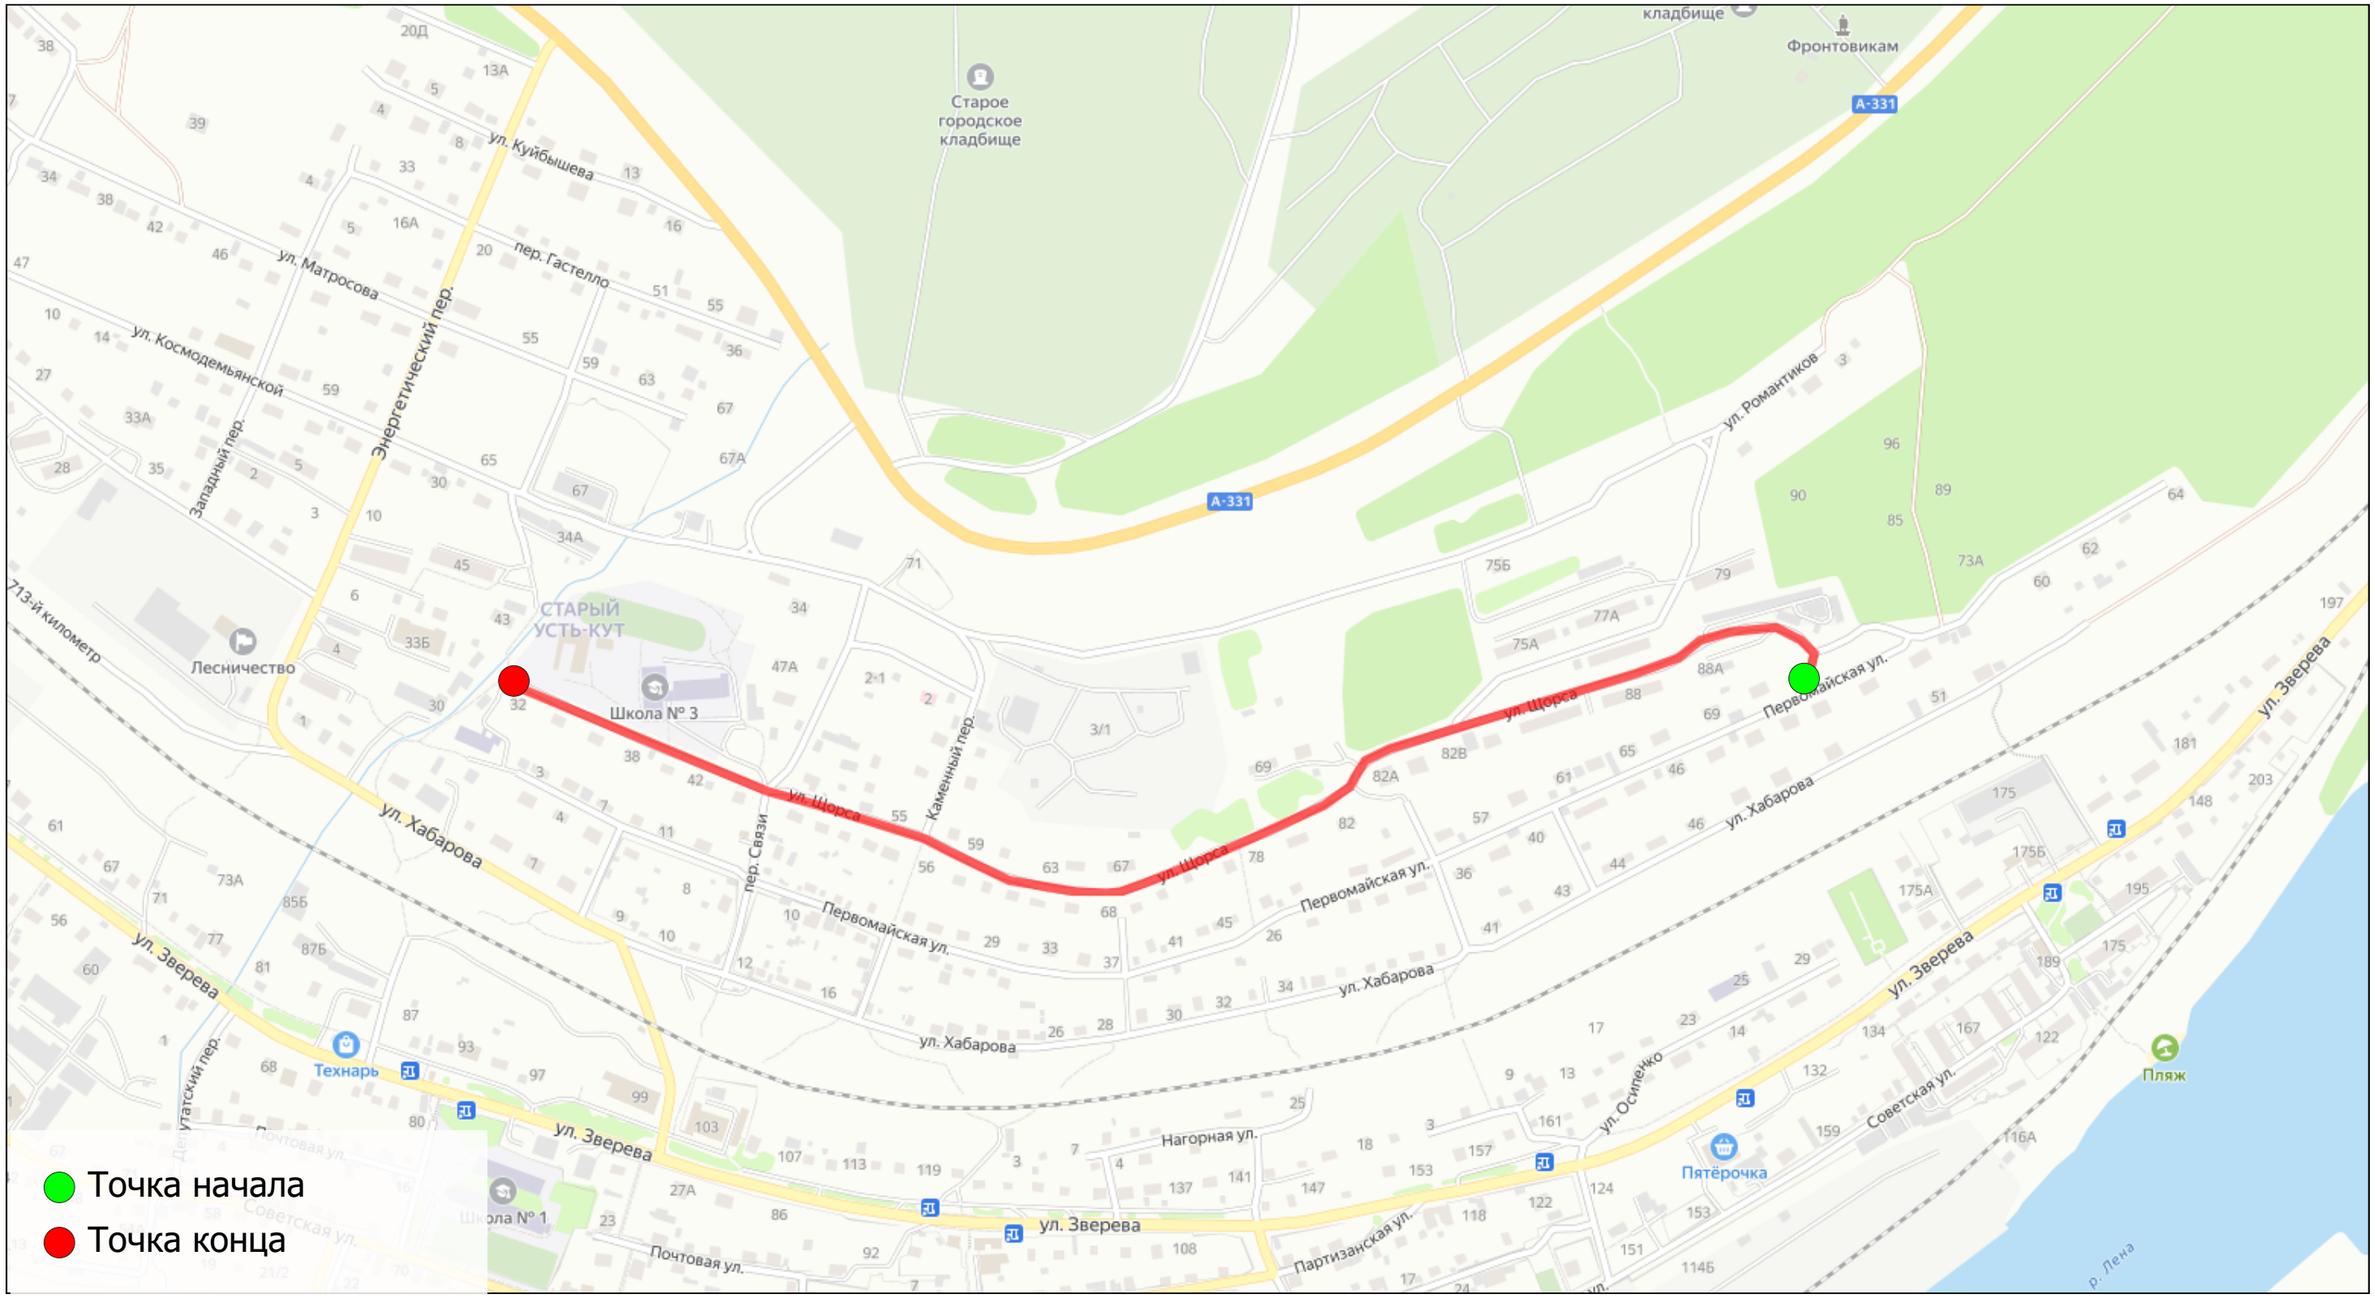

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Первомайская, д. 71 до жилого дома по ул. Щорса, д. 32


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	145 | 145 — 12 — R=2247м — 466 | 58 | 58 — 487 — R=2038м — 588 | 9 — 660 | 12 — R=3378м — 784 | 25 | 25 — 805 — R=2748м — 961 | 32
Кривые в плане	26 — R=652м P=3; a=147° — 162 — R=614м P=23; a=15° — 182 — 213 — 437 — R=661м P=9; a=42° — 482 — R=609м P=10; a=35° — 549 — R=622м P=40; a=9° — 584 — 605 — R=644м P=82; a=5° — 648 — 678 — R=673м P=7; a=52° — 837
Тротуары слева	ширина 1м, а/б, 197 - 332
Характеристики проезжей части	0 — 5,00 — 482 — 4,50

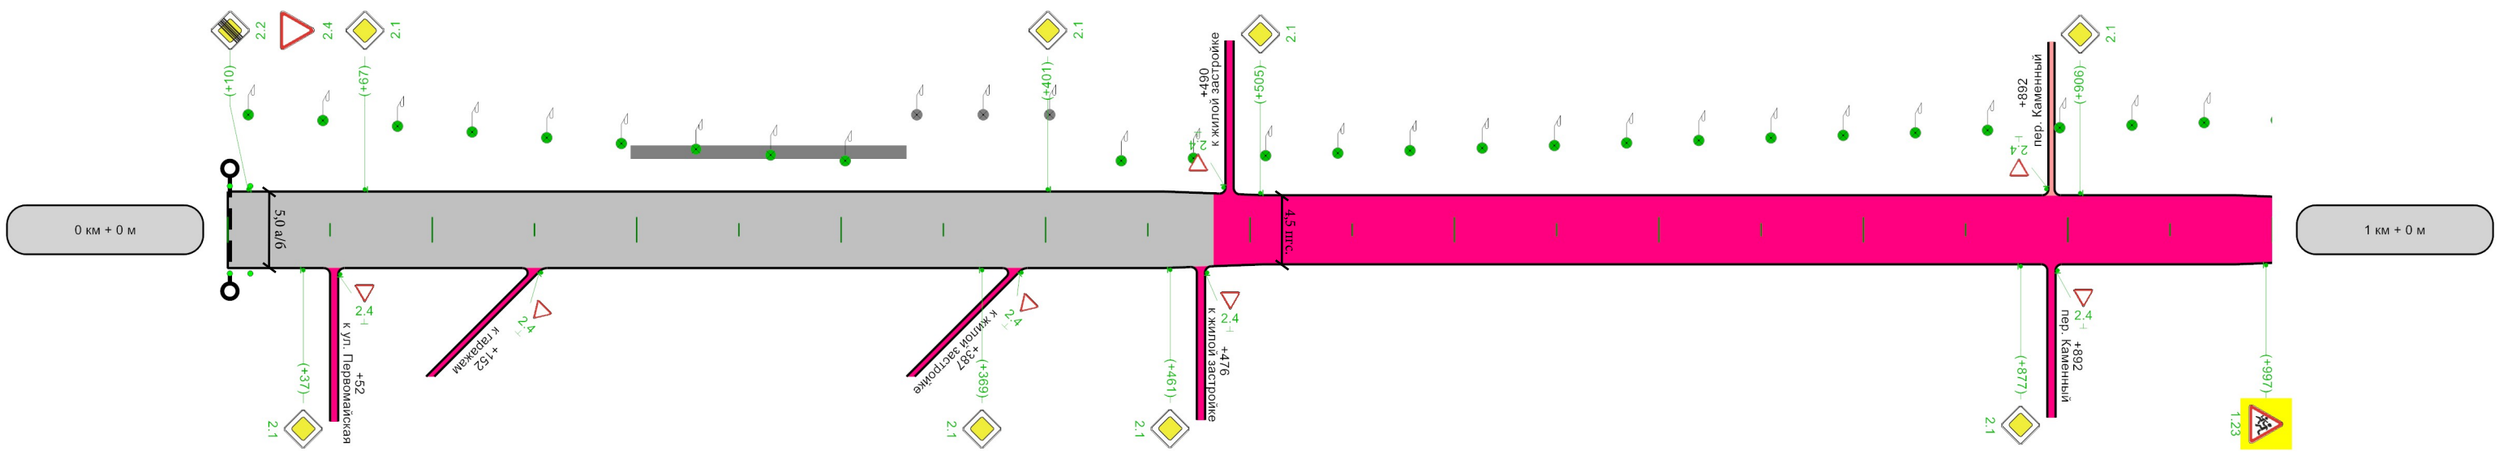

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	32 — 93 — 24 — R=7250м — 210 — 262
Кривые в плане	R=653м P=44; α=8°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50 | 3,50

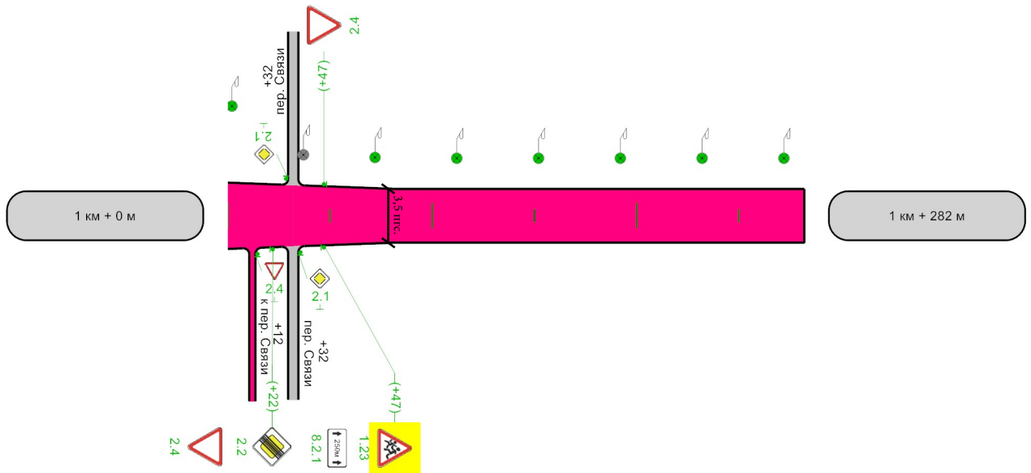

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+997	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			1+047	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+037	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+067	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+369	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+401	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+461	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+877	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+906	Требуется установить	1	слева
11	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
12	2.2	Конец главной дороги			1+022	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу			1+022	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу			1+047	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**13**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.2.1	Зона действия			1+047	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+001	0+011	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+001	0+011	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+302	Населенный пункт	9/9	292	0	Слева
2	0+337	0+402	Населенный пункт	3/3	0	65	Слева
3	0+437	1+002	Населенный пункт	17/17	565	0	Слева
4	1+037	1+037	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	1+072	1+272	Населенный пункт	6/6	200	0	Слева
Итого:				**36/36**	**1057**	**65**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+197	0+332	Жилая застройка	Слева		135
Итого:					**0**	**135**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от производственной базы по ул. Герцена,12 до автодороги ул. Декабристов
км 0+000 - км 0+278

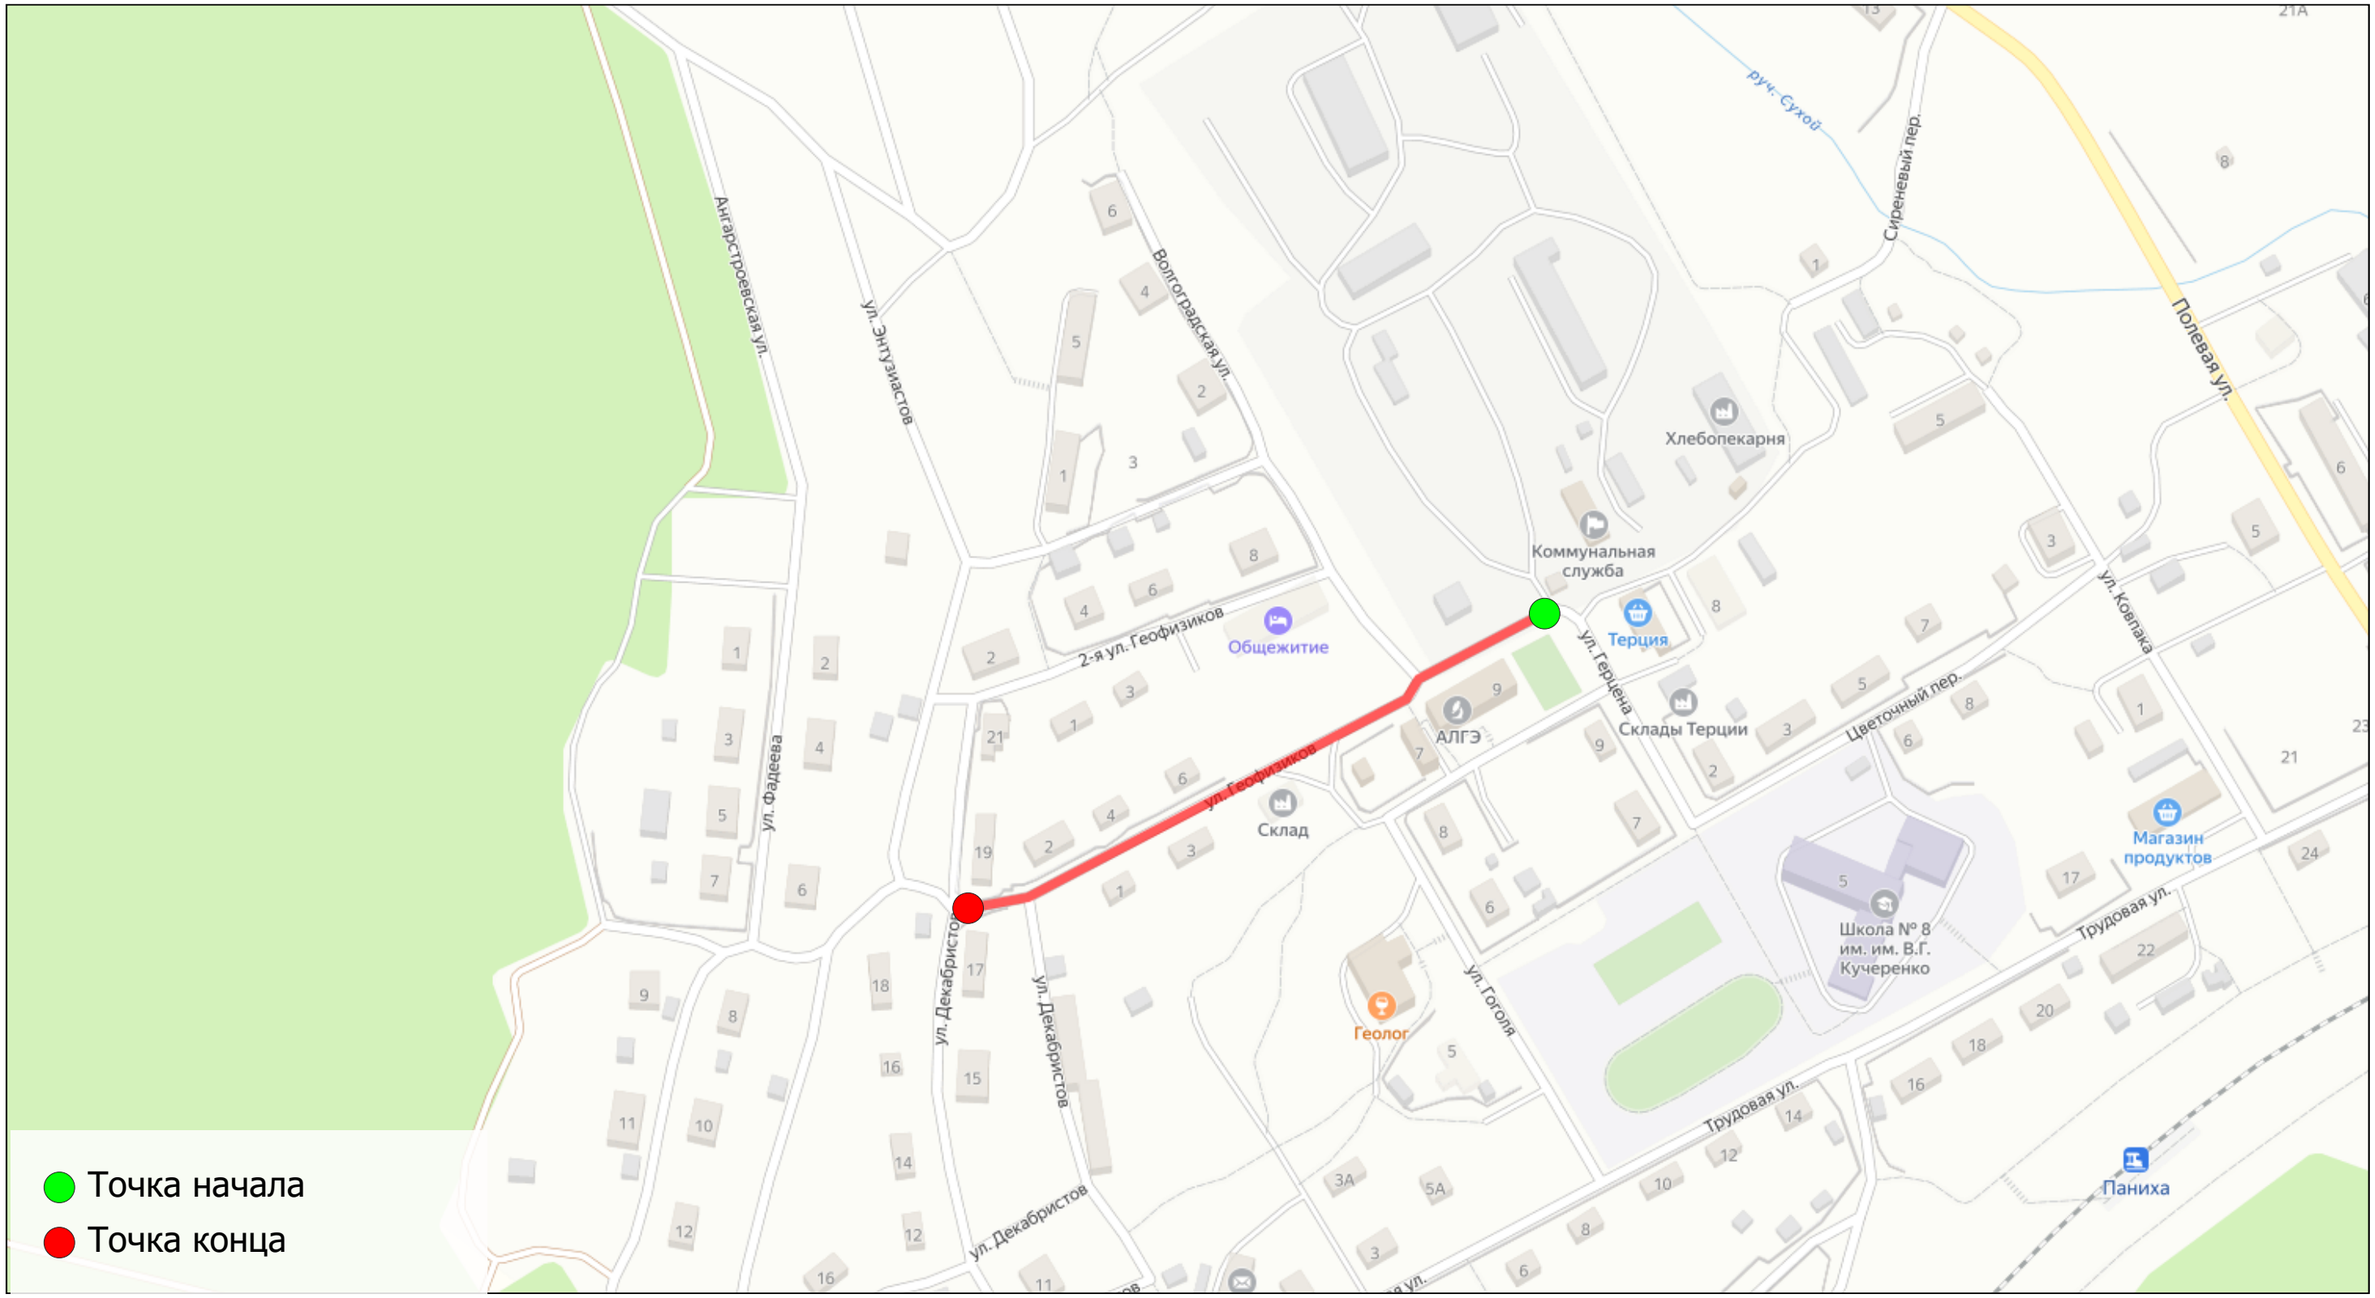

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	81 81 7 R=5185м 118 197
Кривые в плане	R=667м P=21; a=18° 230
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 5,20 70 4,00

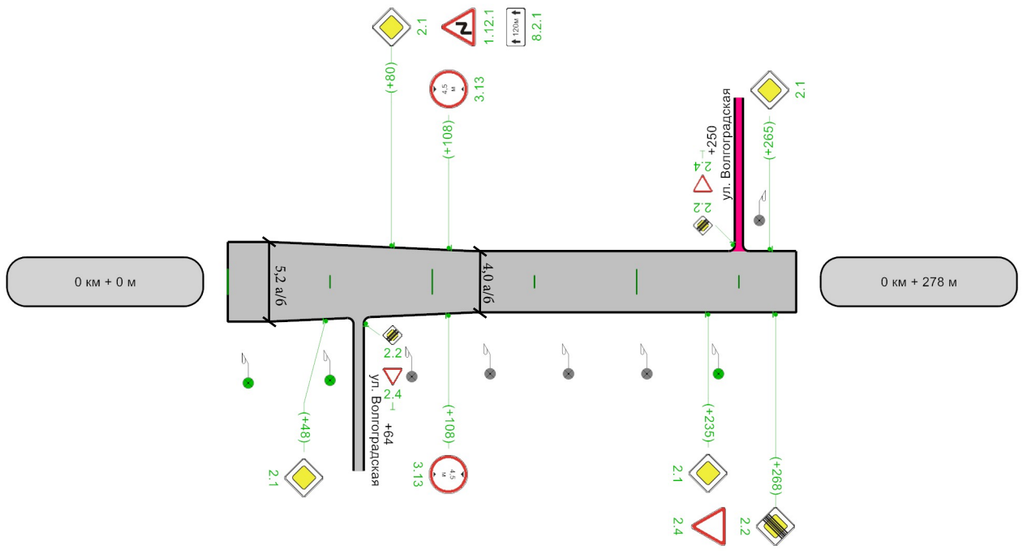

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+080	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+048	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+080	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+235	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+265	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			0+268	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+268	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
8	3.13	Ограничение высоты			0+108	Требуется установить	1	слева
9	3.13	Ограничение высоты			0+108	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.2.1	Зона действия			0+080	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+050	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
2	0+090	0+205	Населенный пункт	4/4	0	115	Справа
3	0+240	0+240	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+260	0+260	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**8/8**	**40**	**115**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. 2-я Геофизиков д. 2 до жилого дома по ул. 2-я Геофизиков д. 8
км 0+000 - км 0+169

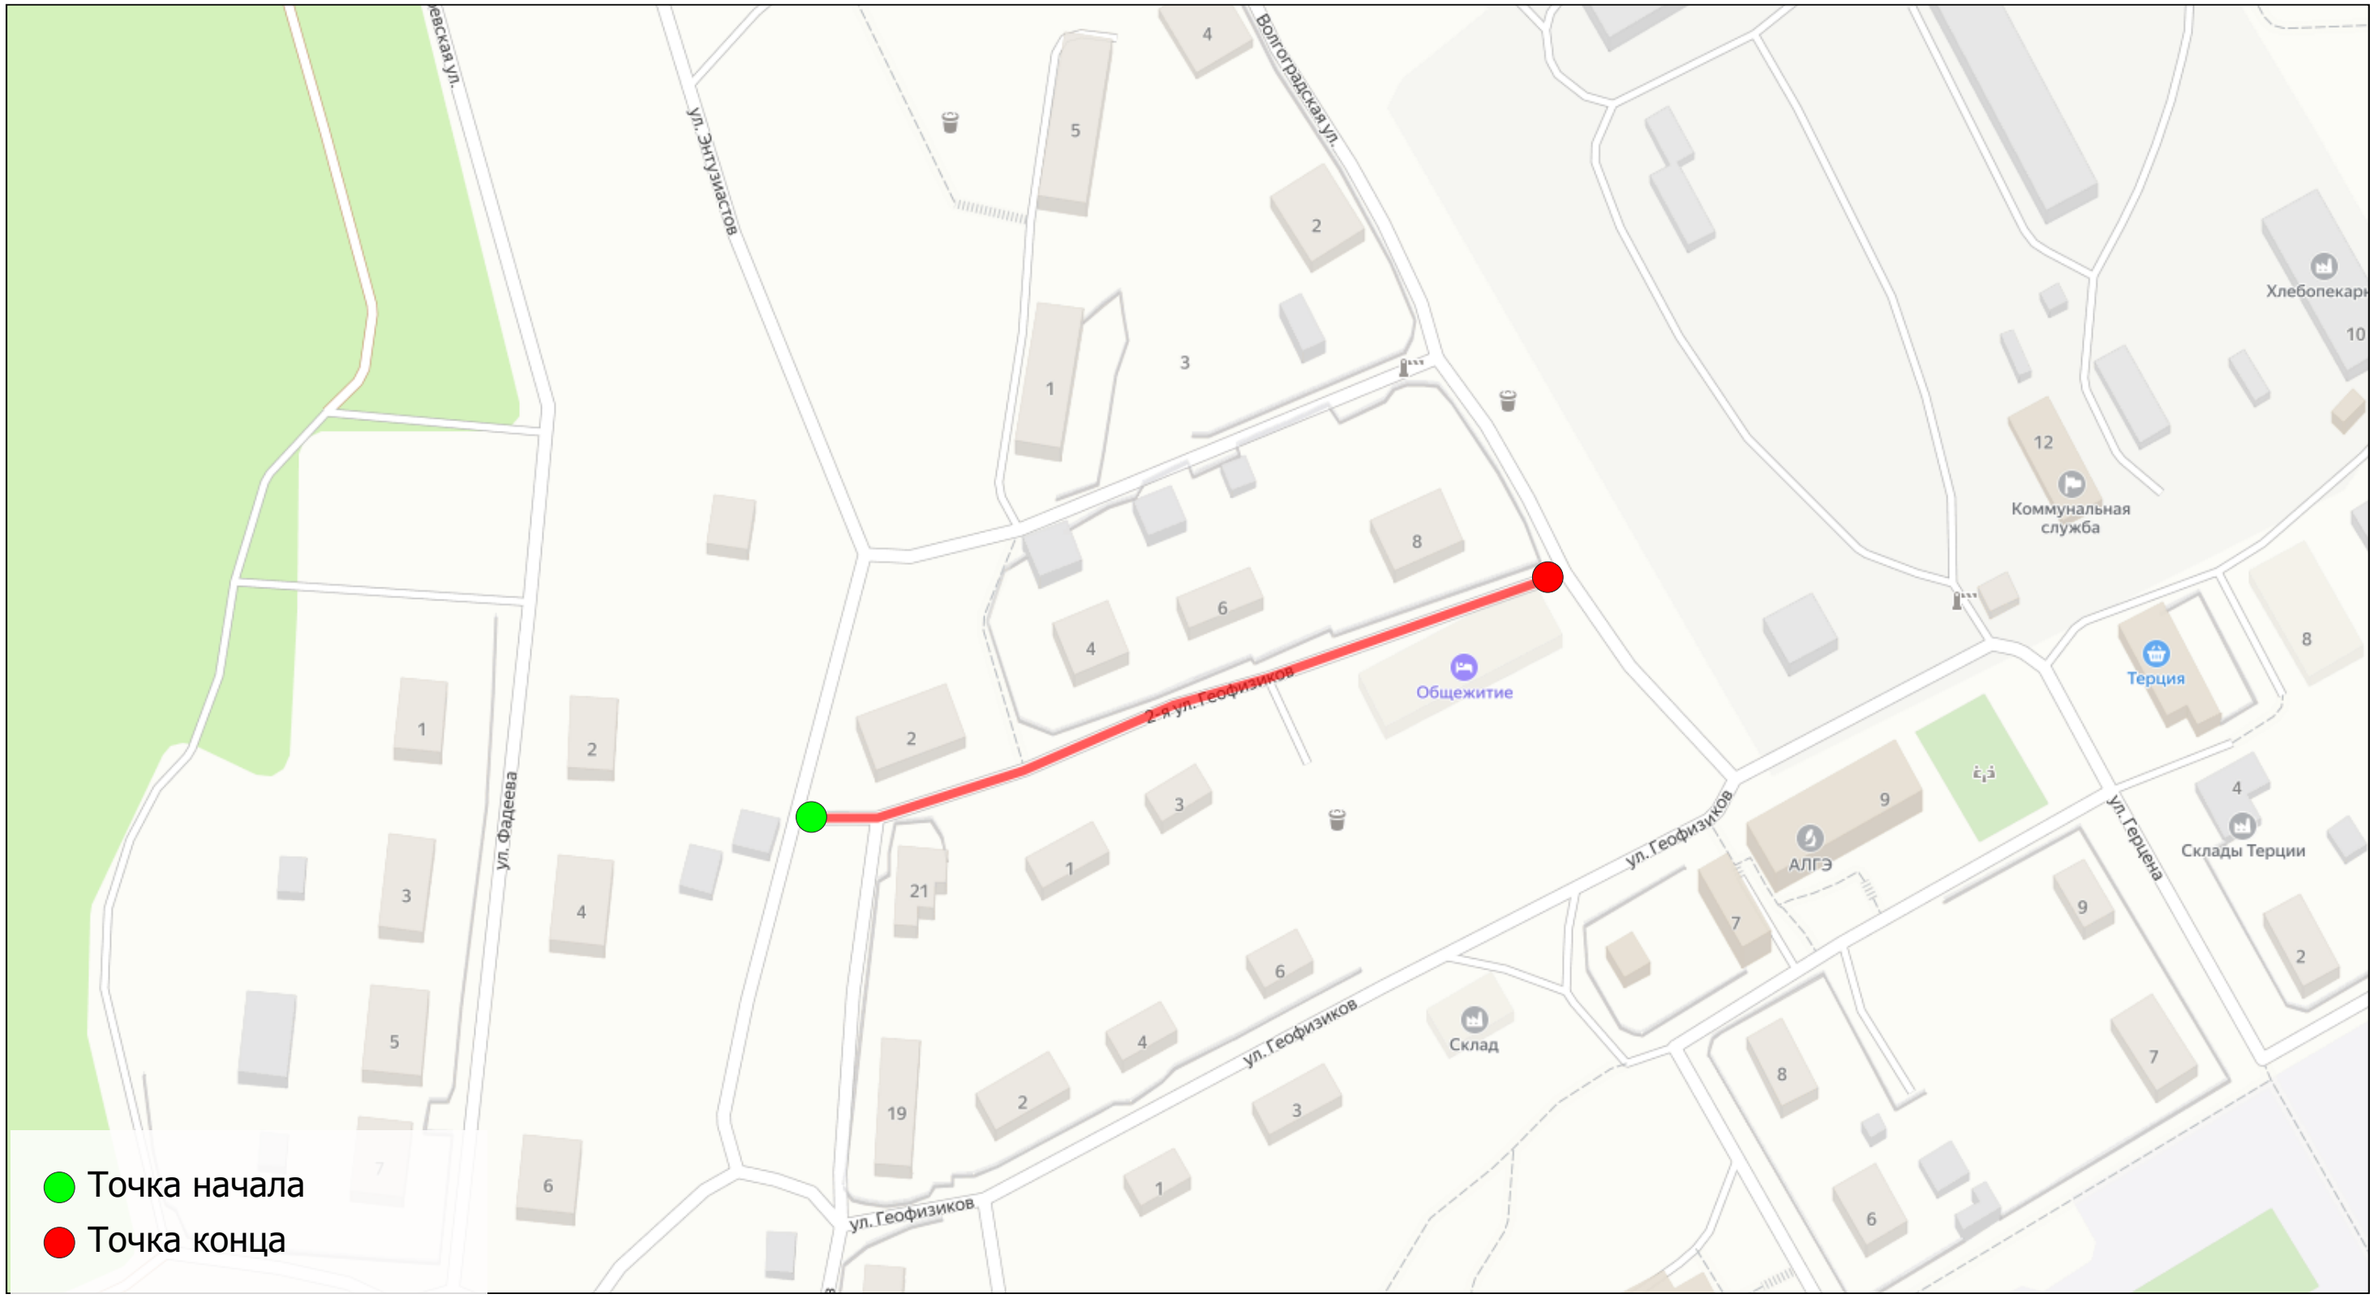

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	101
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

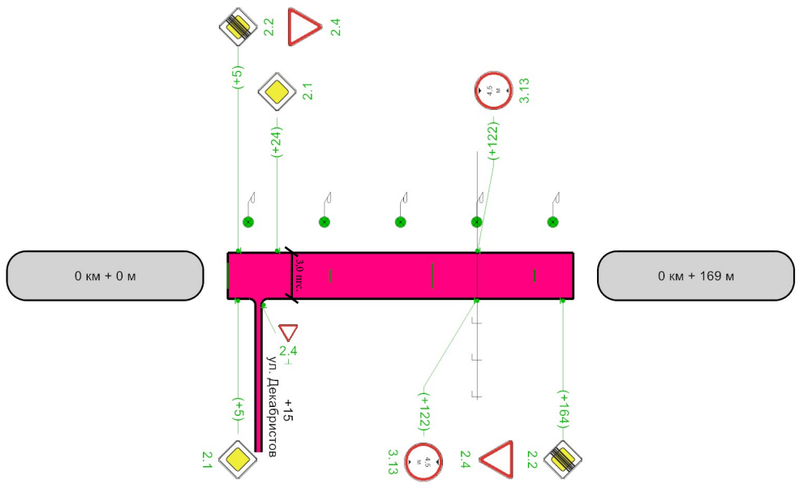

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+005	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+024	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+164	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+164	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
7	3.13	Ограничение высоты			0+122	Требуется установить	1	слева
8	3.13	Ограничение высоты			0+122	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+159	Населенный пункт	5/5	149	0	Слева
Итого:				**5/5**	**149**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Губкина д. 2 до жилого дома по ул. Губкина д. 14
км 0+000 - км 0+192

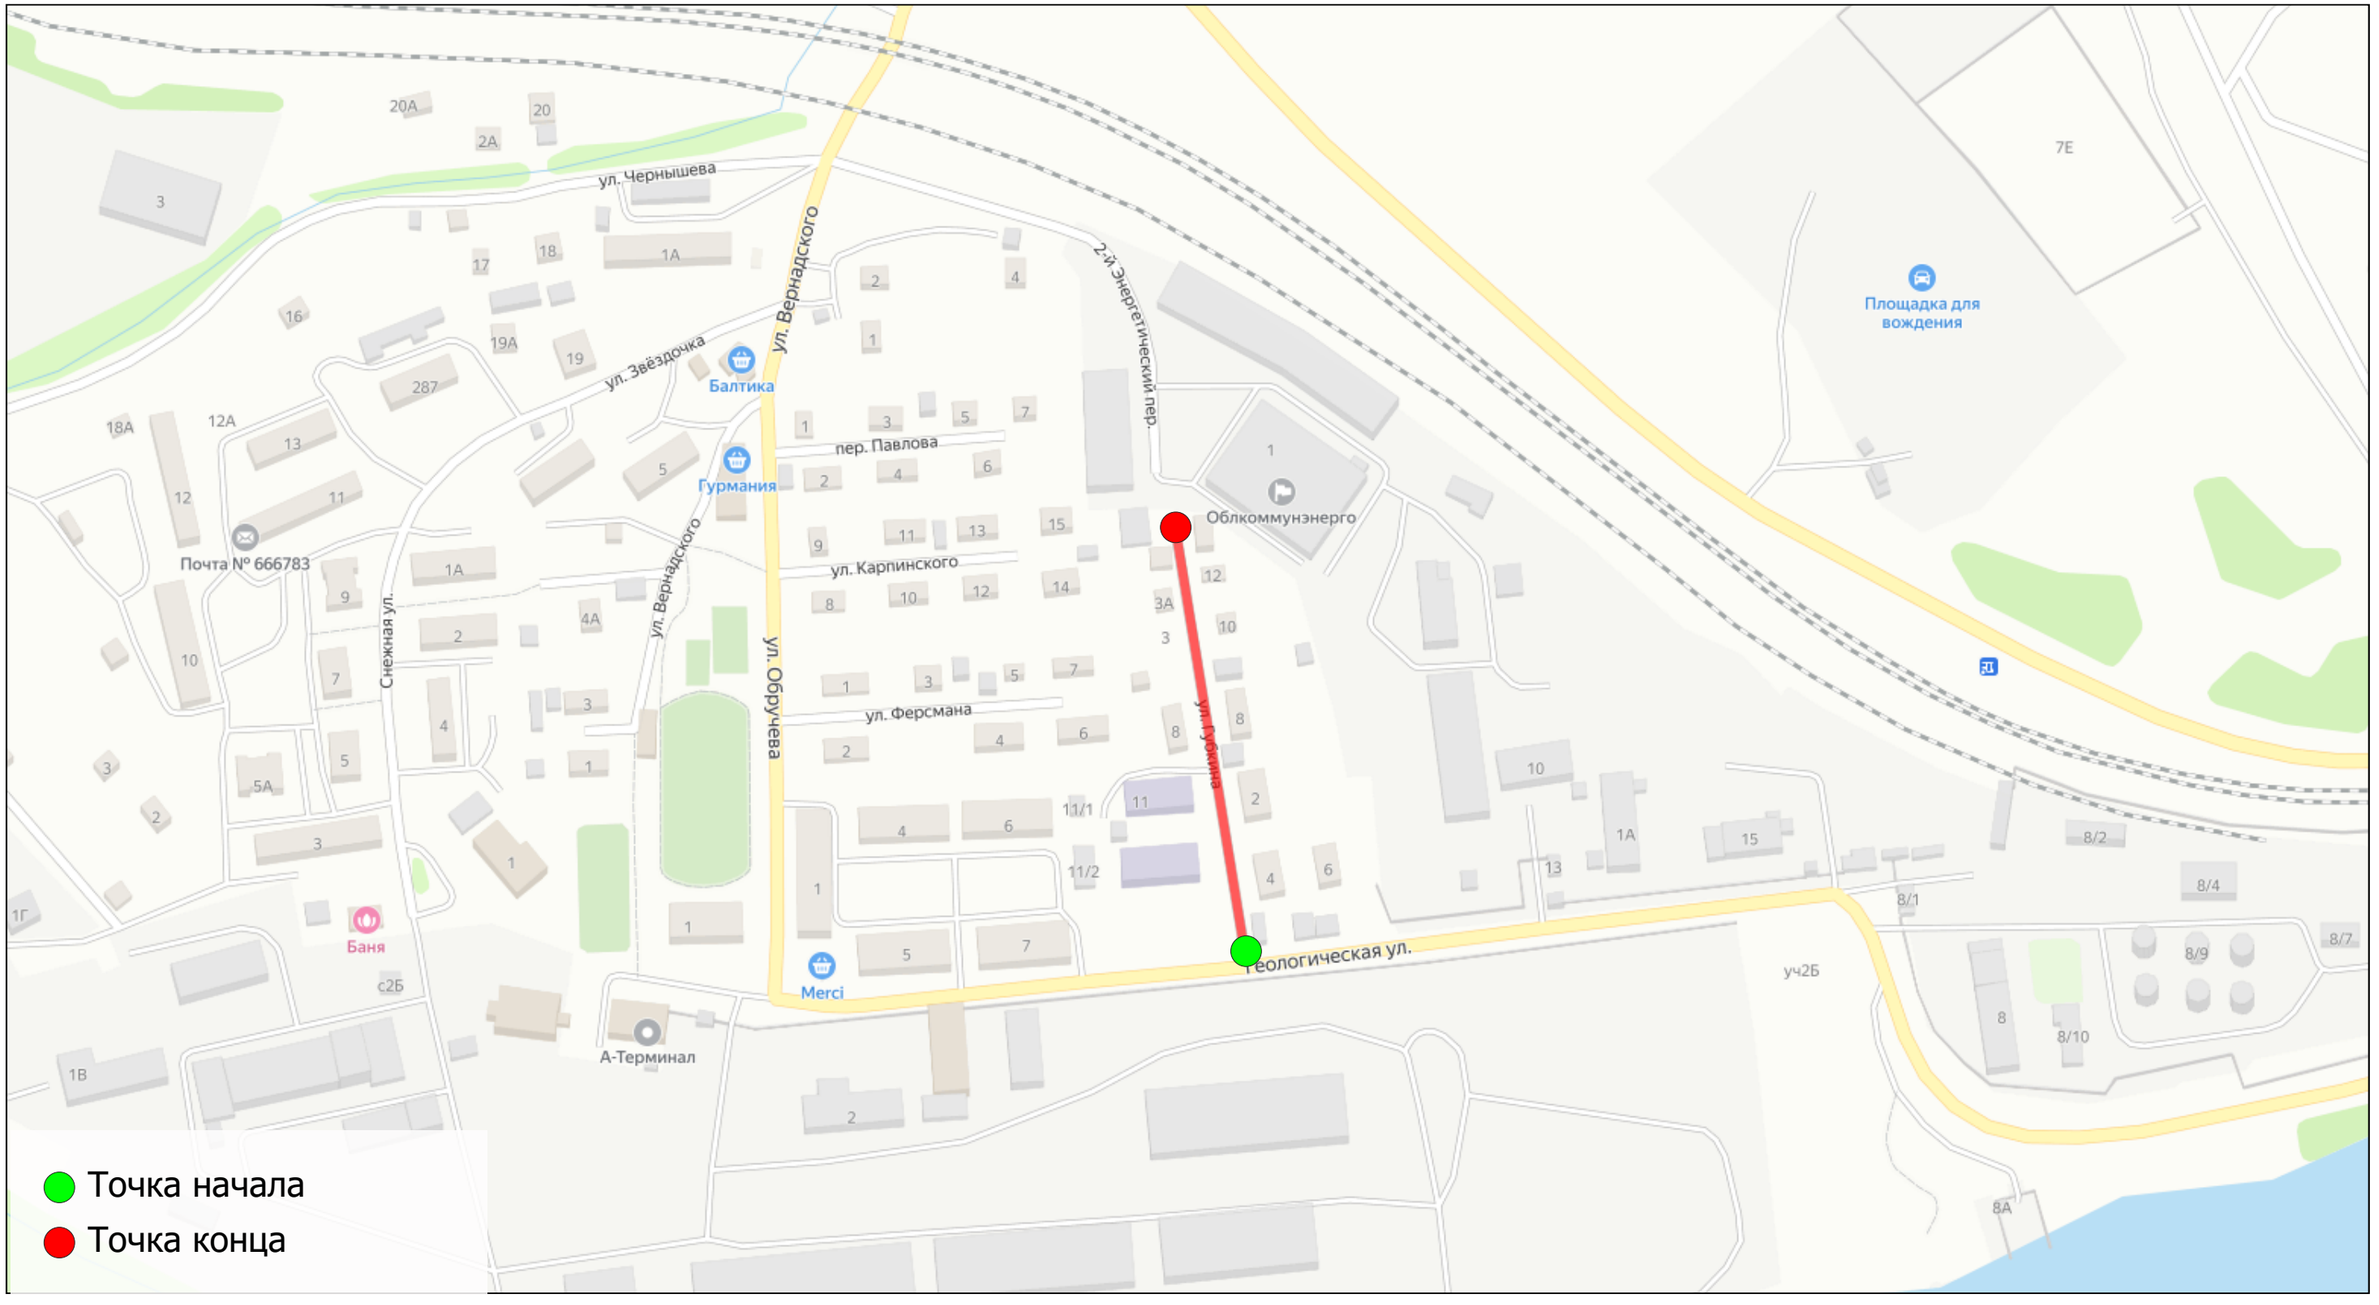

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	23 74 21 R=6686м 189+99
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

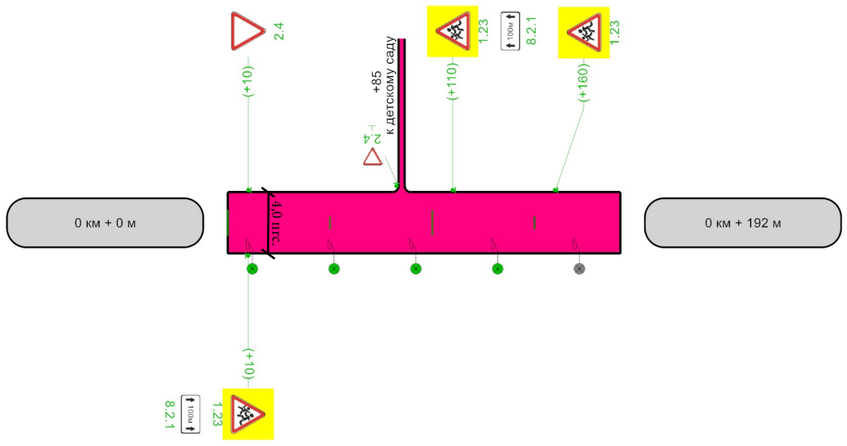

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+010	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+110	Требуется установить	1	слева
3	1.23	Дети			0+160	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.2.1	Зона действия			0+010	Требуется установить	1	справа
6	8.2.1	Зона действия			0+110	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012	0+132	Населенный пункт	4/4	120	0	Справа
2	0+172	0+172	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**5/5**	**120**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от нежилого здания по ул. Снежная, 1 до здания магазина по ул. Вернадского, 7
км 0+000 - км 0+362

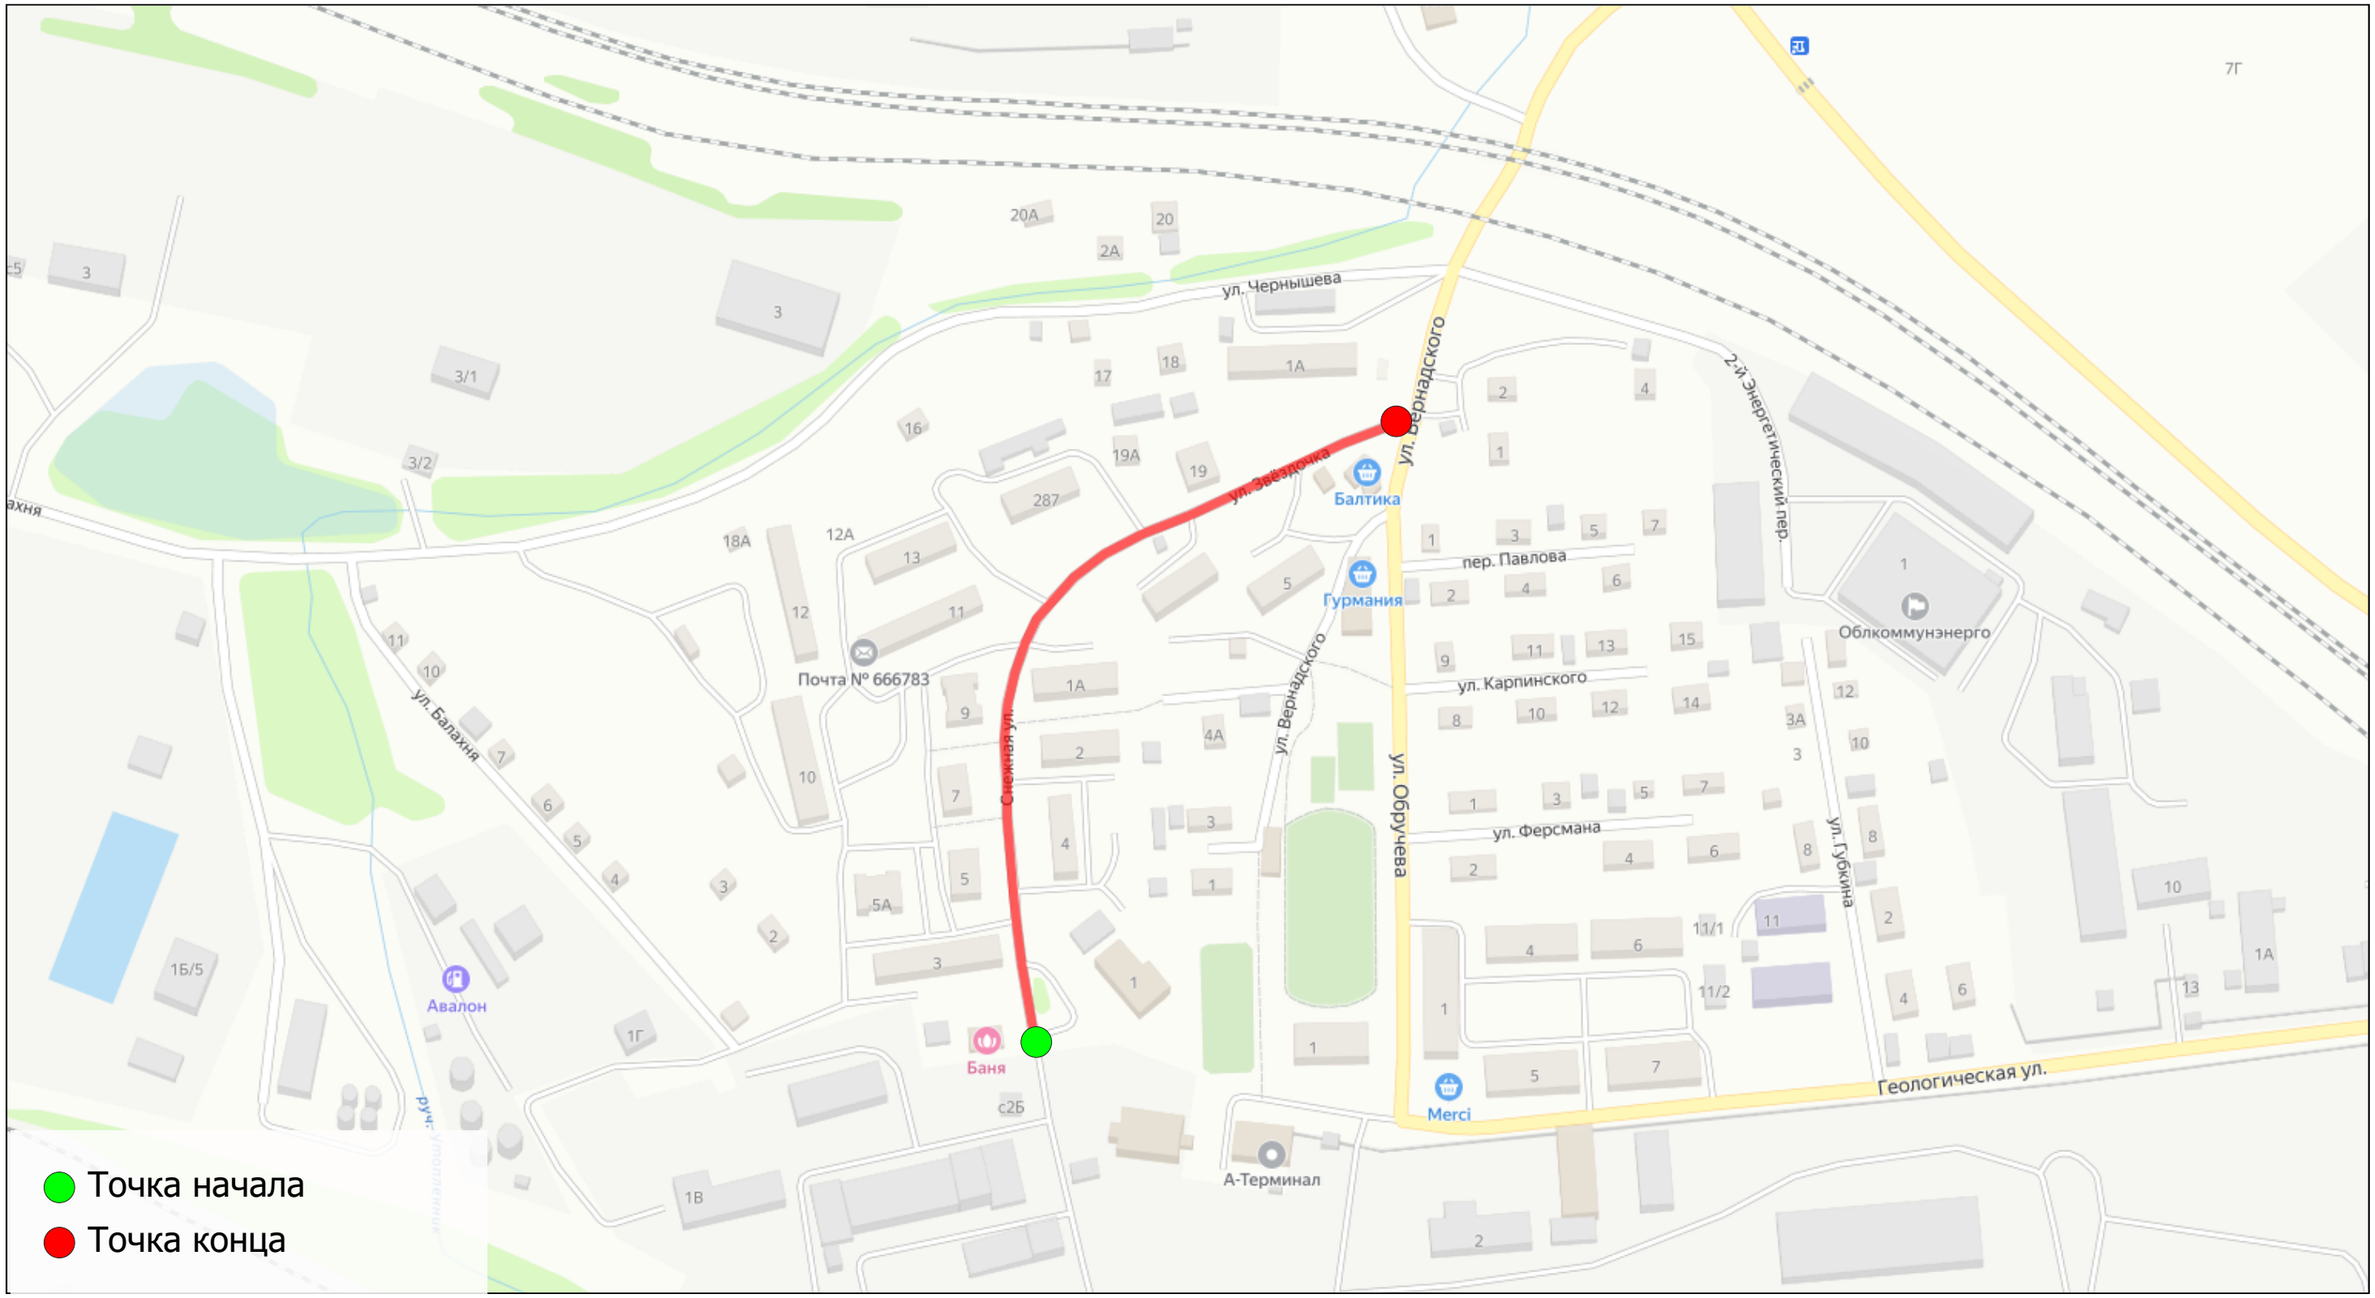

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	33
Кривые в плане	100 R=123м P=1; a=67° 245
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 49 ; н/д: ширина 1м, а/б, 52 - 93 ; н/д: ширина 1м, а/б, 96 - 168 ; н/д: ширина 1м, а/б, 192 - 241 ; н/д: ширина 1м, а/б, 244 - 362
Характеристики проезжей части	0 4,00 200 5,00

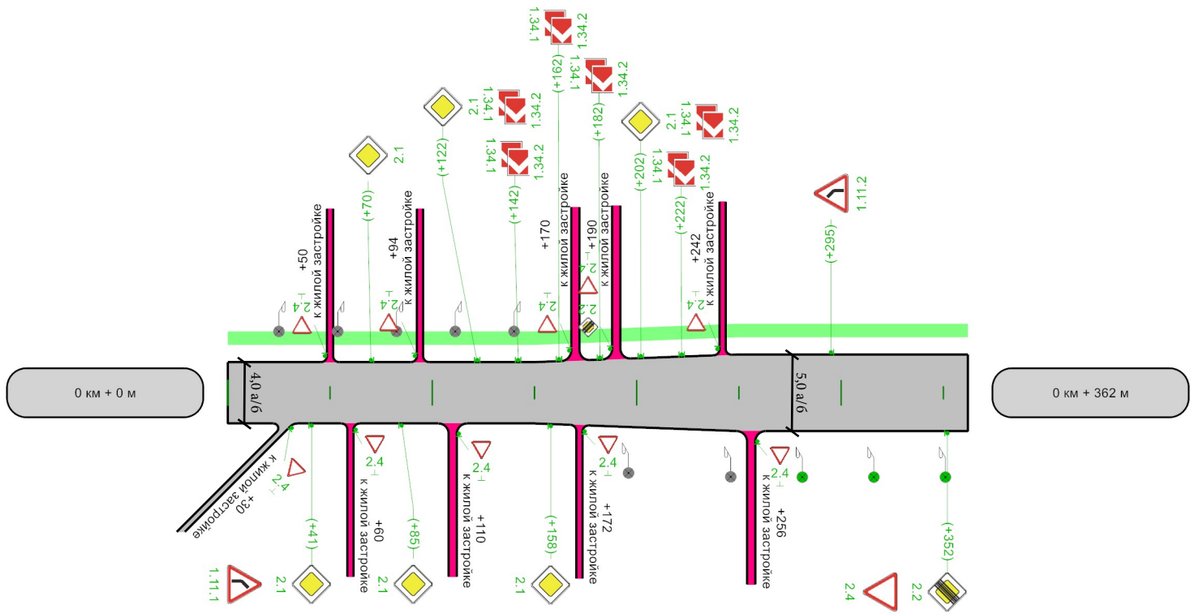

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+041	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+295	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+122	Требуется установить	1	слева
4	1.34.1	Направление поворота			0+142	Требуется установить	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота			0+162	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			0+182	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+202	Требуется установить	1	слева
8	1.34.1	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
9	1.34.2	Направление поворота			0+122	Требуется установить	1	слева
10	1.34.2	Направление поворота			0+142	Требуется установить	1	слева
11	1.34.2	Направление поворота			0+162	Требуется установить	1	слева
12	1.34.2	Направление поворота			0+182	Требуется установить	1	слева
13	1.34.2	Направление поворота			0+202	Требуется установить	1	слева
14	1.34.2	Направление поворота			0+222	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Знаки приоритета						
15	2.1	Главная дорога			0+041	Требуется установить	1	справа
16	2.1	Главная дорога			0+070	Требуется установить	1	слева
17	2.1	Главная дорога			0+085	Требуется установить	1	справа
18	2.1	Главная дорога			0+122	Требуется установить	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+158	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+202	Требуется установить	1	слева
21	2.2	Конец главной дороги			0+352	Требуется установить	1	справа
22	2.4	Уступите дорогу			0+352	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**22**	
		Всего:					**22**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+025	0+140	Населенный пункт	5/5	0	115	Слева
2	0+196	0+196	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+246	0+246	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+281	0+351	Населенный пункт	3/3	70	0	Справа
Итого:				**10/10**	**70**	**115**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+049	Жилая застройка	Слева	49	
2	0+052	0+093	Жилая застройка	Слева	41	
3	0+096	0+168	Жилая застройка	Слева	72	
4	0+172	0+188	Жилая застройка	Слева	16	
5	0+192	0+241	Жилая застройка	Слева	49	
6	0+244	0+362	Жилая застройка	Слева	118	
Итого:					**345**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома ул. Карпинского, д. 9 до жилого дома ул. Карпинского, д. 14

1-й участок: км 0+000 - км 0+110
2-й участок: км 0+000 - км 0+036

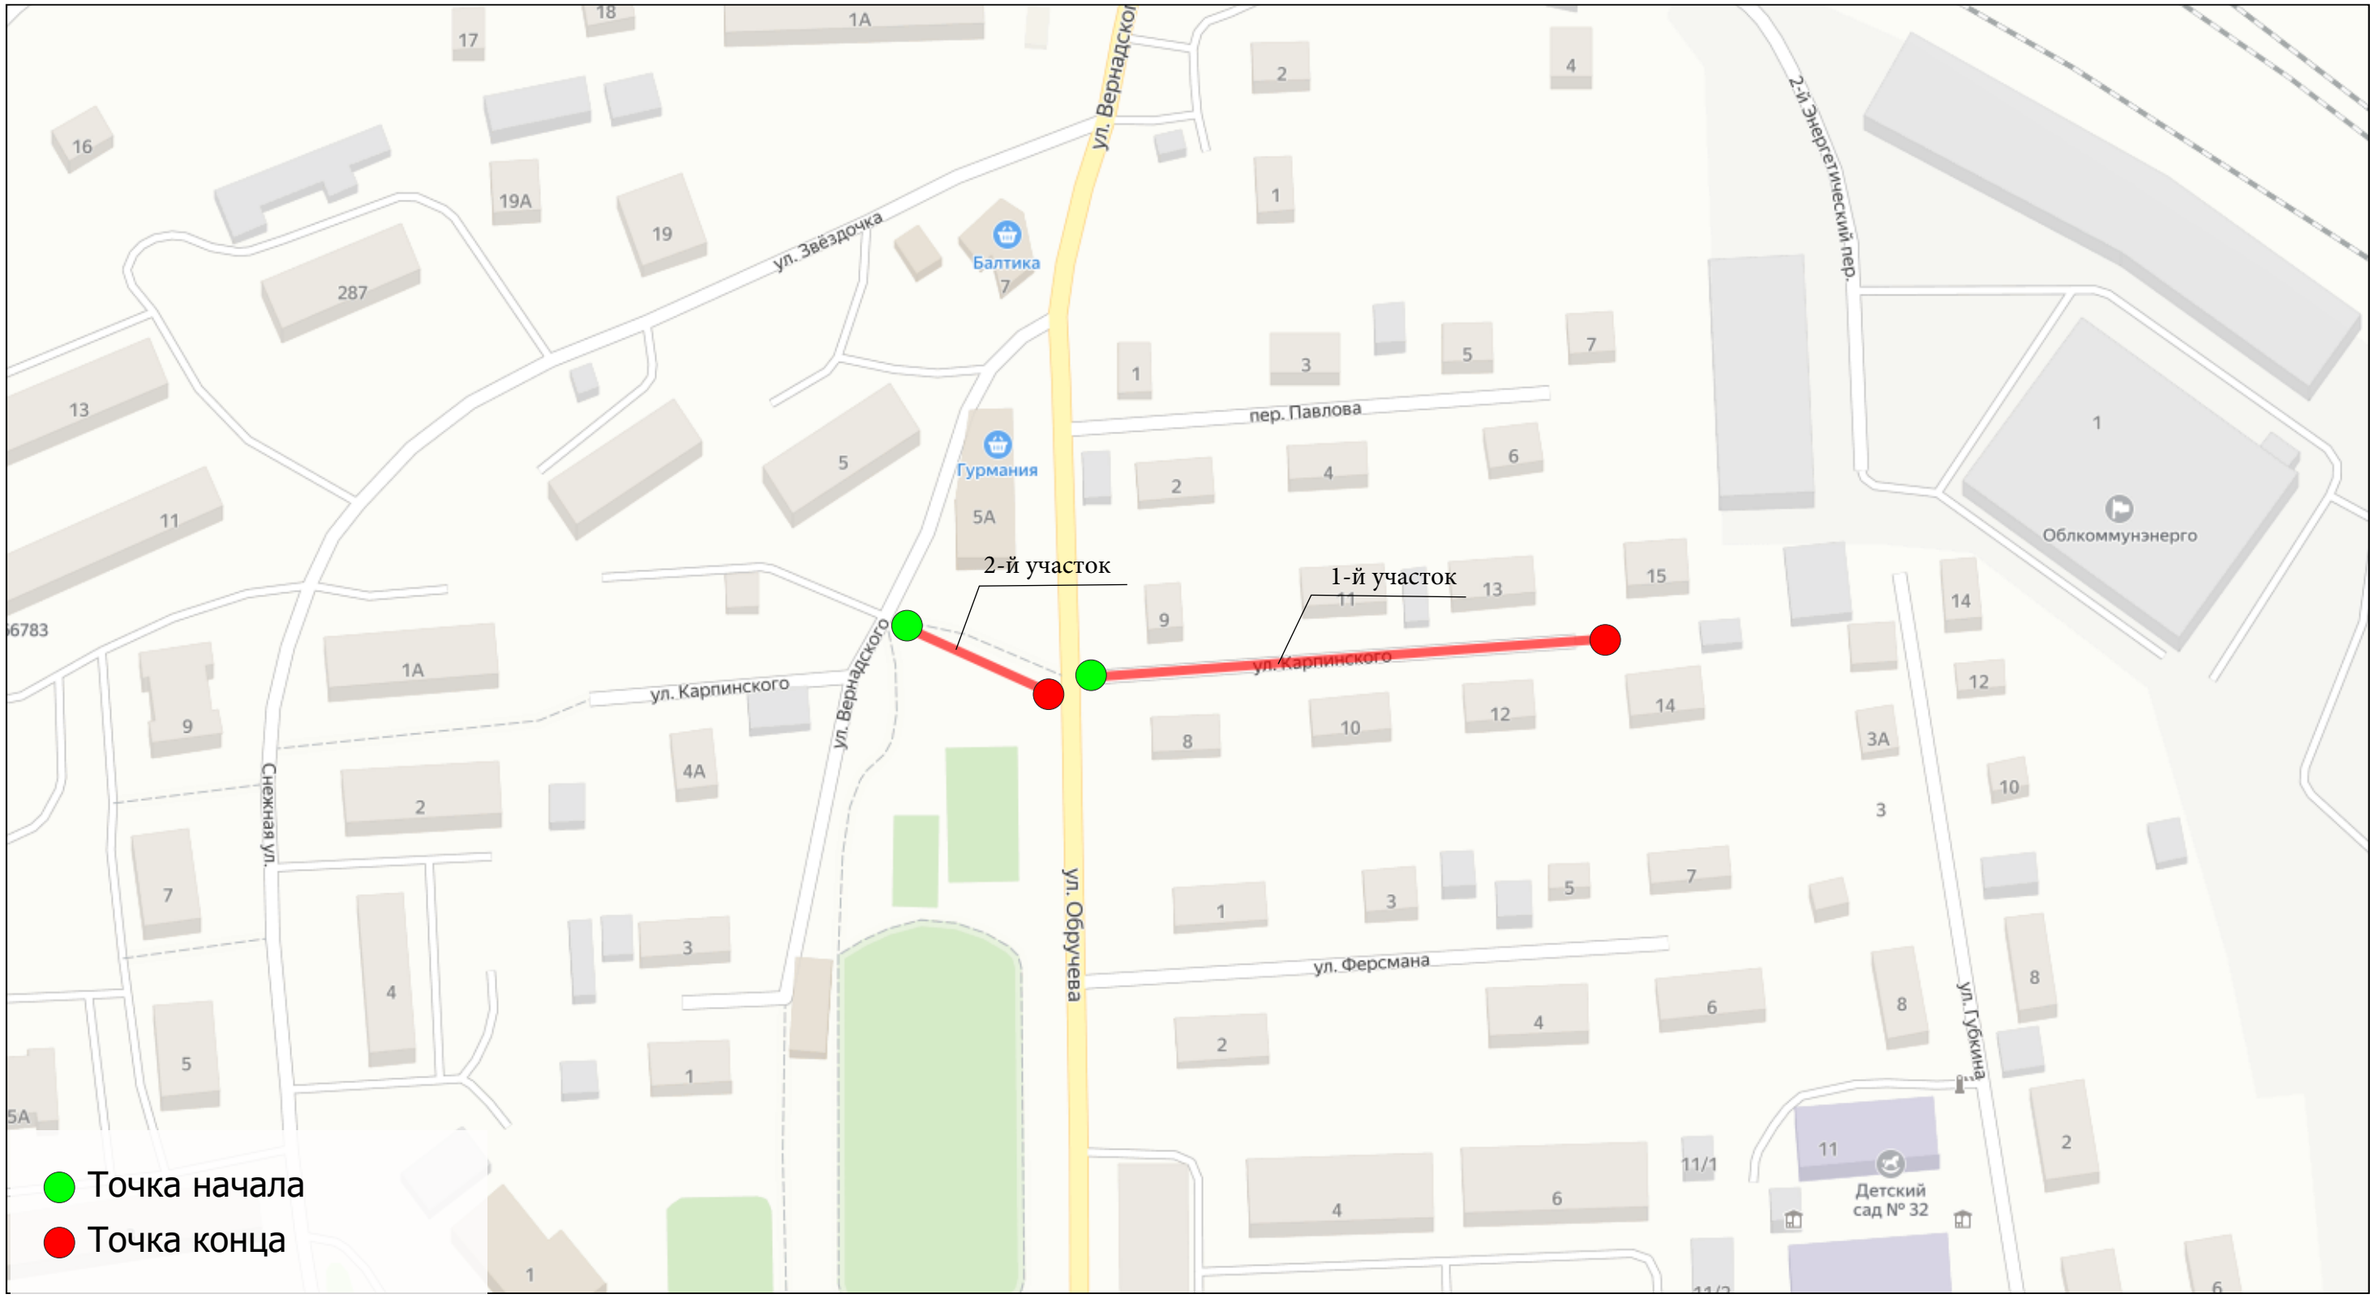

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, а/б, 0 - 25
Характеристики проезжей части	4,50

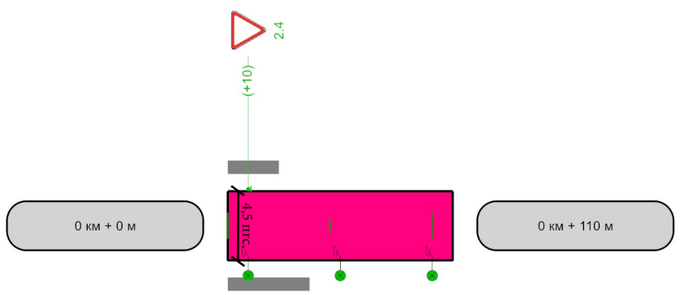

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 0 - 40

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+100	Населенный пункт	3/3	90	0	Справа
Итого:				**3/3**	**90**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+025	Жилая застройка	Слева		25
2	0+000	0+040	Жилая застройка	Справа		40
Итого:					**0**	**65**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

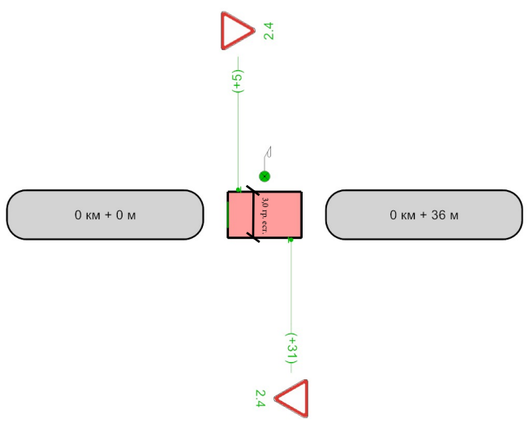

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+031	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+018	0+018	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**1/1**	**0**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от примыкания с автодорогой по ул. 2-я Ледорезная до пересечения с автодорогой по ул. Брагина км 0+000 - км 2+131

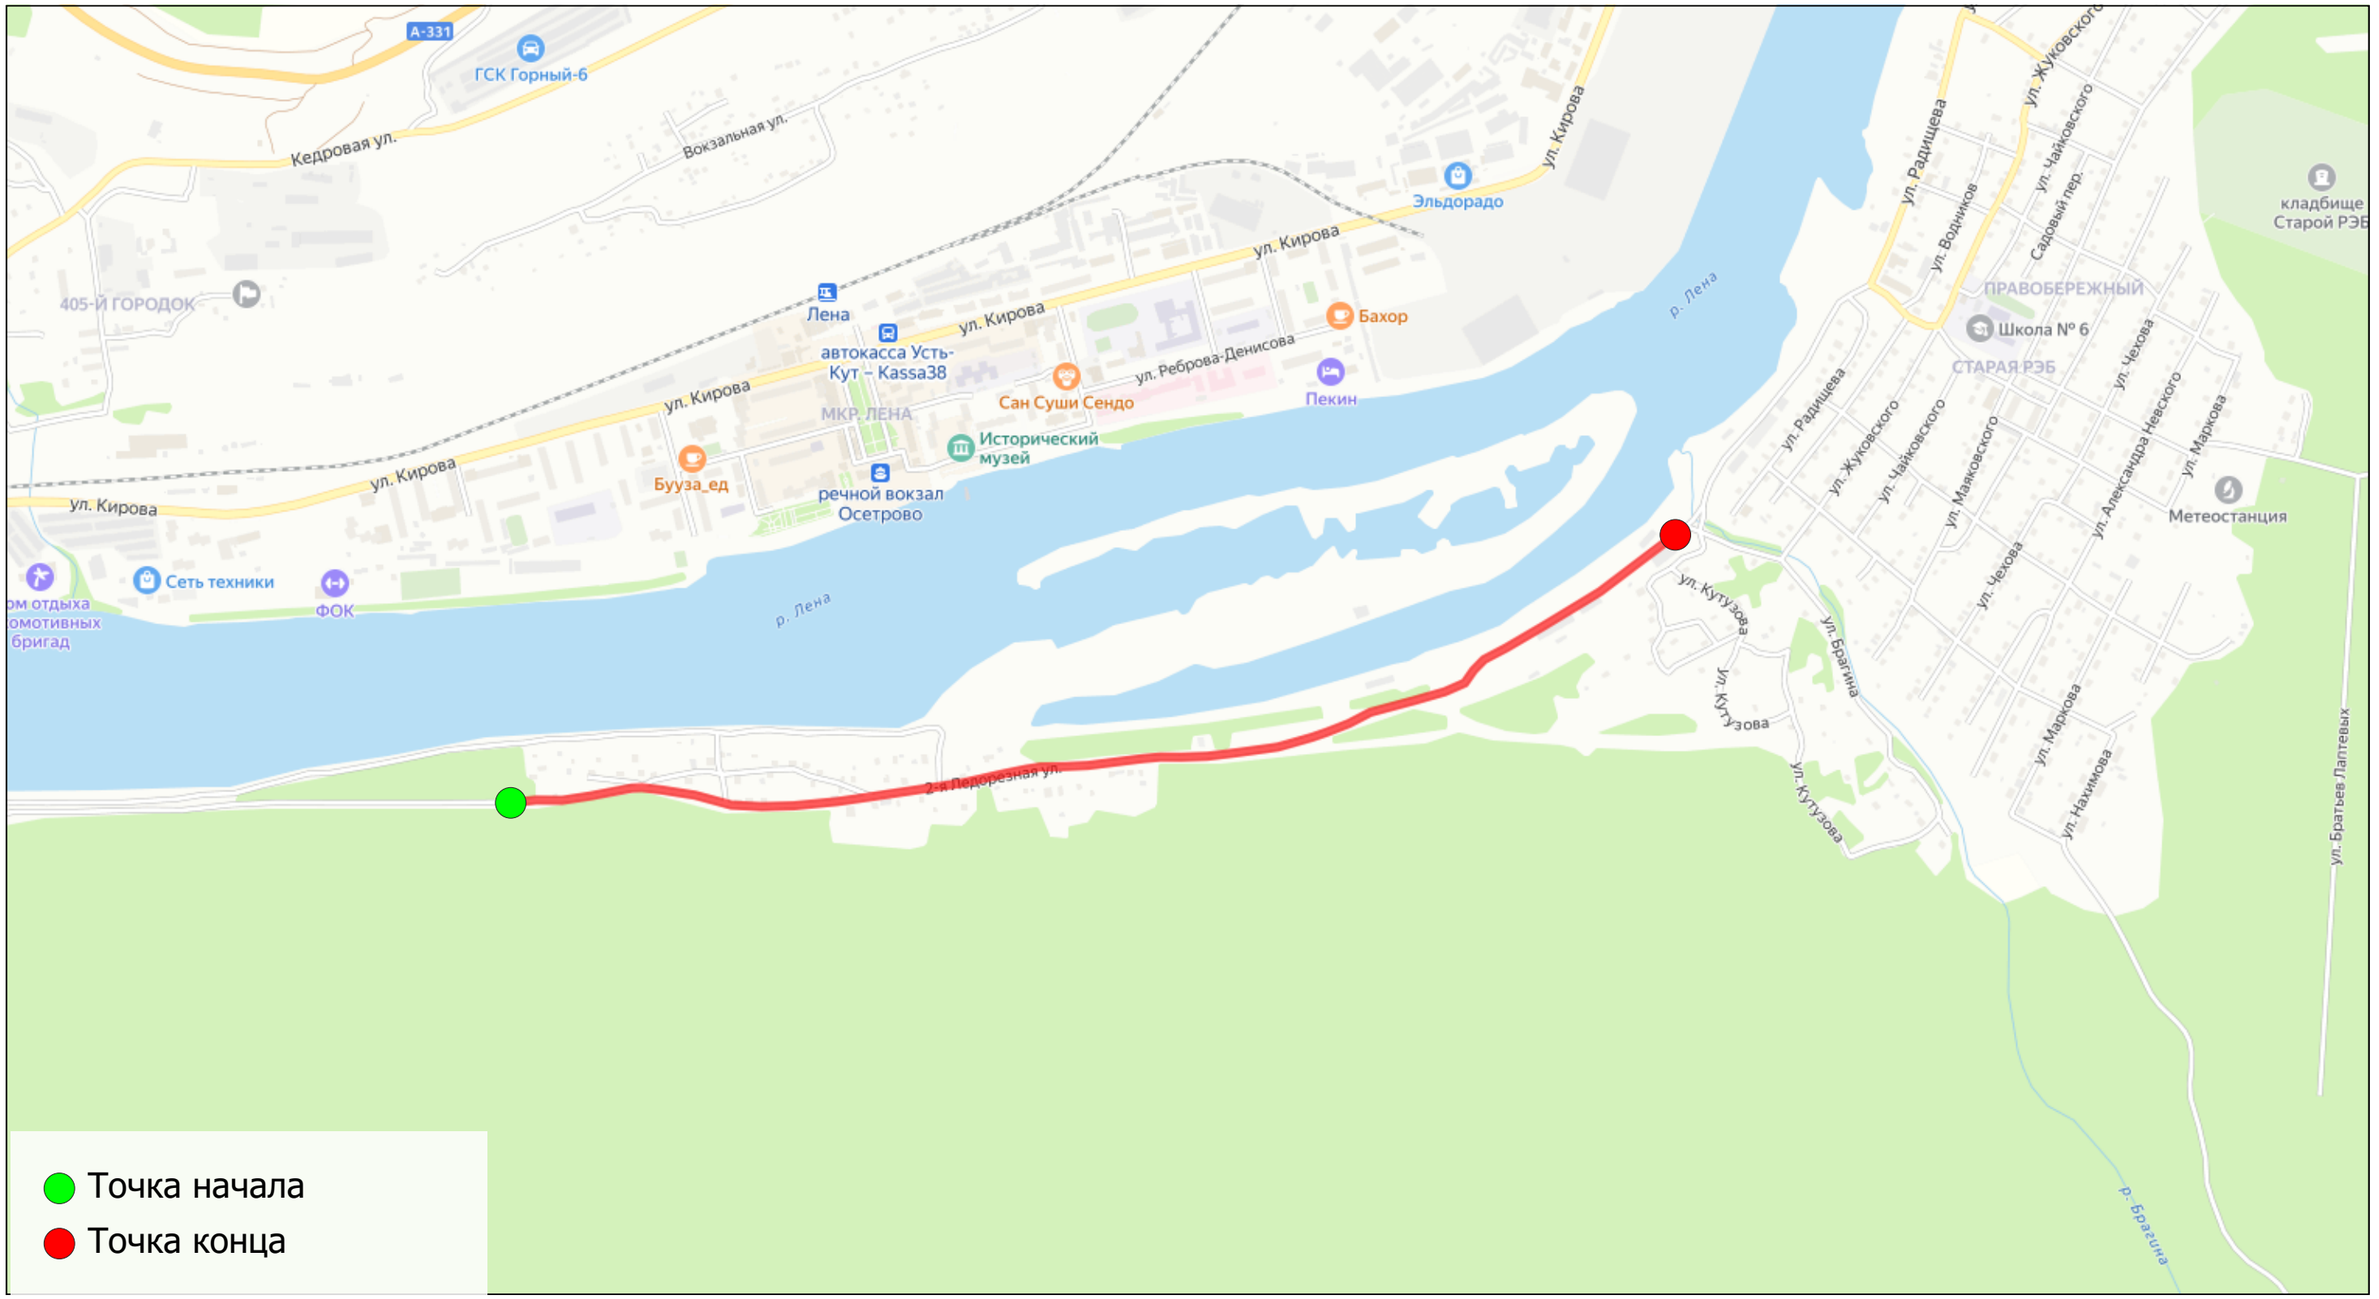

М 1:3000

Автомобильная дорога от примыкания с автодорогой по ул. 2-я Ледорезная до пересечения с автодорогой по ул. Брагина

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 5 2 R=1969м 76 161 76 183 R=1384м 31 331 31 353 R=2015м 36 489 36 511 R=2751м 25 680 25 701 R=4739м 10 867
Кривые в плане	70 R=645м P=32; a=11° 179 190 R=630м P=16; a=23° 281 301 R=690м P=64; a=6° 365 375 R=634м P=21; a=18° 447 564 R=631м P=41; a=9° 615 625 R=639м P=54; a=7° 665 769 R=643м P=45; a=8° 832 842 R=644м P=75; a=5° 880 890 R=642м P=41; a=9° 960 980 R=603м P=46; a=8°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

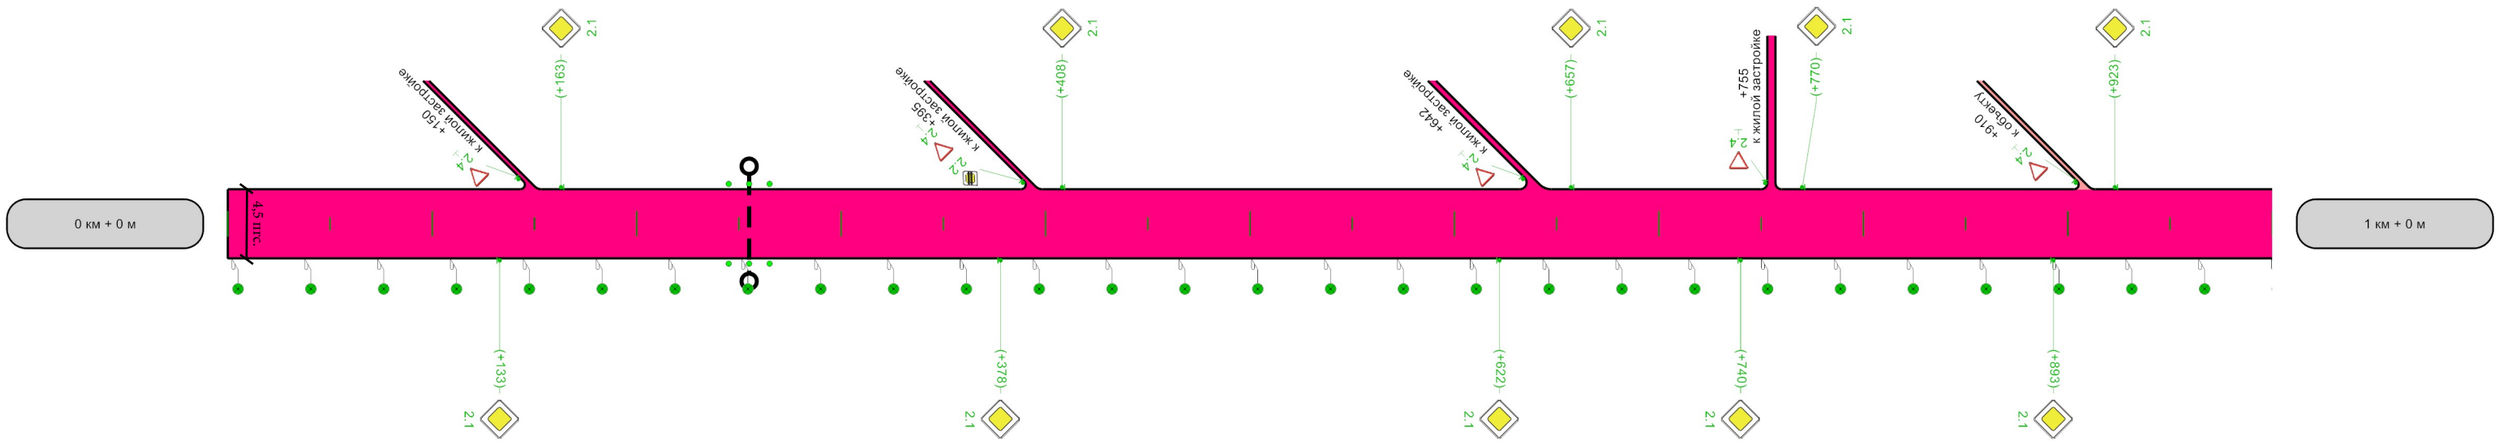


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от примыкания с автодорогой по ул. 2-я Ледорезная до пересечения с автодорогой по ул. Брагина


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 — 12 (297) — R=4875м — 7 (388) — 7 (409) — R=5316м — 11 (503) — 11 (524) — R=2501м — 49 (674) — 49 (695) — R=2937м — 4 (827) — 6 (994)
Кривые в плане	R=603м P=46; a=8° (46 — 66); R=686м P=60; a=7° (144 — 161); R=673м P=44; a=9° (263 — 305); R=618м P=39; a=9° (372 — 400); R=653м P=40; a=9° (458 — 479); R=685м P=30; a=13° (545 — 576); R=678м P=11; a=35° (686 — 755); R=677м P=17; a=22°; R=631м P=41; a=9° (952 — 988)
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50 — 700 — 6,00

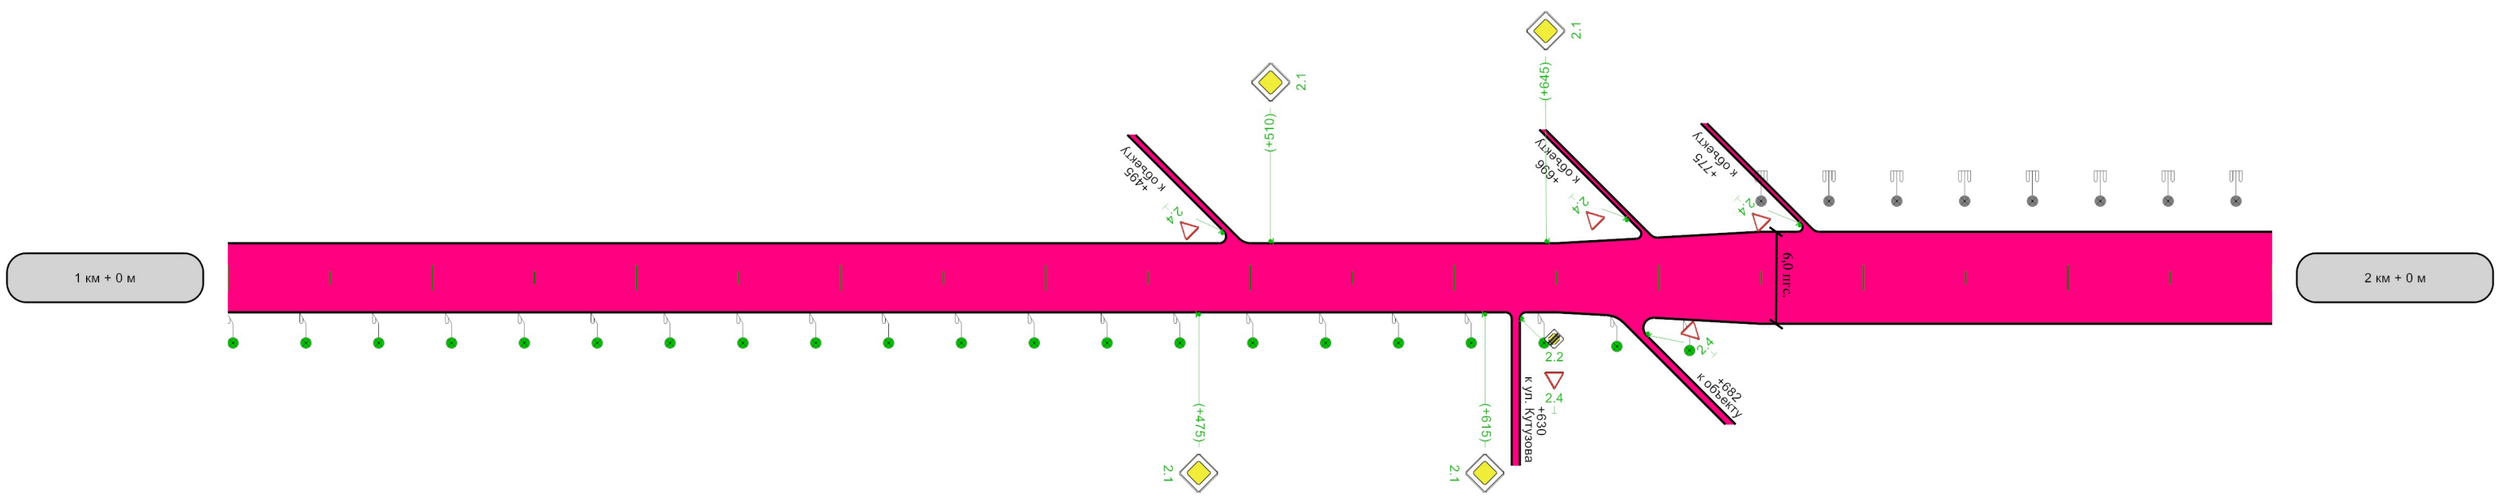

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 R=7339м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

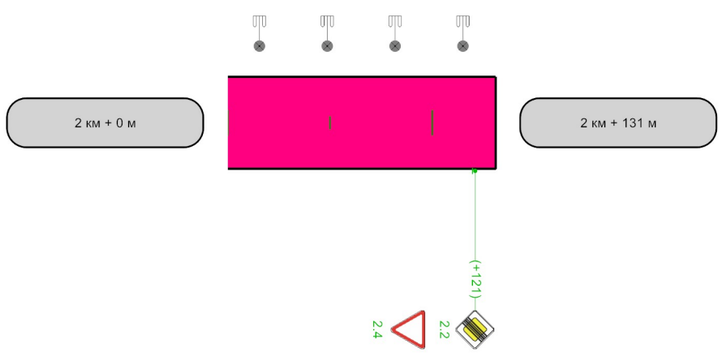

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+133	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+163	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+378	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+408	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+622	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+657	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+740	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+770	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+893	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+923	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			1+475	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			1+510	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			1+615	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1+645	Требуется установить	1	слева
15	2.2	Конец главной дороги			2+121	Требуется установить	1	справа
16	2.4	Уступите дорогу			2+121	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**16**	
		Итого:					**16**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+245	0+265	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+245	0+265	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	1+715	Населенный пункт	49/49	1710	0	Справа
2	1+750	2+115	Населенный пункт	12/24	0	365	Слева
Итого:				**61/73**	**1710**	**365**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до примыкания с автодорогой по ул. 1-я Ледорезная км 0+000 - км 2+306

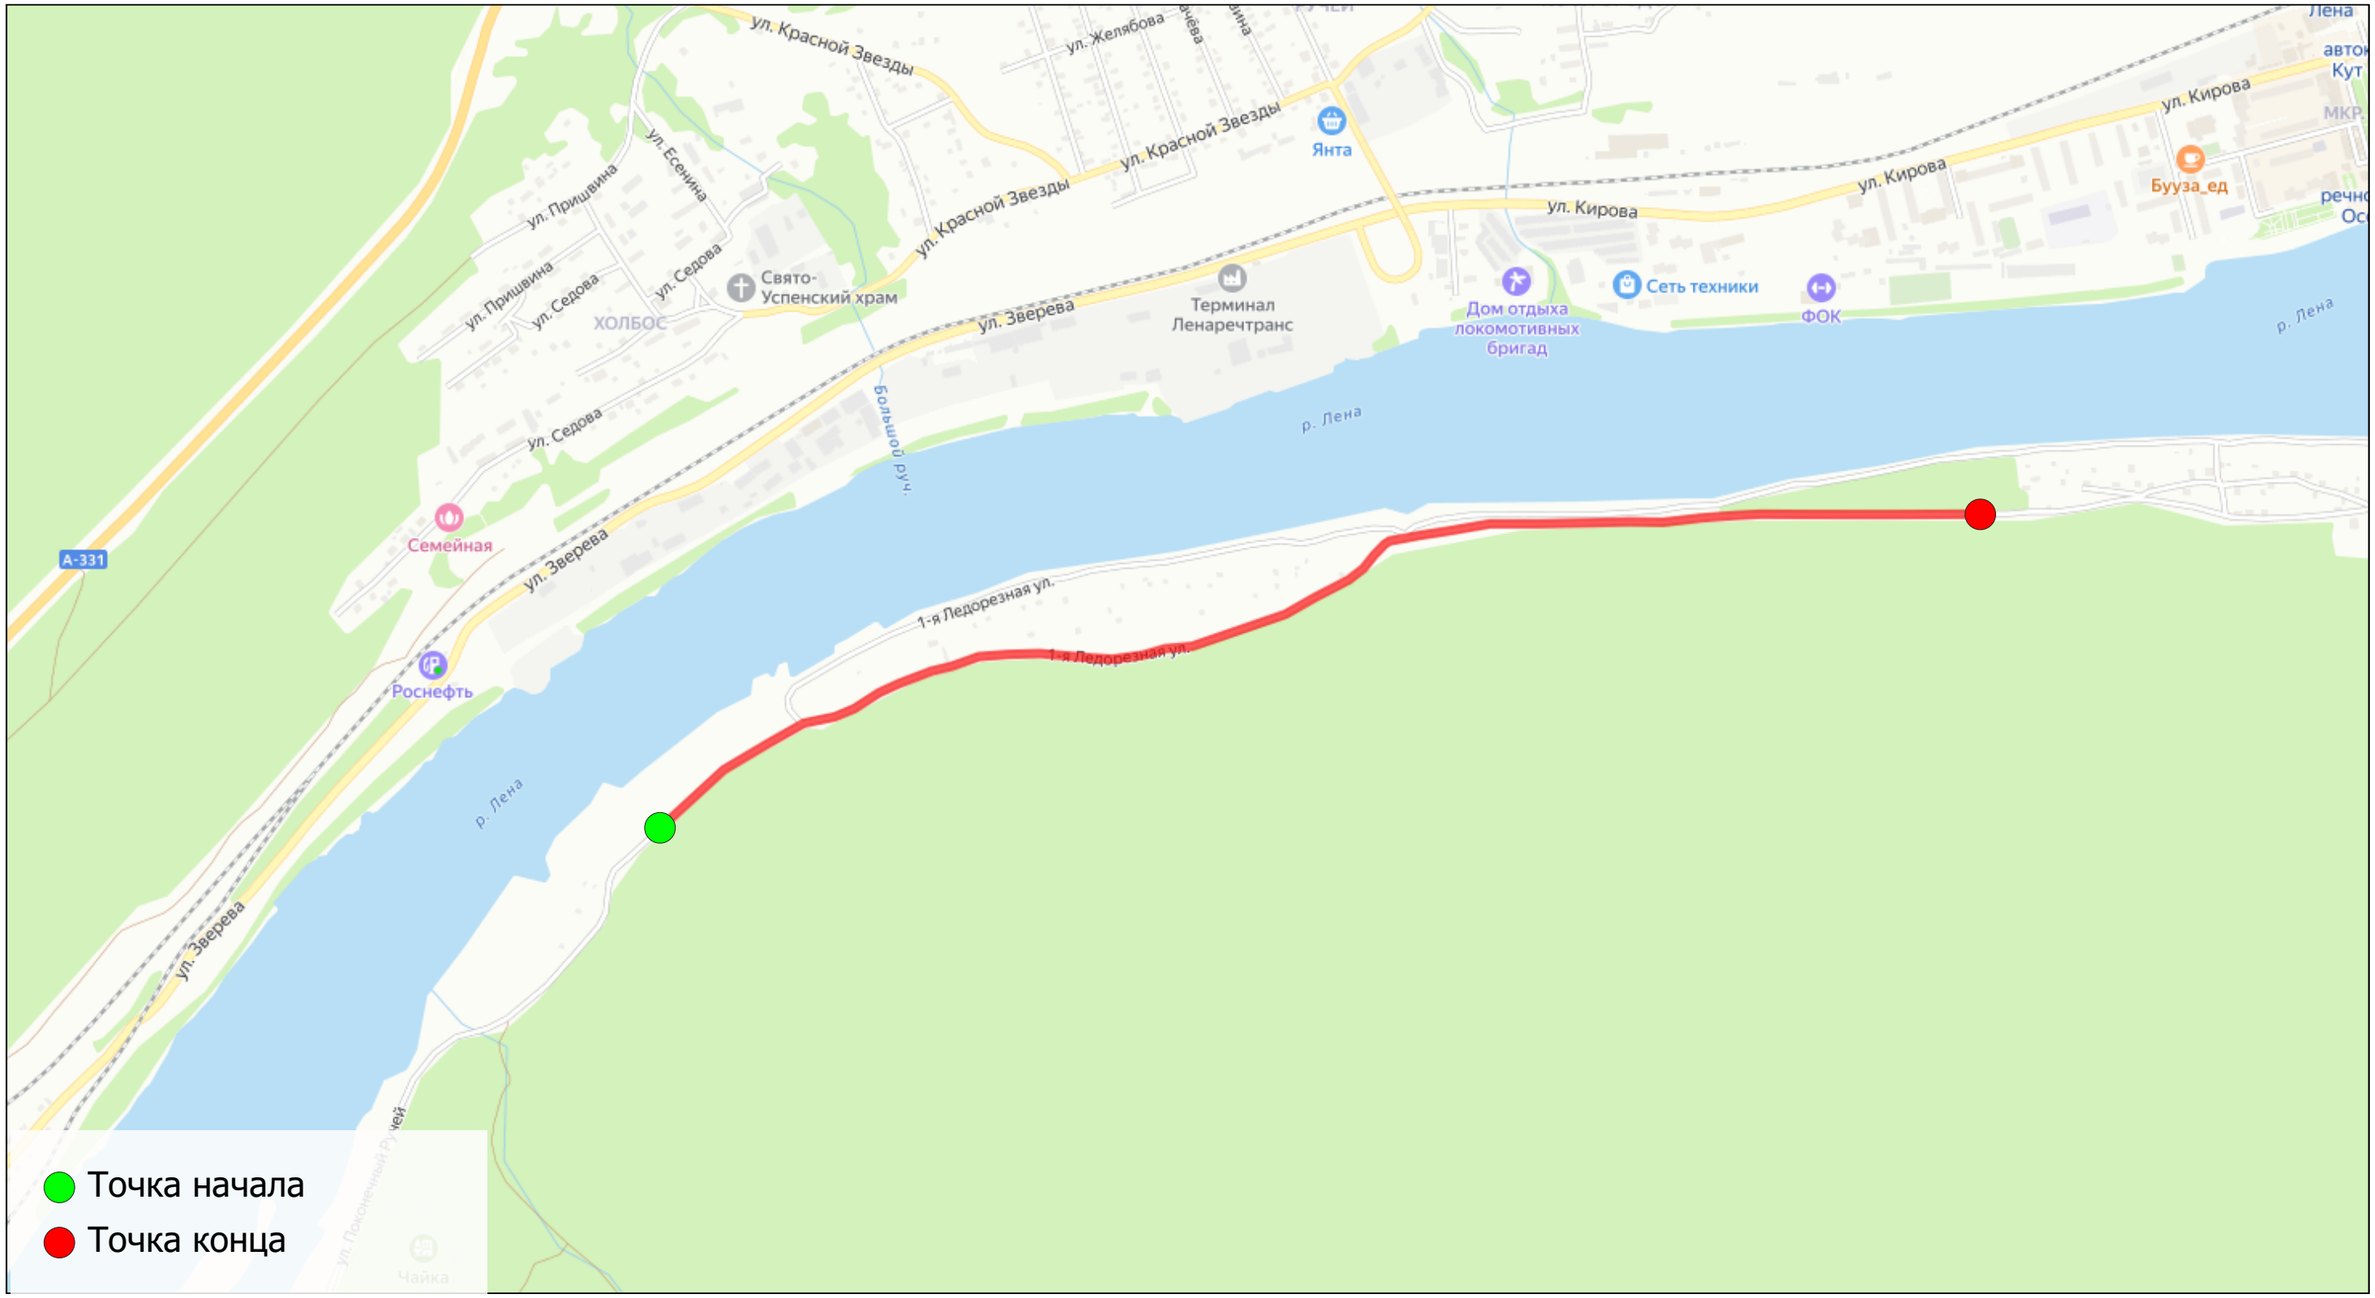

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Поконечный ручей, д. 7 до примыкания с автодорогой по ул. 1-я Ледорезная

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	39 35 40 R=4606м 179 8 429 7 R=4676м 757 65 779 64 R=2233м 908 6 968 8 R=3560м
Кривые в плане	R=658м P=25; a=15° 141 181 R=611м P=26; a=13° 248 297 332 R=694м P=43; a=9° 394 R=603м P=31; a=11° 450 490 597 R=654м P=15; a=25° 750 772 R=640м P=22; a=17° 842 919 R=692м P=58; a=7° 942
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

0 км + 0 м

4,5 пос.


1 км + 0 м

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Поконечный ручей, д. 7 до примыкания с автодорогой по ул. 1-я Ледорезная


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8 R=3560м 60 208 60 229 R=4092м 2 481 2 624 R=4630м
Кривые в плане	100 R=616м P=35; a=10° 137 201 R=633м P=15; a=25° 259 282 R=689м P=10; a=40° 343 370 R=670м P=69; a=6° 415 460 R=626м P=53; a=7° 509 526 R=660м P=105; a=4° 555 753 R=682м P=45; a=9° 841 863 R=633м P=49; a=7° 943
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

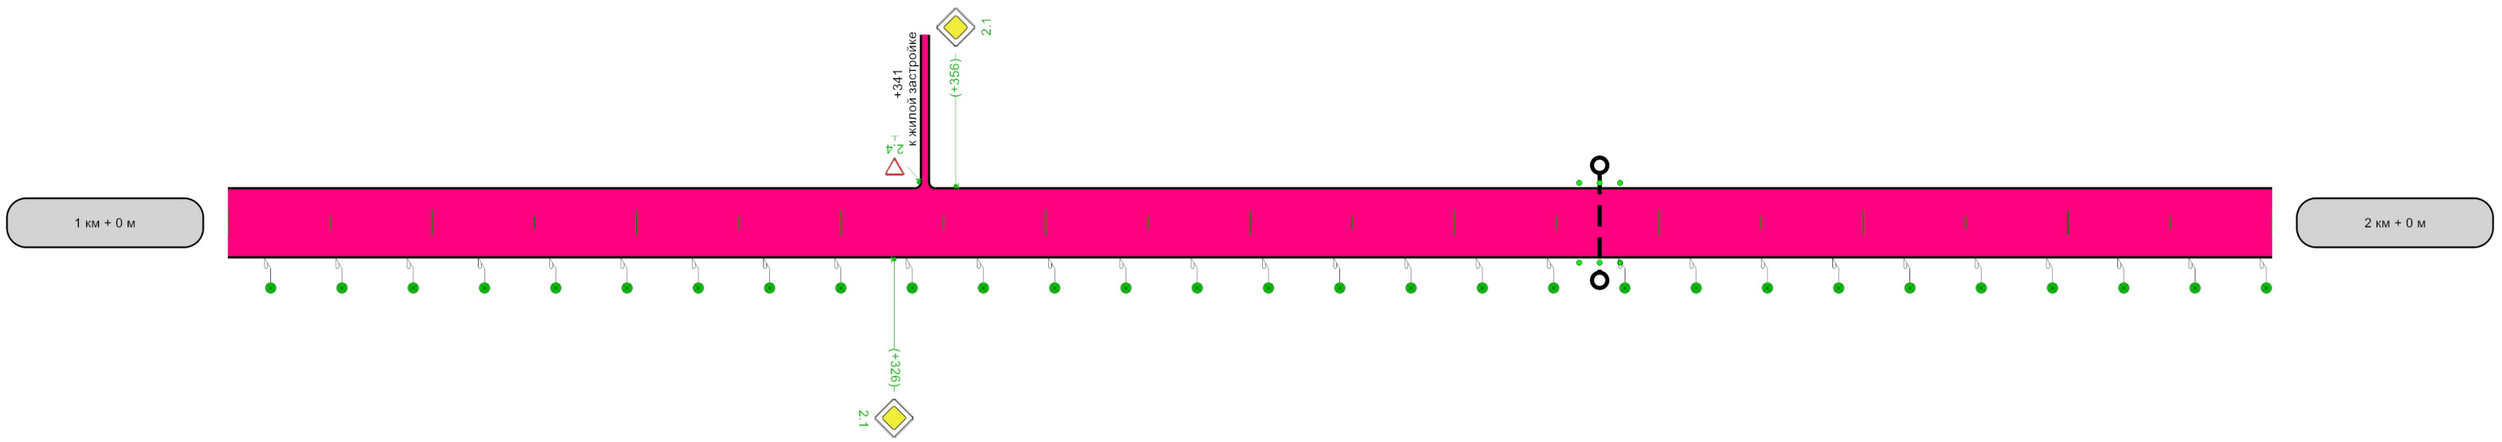

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 87 87 R=4630м 50 52 R=3260м
Кривые в плане	R=657м 150 R=685м 192 119 P=76; a=5° P=61; a=6°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			1+326	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			1+356	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+661	1+681	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	1+661	1+681	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	2+276	Населенный пункт	66/66	2266	0	Справа
Итого:				**66/66**	**2266**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Октябрьская, д. 2 до жилого дома по ул. Октябрьская, д. 44

1-й участок: км 0+000 - км 0+242
2-й участок: км 0+000 - км 0+412



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	30 — 27 — 20 — R=6498м — 178 — 3
Кривые в плане	2 — R=603м, P=10, a=36° — 85
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 90 — 4,00

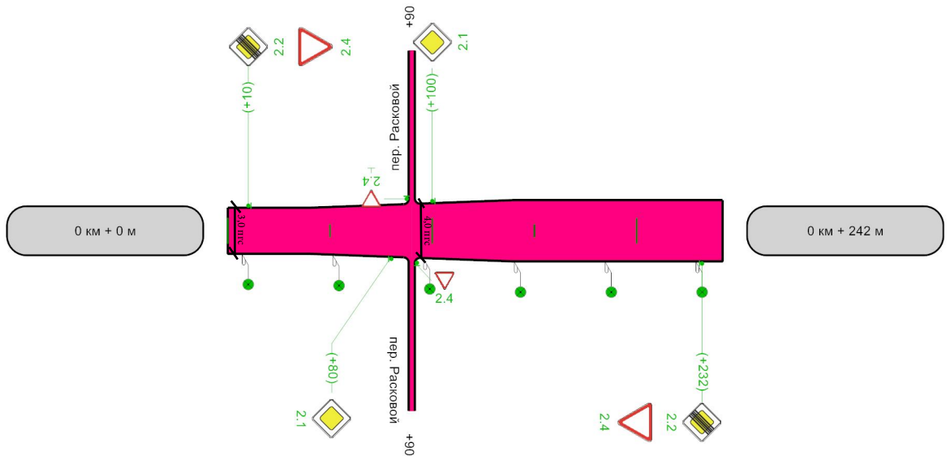

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+080	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+100	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+232	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+232	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+232	Населенный пункт	6/6	222	0	Справа
Итого:				**6/6**	**222**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Элементы дороги в продольном профиле	5	48	2 R=2742м	48	184
Кривые в плане					
Тротуары слева					
Характеристики проезжей части	5,50	55	4,00	165	3,30

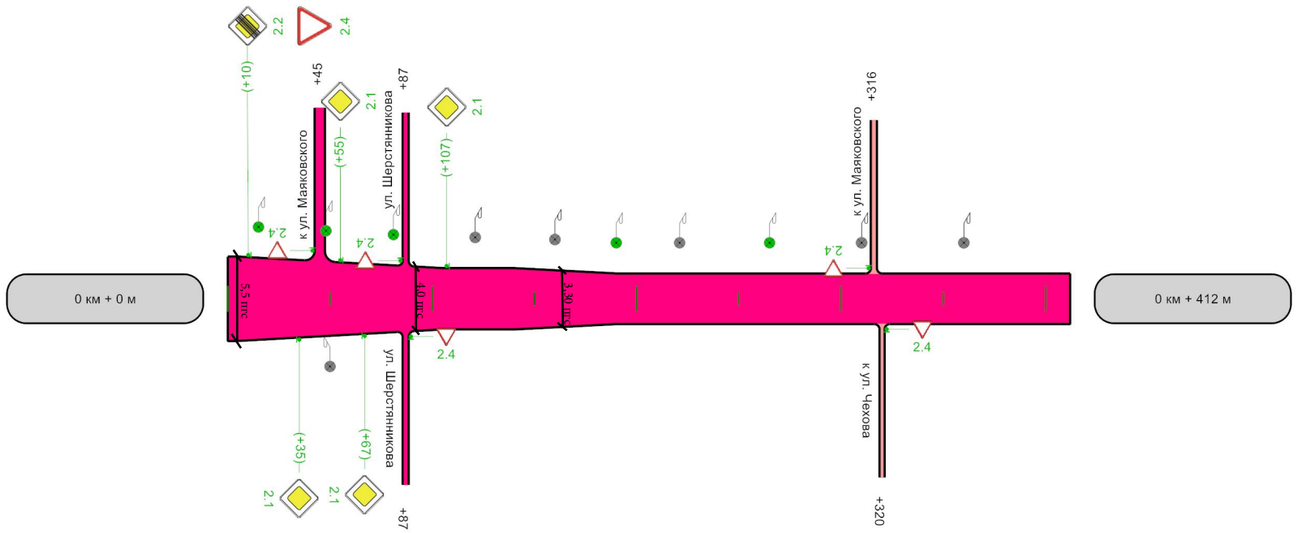

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+035	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+055	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+067	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+107	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+081	Населенный пункт	3/3	66	0	Слева
2	0+050	0+050	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+121	0+160	Населенный пункт	2/2	0	39	Слева
4	0+121	0+160	Населенный пункт	2/2	39	0	Слева
5	0+190	0+190	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
6	0+221	0+221	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+265	0+265	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
8	0+310	0+360	Населенный пункт	2/2	0	50	Слева
9	0+310	0+360	Населенный пункт	2/2	50	0	Слева
10	0+400	0+412	Населенный пункт	3/3	12	0	Слева
Итого:				**18/18**	**167**	**89**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Снежная, д.13 до жилого дома по ул. Снежная, д. 3

1-й участок: км 0+000 - км 0+302
2-й участок: км 0+000 - км 0+070
3-й участок: км 0+000 - км 0+070

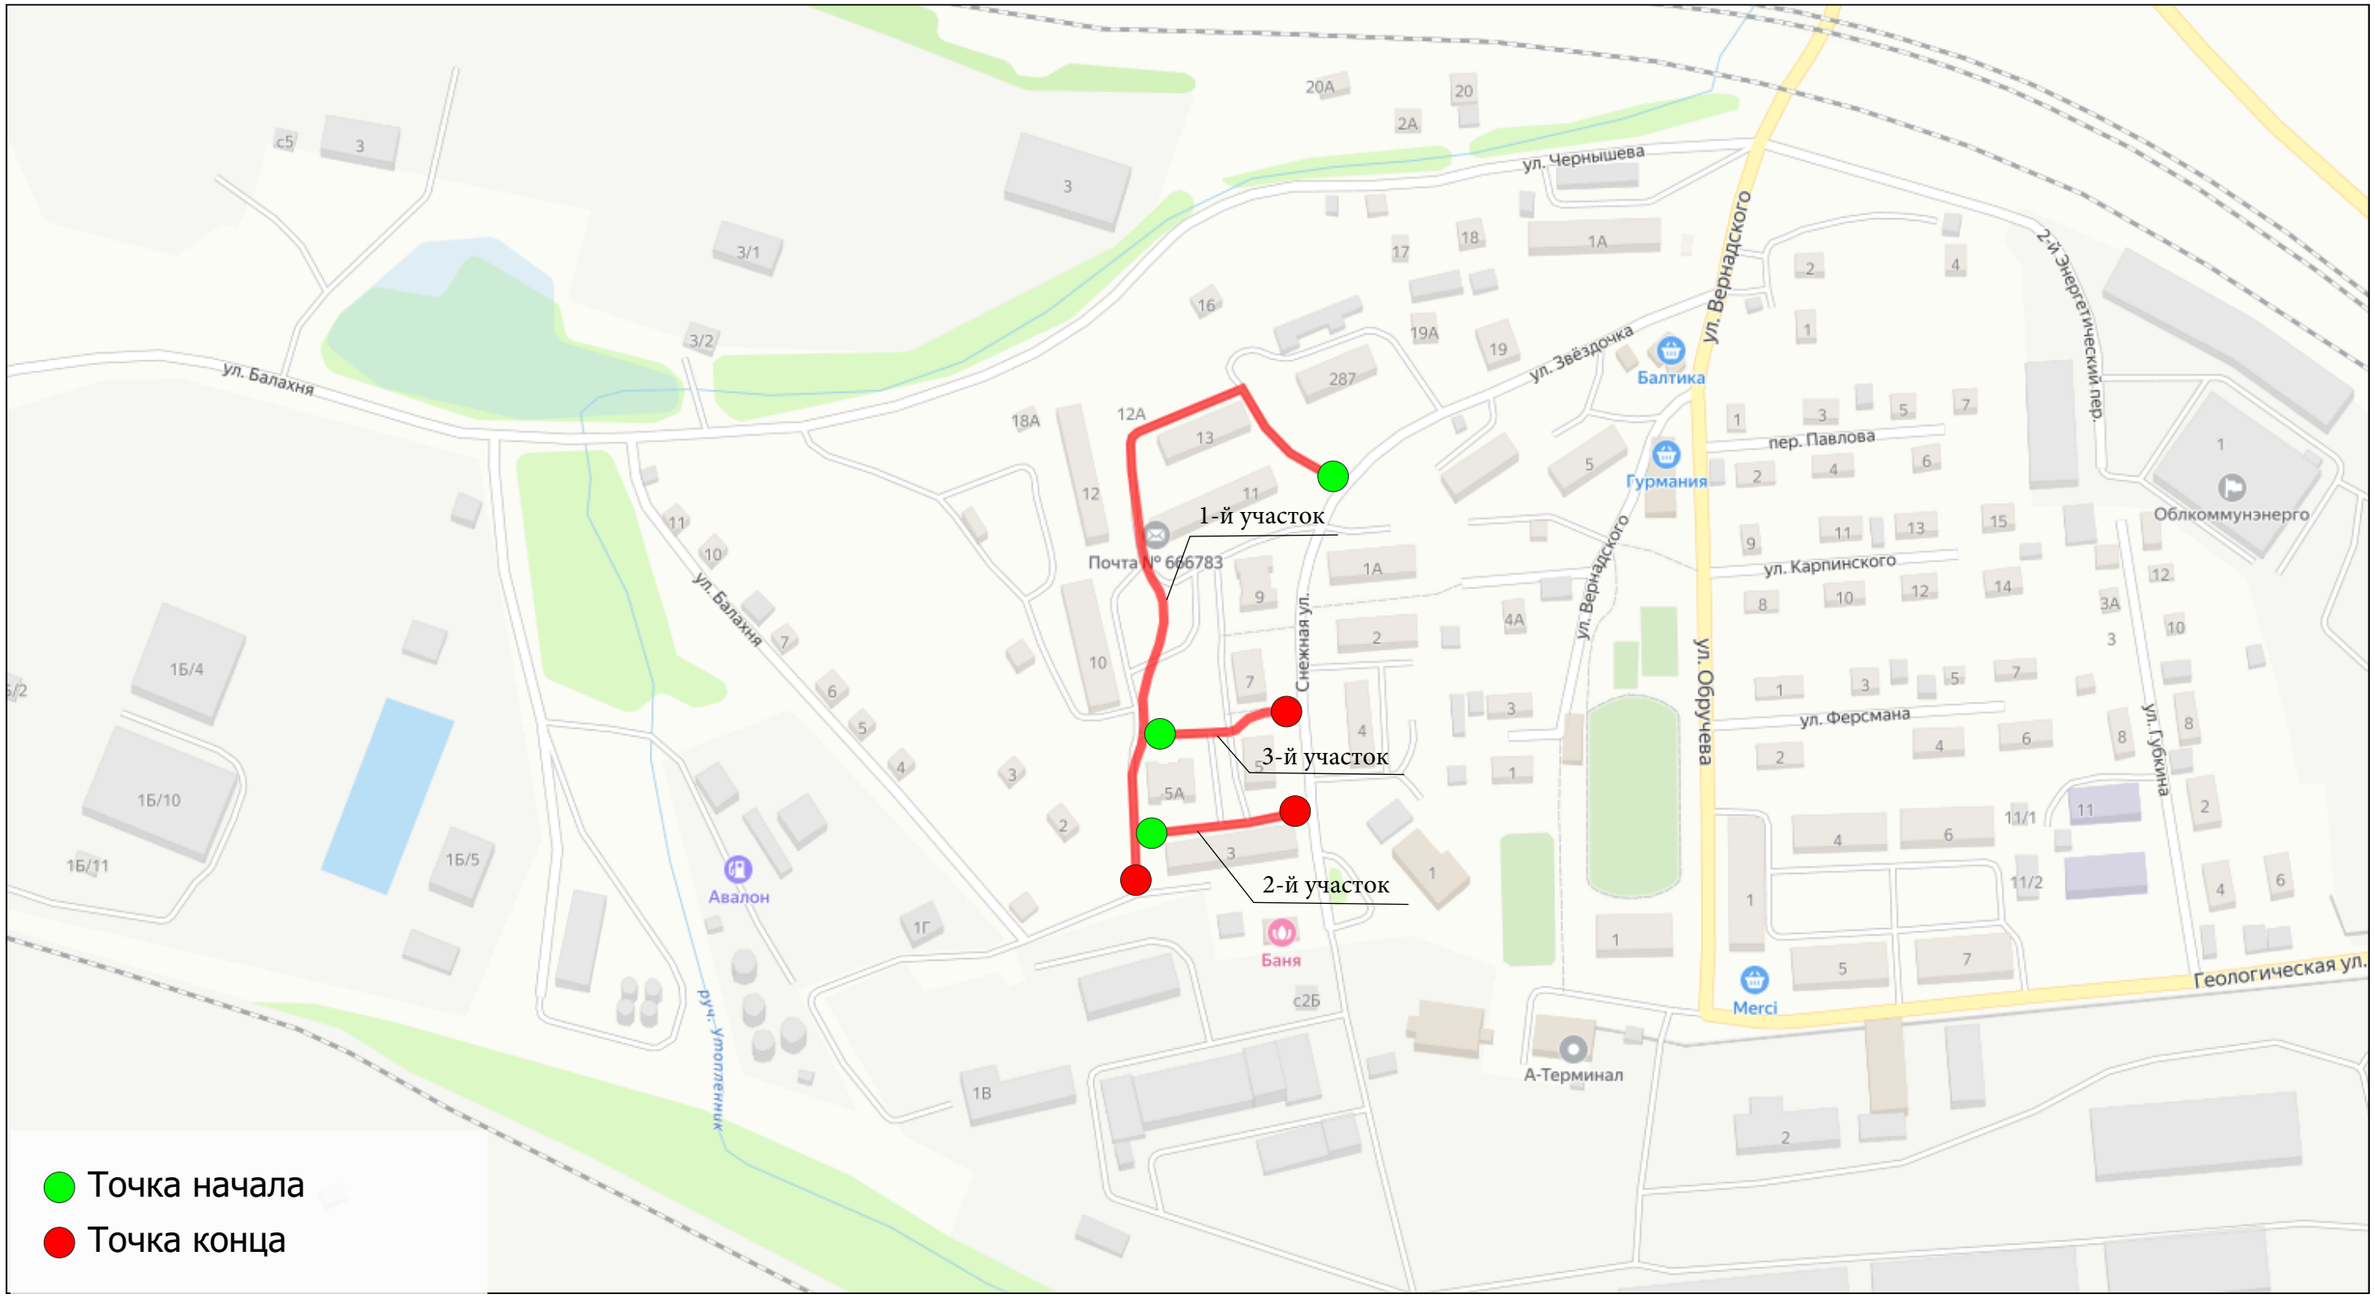

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	17 — 107 — 8 — 157 — 8 — R=9753м — 302
Кривые в плане	R=643м P=7; a=53° — 40 — R=628м P=4; a=81° — 80 — 97 — R=612м P=6; a=60 — 20
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

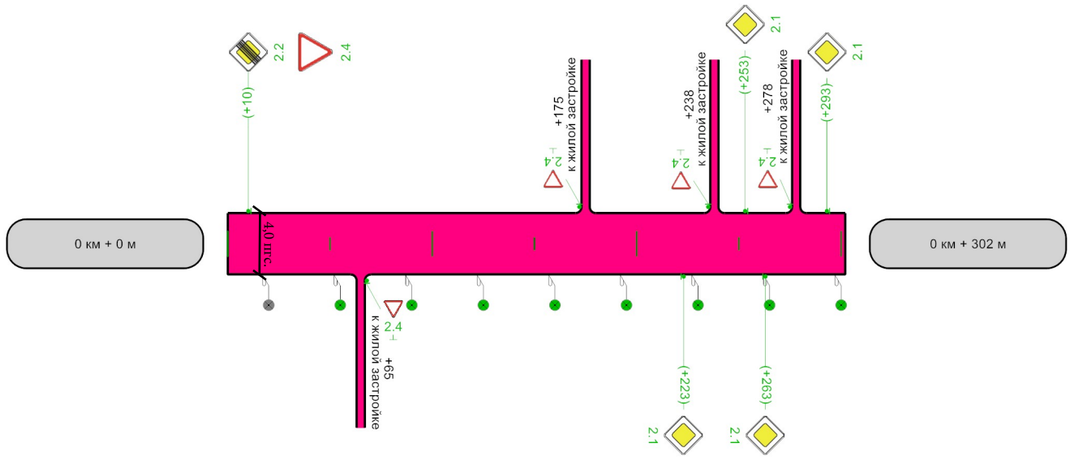

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+223	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+253	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+263	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+293	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+020	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+055	0+300	Населенный пункт	8/8	245	0	Справа
Итого:				**9/9**	**245**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00

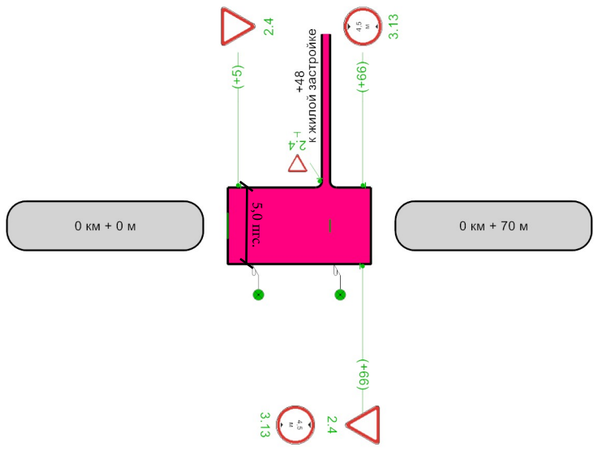

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+066	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.13	Ограничение высоты			0+066	Требуется установить	1	слева
4	3.13	Ограничение высоты			0+066	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+055	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**2/2**	**40**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

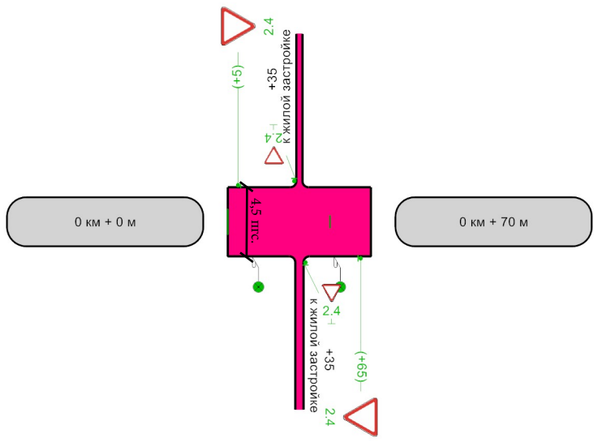

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+065	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+055	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**2/2**	**40**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Ферсмана, д. 1 до жилого дома по ул. Ферсмана, д. 7
км 0+000 - км 0+125

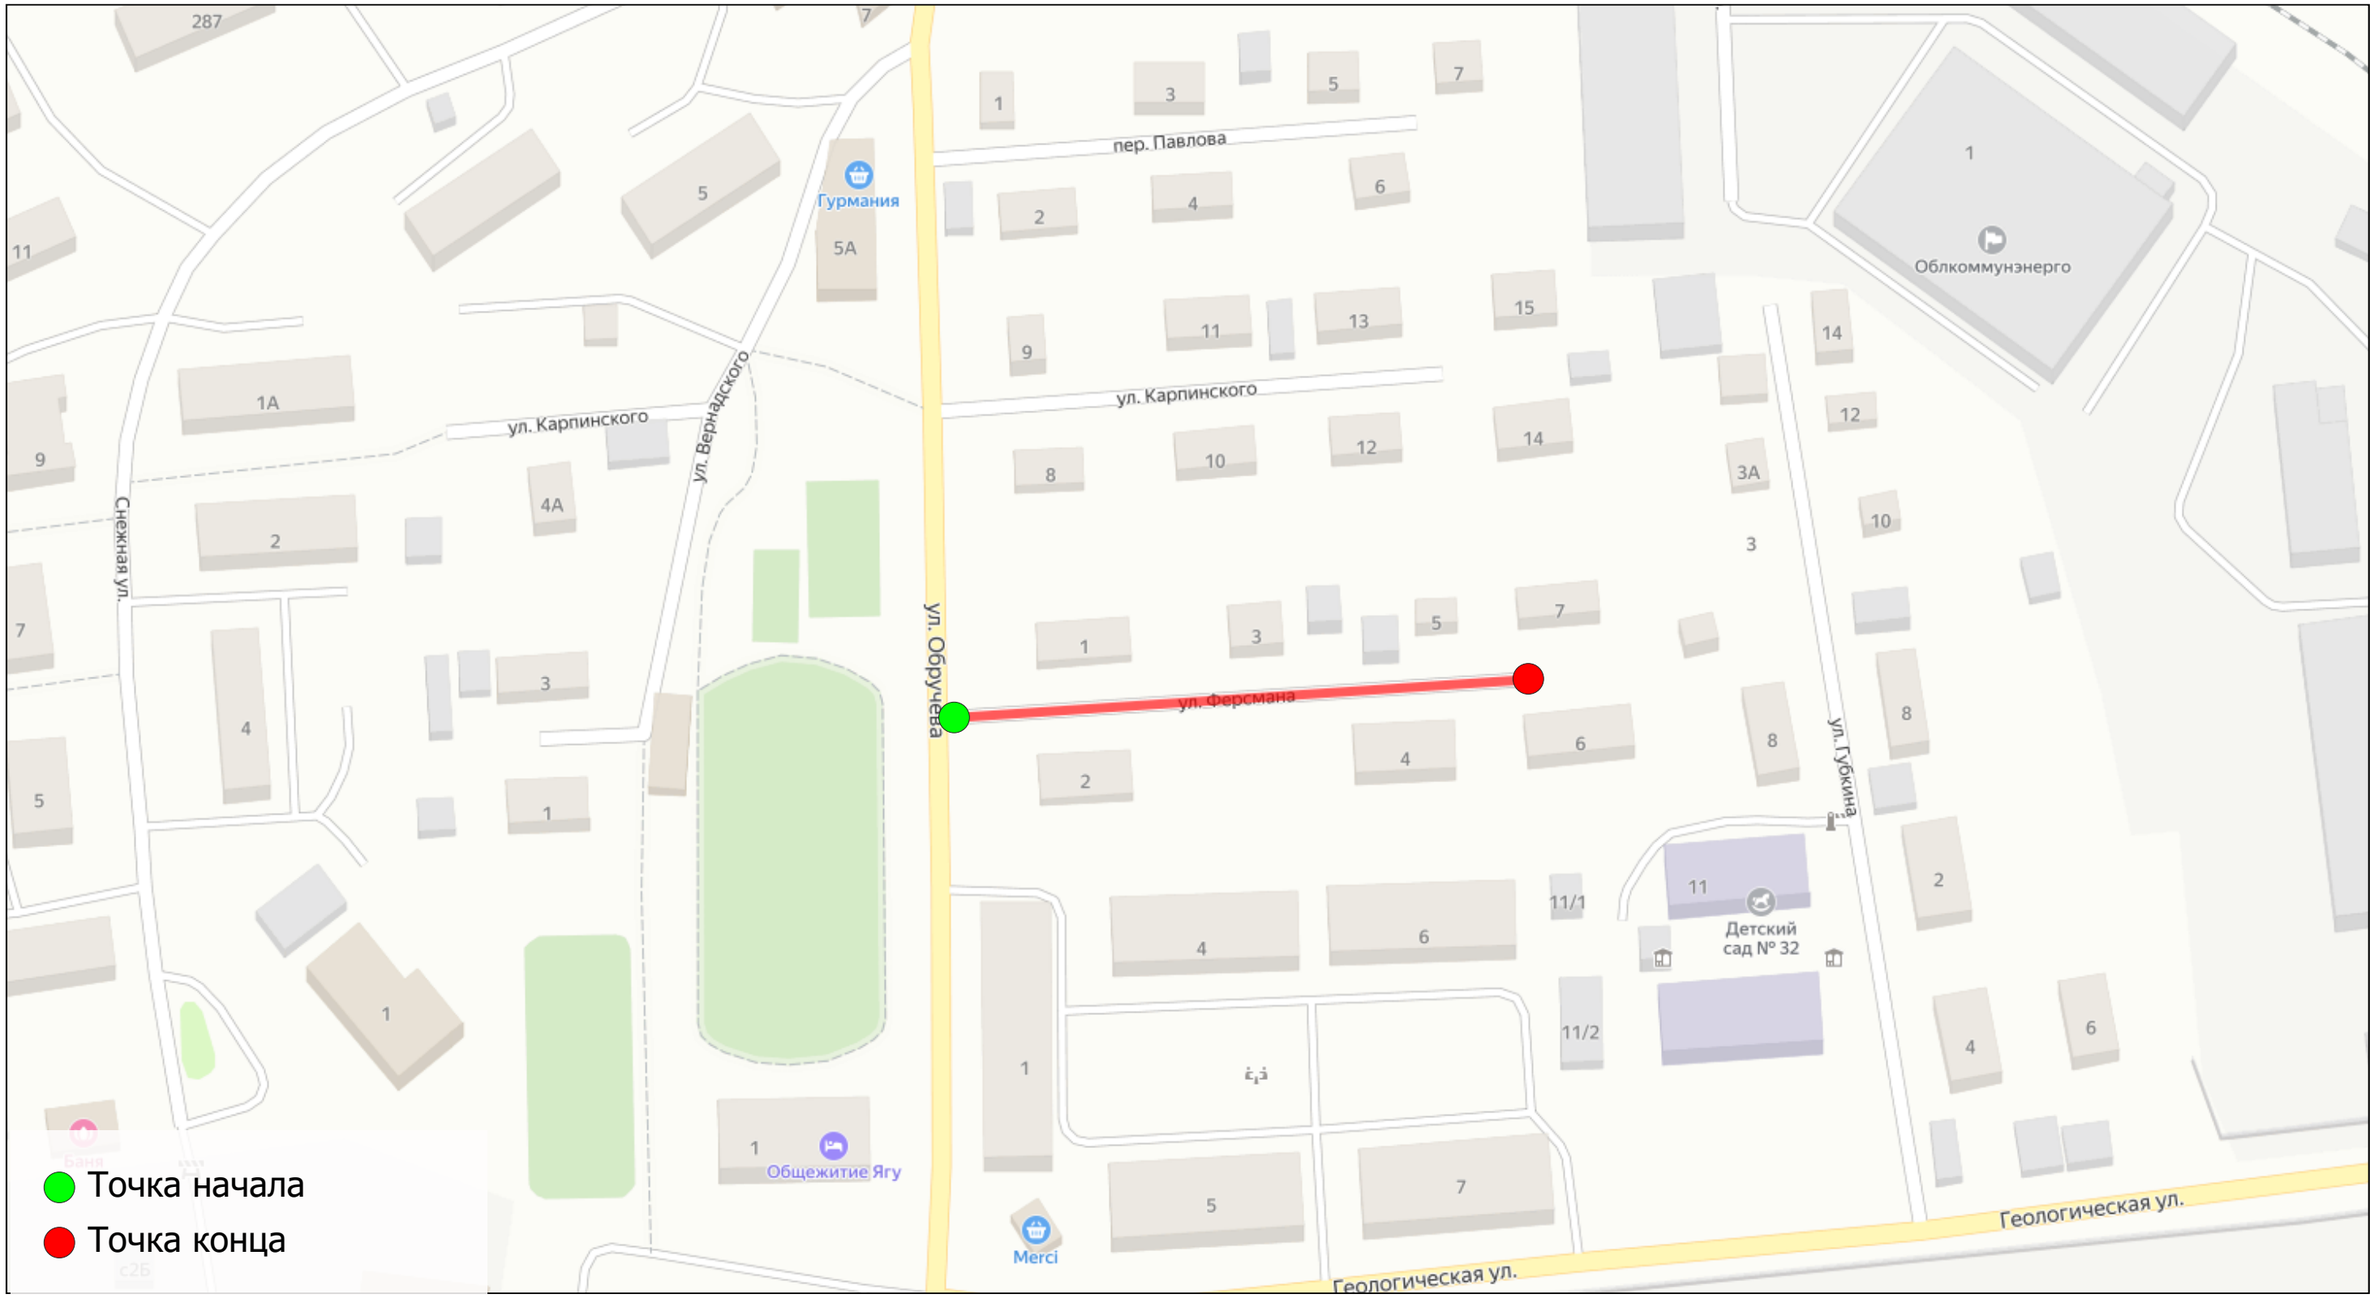

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	30 / 9 — 31 — R=5496м — 32
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6 — 4,50

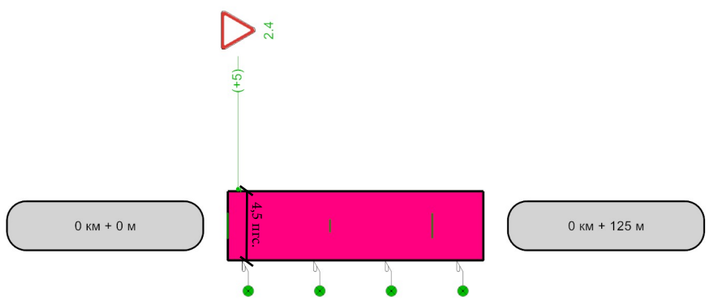

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+115	Населенный пункт	4/4	105	0	Справа
Итого:				**4/4**	**105**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Чайковского, д. 4 до жилого дома по ул. Чайковского, д. 66

1-й участок: км 0+000 - км 0+352
2-й участок: км 0+000 - км 0+580

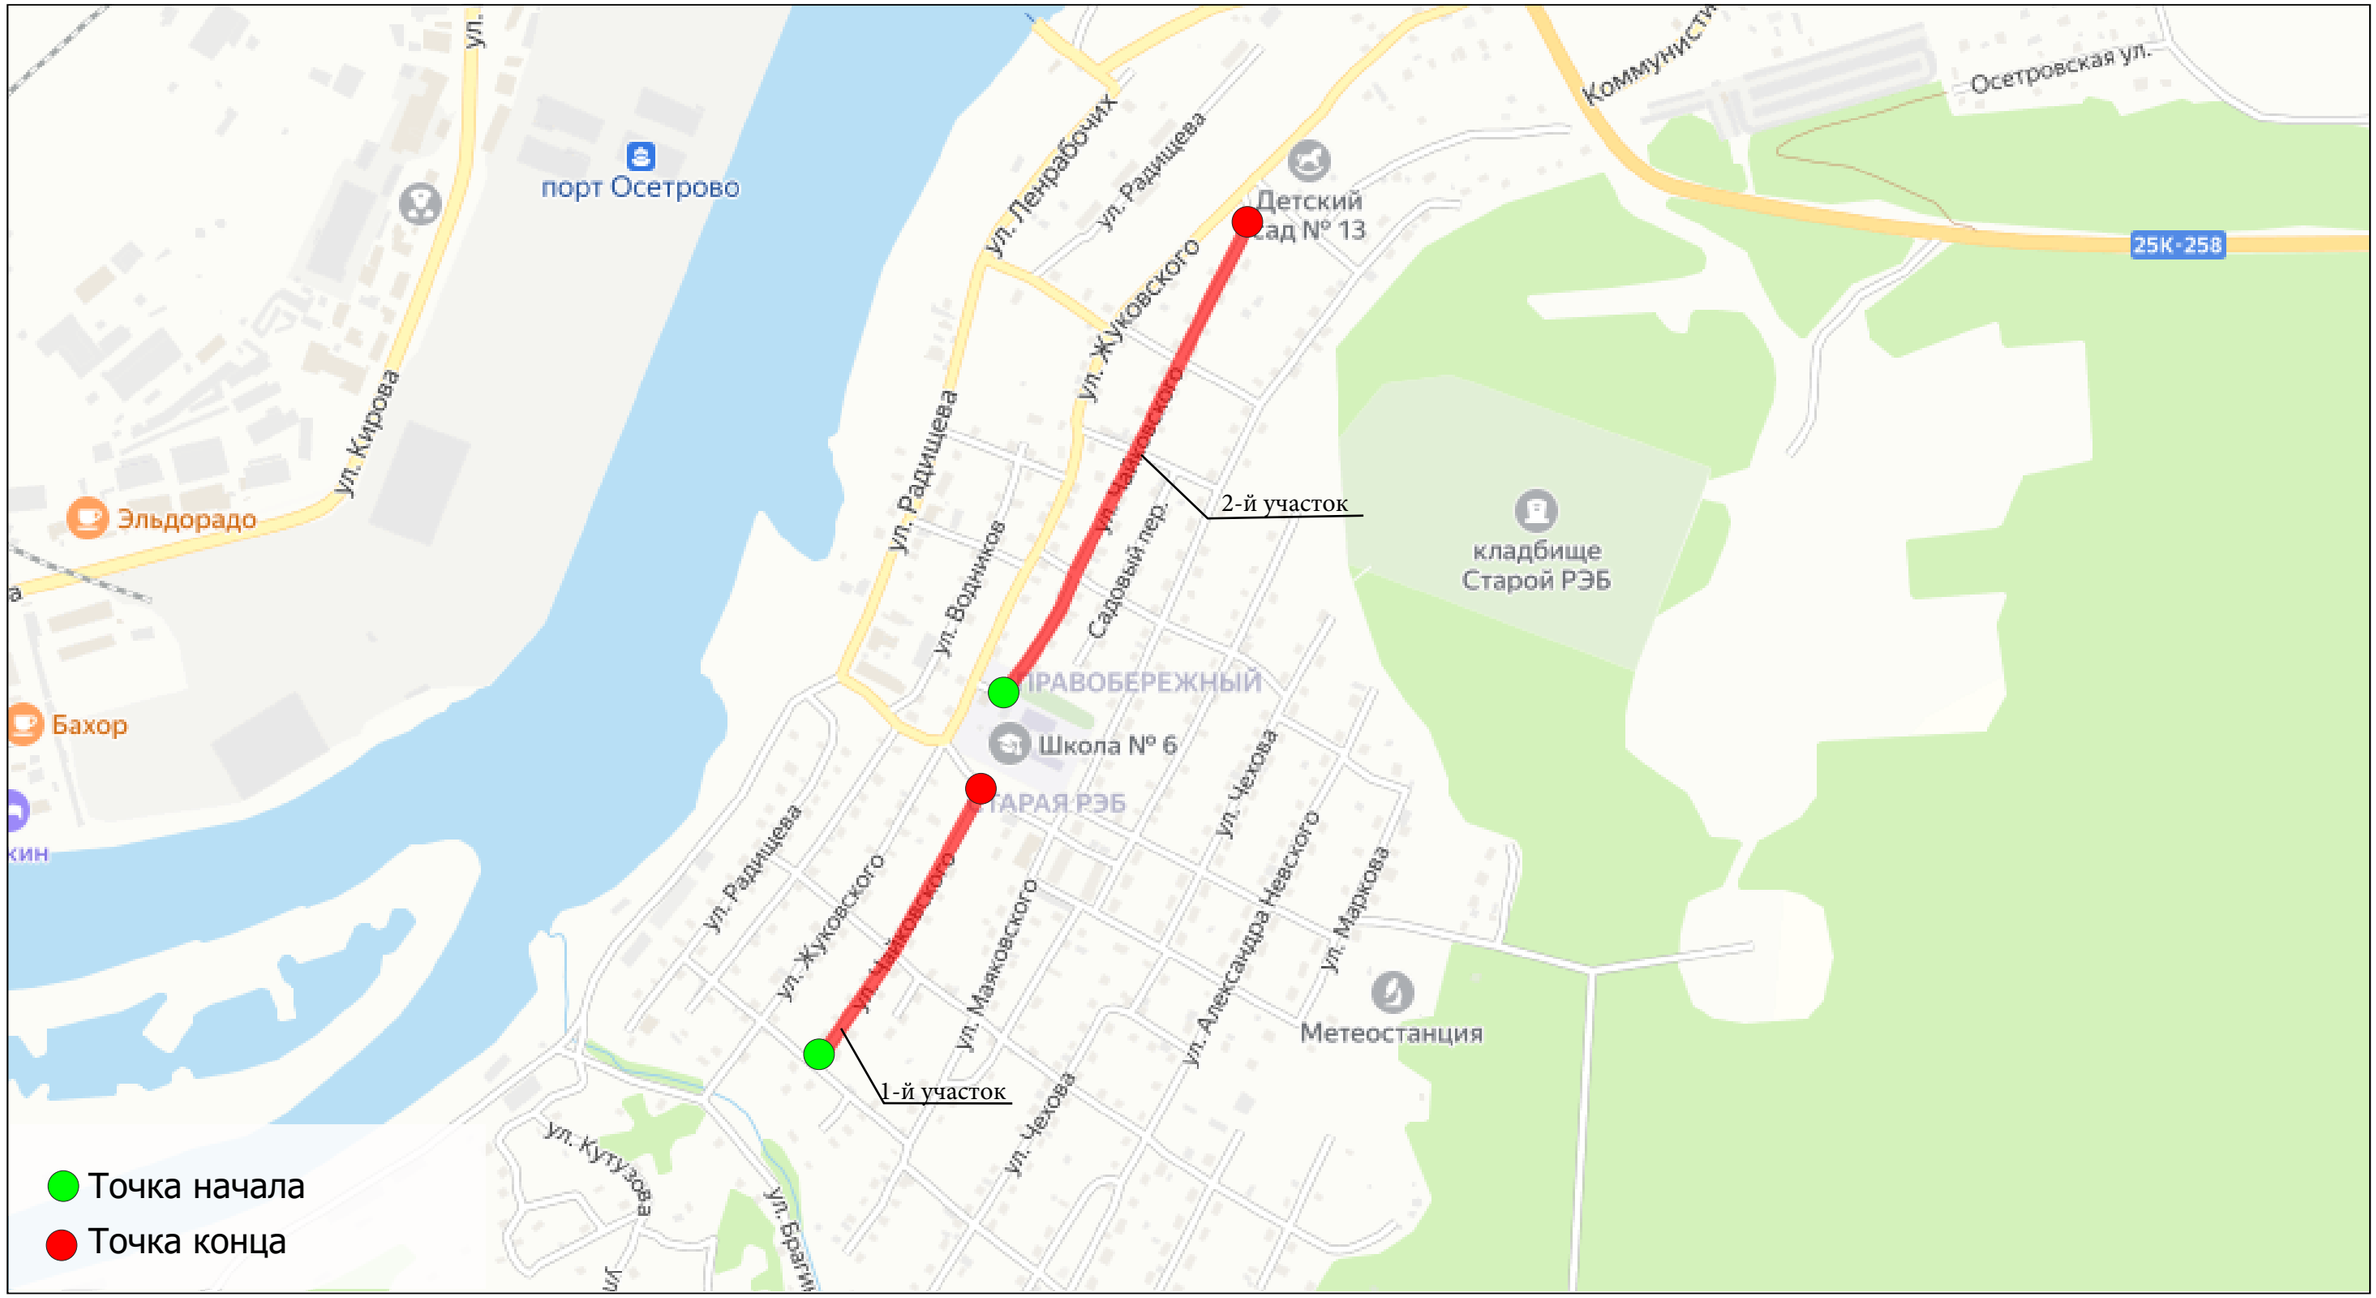

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 34 40 2 R=2228м 75 260 R=2427м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

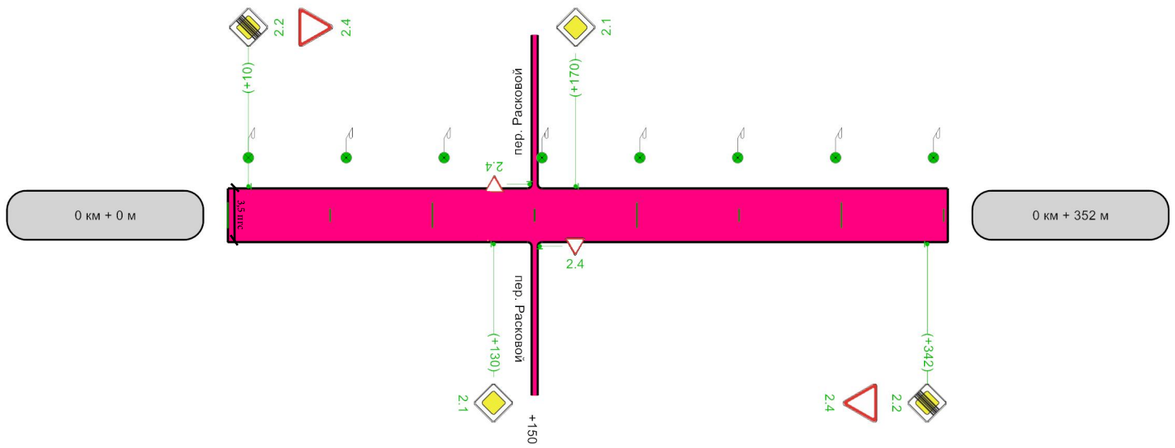

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+170	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+342	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+342	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+345	Населенный пункт	8/8	335	0	Слева
Итого:				**8/8**	**335**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 — 21 — 376 — R=10383м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

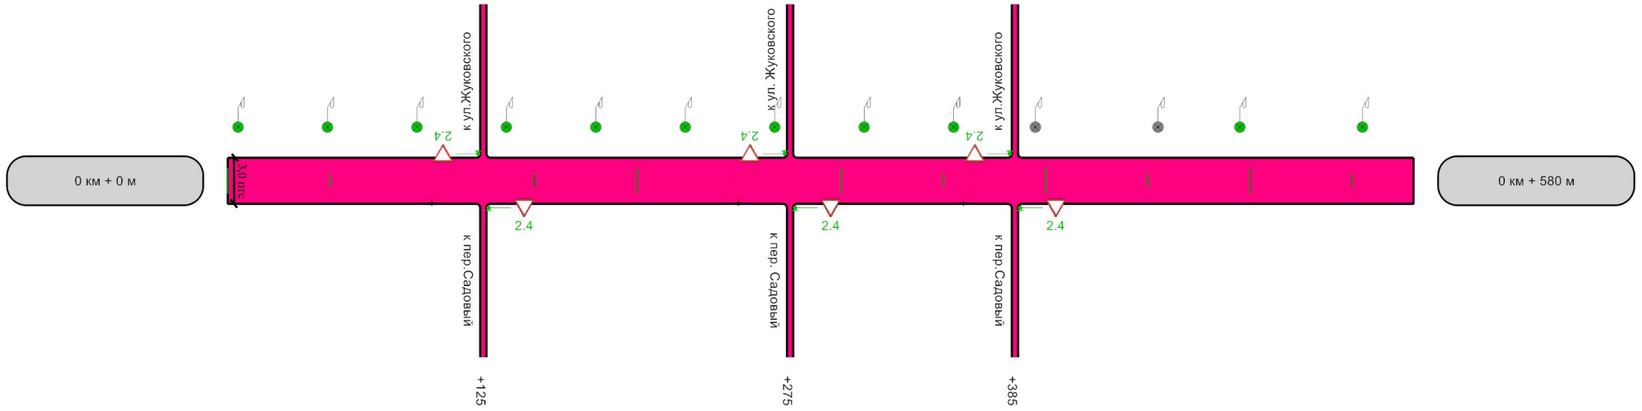

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+355	Населенный пункт	9/9	350	0	Слева
2	0+395	0+455	Населенный пункт	2/2	0	60	Слева
3	0+495	0+555	Населенный пункт	2/2	60	0	Слева
Итого:				**13/13**	**410**	**60**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Чехова д. 1а до жилого дома по ул. Чехова д. 63

1-й участок: км 0+000 - км 0+515
2-й участок: км 0+000 - км 0+421

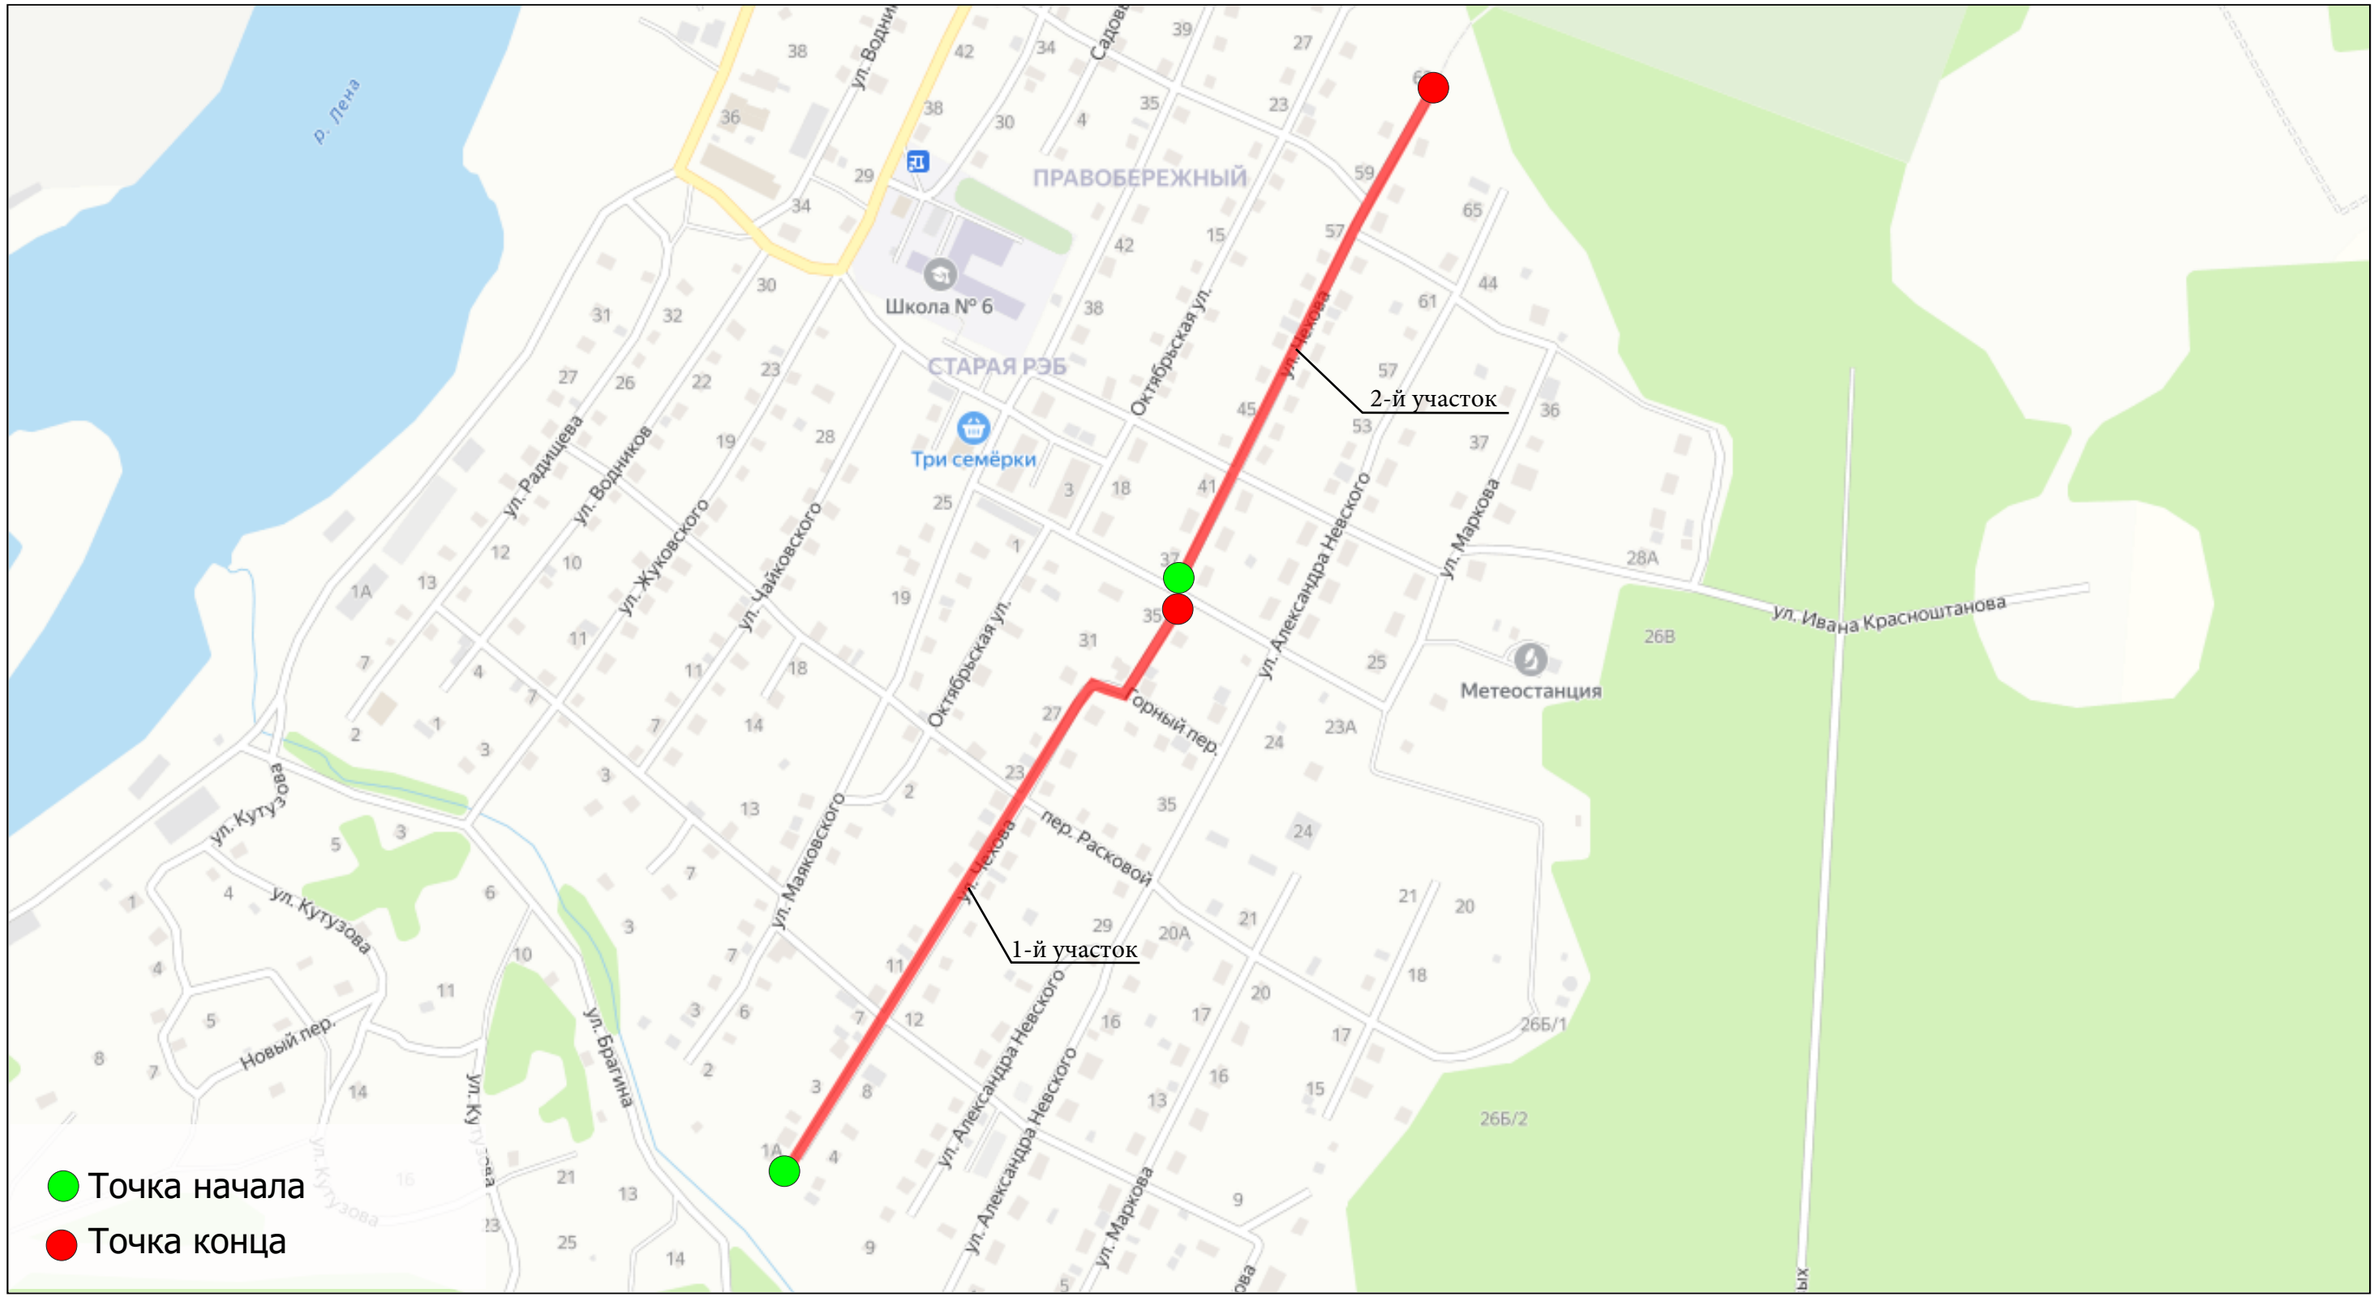

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Кривые в плане	390 R=604м α=73; a=5' 419 R=607м P=107; a=3' 446
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

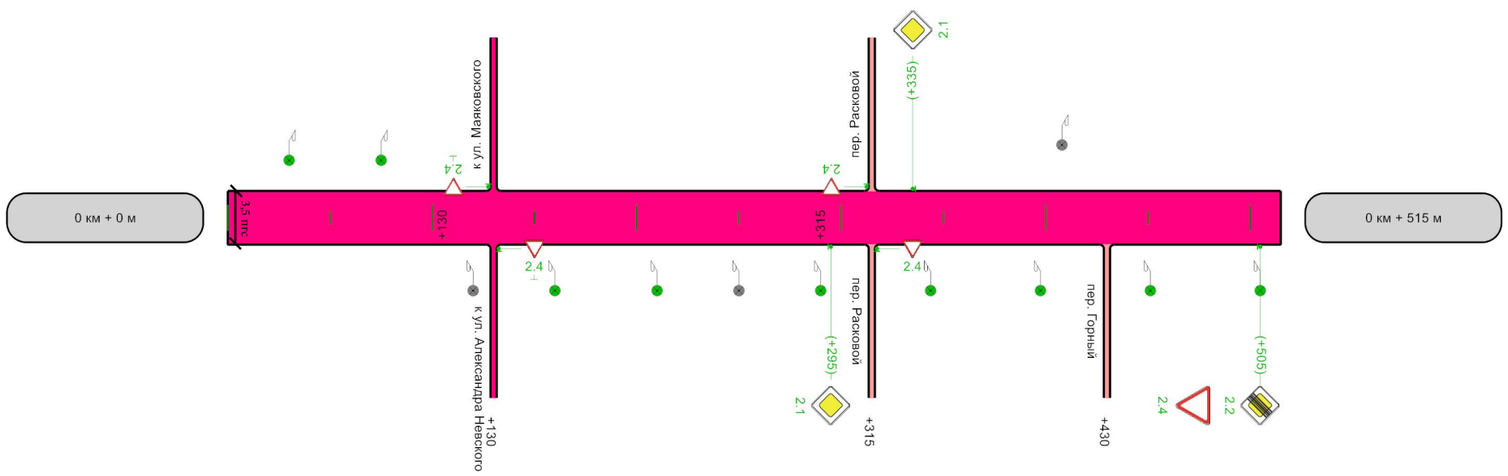

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+295	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+335	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+505	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+505	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+075	Населенный пункт	2/2	45	0	Слева
2	0+120	0+120	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+160	0+210	Населенный пункт	2/2	50	0	Справа
4	0+250	0+250	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+290	0+505	Населенный пункт	5/5	215	0	Справа
6	0+408	0+408	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**12/12**	**310**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 4 4 R=2603м 137 47 272 34 R=972м 372 138 416
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

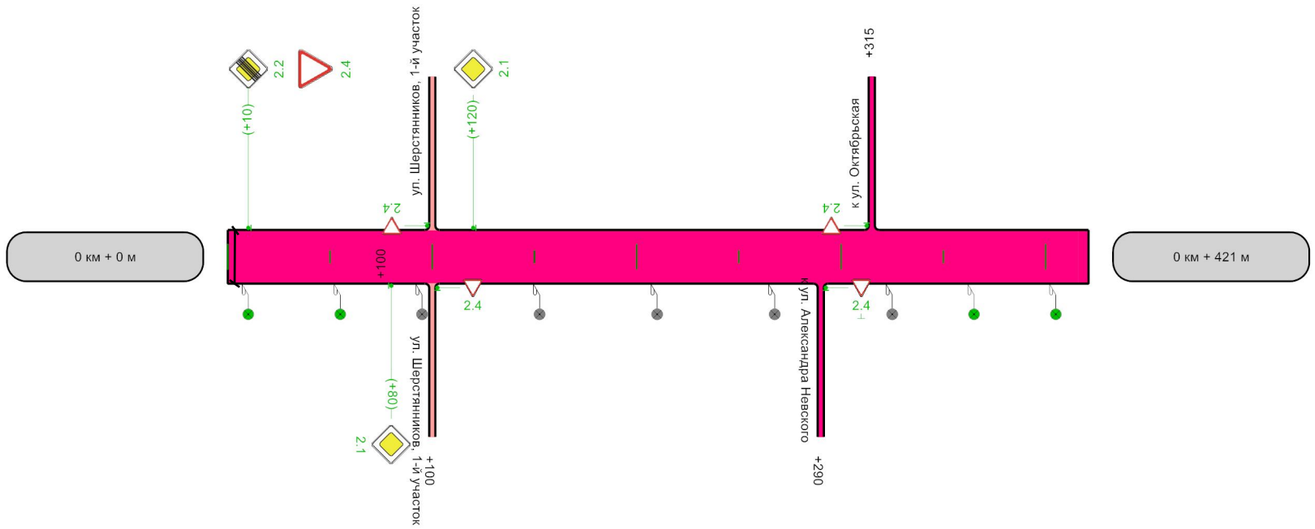

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+080	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+120	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+055	Населенный пункт	2/2	45	0	Справа
2	0+095	0+325	Населенный пункт	5/5	0	230	Справа
3	0+095	0+325	Населенный пункт	5/5	230	0	Справа
4	0+365	0+405	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
Итого:				**14/14**	**315**	**230**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Ярактинская, 3 до жилого дома по ул. Ярактинская, д. 25
км 0+000 - км 0+432

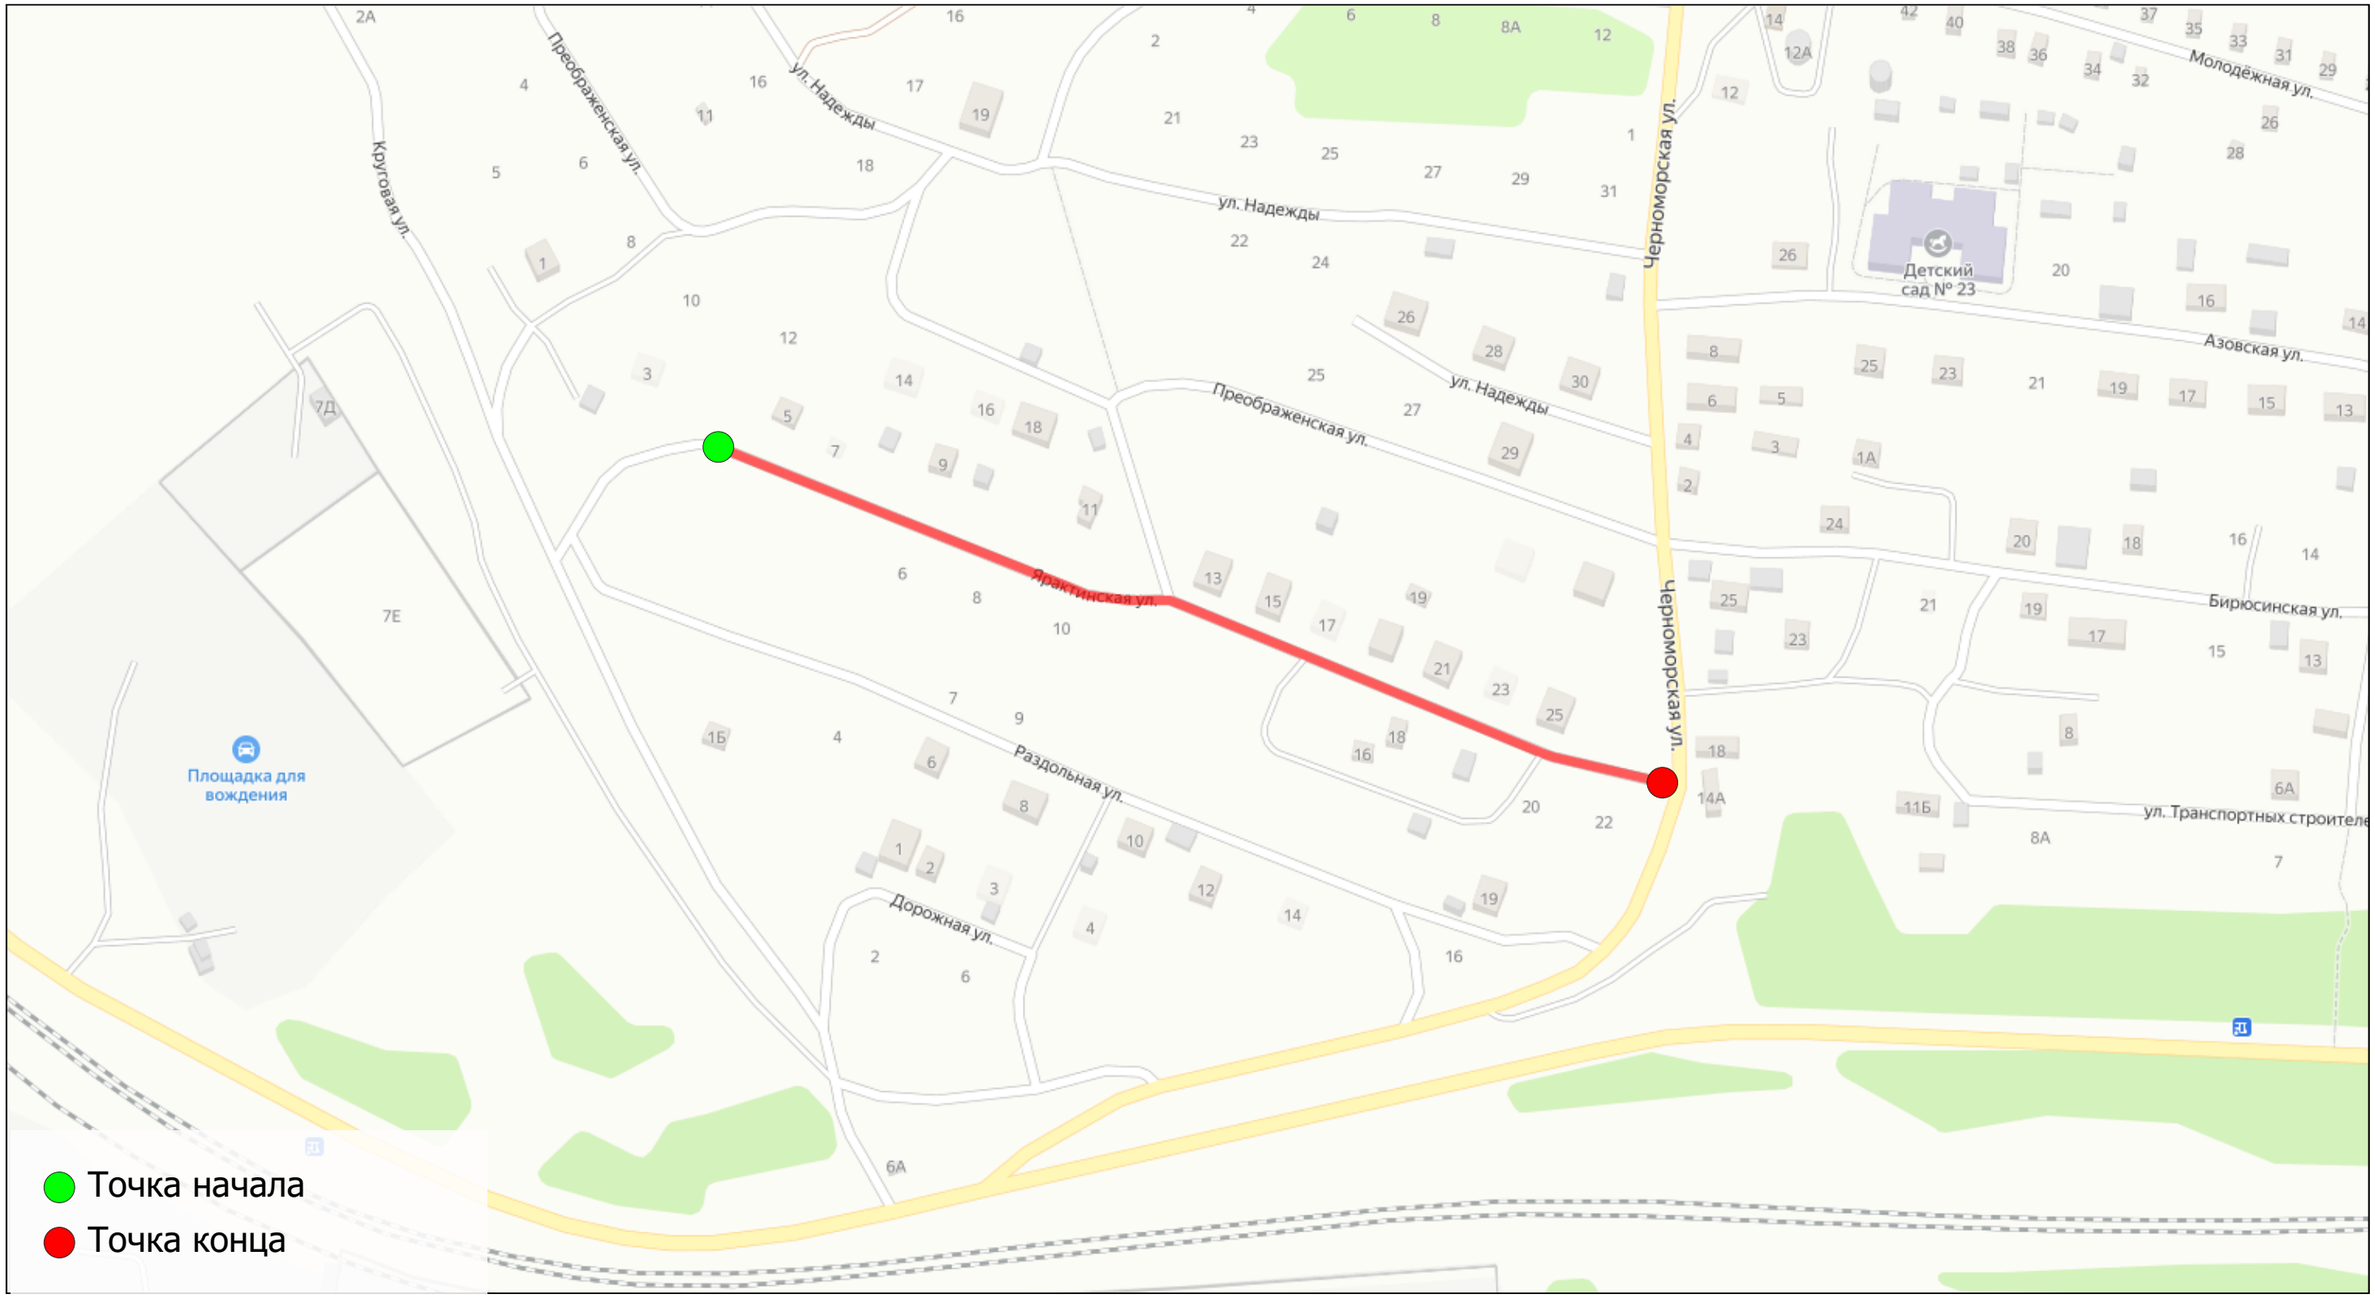

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	39 / 31 / 131 / R=2922м / 278 / 19
Кривые в плане	145 R=678м P=15; a=25° / R=654м P=12; a=32° 160 210
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

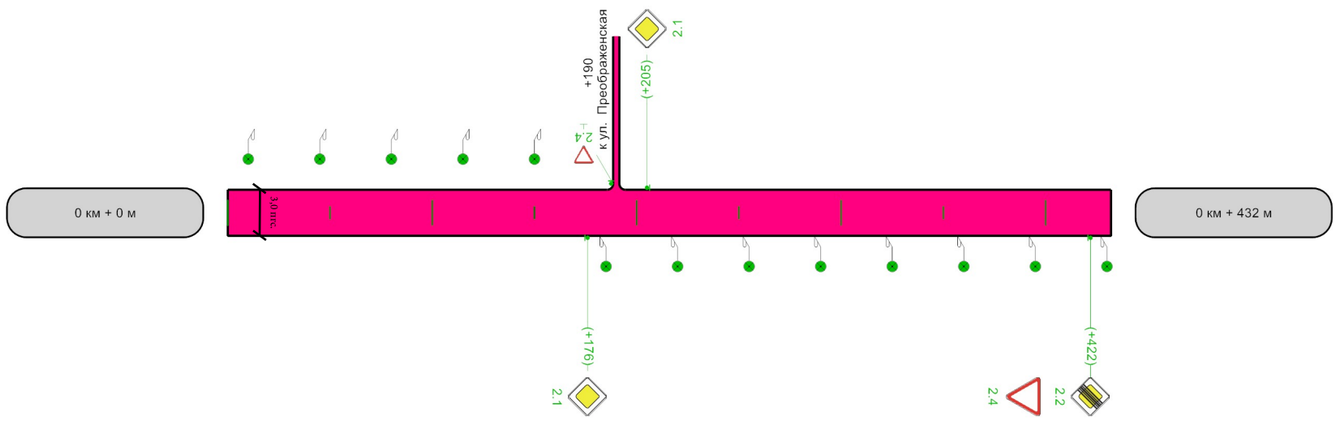

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+176	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+205	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+422	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+422	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+150	Населенный пункт	5/5	140	0	Слева
2	0+185	0+430	Населенный пункт	8/8	245	0	Справа
Итого:				**13/13**	**385**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Нахимова, д. 19 до жилого дома по ул. Радищева, д. 22
км 0+000 - км 0+697

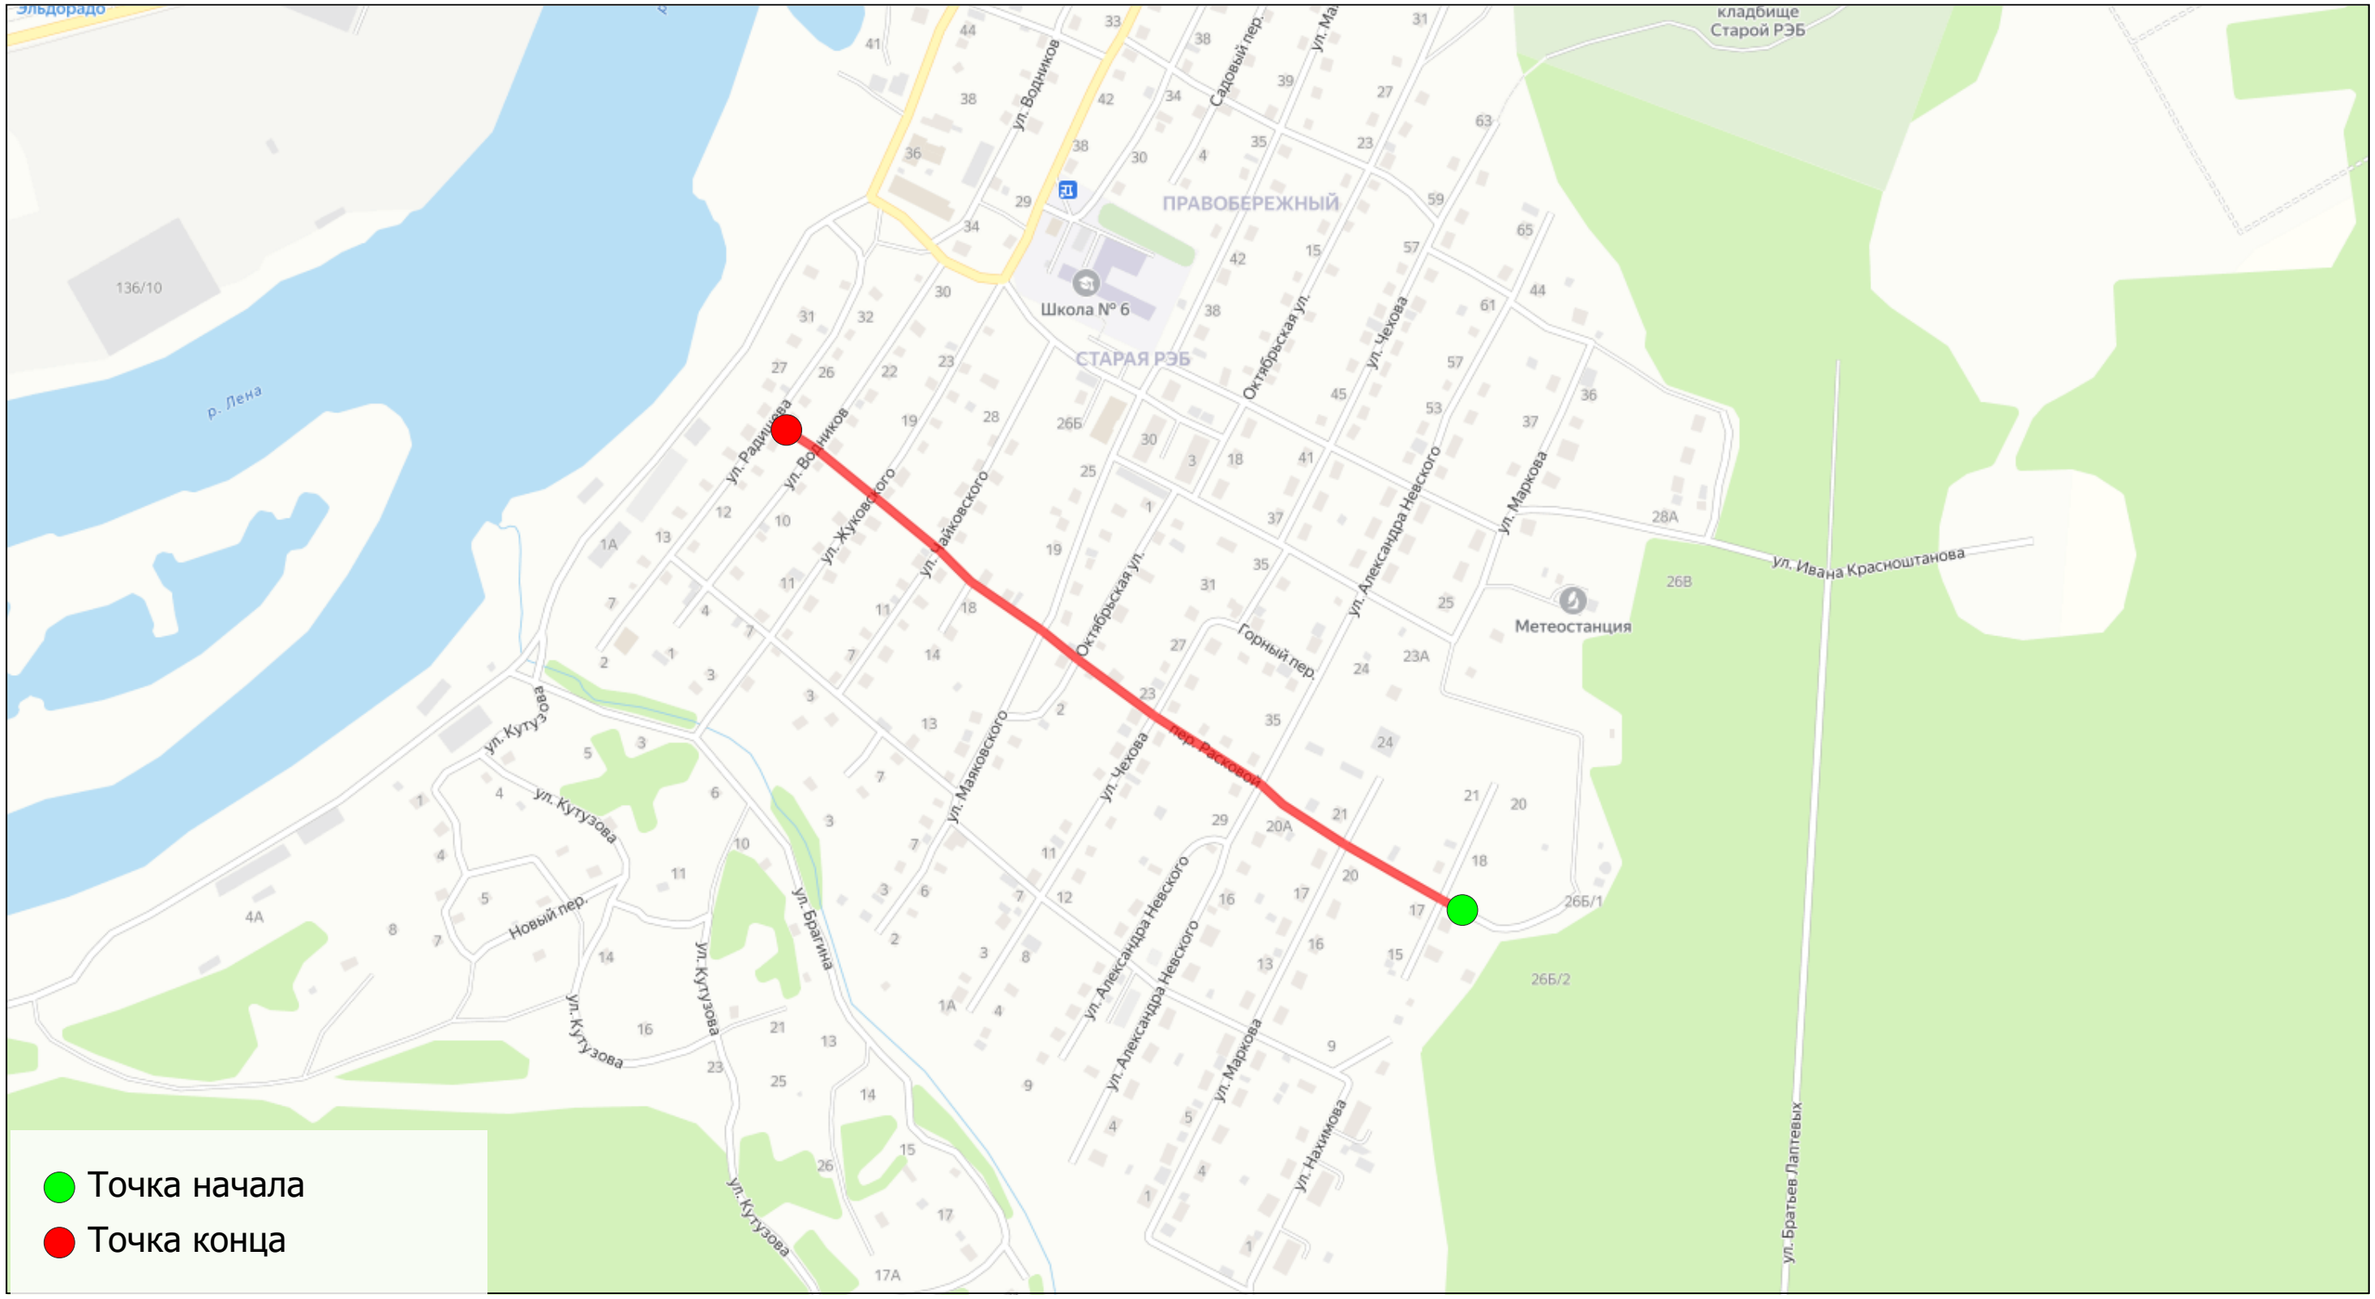

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 139 — R=1736м — 211 — 12 — 231 — 12 — R=6390м — 364 — 34 — 385 — 34 — R=2009м — 491 — 22 — 510 — 21 — R=5821м
Кривые в плане	16 — R=622м P=48; a=7° — 68; 465 — R=699м P=41; a=10° — 497; 529 — R=622м P=71; a=5° — 572; 640 — R=656м P=78; a=5° — 668
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 114 — 4,50 — 200 — 3,50

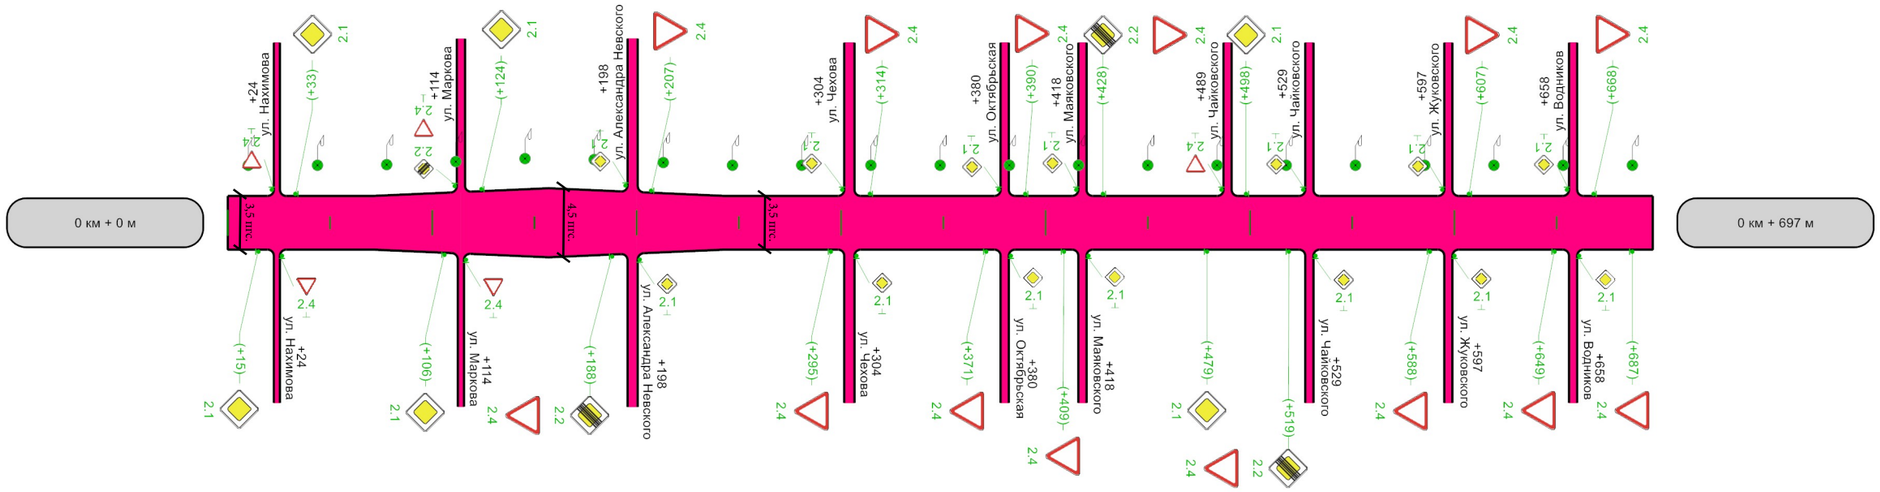

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+033	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+106	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+124	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+479	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+498	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+188	Требуется установить	1	справа
8	2.2	Конец главной дороги			0+428	Требуется установить	1	слева
9	2.2	Конец главной дороги			0+519	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+188	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+207	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+295	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+314	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу			0+371	Требуется установить	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу			0+390	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+409	Требуется установить	1	справа
17	2.4	Уступите дорогу			0+428	Требуется установить	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу			0+519	Требуется установить	1	справа
19	2.4	Уступите дорогу			0+588	Требуется установить	1	справа
20	2.4	Уступите дорогу			0+607	Требуется установить	1	слева
21	2.4	Уступите дорогу			0+649	Требуется установить	1	справа
22	2.4	Уступите дорогу			0+668	Требуется установить	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу			0+687	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**23**	
		Итого:					**23**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**23**	
		Всего:					**23**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+687	Населенный пункт	21/21	677	0	Слева
Итого:				**21/21**	**677**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Озерная, №1 до жилого дома по ул. Озерная, № 9
км 0+000 - км 0+046

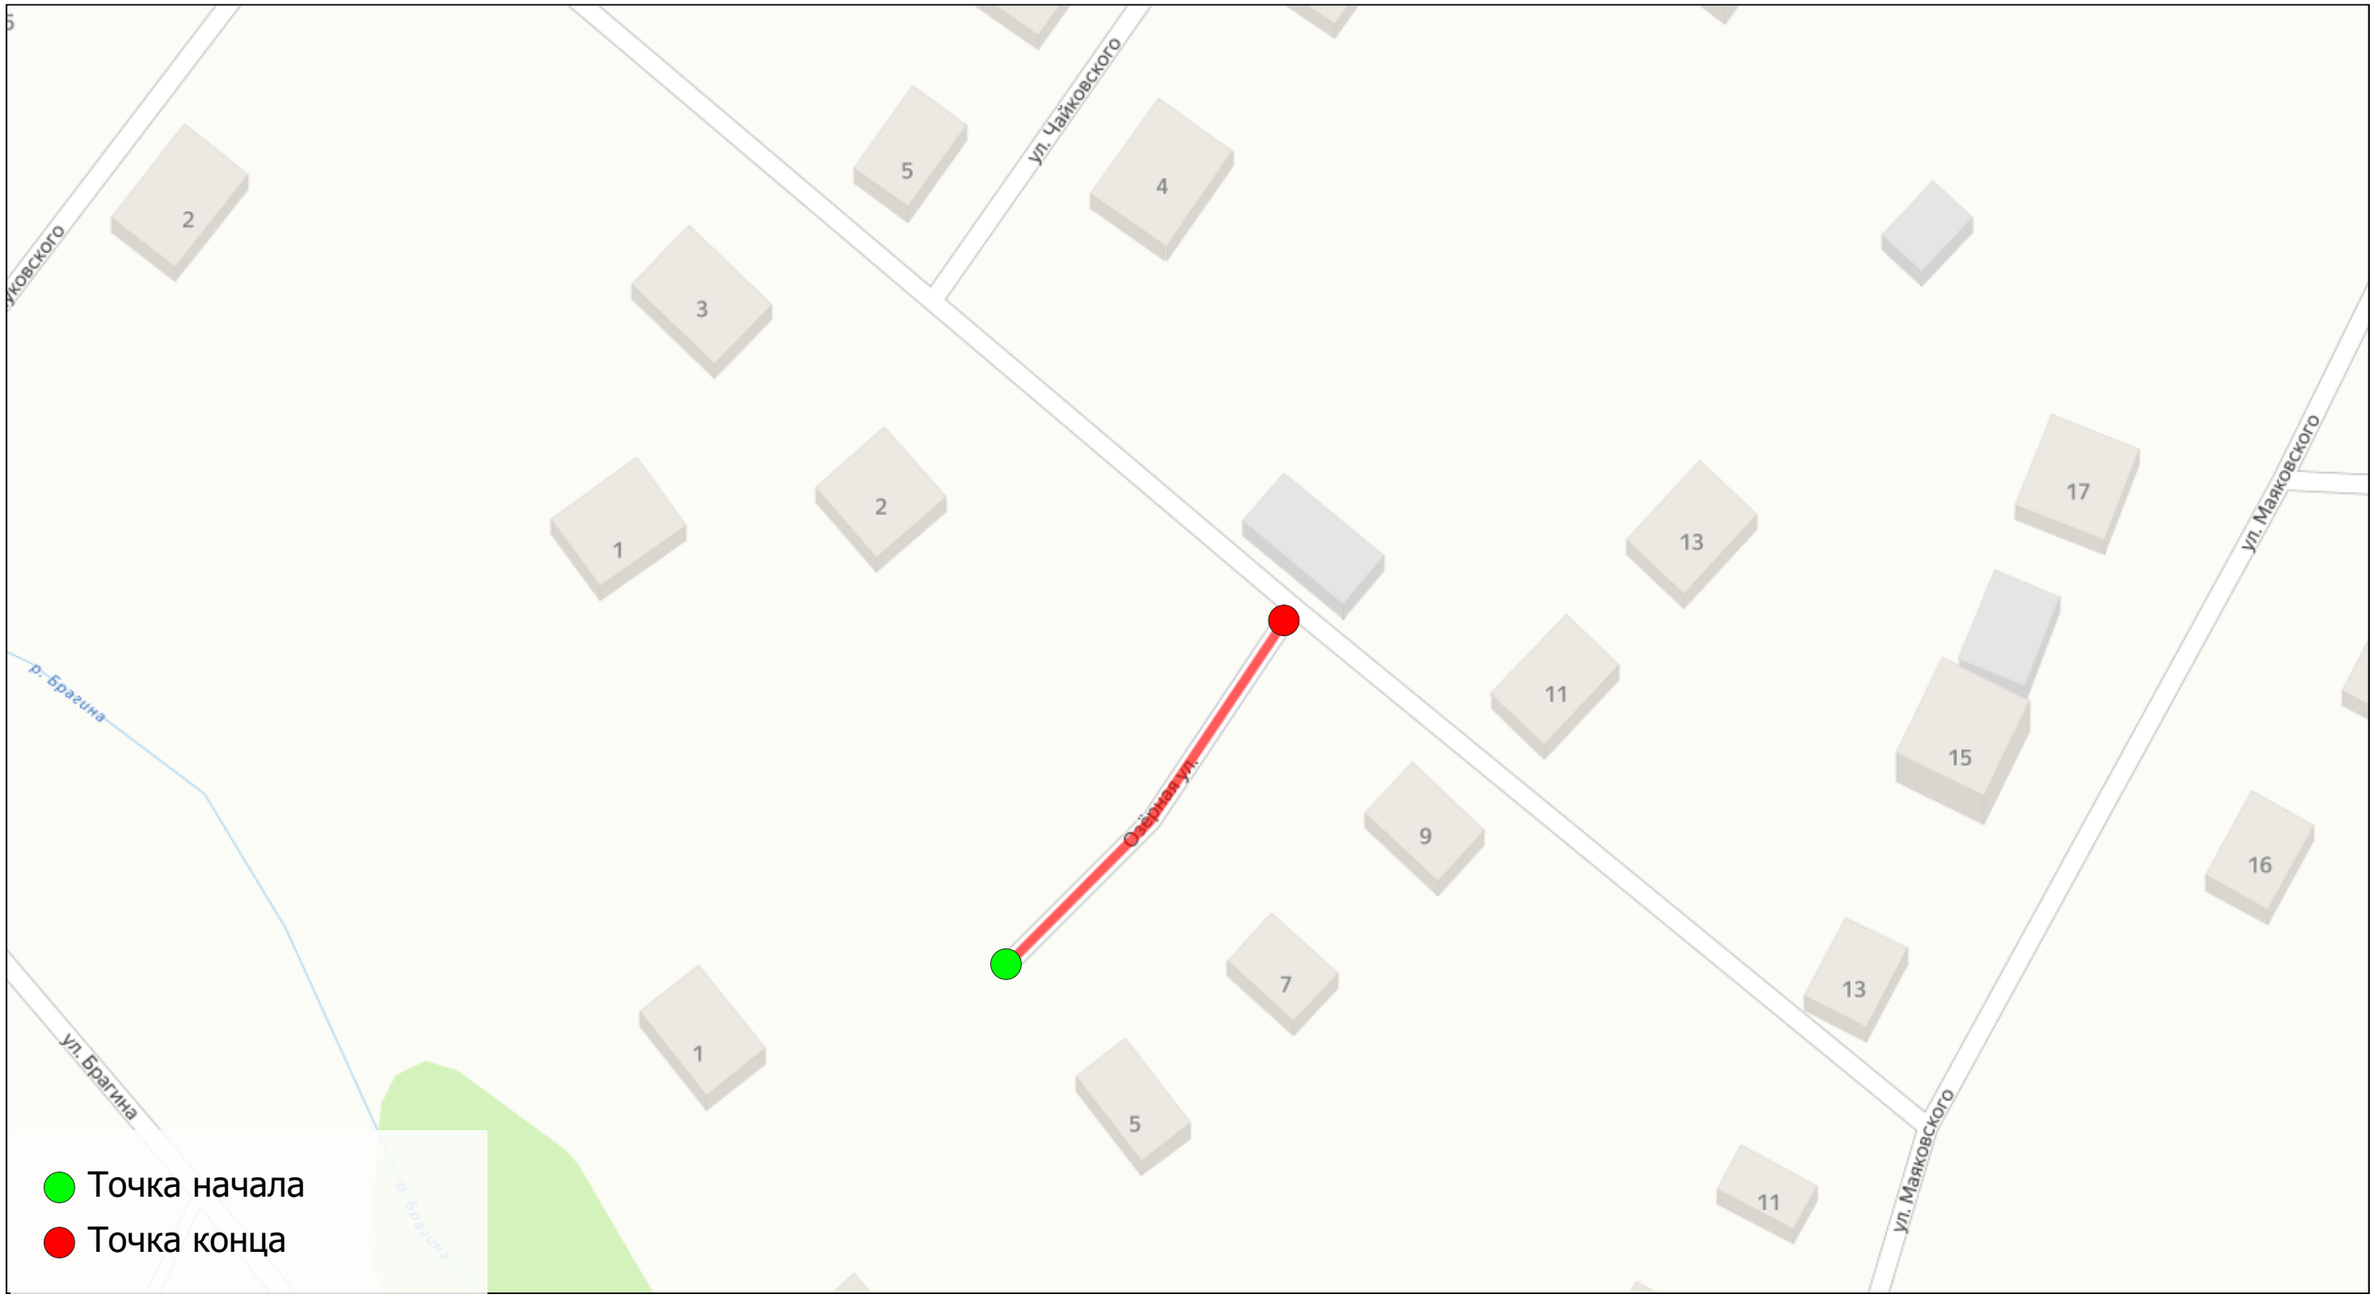

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

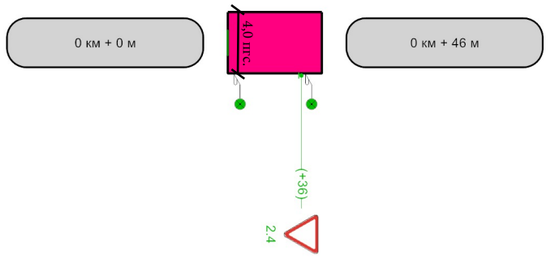

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+036	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+006	0+041	Населенный пункт	2/2	35	0	Справа
Итого:				**2/2**	**35**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Маяковского, д. 53 до территории МОУ СОШ № 6 по ул. Шерстянникова, 3
км 0+000 - км 0+372



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 12 (243) — R=4805м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0: 3,00 | 142: 3,00 | 302: 3,00

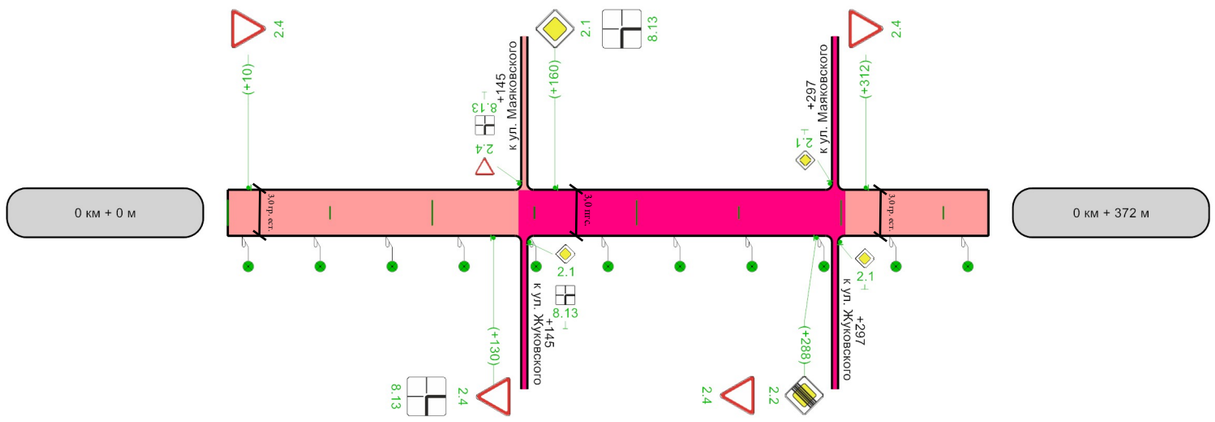

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+160	Требуется установить	1	слева
2	2.2	Конец главной дороги			0+288	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+130	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+288	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+312	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+160	Требуется установить	1	слева
8	8.13	Направление главной дороги			0+130	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+362	Населенный пункт	11/11	352	0	Справа
Итого:				**11/11**	**352**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от земельного участка по ул. Кутузова, 2 до жилого дома по пер. Речников,17а

1-й участок: км 0+000 - км 0+255
2-й участок: км 0+000 - км 0+113



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13 — 12 — 129
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ


Ведомость дорожной

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+250	Населенный пункт	8/8	245	0	Слева
Итого:				**8/8**	**245**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	43
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+110	Населенный пункт	4/4	105	0	Слева
Итого:				**4/4**	**105**	**0**	

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
