394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 5, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога от жилого дома по ул. Космодемьянской, д.1 до земельного участка ул. Космодемьянской, участок № 71	6
5.	Автодорога по ул. Котовского от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до жилого дома по ул. Новая, д.23	12
6.	Автодорога от автодороги областного значения «Усть-Кут – Омолой» до земельного участка по ул. Курорт, уч. №1	17
7.	Автодорога от земельного участка по ул. Курорт, уч.№1 до проходной на въезде в «Санаторий Усть-Кут»	21
8.	Автодорога от жилого дома по ул. Менжинского, д, 34 до жилого дома по ул. Красной Звезды, д. 21	28
9.	Автодорога от жилого дома по ул. Мелиораторов, д.9 до жилого дома по ул. Мелиораторов, д.2	32
10.	Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до территории детского сада по ул. МК-83, №3	35
11.	Автодорога по пер. Милицейский от д. №37 по ул. Набережная до д. №104 по ул. Советская	41
12.	Автодорога от жилого дома по ул. Карбышева, д.4 до жилого дома по ул. Чернышевского, д. 21	45
13.	Автодорога от здания магазина по ул. Кедровая, 19 а до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»	49
14.	Автодорога от жилого дома по ул. Ленская, д.1в до жилого дома по ул. Ленская, д.31	54
15.	Автодорога по ул. Лермонтова от жилого дома по ул. Горького, д. 15 до автодороги по ул. Высоцкого	58
16.	Автодорога от дома №5 по ул. Ломоносова до здания детского сада по ул. Ломоносова, 56	62
17.	Автодорога от жилого дома по ул. Иркутская, д.17 до жилого дома по ул. Звезднинская д.2	66
18.	Автодорога по ул. Зеленая от дома по ул. Су-81, д.1а до жилого дома по ул. Зелёная, 30а	70
19.	Автодорога от жилого дома по ул. Красногвардейская, д. 5 до жилого дома по ул. Красной Звезды, д. 21	73
20.	Автодорога по ул. Крылова: от жилого дома ул. Пушкина, д. 38 б до жилого дома по ул. Горького, д. 29	77
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Куйбышева, д. 1а до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»	81
22.	Автодорога от жилого дома по ул. Кутская, д. 40 до автодороги ул. Благополучная	91
23.	Автодорога от жилого дома по ул. Есенина, д. 8 до жилого дома по ул. Есенина, д. 4	98
24.	Автодорога от жилого дома по ул. Ковпака, д. 5 до магазина по ул. Трудовая, д. 19а	103
25.	Автодорога от жилого дома по ул. Коммунальная, д.3 до автомобильной дороги А-331 "Вилюй"	107
26.	Автодорога от многоквартирного дома по переулку Комсомольский д. 1 до жилого дома по переулку Комсомольский д. 2	111
27.	Автодорога от жилого дома по ул. Дачная, д. 30 до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»	116
28.	Автодорога от жилого дома по ул. Декабристов, д. 3 до жилого дома по ул. Декабристов, д. 21	135
29.	Автодорога от жилого дома по ул. Зеленая Поляна, д.2 до жилого дома по ул. Зеленая Поляна, д.13	139
30.	Автодорога по ул. Майская, от примыкания ул. Солнечная до пер. Сиреневый	143
31.	Автодорога от жилого дома по ул. Постышева, д. 6 до жилого дома по ул. Каландарашвили, д. 12	146
32.	Автодорога по пер. Каменный от жилого дома по ул. Хабарова, д. 12 до жилого дома по пер. Каменный, д.2	150
33.	Автодорога от здания магазина по ул. Гайдара, 2 до жилого дома по ул. Гайдара, д.10	155
34.	Обосновывающая часть ПОДД	159

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги


Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Космодемьянской, д.1 до земельного участка ул. Космодемьянской, участок № 71


1-й участок: км 0+000 - км 0+190
2-й участок: км 0+000 - км 1+314

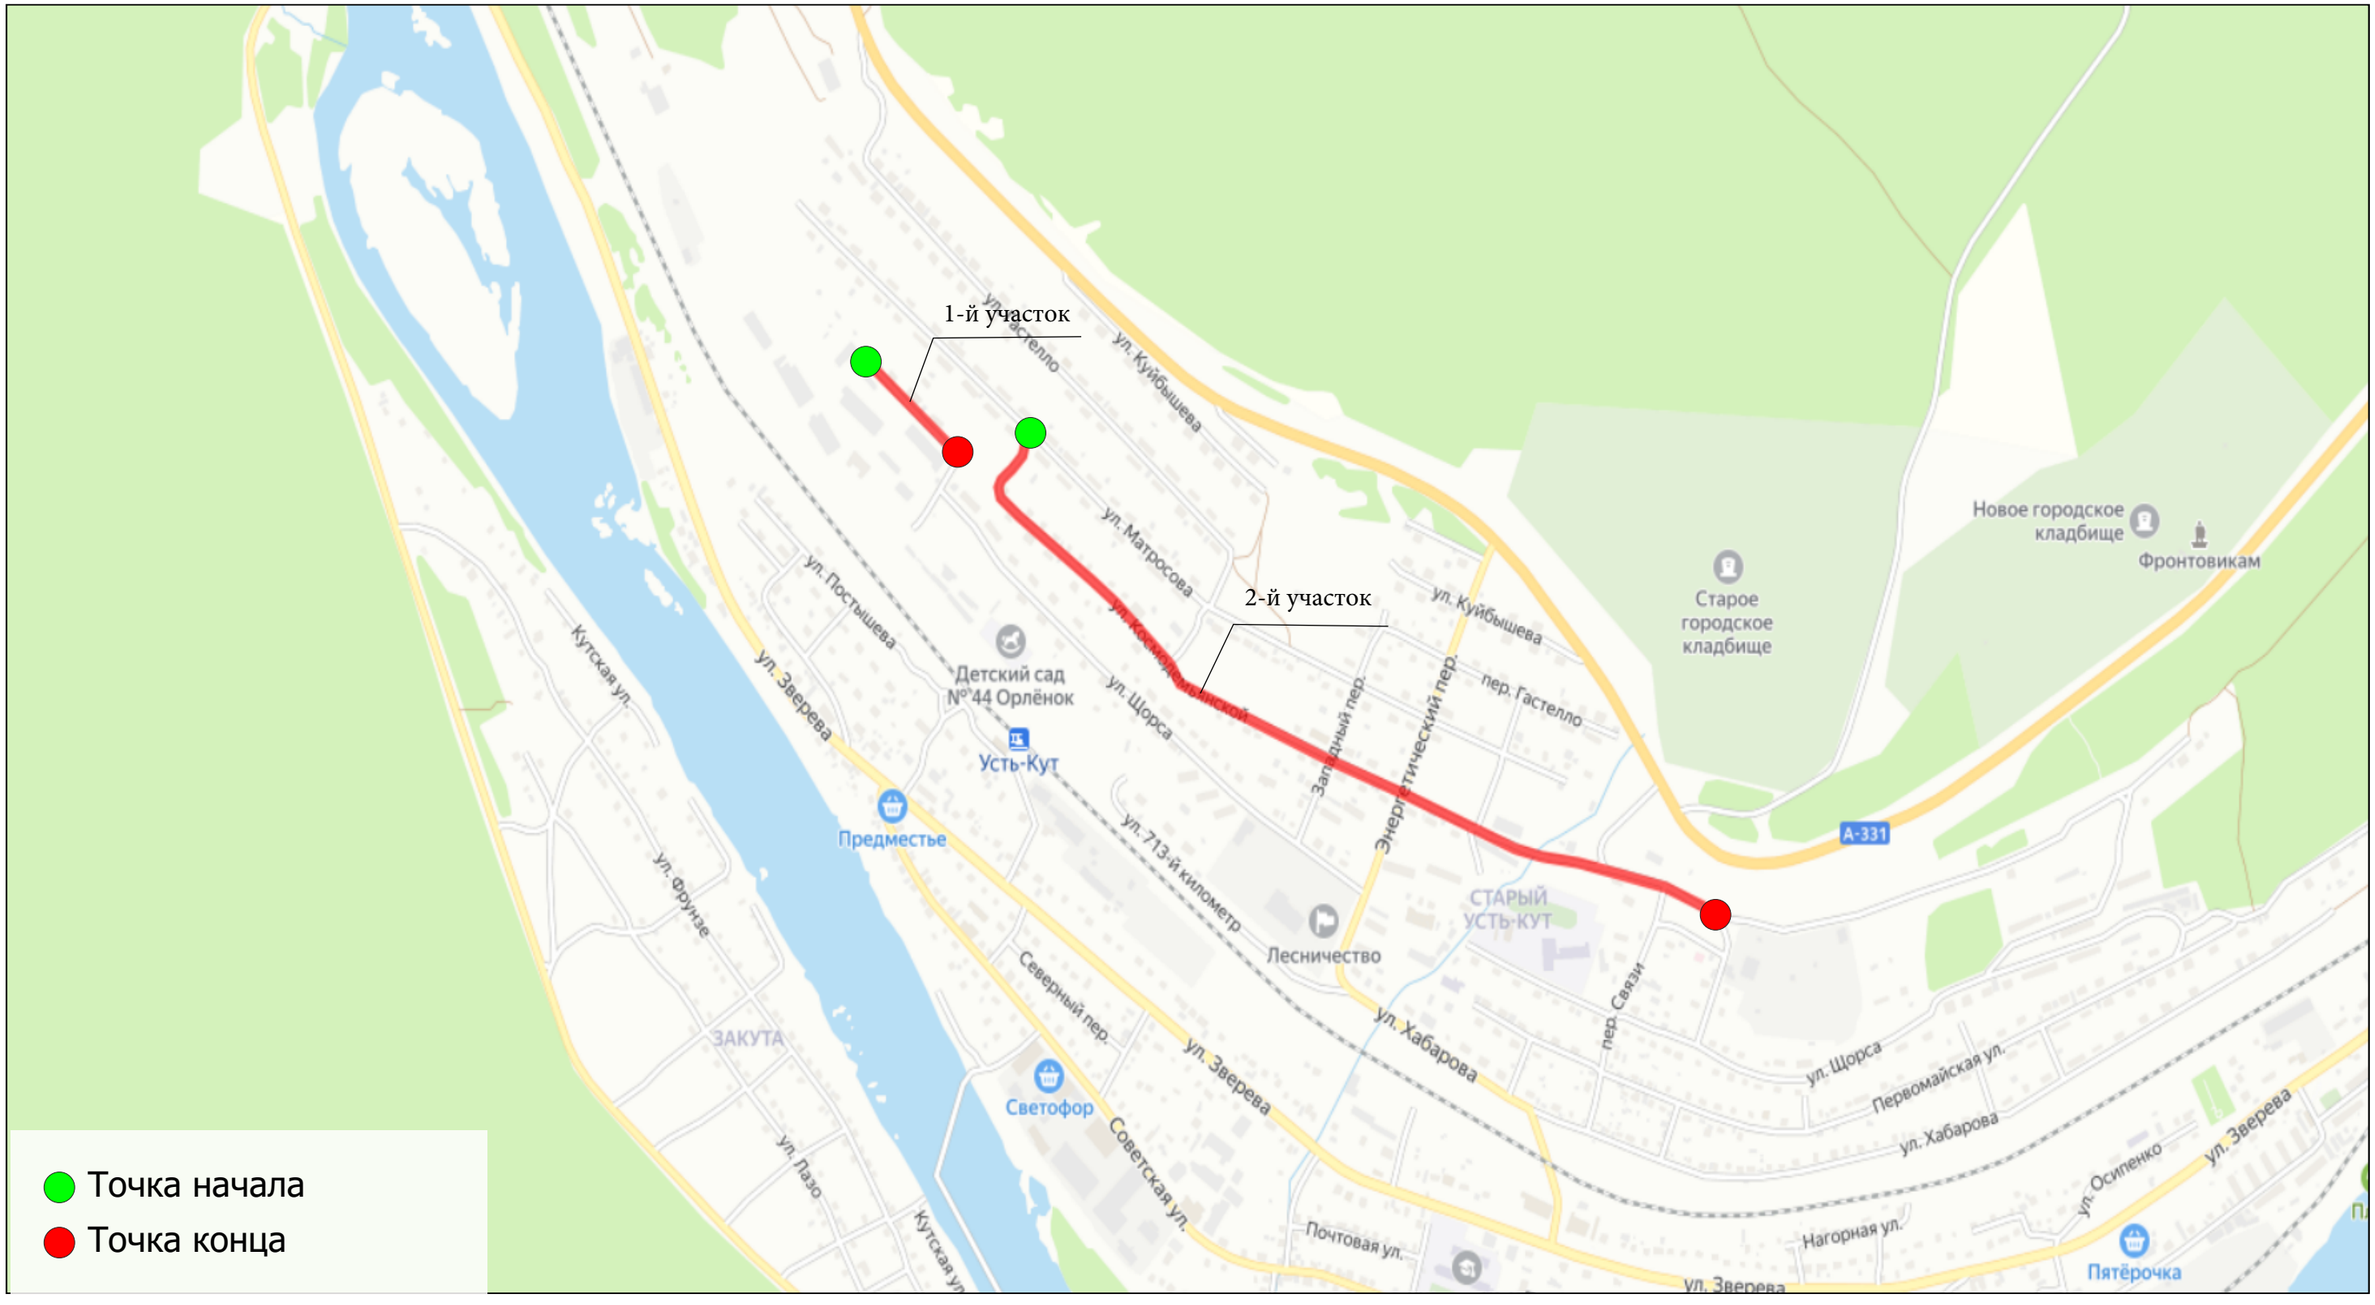

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Космодемьянской, д.1 до земельного участка ул. Космодемьянской, № 71 , 1-й участок

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	24 22 6 R=3506м
Кривые в плане	R=329м 153 P=30, a=6° 15
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 190
Характеристики проезжей части	0 4,00 80 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+010	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
2	0+060	0+155	Жилая застройка	3/3	0	95	Слева
3	0+060	0+155	Жилая застройка	3/3	95	0	Слева
Итого:				**7/7**	**95**	**95**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+190	Жилая застройка	Слева	190	
Итого:					**190**	**0**

М 1:3000

Автодорога общего пользования от жилого дома по ул. Космодемьянской, д.1 до земельного участка ул. Космодемьянской, участок № 71, 2-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	142 — 146 — 25 — R=805м — 141 — 12 — 161 — 11 — R=1849м — 227 — 28 — 246 — 27 — R=3786м — 345 — 2 — 437 — 12 — R=2357м — 544 — 37 — 566 — 36 — R=2683м — 646 — 4 — 669 — 6 — R=4128м — 737 — 24 — 814 — 29 — R=2492м — 896 — 6 — 916 — 6 — R=1713м
Кривые в плане	2 — R=37м P=0, a=64° — 41 — 84 — R=35м P=0; a=103° — 143 — 454 — R=116м P=2; a=33° — 516
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 650 - 1000
Характеристики проезжей части	0 — 3,80 — 344 — 4,30 — 462 — 4,00 — 4,00 — 704 — 5,80 — 934 — 5,00

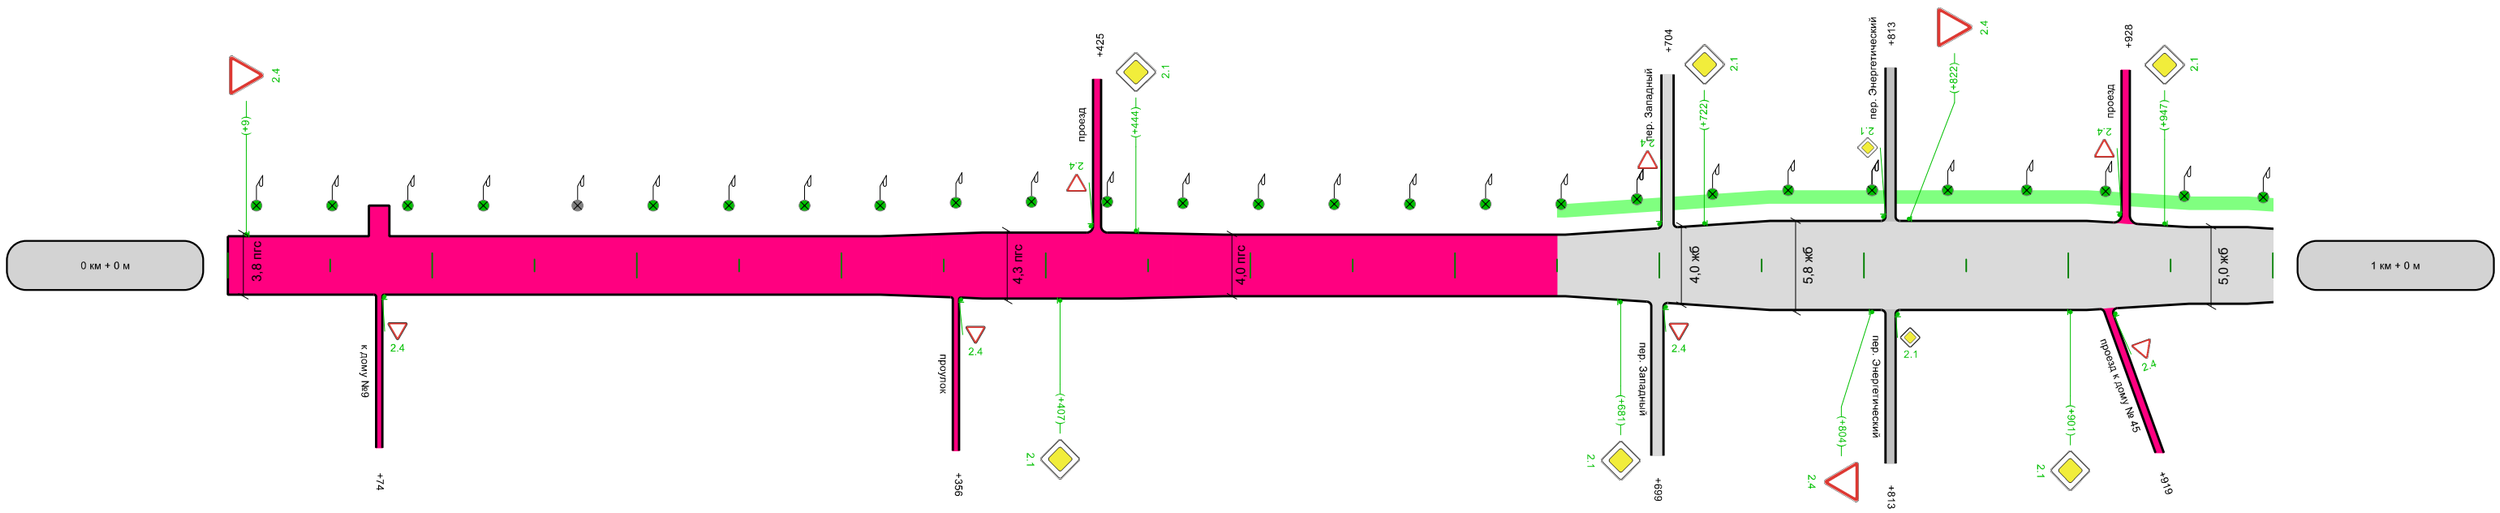

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 R=1713м 87 63 87 86 R=3014м 31 240
Кривые в плане	154 R=331м P=9; a=21° 282
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 5‡
Характеристики проезжей части	5,00 | 4,00 | 5‡ | 4,20

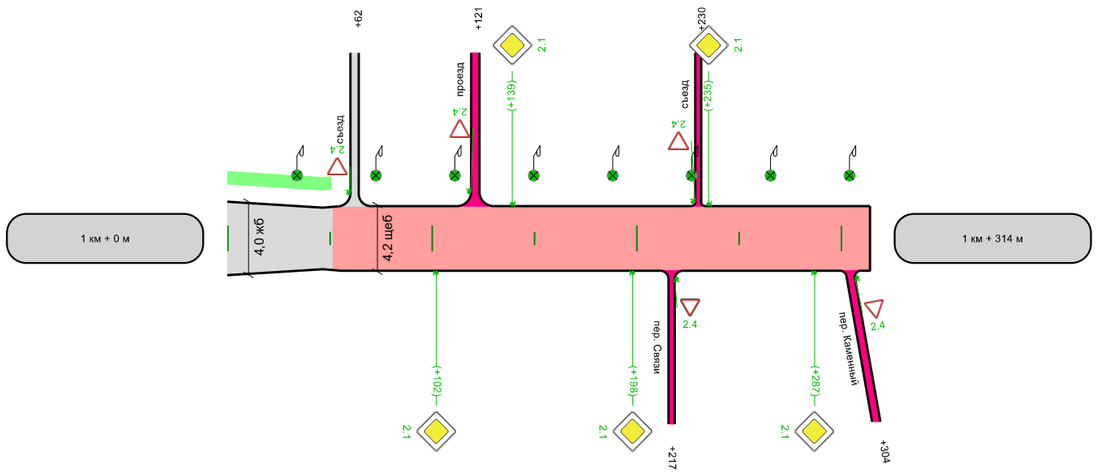

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+407	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+444	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+681	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+722	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+901	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+947	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			1+102	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			1+139	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			1+198	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			1+235	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			1+287	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+804	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу			0+822	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+014	0+125	Жилая застройка	4/4	111	0	Слева
2	0+171	0+171	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
3	0+208	0+652	Жилая застройка	13/13	444	0	Слева
4	0+689	0+804	Жилая застройка	2/2	0	115	Слева
5	0+689	0+804	Жилая застройка	2/2	115	0	Слева
6	0+726	0+763	Жилая застройка	2/2	37	0	Слева
7	0+841	1+304	Жилая застройка	13/13	463	0	Слева
Итого:				**37/37**	**1170**	**115**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+650	1+051	Жилая застройка	Слева	401	
Итого:					**401**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Котовского от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до жилого дома по ул. Новая, д.23

км 0+000 - км 1+276

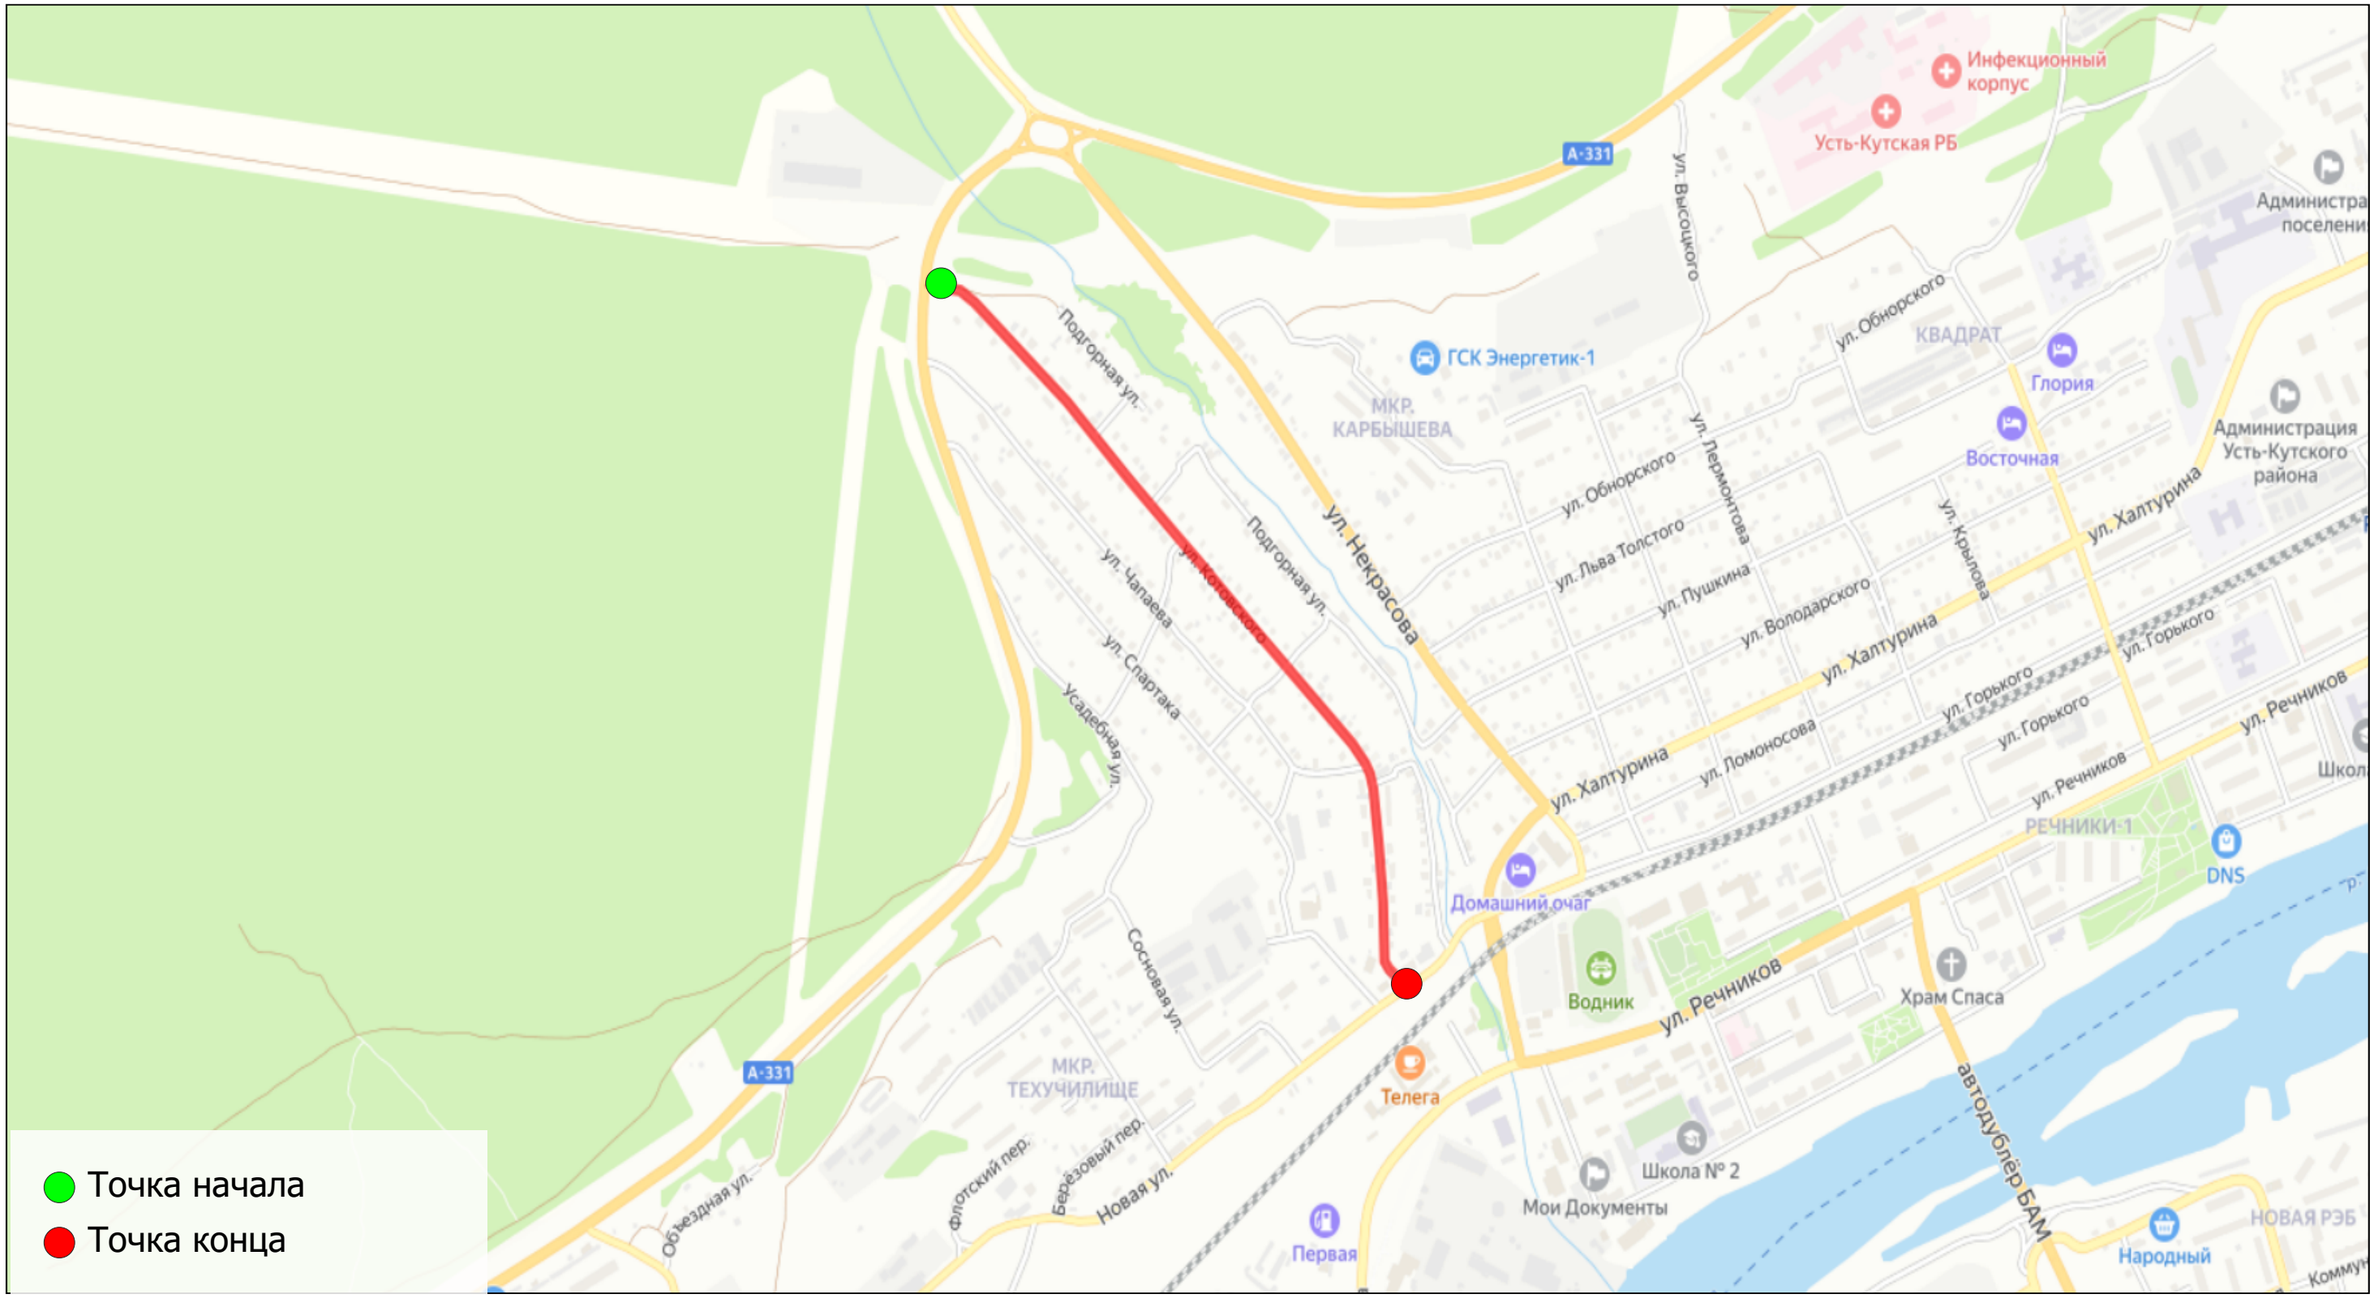


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	56 5 60 R=4752м 100 40 166 45 R=3780м 252 22 280 22 R=2243м 383 68 481 62 R=4896м 557 77 718 71 R=4608м 793 55 855 65 R=2859м 923 41 947 41 R=2701м
Кривые в плане	2 R=37м P=0; a=62° 58 258 R=86м P=2; a=25° 338 464 R=337м P=32; a=6° 500
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,80 516 4,50 648 3,40

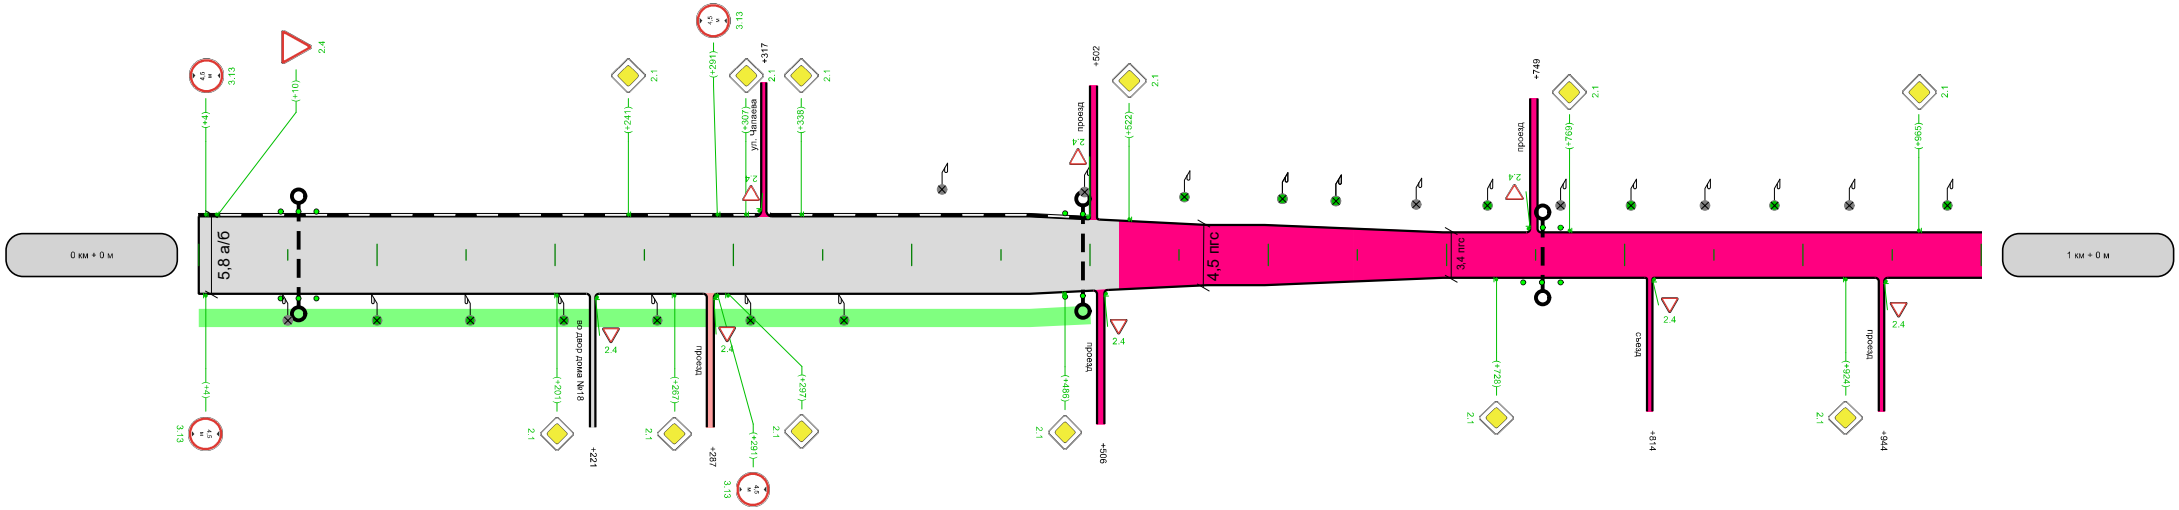

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 500

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	62
Кривые в плане	31 R=294м 61 P=29, a=6°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,40

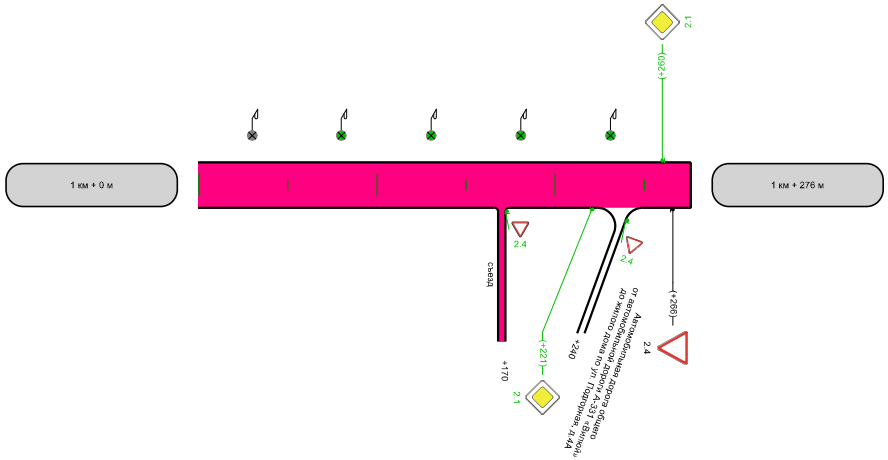

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+201	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+241	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+267	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+297	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+307	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+338	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+486	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+522	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+728	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+769	Требуется установить	1	слева
11	2.1	Главная дорога			0+924	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+965	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			1+221	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1+260	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			1+266	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**16**	
		Запрещающие знаки						
17	3.13	Ограничение высоты			0+004	Требуется установить	1	слева
18	3.13	Ограничение высоты			0+004	Требуется установить	1	справа
19	3.13	Ограничение высоты			0+291	Требуется установить	1	слева
20	3.13	Ограничение высоты			0+291	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**19**	
		Всего:					**20**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+046	0+066	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+046	0+066	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	0+486	0+496	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+486	0+496	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+743	0+764	21/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+754	0+764	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**91/15**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+050	0+050	Жилая застройка	1/1	0	0	Справа
2	0+100	0+362	Жилая застройка	6/6	262	0	Справа
3	0+417	0+497	Жилая застройка	2/2	0	80	Слева
4	0+553	0+553	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
5	0+608	0+638	Жилая застройка	2/2	0	30	Слева
6	0+608	0+638	Жилая застройка	2/2	30	0	Слева
7	0+683	0+926	Жилая застройка	4/4	0	243	Слева
8	0+723	0+884	Жилая застройка	3/3	161	0	Слева
9	0+981	0+981	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
10	1+030	1+030	Жилая застройка	1/1	0	0	Слева
11	1+080	1+231	Жилая застройка	4/4	151	0	Слева
Итого:				**27/27**	**604**	**353**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+500	Жилая застройка	Справа	500	
Итого:					**500**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автодороги областного значения «Усть-Кут – Омолой» до земельного участка по ул. Курорт, уч. №1
км 0+000 - км 0+328



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 15 R=8822м 159 7 225 8 R=7320м
Кривые в плане	204 R=529м P=24; a=13° 320
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 6,00

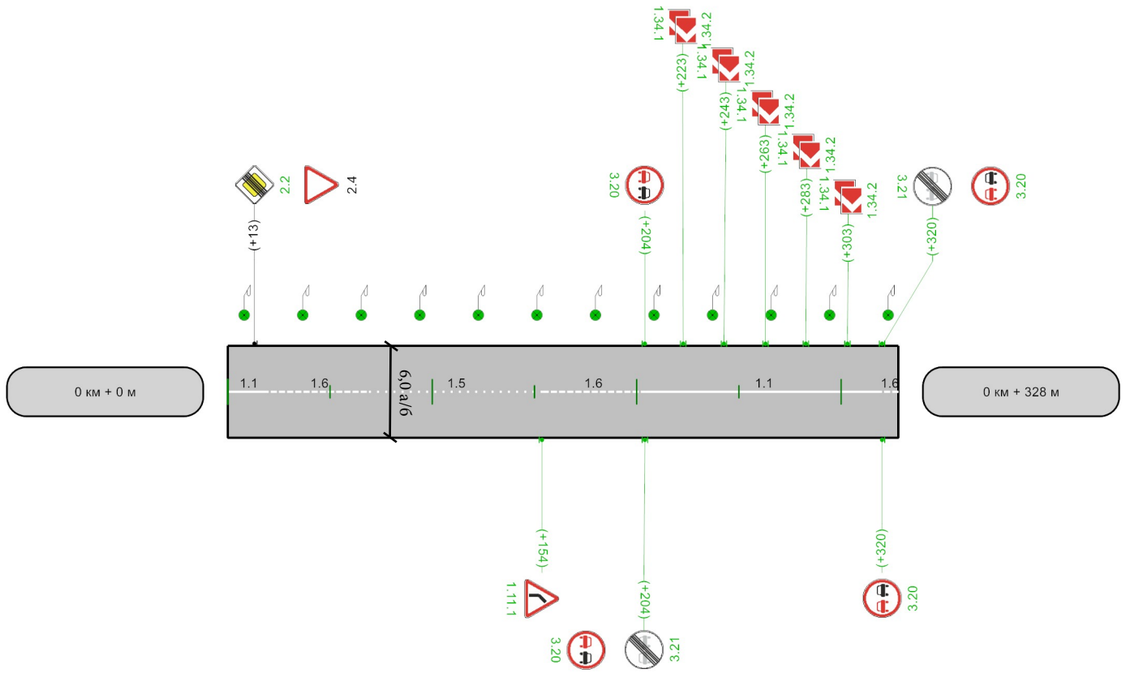

	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 70	1.5 70 - 154	1.6 154 - 204	1.1 204 - 320
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	136,000	84,000	108,000	**23,800**
ИТОГО	**136,000**	**84,000**	**108,000**	**23,800**
ЛИН.КМ	**0,136**	**0,084**	**0,108**	
ПРИВЕД.КМ	**0,136**	**0,021**	**0,081**	
ПЛОЩАДЬ	**13,600**	**2,100**	**8,100**	**23,800**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+154	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+223	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+243	Требуется установить	1	слева
4	1.34.1	Направление поворота			0+263	Требуется установить	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота			0+283	Требуется установить	1	слева
6	1.34.1	Направление поворота			0+303	Требуется установить	1	слева
8	1.34.2	Направление поворота			0+223	Требуется установить	1	слева
9	1.34.2	Направление поворота			0+243	Требуется установить	1	слева
10	1.34.2	Направление поворота			0+263	Требуется установить	1	слева
11	1.34.2	Направление поворота			0+283	Требуется установить	1	слева
12	1.34.2	Направление поворота			0+303	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Знаки приоритета						
14	2.2	Конец главной дороги			0+013	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+013	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
16	3.20	Обгон запрещен			0+204	Требуется установить	1	слева
17	3.20	Обгон запрещен			0+204	Требуется установить	1	справа
18	3.20	Обгон запрещен			0+320	Требуется установить	1	слева
19	3.20	Обгон запрещен			0+320	Требуется установить	1	справа
20	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+204	Требуется установить	1	справа
21	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+320	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**18**	
		Всего:					**19**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+325	Населенный пункт	10/10	315	0	Слева
Итого:				**10/10**	**315**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от земельного участка по ул. Курорт, уч.№1 до проходной на въезде в «Санаторий Усть-Кут»

км 0+000 - км 1+228

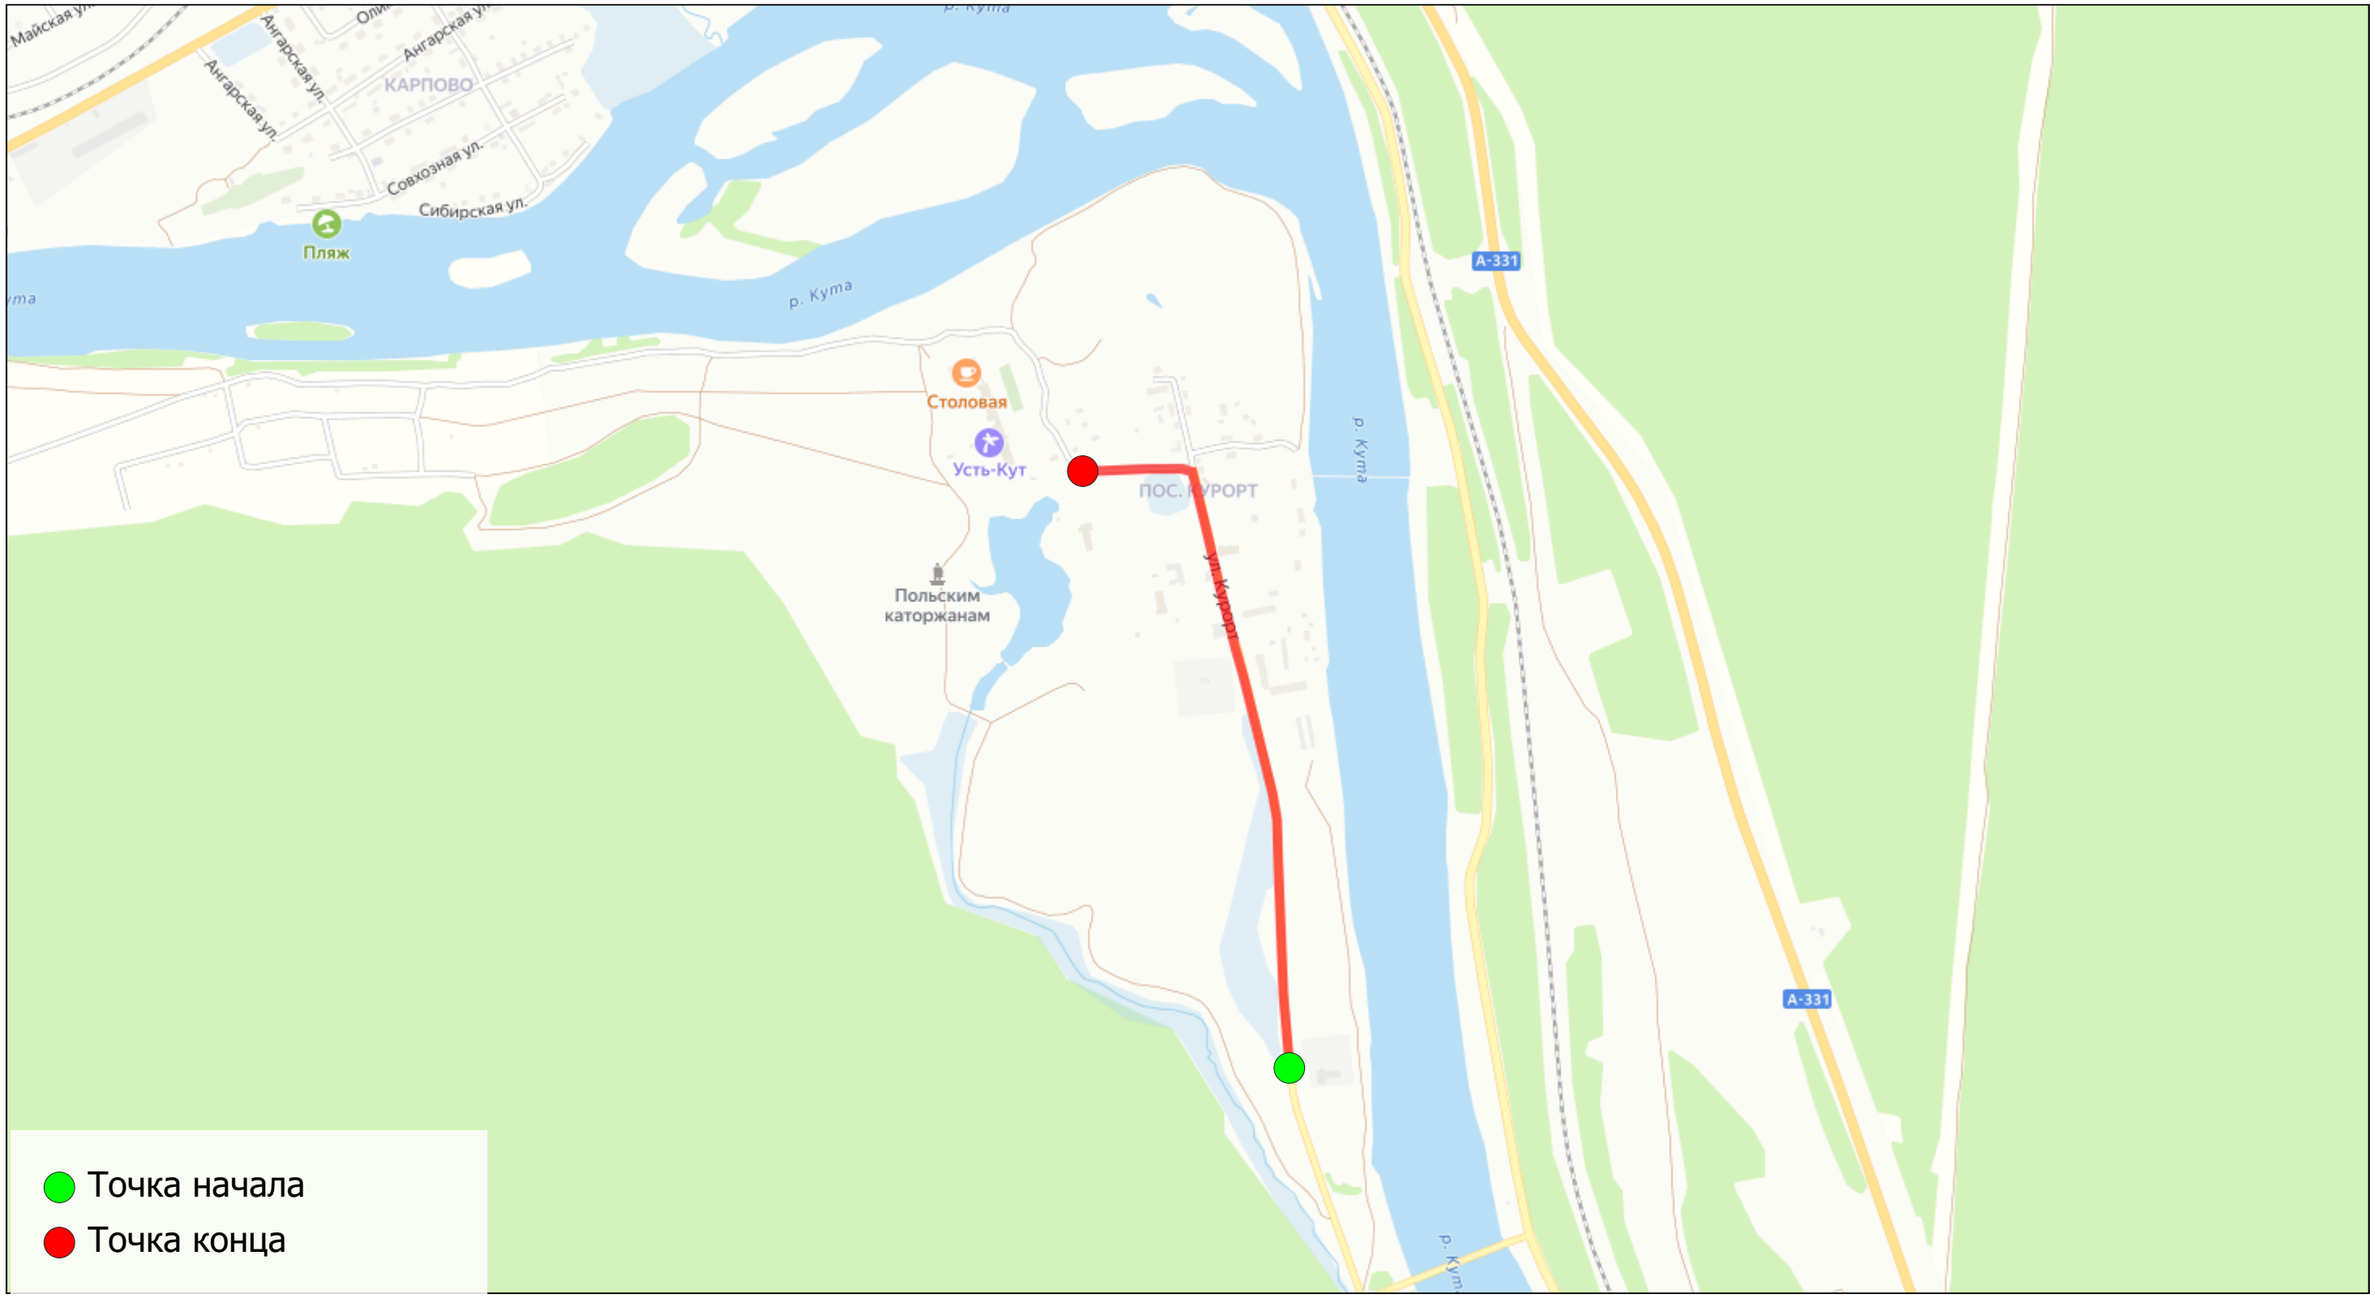

М 1:3000


1-ая от осевой	717 717 728
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	11 — 0 (461) — R=14956м — 15 (708) — 15 (736) — R=8970м — 10 (975)
Кривые в плане	378 — R=571м, P=29; a=11° — 496
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 6,00

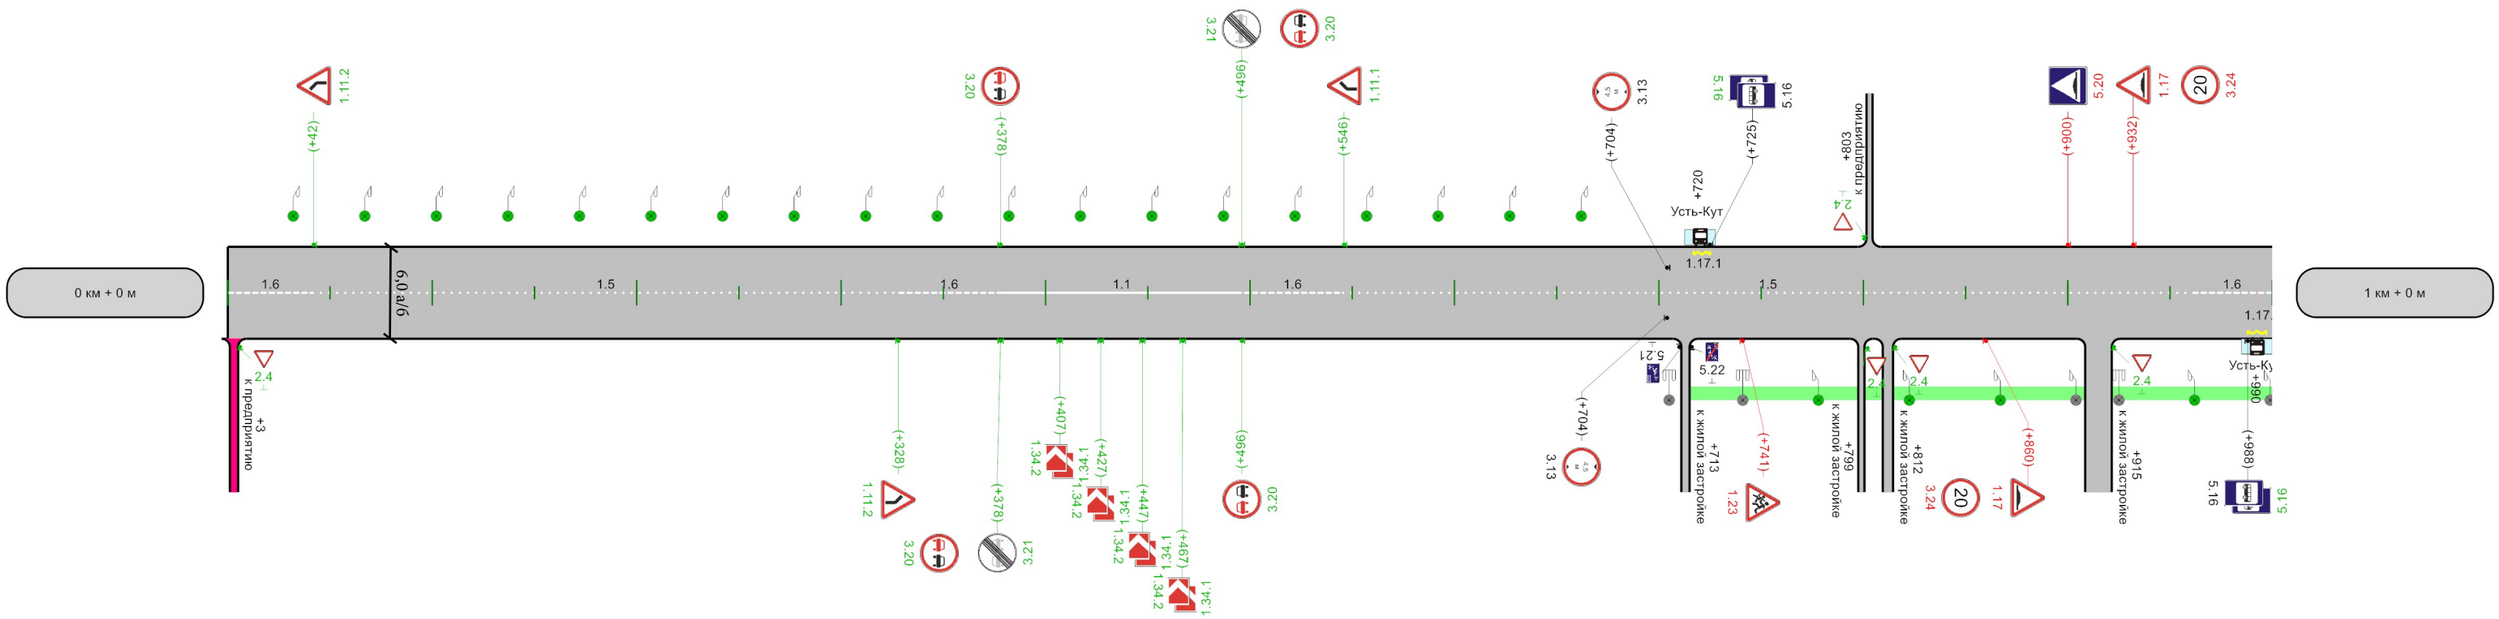

осевая	1.6 0 - 42	1.5 42 - 328	1.6 328 - 378	1.1 378 - 496	1.6 496 - 546	1.5 546 - 961	1.6 961 - 1000
1-ая от осевой							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа							
Тротуары справа						н/д: ширина 1м, а/б, 715 - 798	н/д: ширина 1м, а/б, 815 - 908	н/д: ширина 1м, а/б, 922 - 1000

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 10 9 R=9198м 12 223
Кривые в плане	20 R=37м P=0; a=74° 65
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

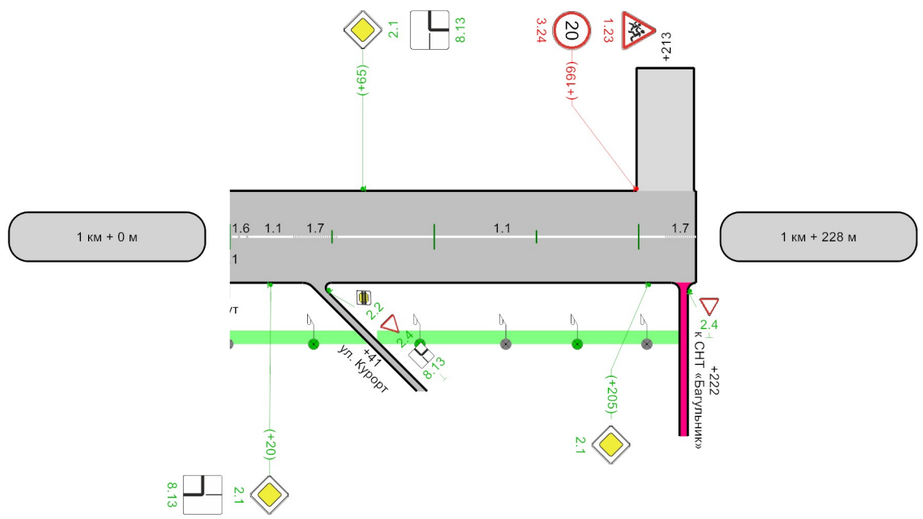

	осевая	1.6 0 - 11	1.1 11 - 31	1.7 31 - 53	1.1 53 - 213	1.7 213 - 228
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
	Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 67			н/д: ширина 1м, а/б, 72 - 220	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.17.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.250	0.750	0.000	1.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	132,000	669,000	180,000	0,000	16,000	**46,485**
1 - 2	152,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**15,200**
ИТОГО	**284,000**	**669,000**	**180,000**	**0,000**	**16,000**	**61,685**
ЛИН.КМ	**0,284**	**0,669**	**0,180**	**0,000**	**0,016**	
ПРИВЕД.КМ	**0,284**	**0,167**	**0,135**	**0,000**	**0,031**	
ПЛОЩАДЬ	**28,400**	**16,725**	**13,500**	**0,000**	**3,060**	**61,685**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+522	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+040	Требуется установить	1	слева
3	1.11.2	Опасный поворот			0+310	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+818	Демонтировать	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность			0+886	Демонтировать	1	слева
6	1.23	Дети			0+705	Демонтировать	1	справа
7	1.23	Дети			1+140	Демонтировать	1	слева
8	1.34.1	Направление поворота			0+386	Требуется установить	1	справа
9	1.34.1	Направление поворота			0+406	Требуется установить	1	справа
10	1.34.1	Направление поворота			0+426	Требуется установить	1	справа
11	1.34.1	Направление поворота			0+446	Требуется установить	1	справа
12	1.34.2	Направление поворота			0+386	Требуется установить	1	справа
13	1.34.2	Направление поворота			0+406	Требуется установить	1	справа
14	1.34.2	Направление поворота			0+426	Требуется установить	1	справа
15	1.34.2	Направление поворота			0+446	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**11**	
		Знаки приоритета						
16	2.1	Главная дорога			0+970	Требуется установить	1	справа
17	2.1	Главная дорога			1+013	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			1+146	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3.13	Ограничение высоты			0+670	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
20	3.13	Ограничение высоты			0+670	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
21	3.20	Обгон запрещен			0+360	Требуется установить	1	слева
22	3.20	Обгон запрещен			0+360	Требуется установить	1	справа
23	3.20	Обгон запрещен			0+472	Требуется установить	1	слева
24	3.20	Обгон запрещен			0+472	Требуется установить	1	справа
25	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+360	Требуется установить	1	справа
26	3.21	Конец зоны запрещения обгона			0+472	Требуется установить	1	слева
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+818	Демонтировать	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+886	Демонтировать	1	слева
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+140	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**8**	
		Знаки особых предписаний						
30	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+690	Установлено	1	слева
31	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+690	Требуется установить	1	слева
32	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+940	Установлено	1	справа
33	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+940	Требуется установить	1	справа
34	5.20	Искусственная неровность			0+856	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
35	8.13	Направление главной дороги			1+013	Требуется установить	1	слева
36	8.13	Направление главной дороги			0+970	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**8**	
		Всего требуется установить:					**24**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					28	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+636	Населенный пункт	18/18	606	0	Слева
2	0+671	0+705	Населенный пункт	2/2	0	34	Справа
3	0+740	0+825	Населенный пункт	3/3	85	0	Справа
4	0+860	0+860	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+880	0+880	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
6	0+915	0+915	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
7	0+950	0+950	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
8	0+990	1+040	Населенный пункт	2/2	50	0	Справа
9	1+080	1+080	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
10	1+113	1+113	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
11	1+145	1+145	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				32/32	741	34	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+685	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
2	0+942	Справа	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)


№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+680	0+759	Жилая застройка	Справа	79	
2	0+762	0+770	Жилая застройка	Справа	8	
3	0+775	0+864	Жилая застройка	Справа	89	
4	0+877	1+015	Жилая застройка	Справа	138	
5	1+020	1+160	Жилая застройка	Справа	140	
Итого:					454	0

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+853	3,00	6,00	0,07	1,26	Требуется демонтаж


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Менжинского, д, 34 до жилого дома по ул. Красной Звезды, д. 21
км 0+000 - км 0+529

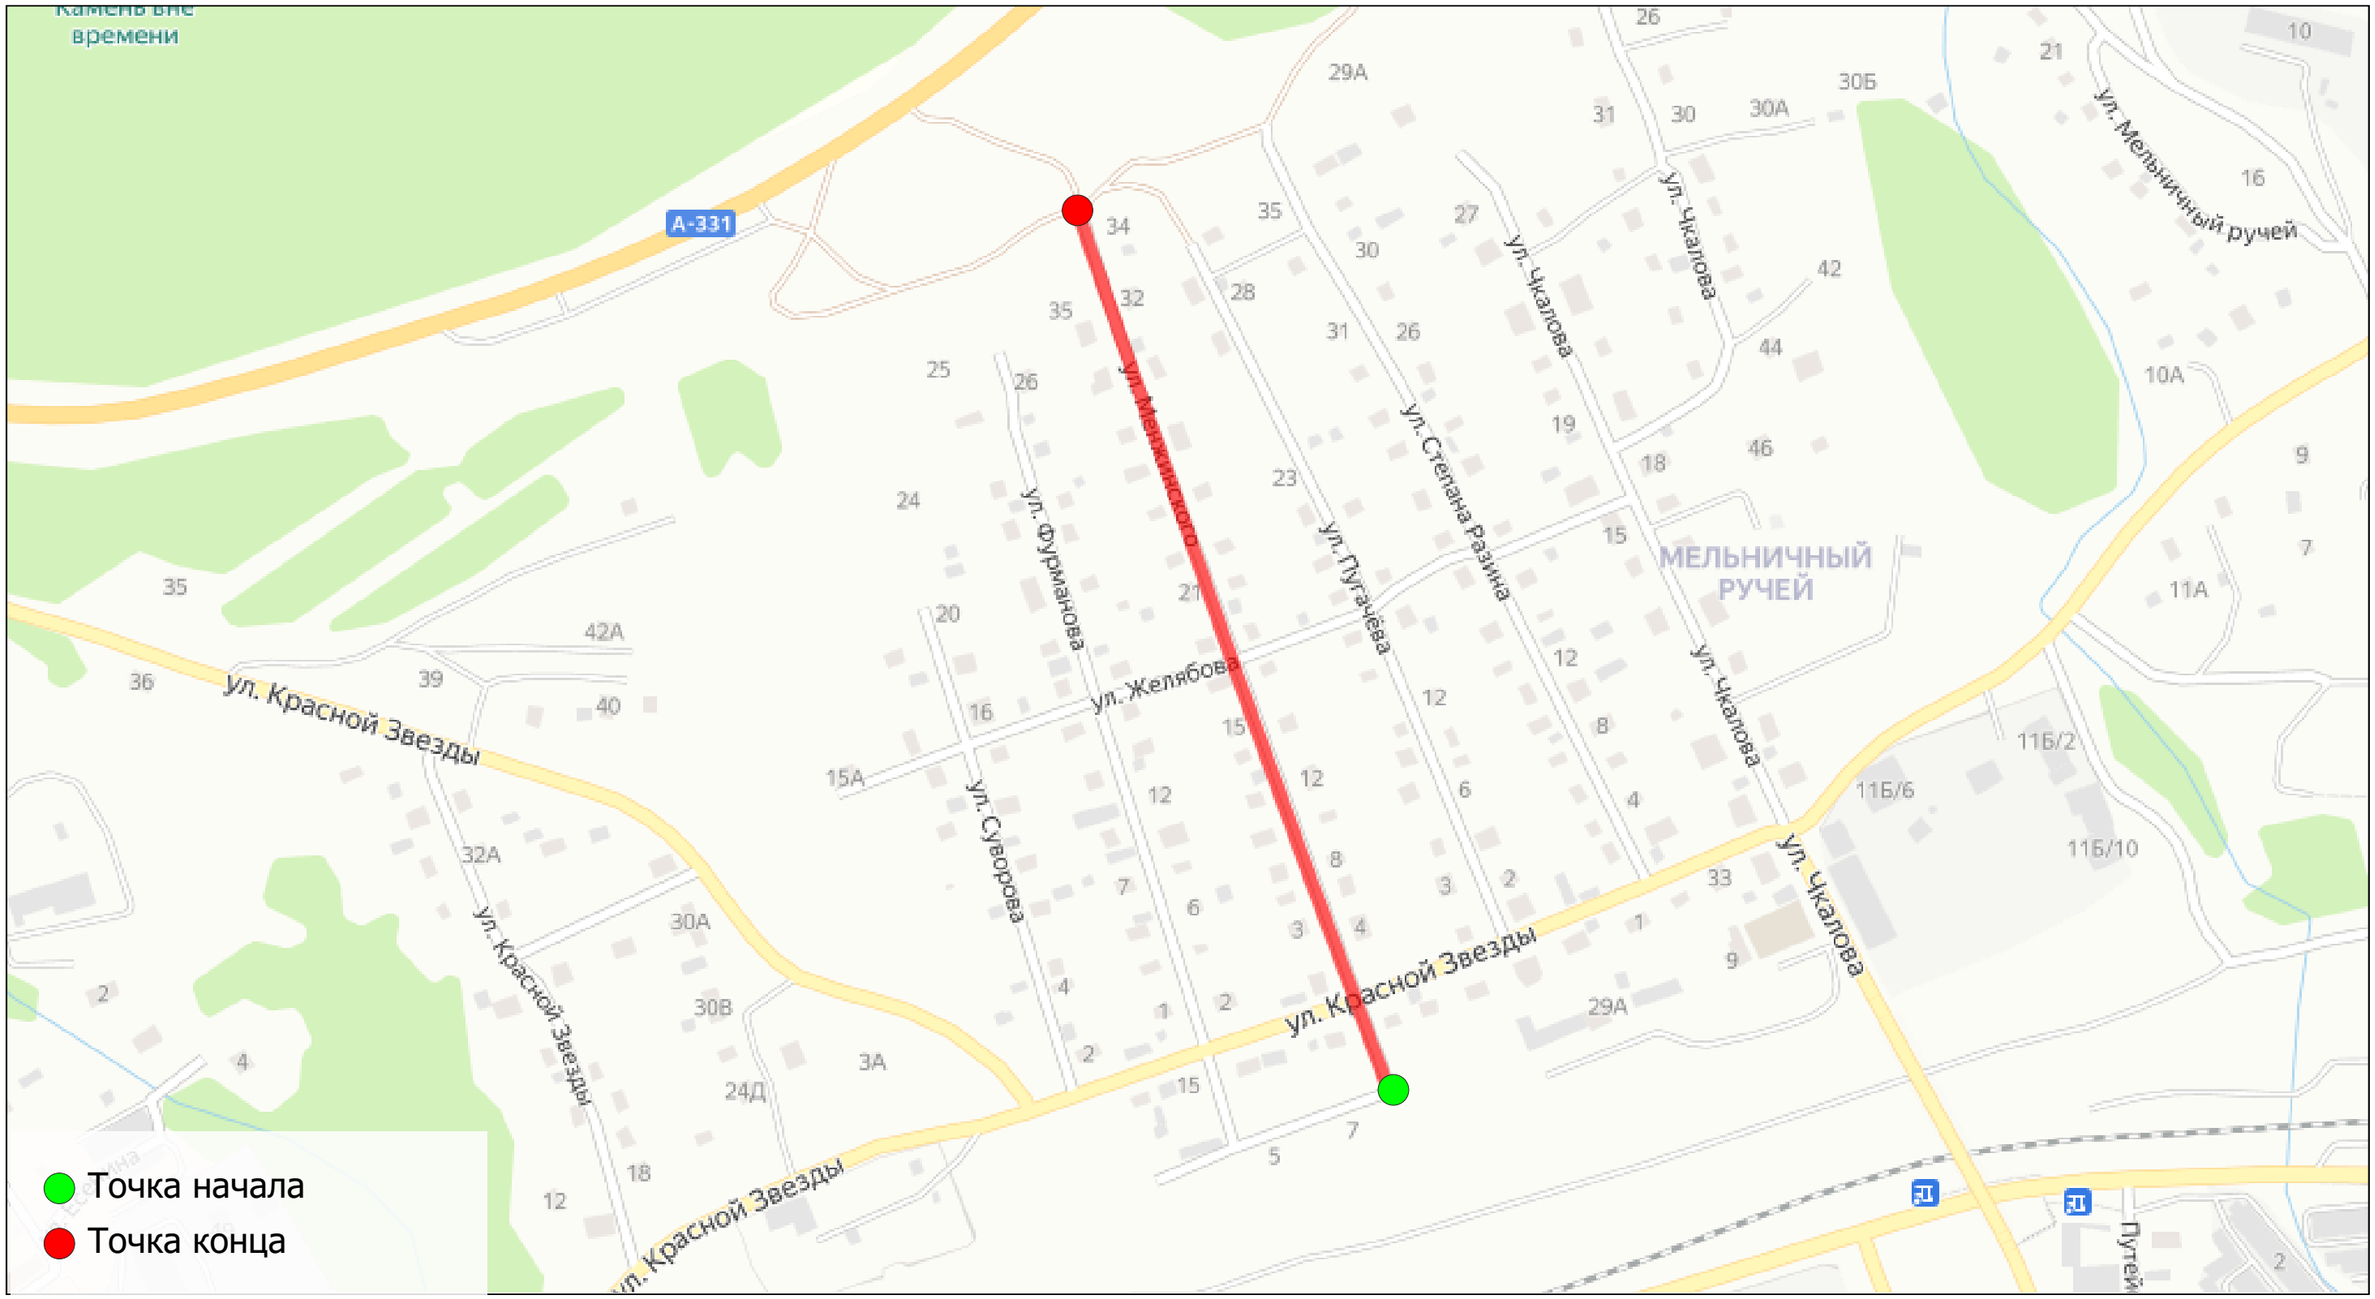

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	111 12 107 R=2078м 102 155 122 154 R=3279м 267 105
Кривые в плане	75 R=200 90 R=201м 40 P=12, a=9 32
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

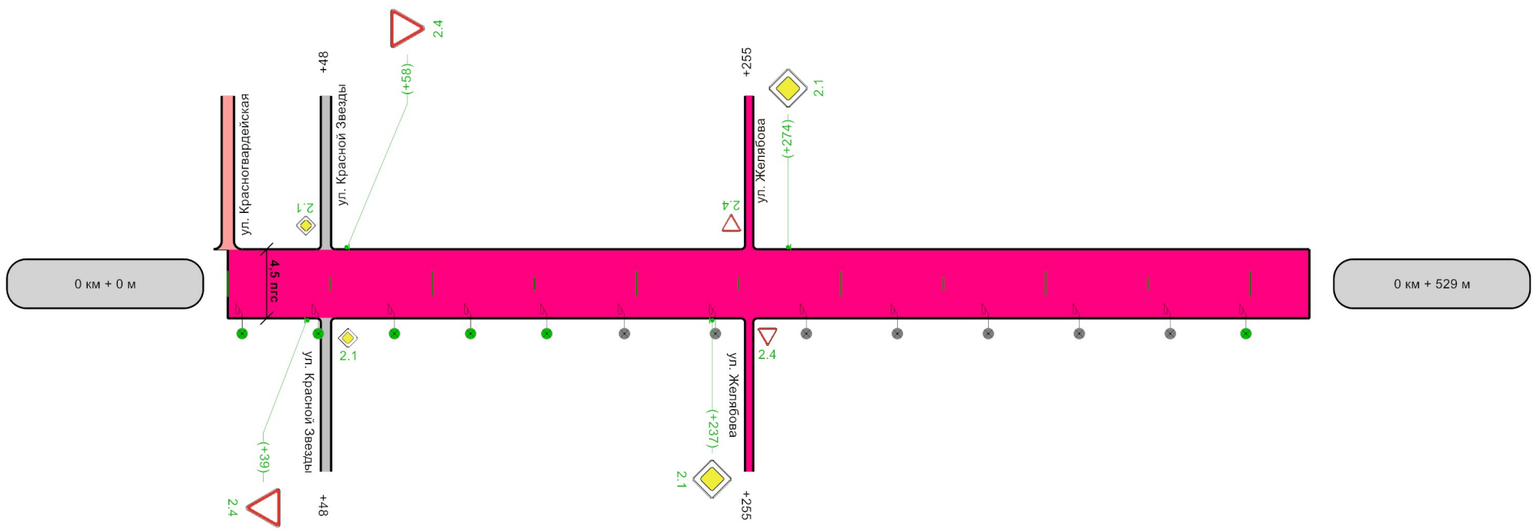

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+237	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+274	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+039	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+058	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+007	0+156	Населенный пункт	5/5	149	0	Справа
2	0+194	0+461	Населенный пункт	7/7	0	267	Справа
3	0+498	0+498	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**13/13**	**149**	**267**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Мелиораторов, д.9 до жилого дома по ул. Мелиораторов, д.2
км 0+000 - км 0+169

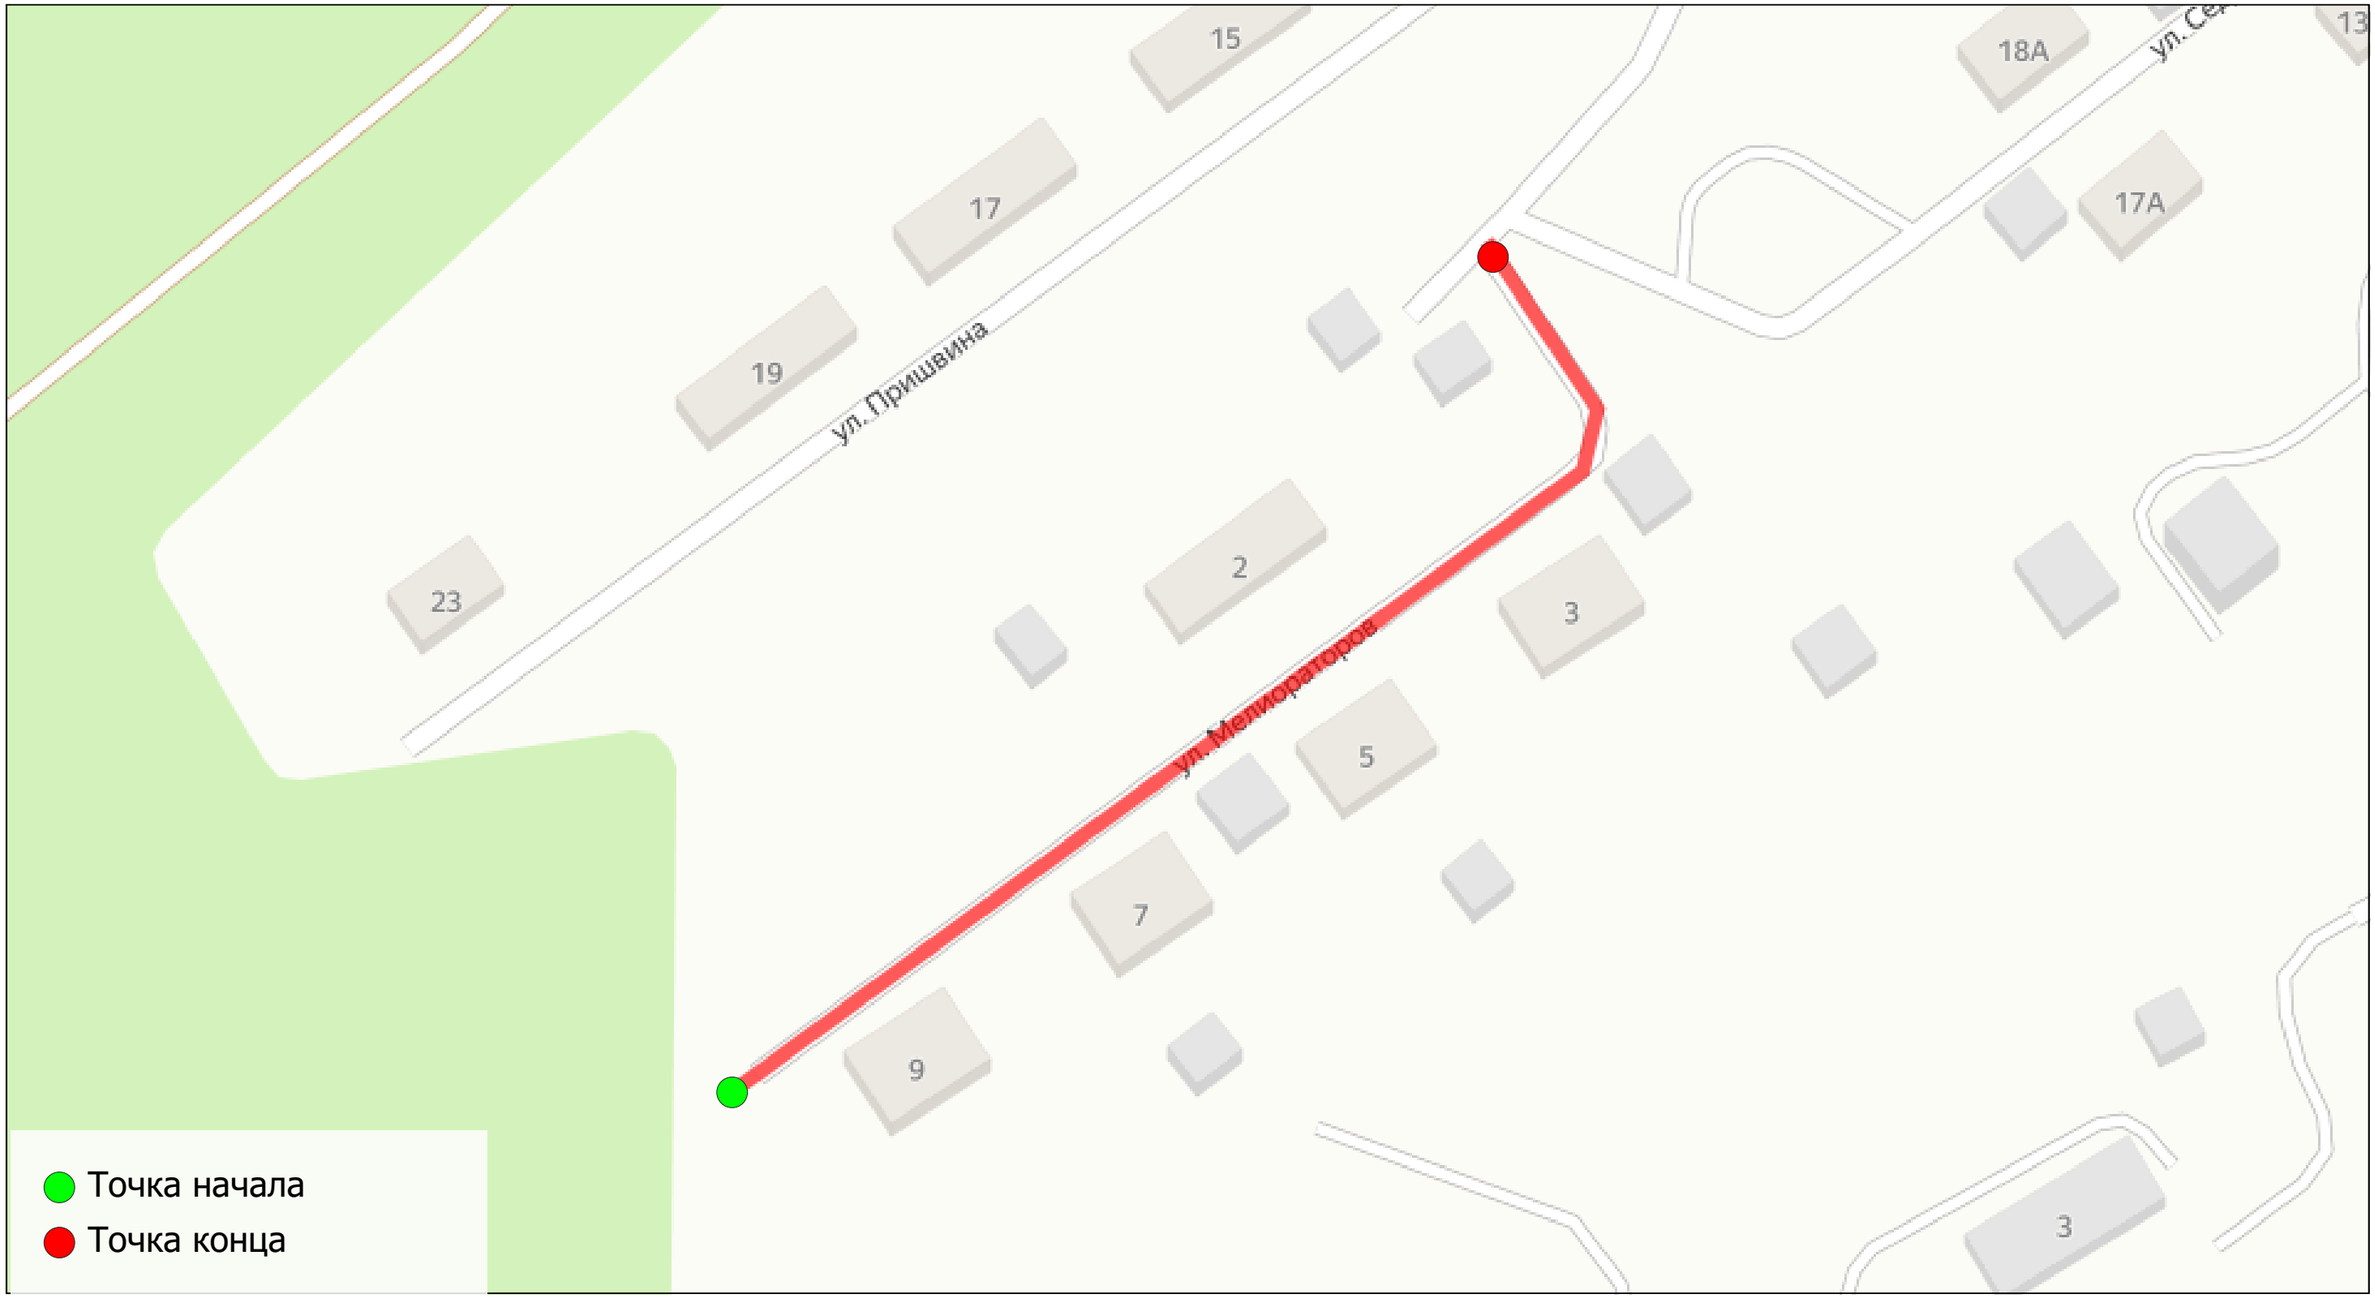

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	53 42 68 R=2322м
Кривые в плане	103 120
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,20



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+008	0+166	Населенный пункт	6/6	158	0	Справа
Итого:				**6/6**	**158**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автомобильной дороги А-331 «Вилюй» до территории детского сада по ул. МК-83, №3


1-й участок: км 0+000 - км 1+306
2-й участок: км 0+000 - км 0+966

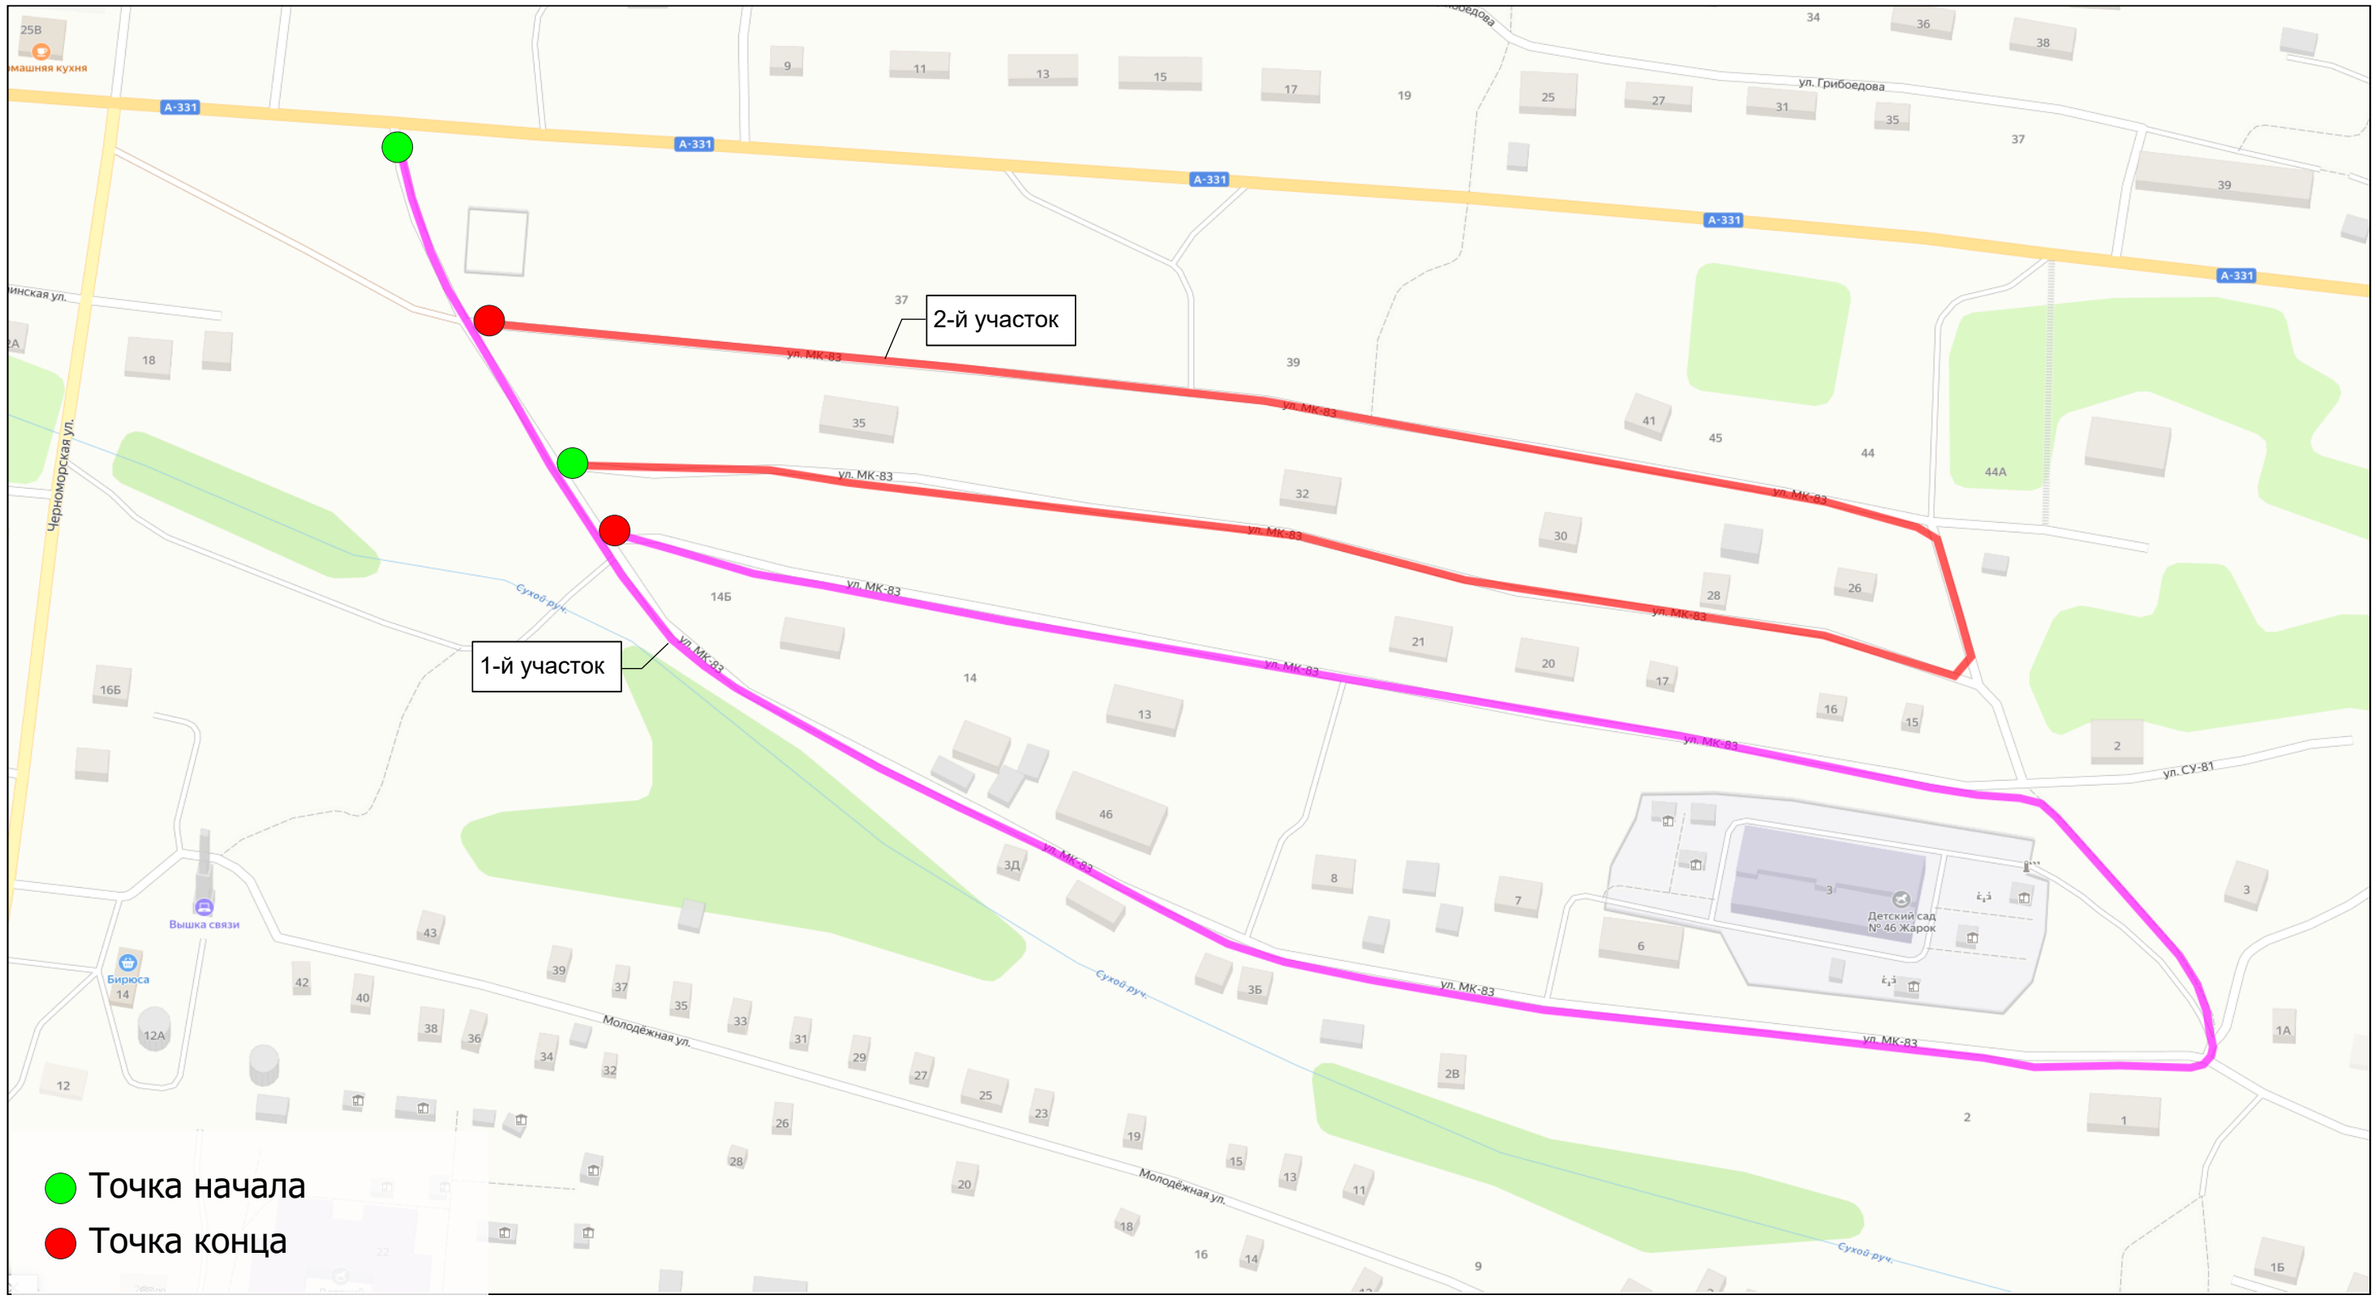

М 1:3000

Автомобильная дорога по ул. МК-83, 1-й участок


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 143 2 R=2182м 210 49 298 55 496 R=5137м 868 17 735 105 R=1542м 1006
Кривые в плане	R=543м P=70; a=4° 254 365 R=317м P=9; a=21° 491 694 R=35м P=1; a=21° 750 826 R=32м P=0; a=83° 857
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,30 61 4,80 291 3,50 410 4,00 755 3,00 903 3,00

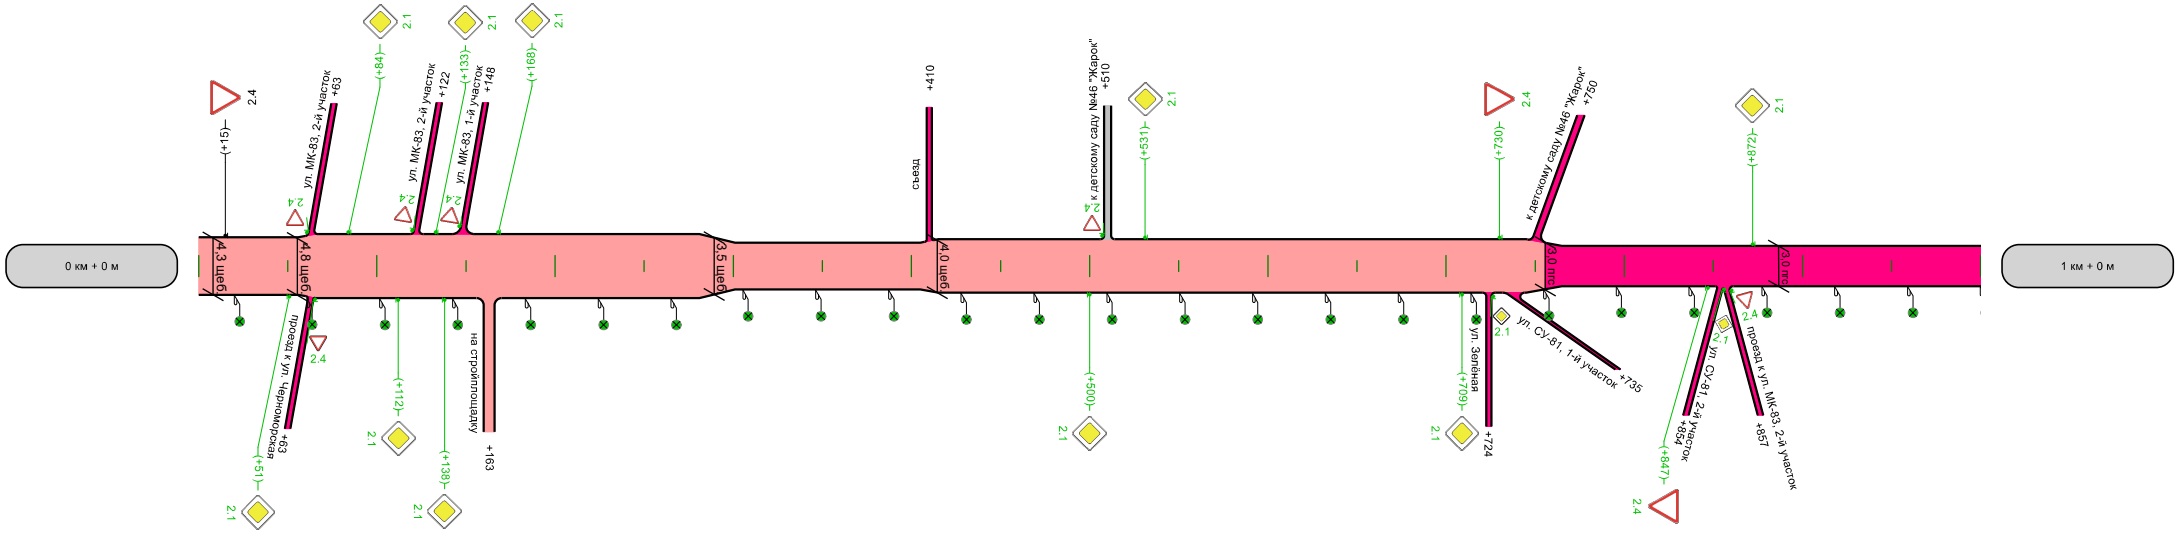

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	106 R=1542м 37 1 63 R=3850м 266 51
Кривые в плане	245 R=870м P=8; a=63°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

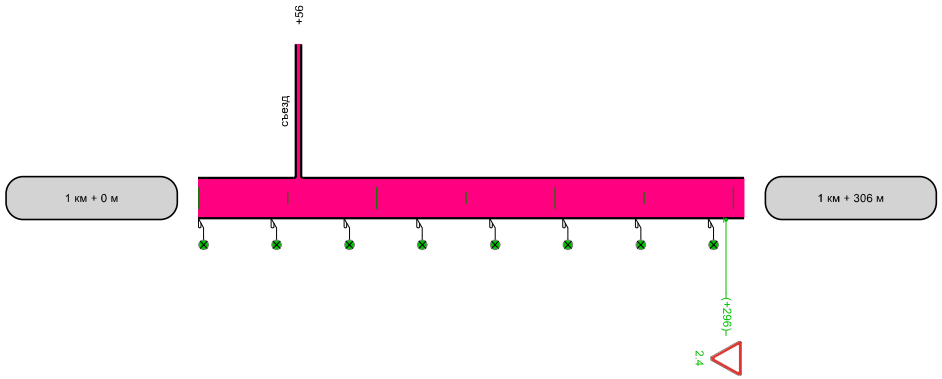

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+051	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+084	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+112	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+133	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+138	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+168	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+500	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+531	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			0+709	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			0+872	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+730	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+847	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу			1+296	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**13**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**14**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+023	1+289	Населённый пункт	32/32	1266	0	Справа
Итого:				**32/32**	**1266**	**0**	

М 1:3000

Автомобильная дорога по ул. МК-83, 2-й участок

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	45 R=4638м 19 302 27 383 R=1432м 61 510 61 540 R=4052м 12 837
Кривые в плане	425 R=90м 515
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

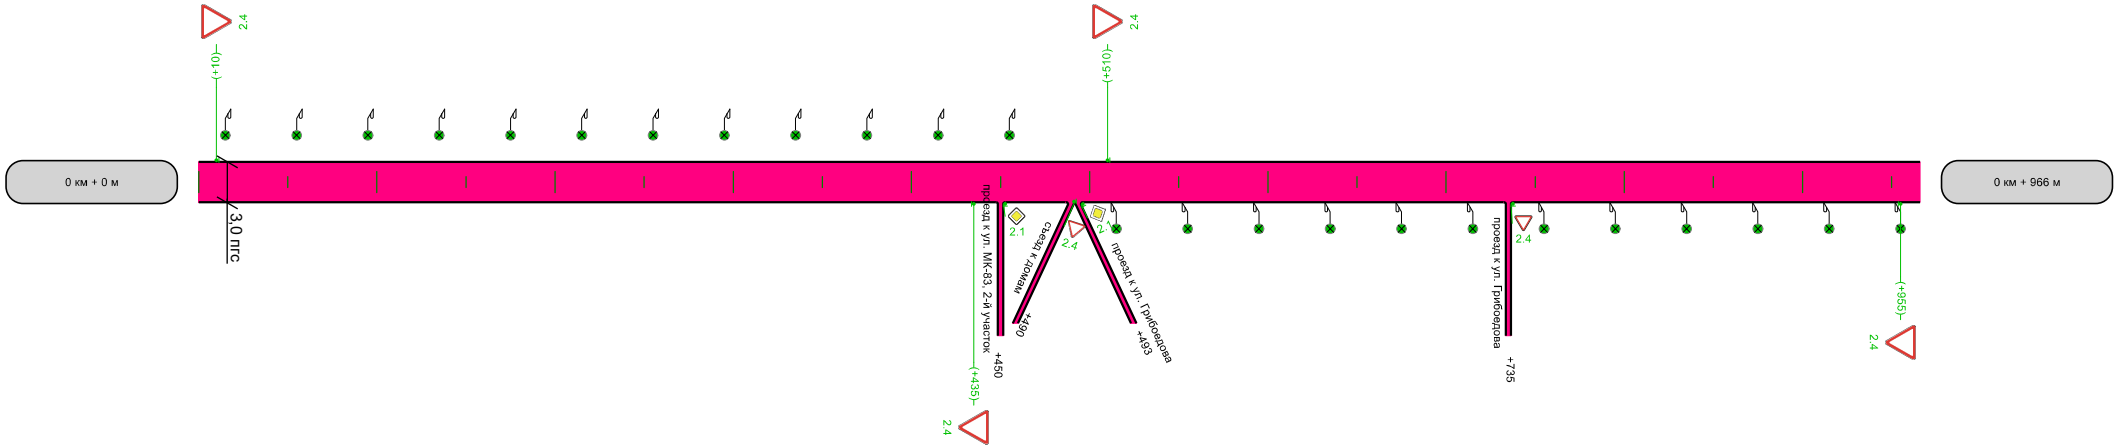

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+435	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+510	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+955	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+455	Населённый пункт	12/12	440	0	Слева
2	0+515	0+955	Населённый пункт	12/12	440	0	Справа
Итого:				**24/24**	**880**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по пер. Милицейский от д. №37 по ул. Набережная до д. №104 по ул. Советская


км 0+000 - км 0+165

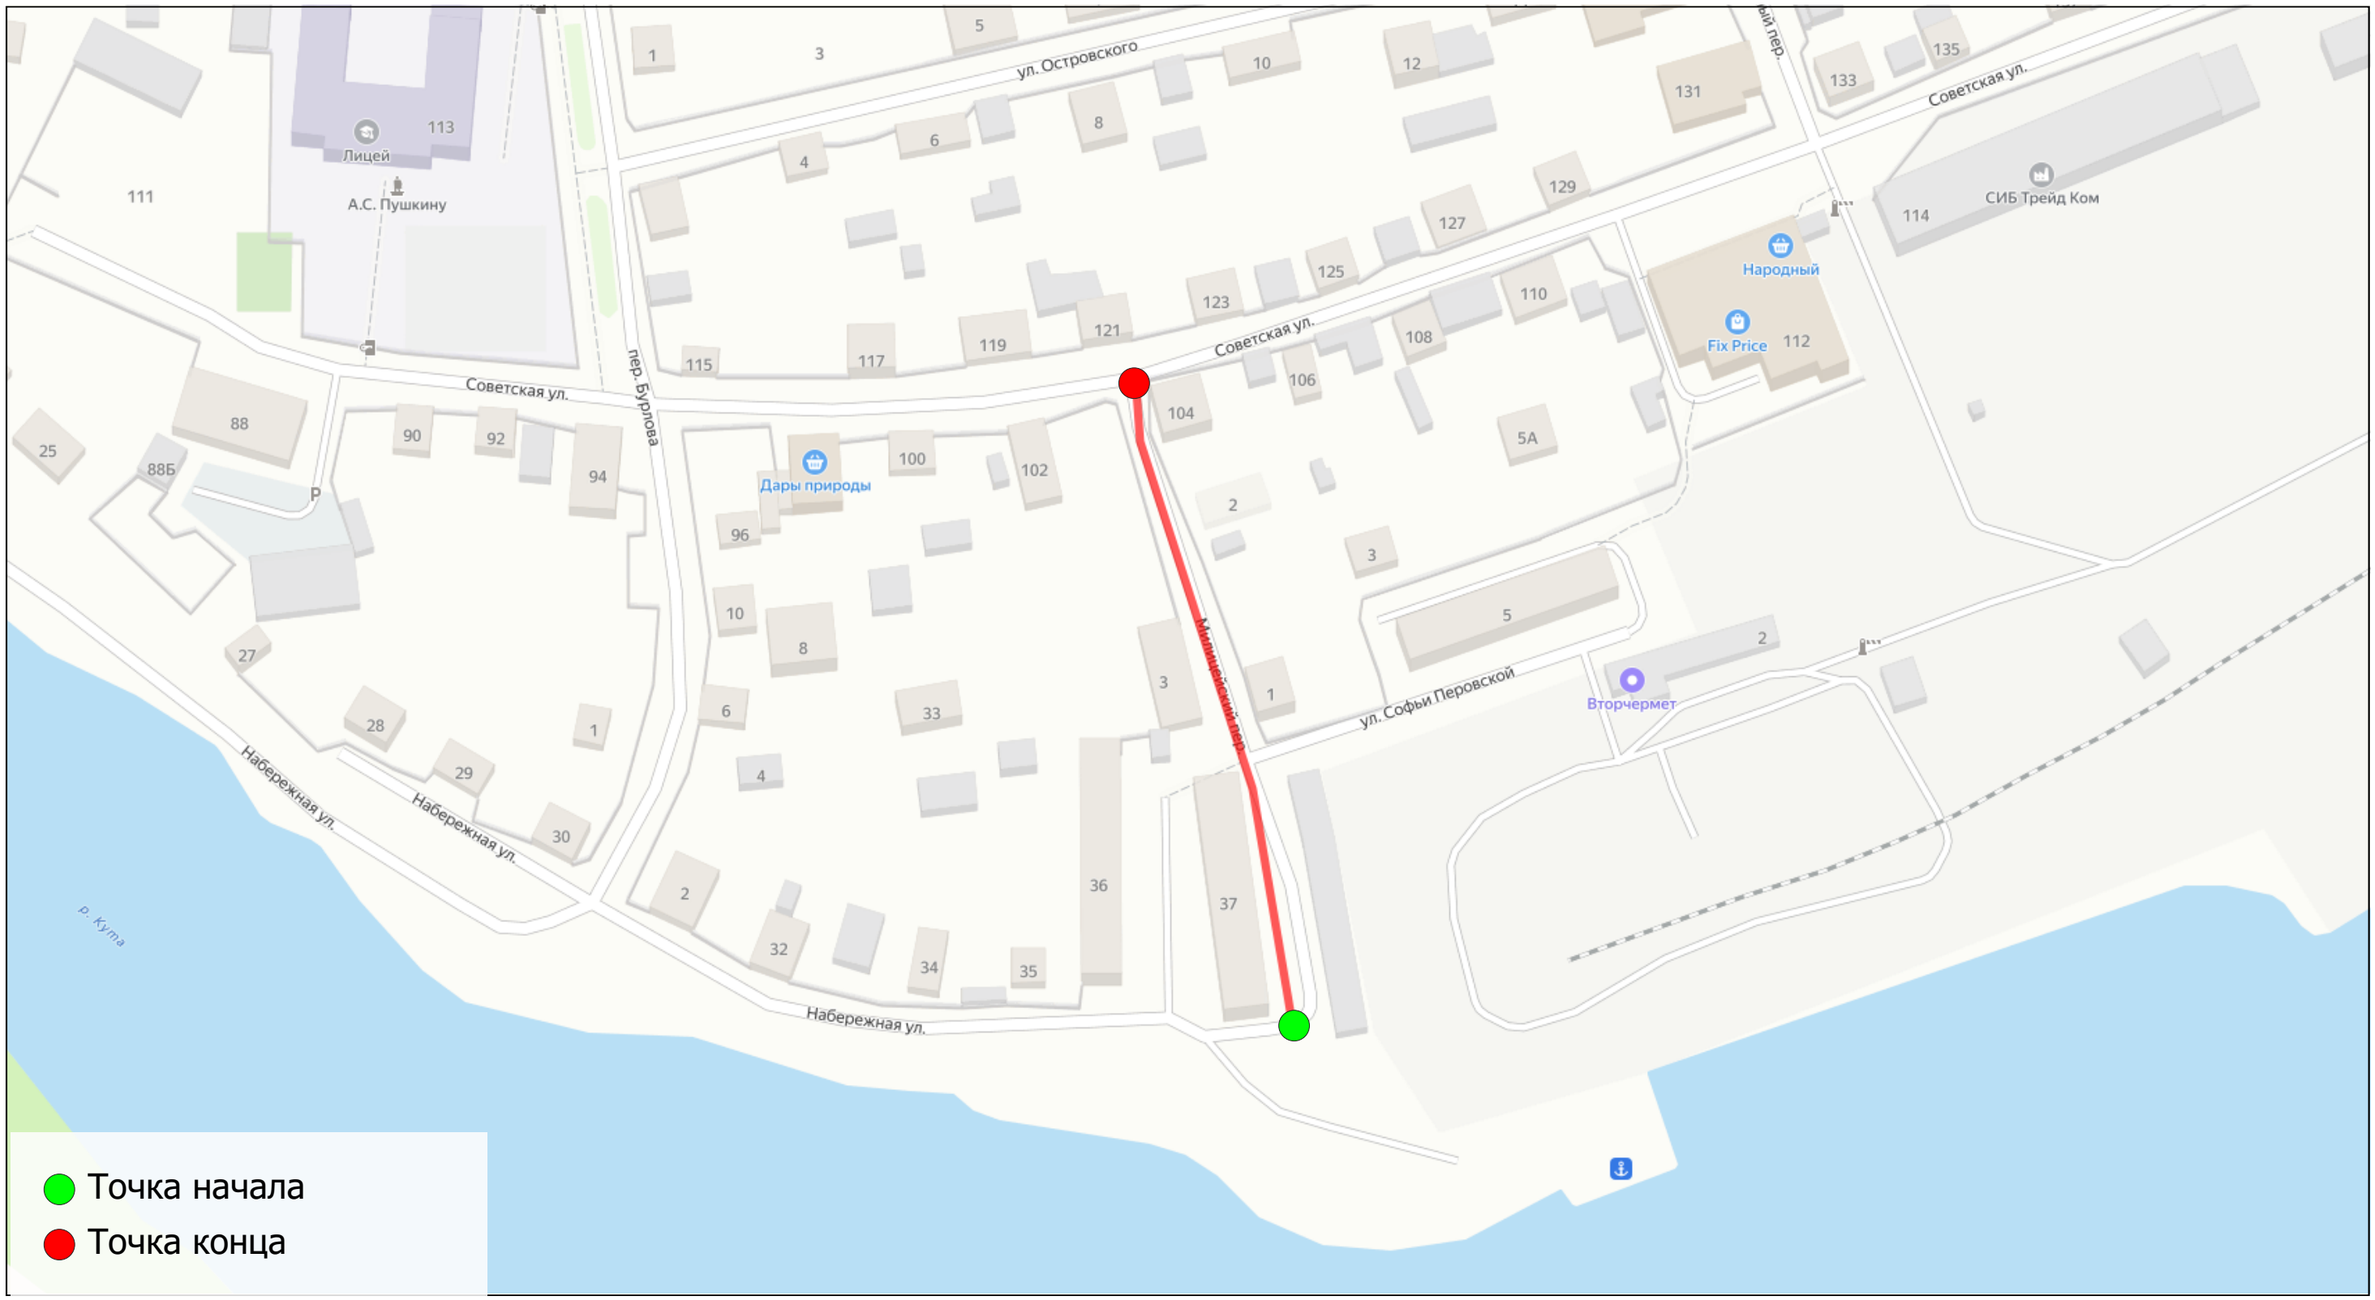

Автодорога по пер. Милицейский от д. №37 по ул. Набережная до д. №104 по ул. Советская

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	111 2 R=2129м 91 72
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 7,50 70 4,00

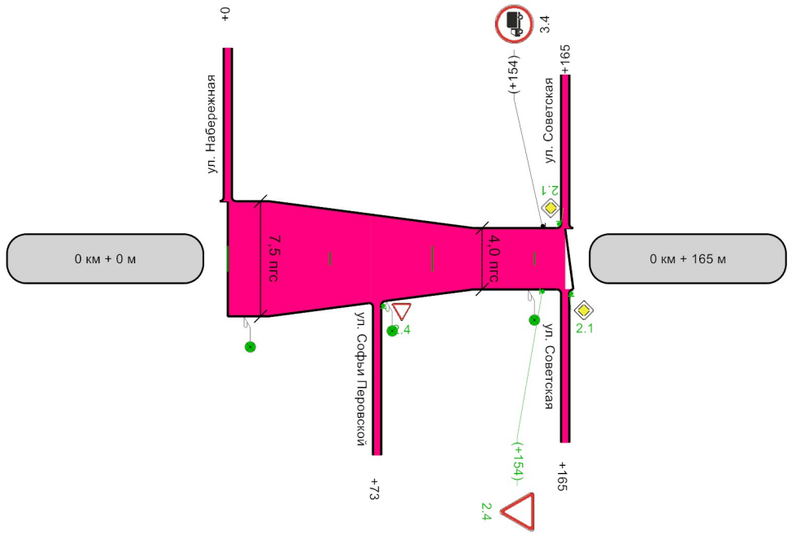

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+154	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+154	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+150	Населенный пункт	3/3	140	0	Справа
Итого:				**3/3**	**140**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Карбышева, д.4 до жилого дома по ул. Чернышевского, д. 21
км 0+000 - км 0+599

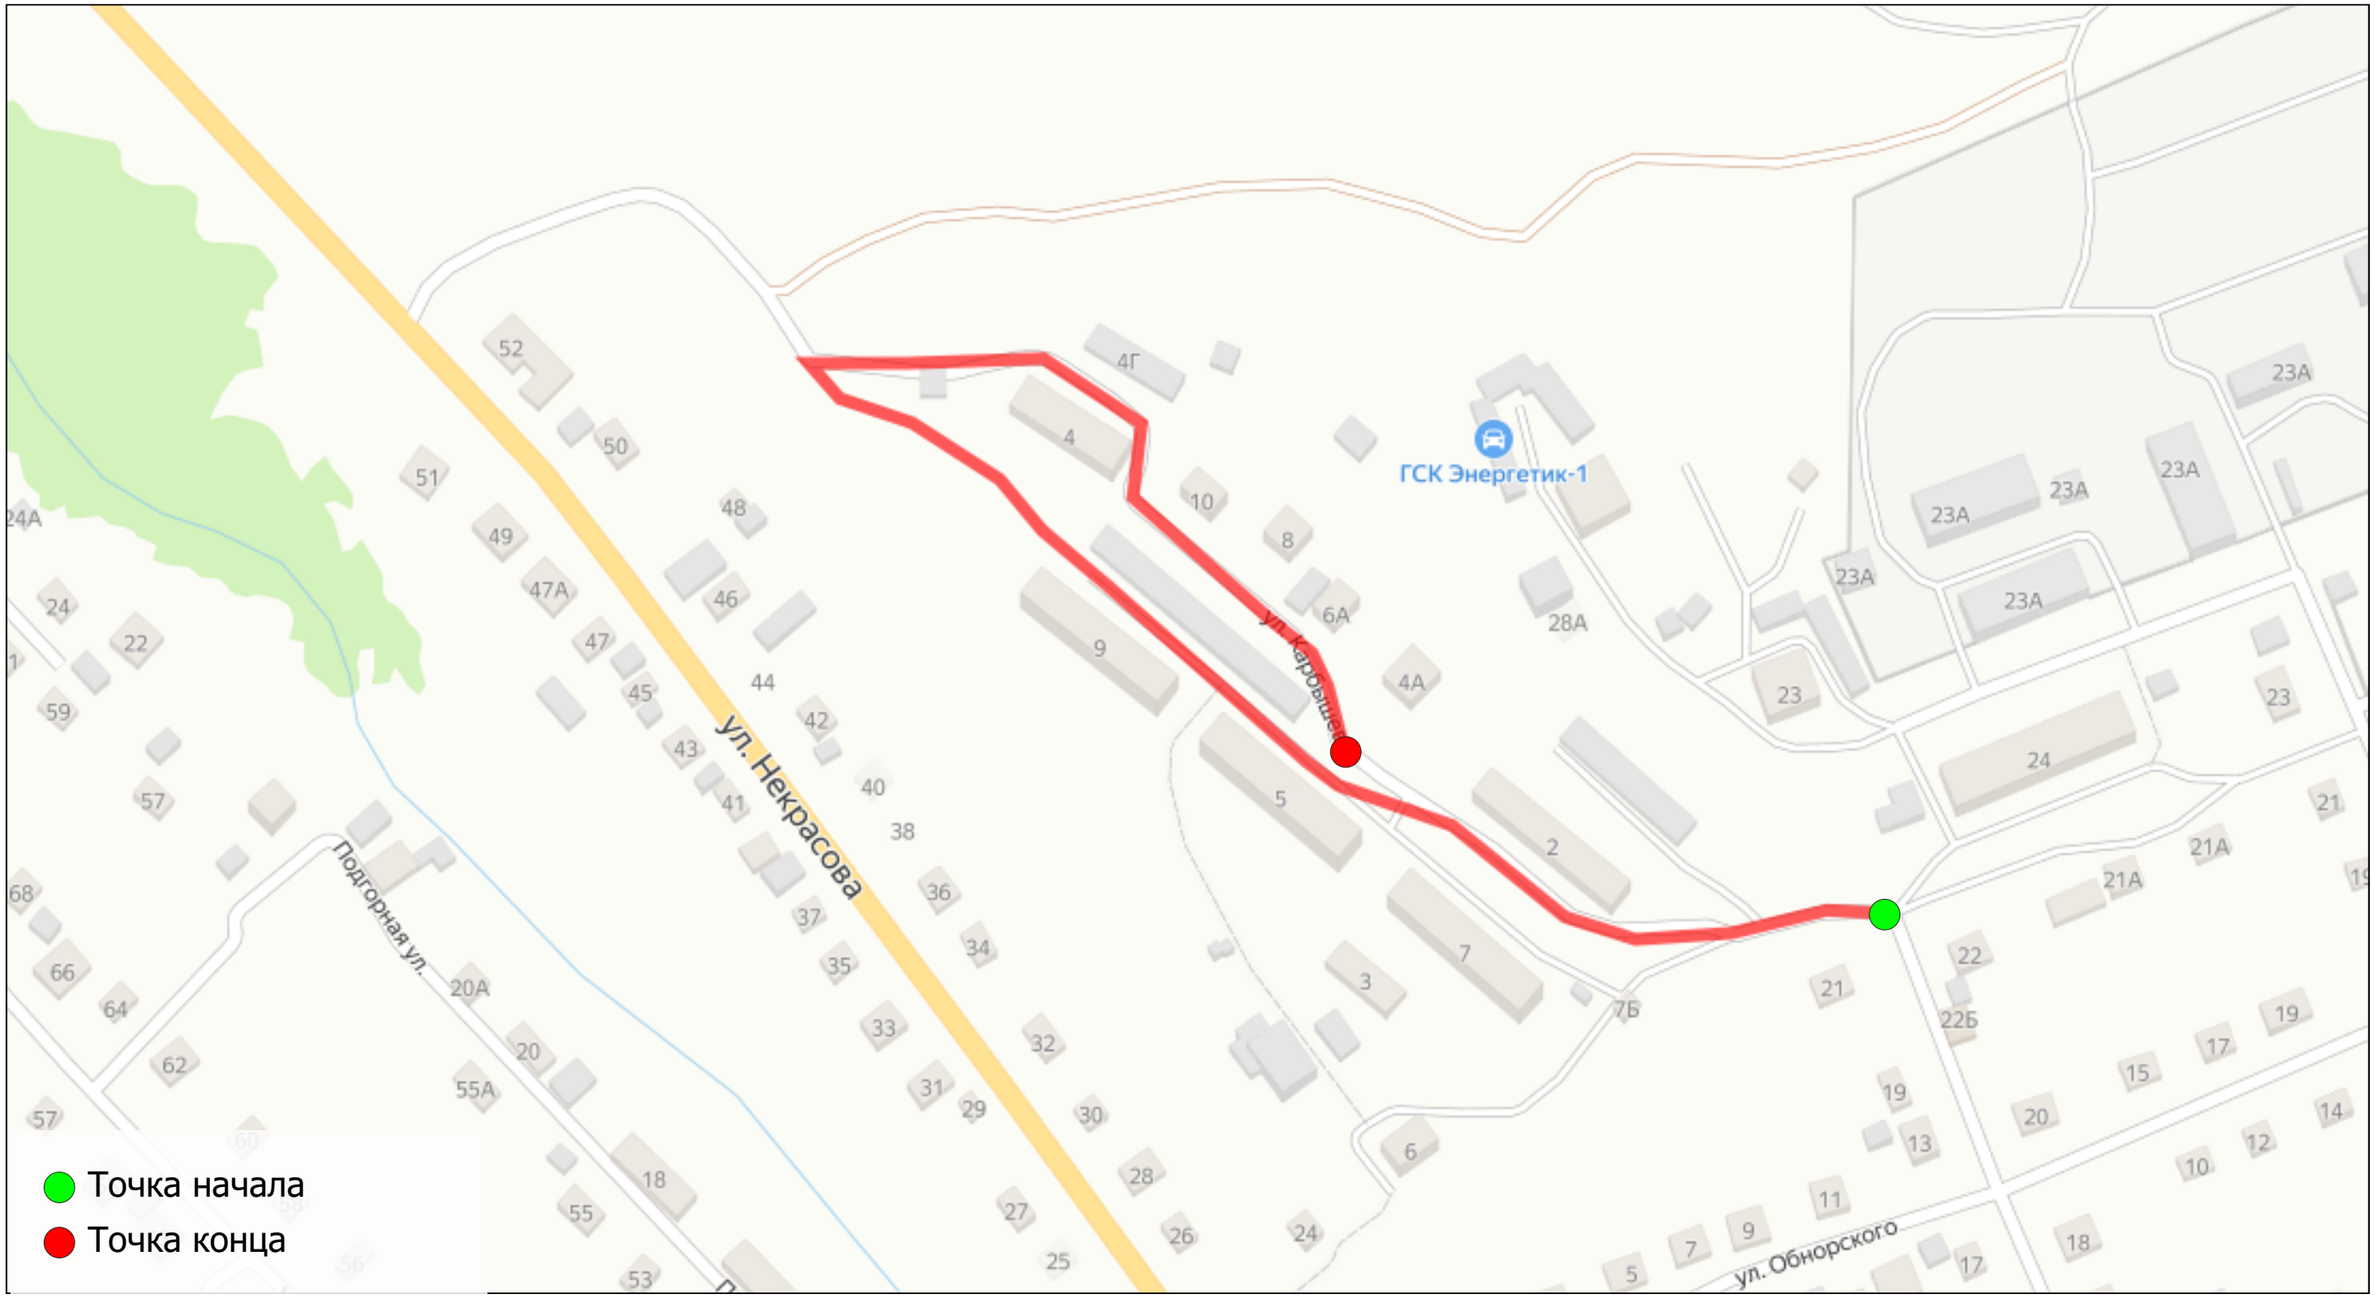

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13 10 17 R=2718м 46 158 182 44 R=1803м 82 394
Кривые в плане	R=54м 73 P=1; a=55° 112 R=5м 335 P=0; a=17° 363 R=48м 406 P=1; a=4° 426 451 465 471 486 R=74м 516 P=2; a=2° 540 554 R=33м P=0; a=38° 580 590
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

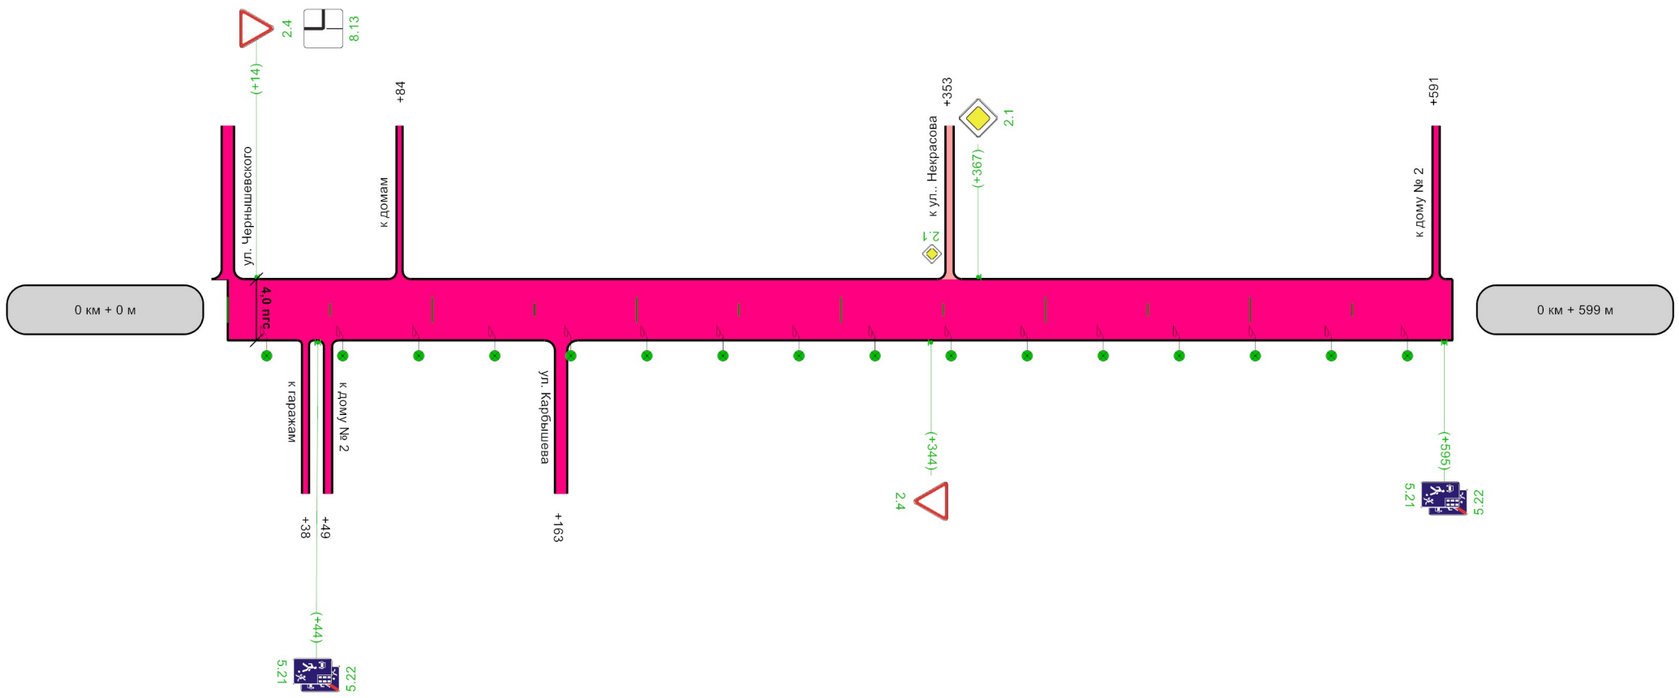

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+367	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+014	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+344	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки особых предписаний						
4	5.21	Жилая зона			0+044	Требуется установить	1	справа
5	5.21	Жилая зона			0+595	Требуется установить	1	справа
6	5.22	Конец жилой зоны			0+044	Требуется установить	1	справа
7	5.22	Конец жилой зоны			0+595	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.13	Направление главной дороги			0+014	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+019	0+577	Населенный пункт	16/16	558	0	Справа
Итого:				**16/16**	**558**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от здания магазина по ул. Кедровая, 19 а до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»

1-й участок: км 0+000 - км 0+183
2-й участок: км 0+000 - км 0+296

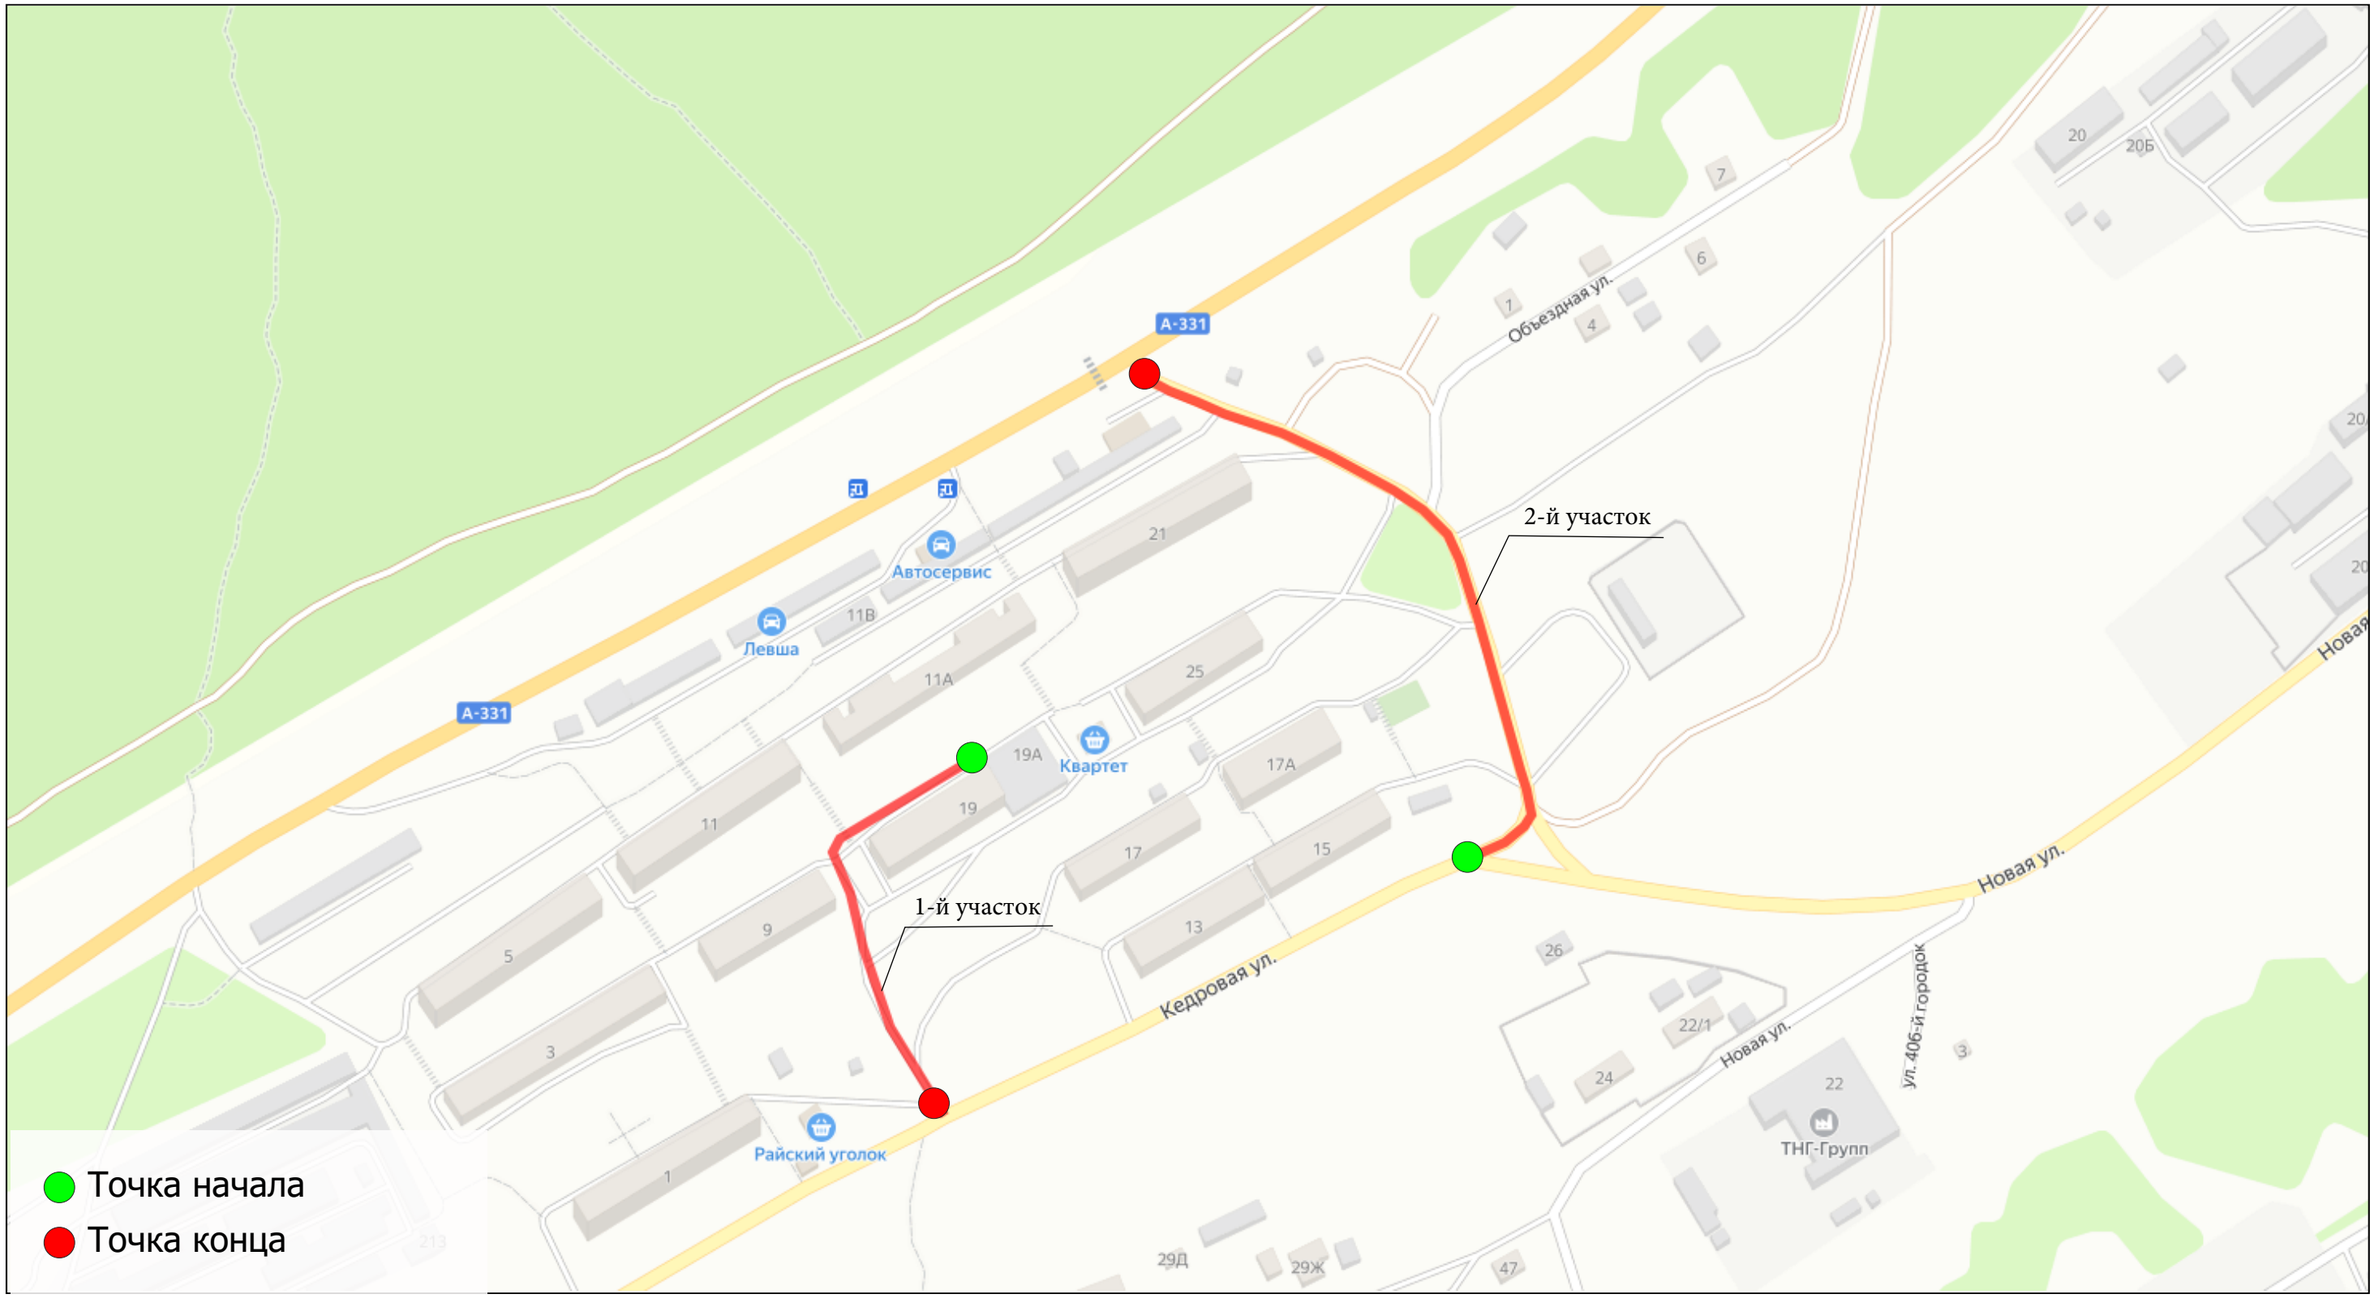

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	165 166 12 R=1004м 158 1
Кривые в плане	R=675м 96 114
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00 | 5,00 | 4,00

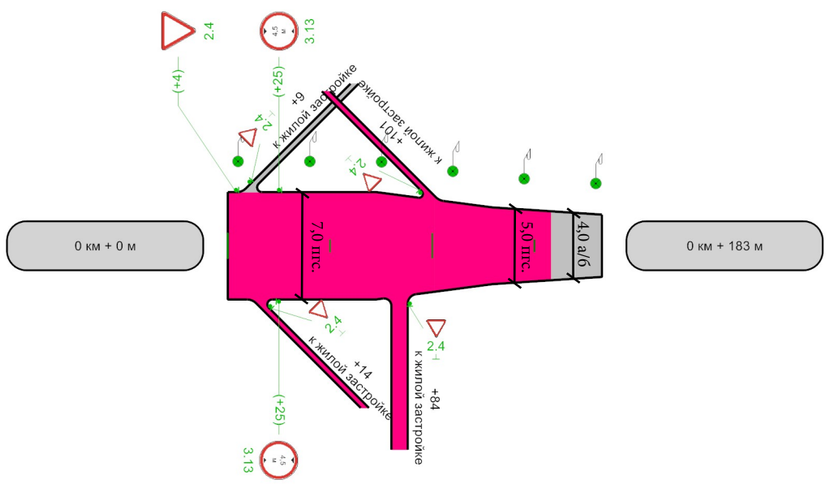

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+004	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+025	Требуется установить	1	слева
3	3.13	Ограничение высоты			0+025	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+180	Населенный пункт	6/6	175	0	Слева
Итого:				**6/6**	**175**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	96 / 113 / 28 / R=1915м / 99 / 152
Кривые в плане	R=626м P=3; a=121° / 55 / 123 / R=699м P=9; a=44° / 199 / 266 / R=700м P=23; a=18°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00

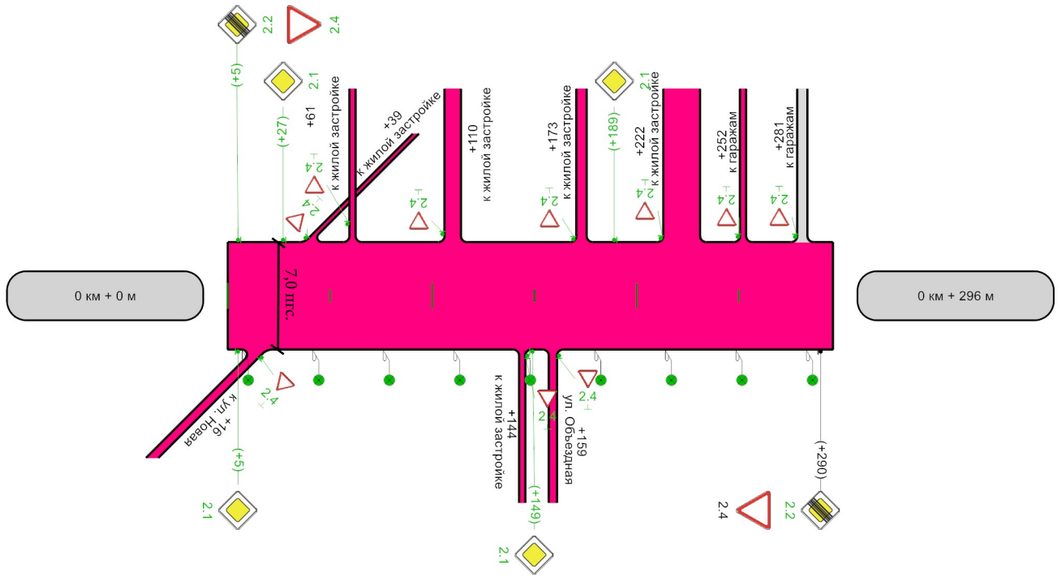

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+005	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+027	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+149	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+189	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			0+290	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+290	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+286	Населенный пункт	9/9	276	0	Справа
Итого:				**9/9**	**276**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Ленская, д.1в до жилого дома по ул. Ленская, д.31
км 0+000 - км 1+067



М 1:3000

Автодорога от жилого дома по ул. Ленская, д.1в до жилого дома по ул. Ленская, д.31

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	14 R=2362м 40 3 265 1 R=1579м 363 64
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

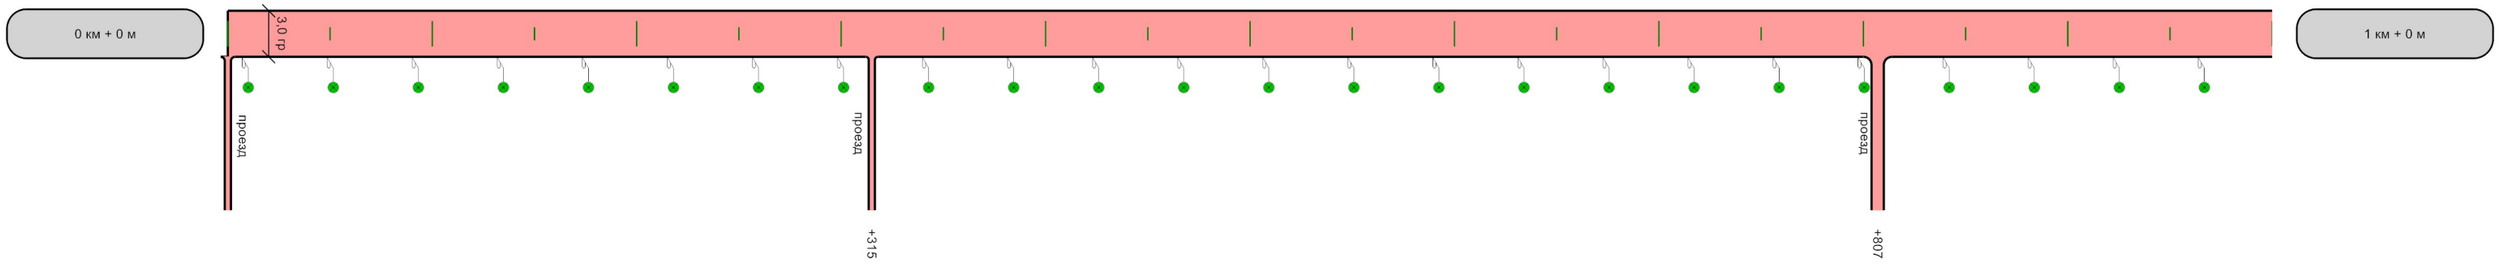


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автодорога от жилого дома по ул. Ленская, д.1в до жилого дома по ул. Ленская, д.31

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	64
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	1+050	Населенный пункт	26/26	1040	0	Справа
Итого:				**26/26**	**1040**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Лермонтова от жилого дома по ул. Горького, д. 15 до автодороги по ул. Высоцкого
км 0+000 - км 0+660

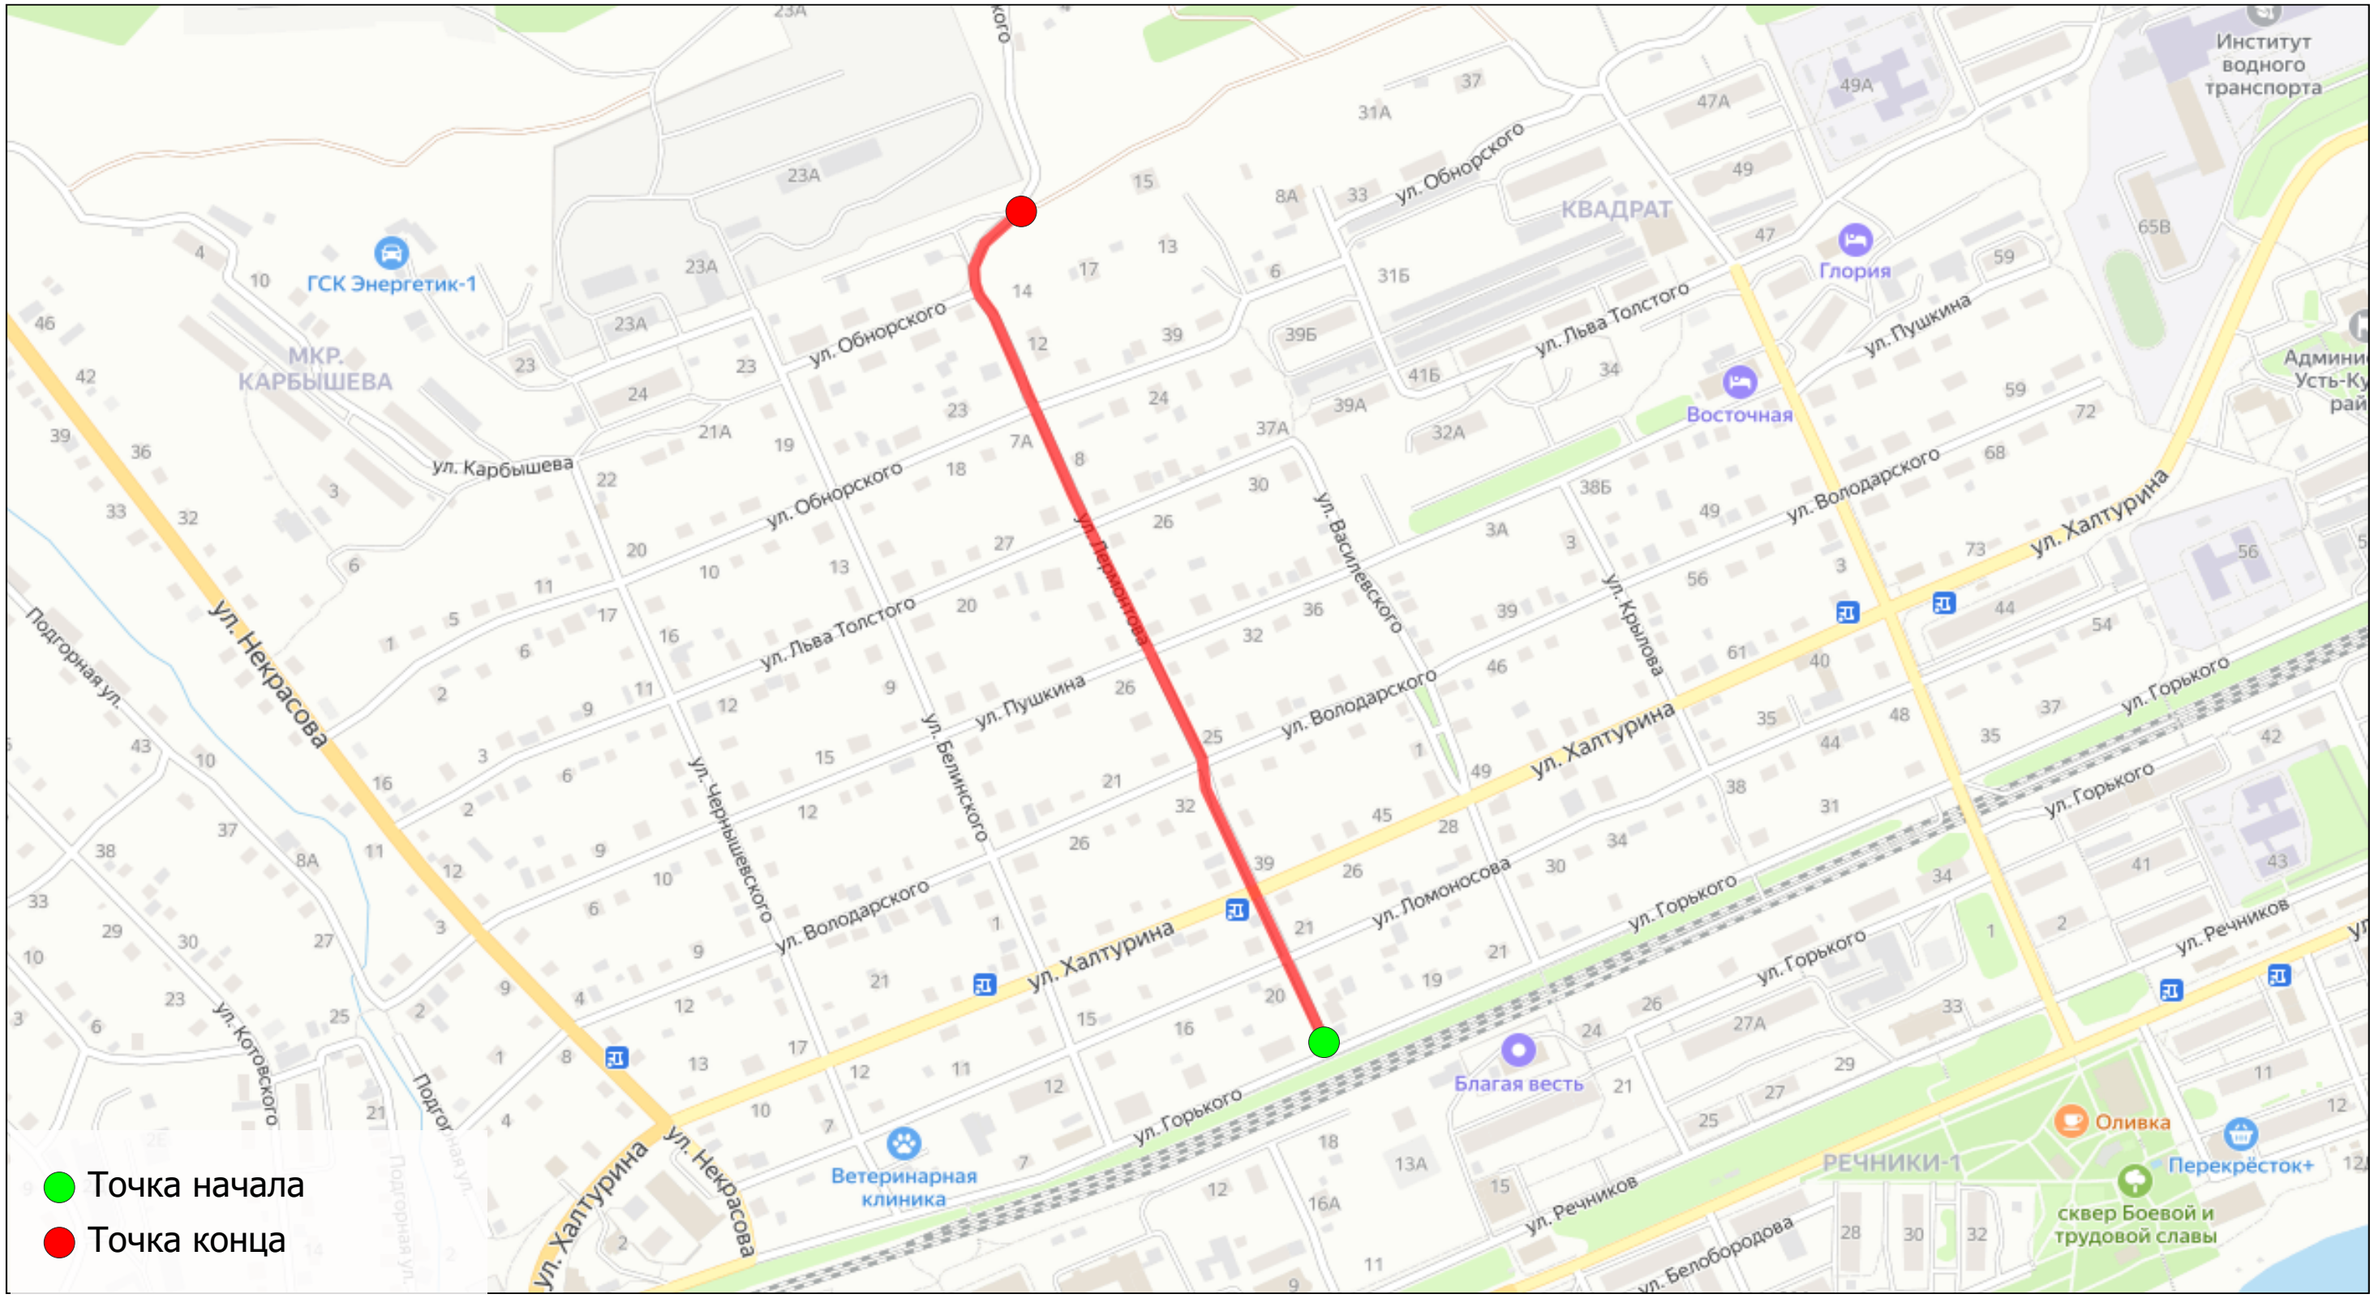

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	95 95 120 120 98 6 R=5882м 150 183 R=9071м 382
Кривые в плане	55 R=103м P=1; a=49° 144
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

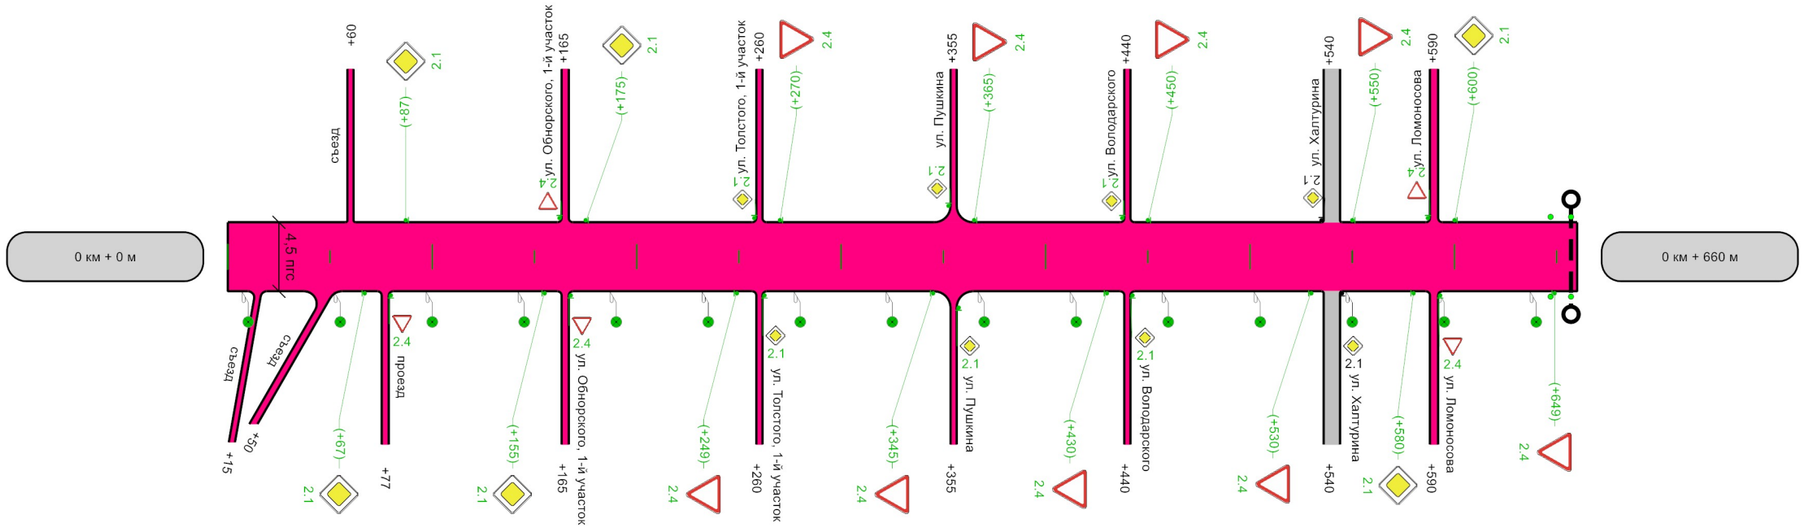

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+067	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+087	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+155	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+175	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+580	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+600	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+249	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+270	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+345	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+365	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+430	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+450	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+530	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу			0+550	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+649	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**15**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется					**15**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		установить:						
		Всего:					15	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+647	0+657	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+647	0+657	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			20/4					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+640	Населённый пункт	15/15	630	0	Справа
Итого:				15/15	630	0	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от дома №5 по ул. Ломоносова

до здания детского сада по ул. Ломоносова, 56


км 0+000 - км 1+054

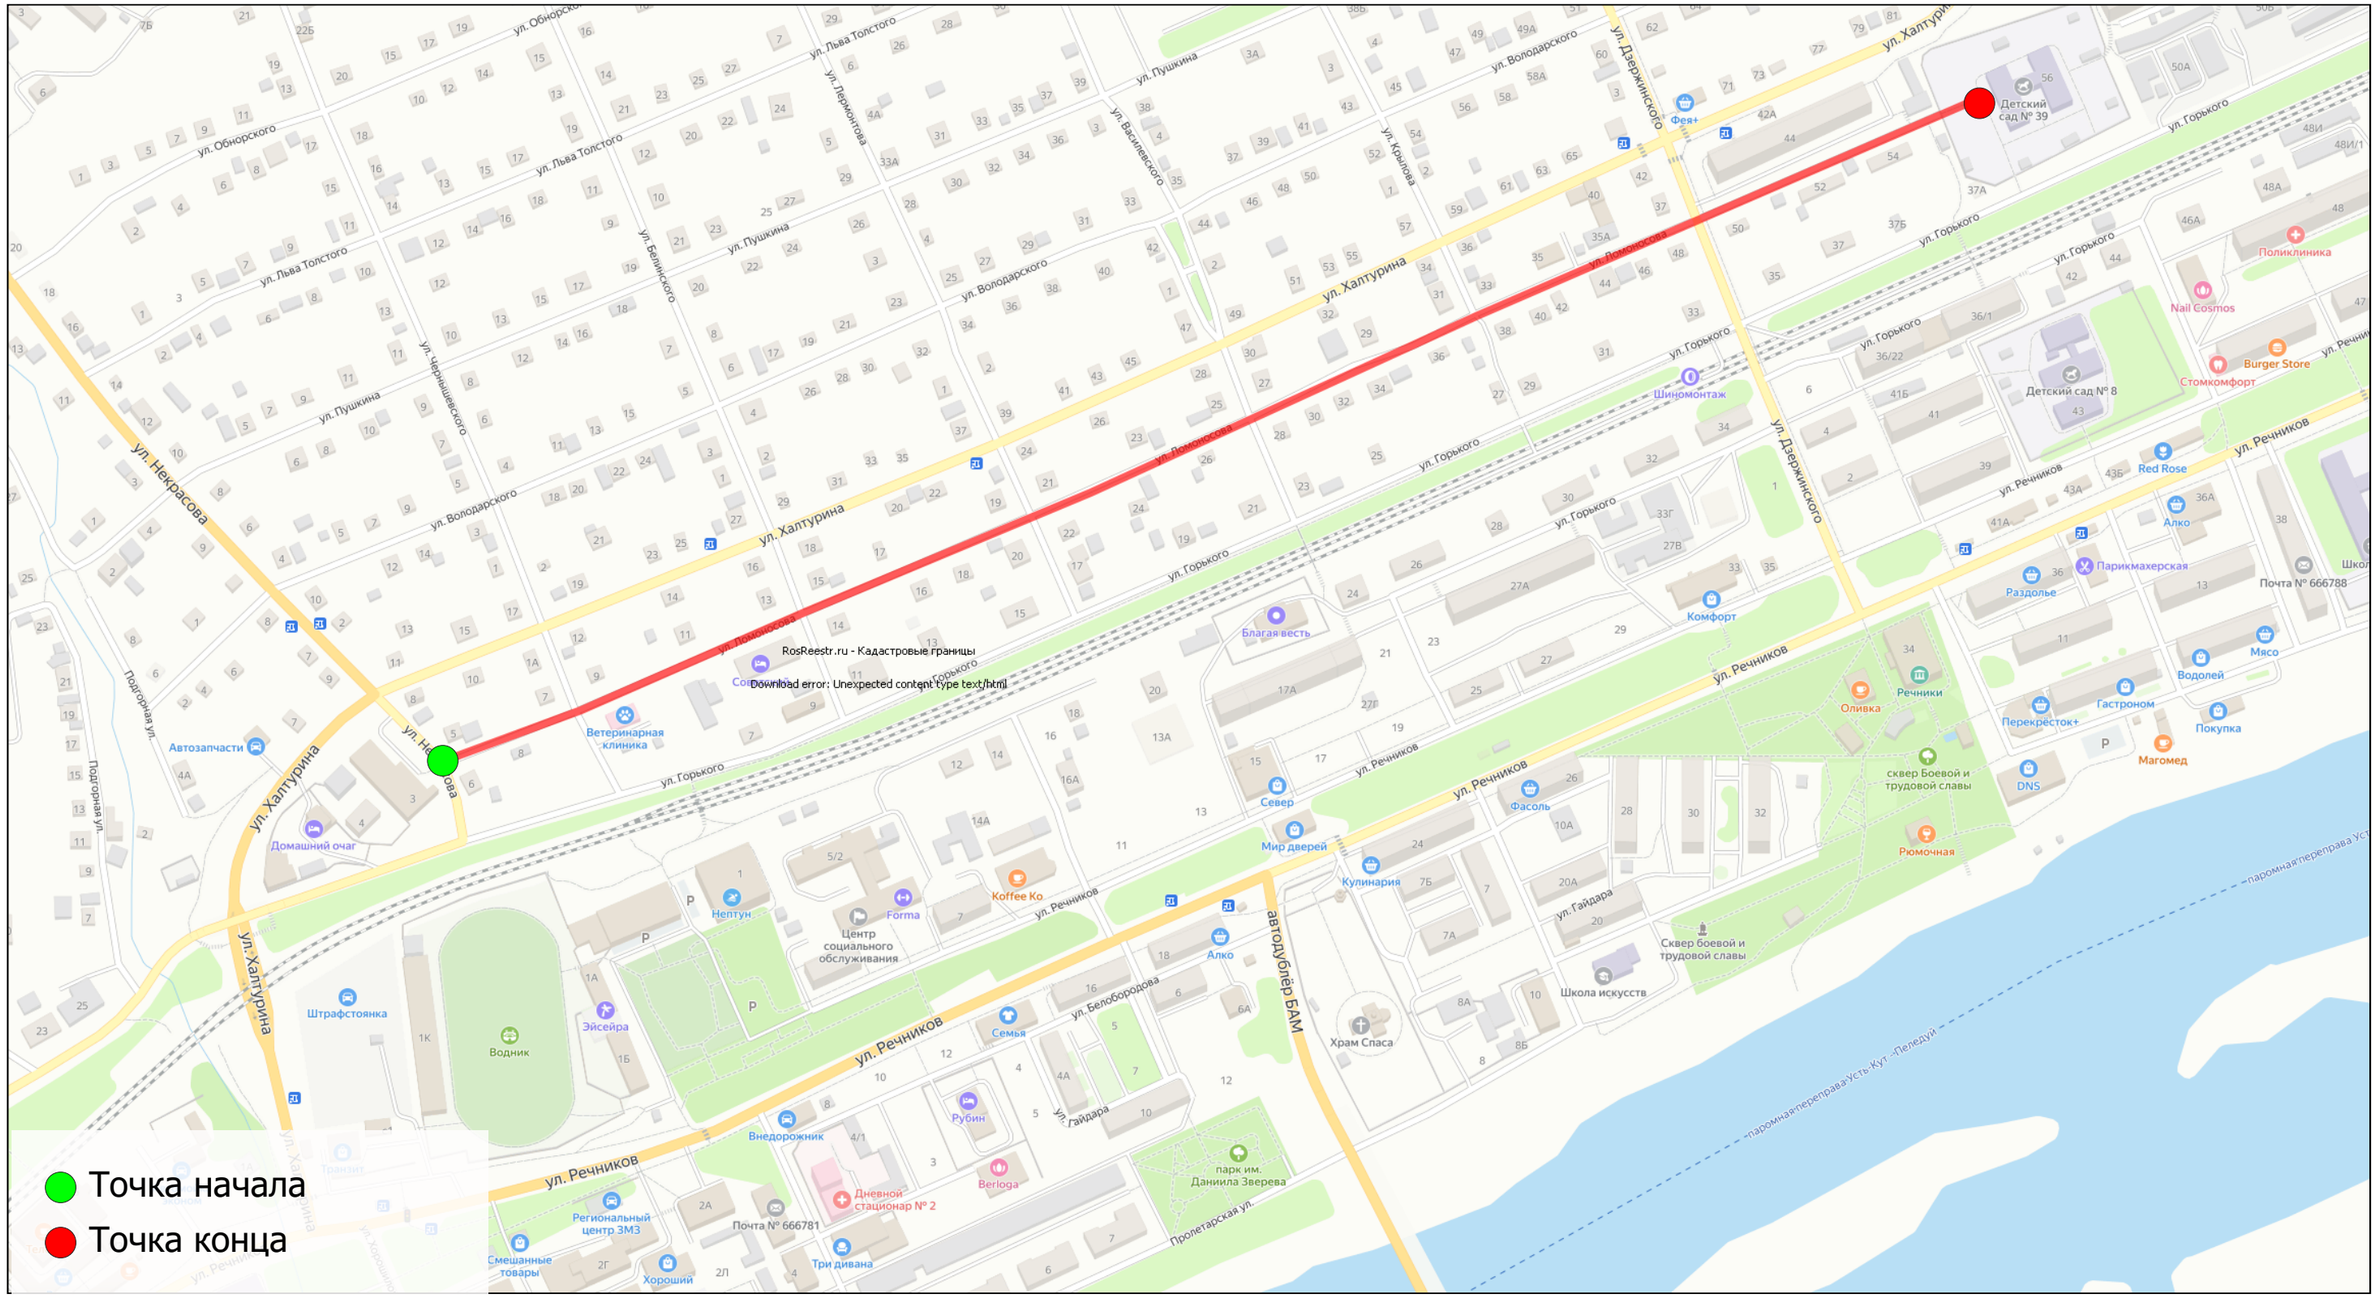

М 1:3000

Автомобильная дорога от дома №5 по ул. Ломоносова до здания детского сада по ул. Ломоносова, 56

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	7 · 86 · 7 · R=2253м · 41 · 195 · 41 · 215 · R=3055м · 16 · 291 · 19 · 406 · R=3128м · 7 · 485 · 6 · 509 · R=2023м · 35 · 593 · 35 · 612 · R=2085м · 8 · 702 · 3 · 777 · R=3679м · 24 · 853
Кривые в плане	129.54 · R=331м · 627 P=30; a=6° 664
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00 · 730 · 5,00 · 810 · 4,00 · 5,00 · 956 · 3,00

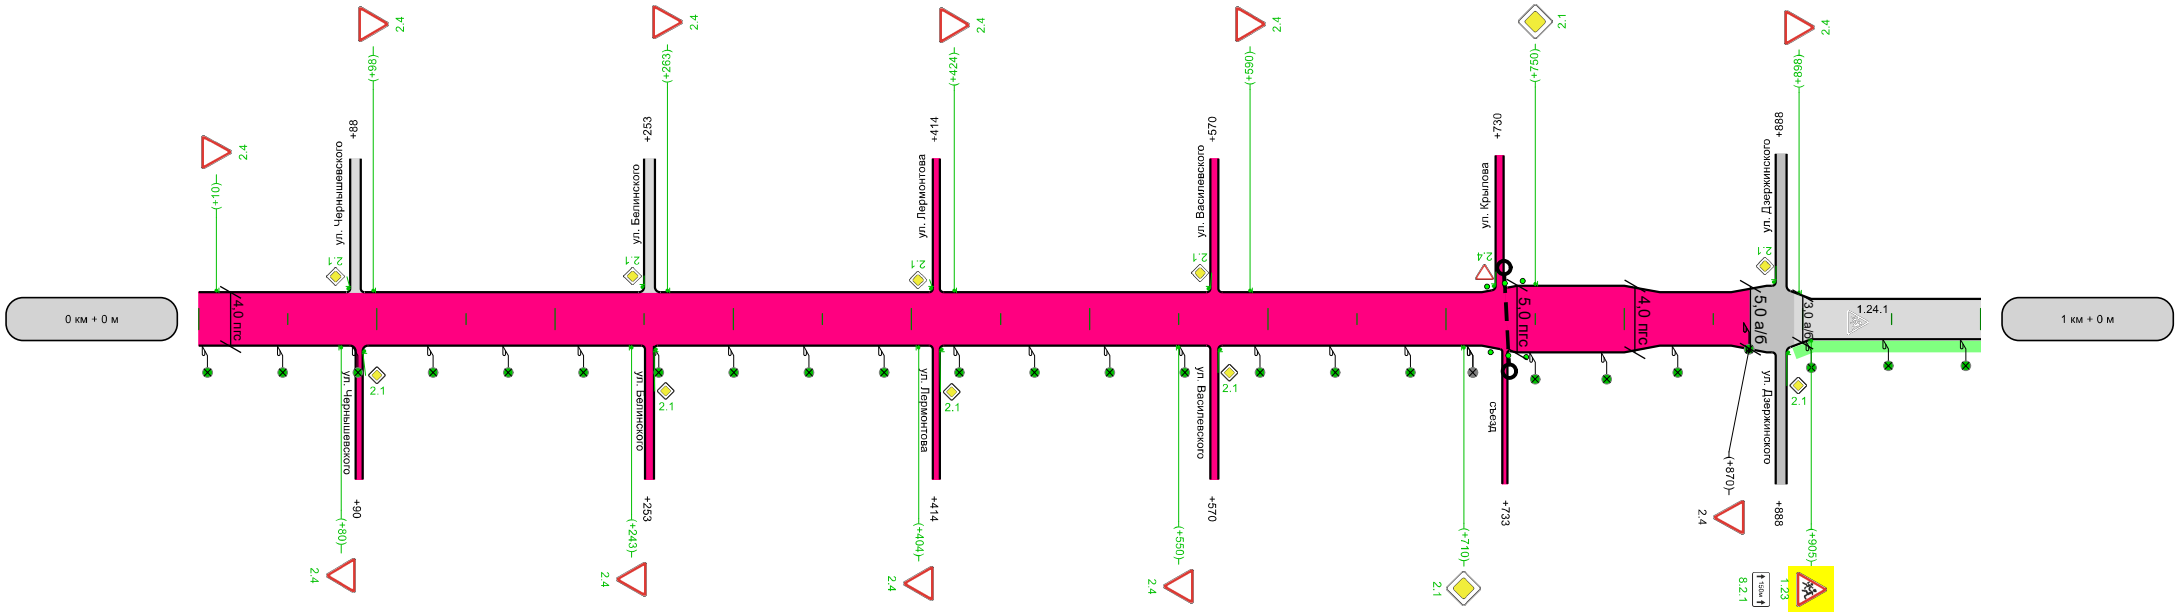

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 894 - 1000

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.24.1(шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.550	
Ширина, м	1.00	
1	2	3
0 - 1	1,000	
1 - 2	0,000	
ИТОГО	1,000	
ЛИН.КМ	0,000	
ПРИВЕД.КМ	0,000	
ПЛОЩАДЬ	1,36	1,36

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+905	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+710	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+750	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Демонтировать	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+080	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+098	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+243	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+263	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+404	Требуется установить	1	справа
11	2.4	Уступите дорогу			0+424	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+550	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+590	Требуется установить	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу			0+870	Установлено	1	справа
15	2.4	Уступите дорогу			0+898	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**13**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.2.1	Зона действия			0+905	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**15**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+723	0+743	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+725	0+745	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**				

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+680	Населённый пункт	17/17	675	0	Справа
2	0+715	0+715	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+715	0+715	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+750	0+830	Населённый пункт	3/3	80	0	Справа
5	0+870	0+870	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
6	0+870	0+870	Населённый пункт	1/1	0	0	Справа
7	0+905	1+035	Населённый пункт	4/4	130	0	Справа
Итого:				**28/28**	**885**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+894	1+050	Жилая застройка	Справа	156	
Итого:					**156**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Иркутская, д.17 до жилого дома по ул. Звезднинская д.2
км 0+000 - км 0+416

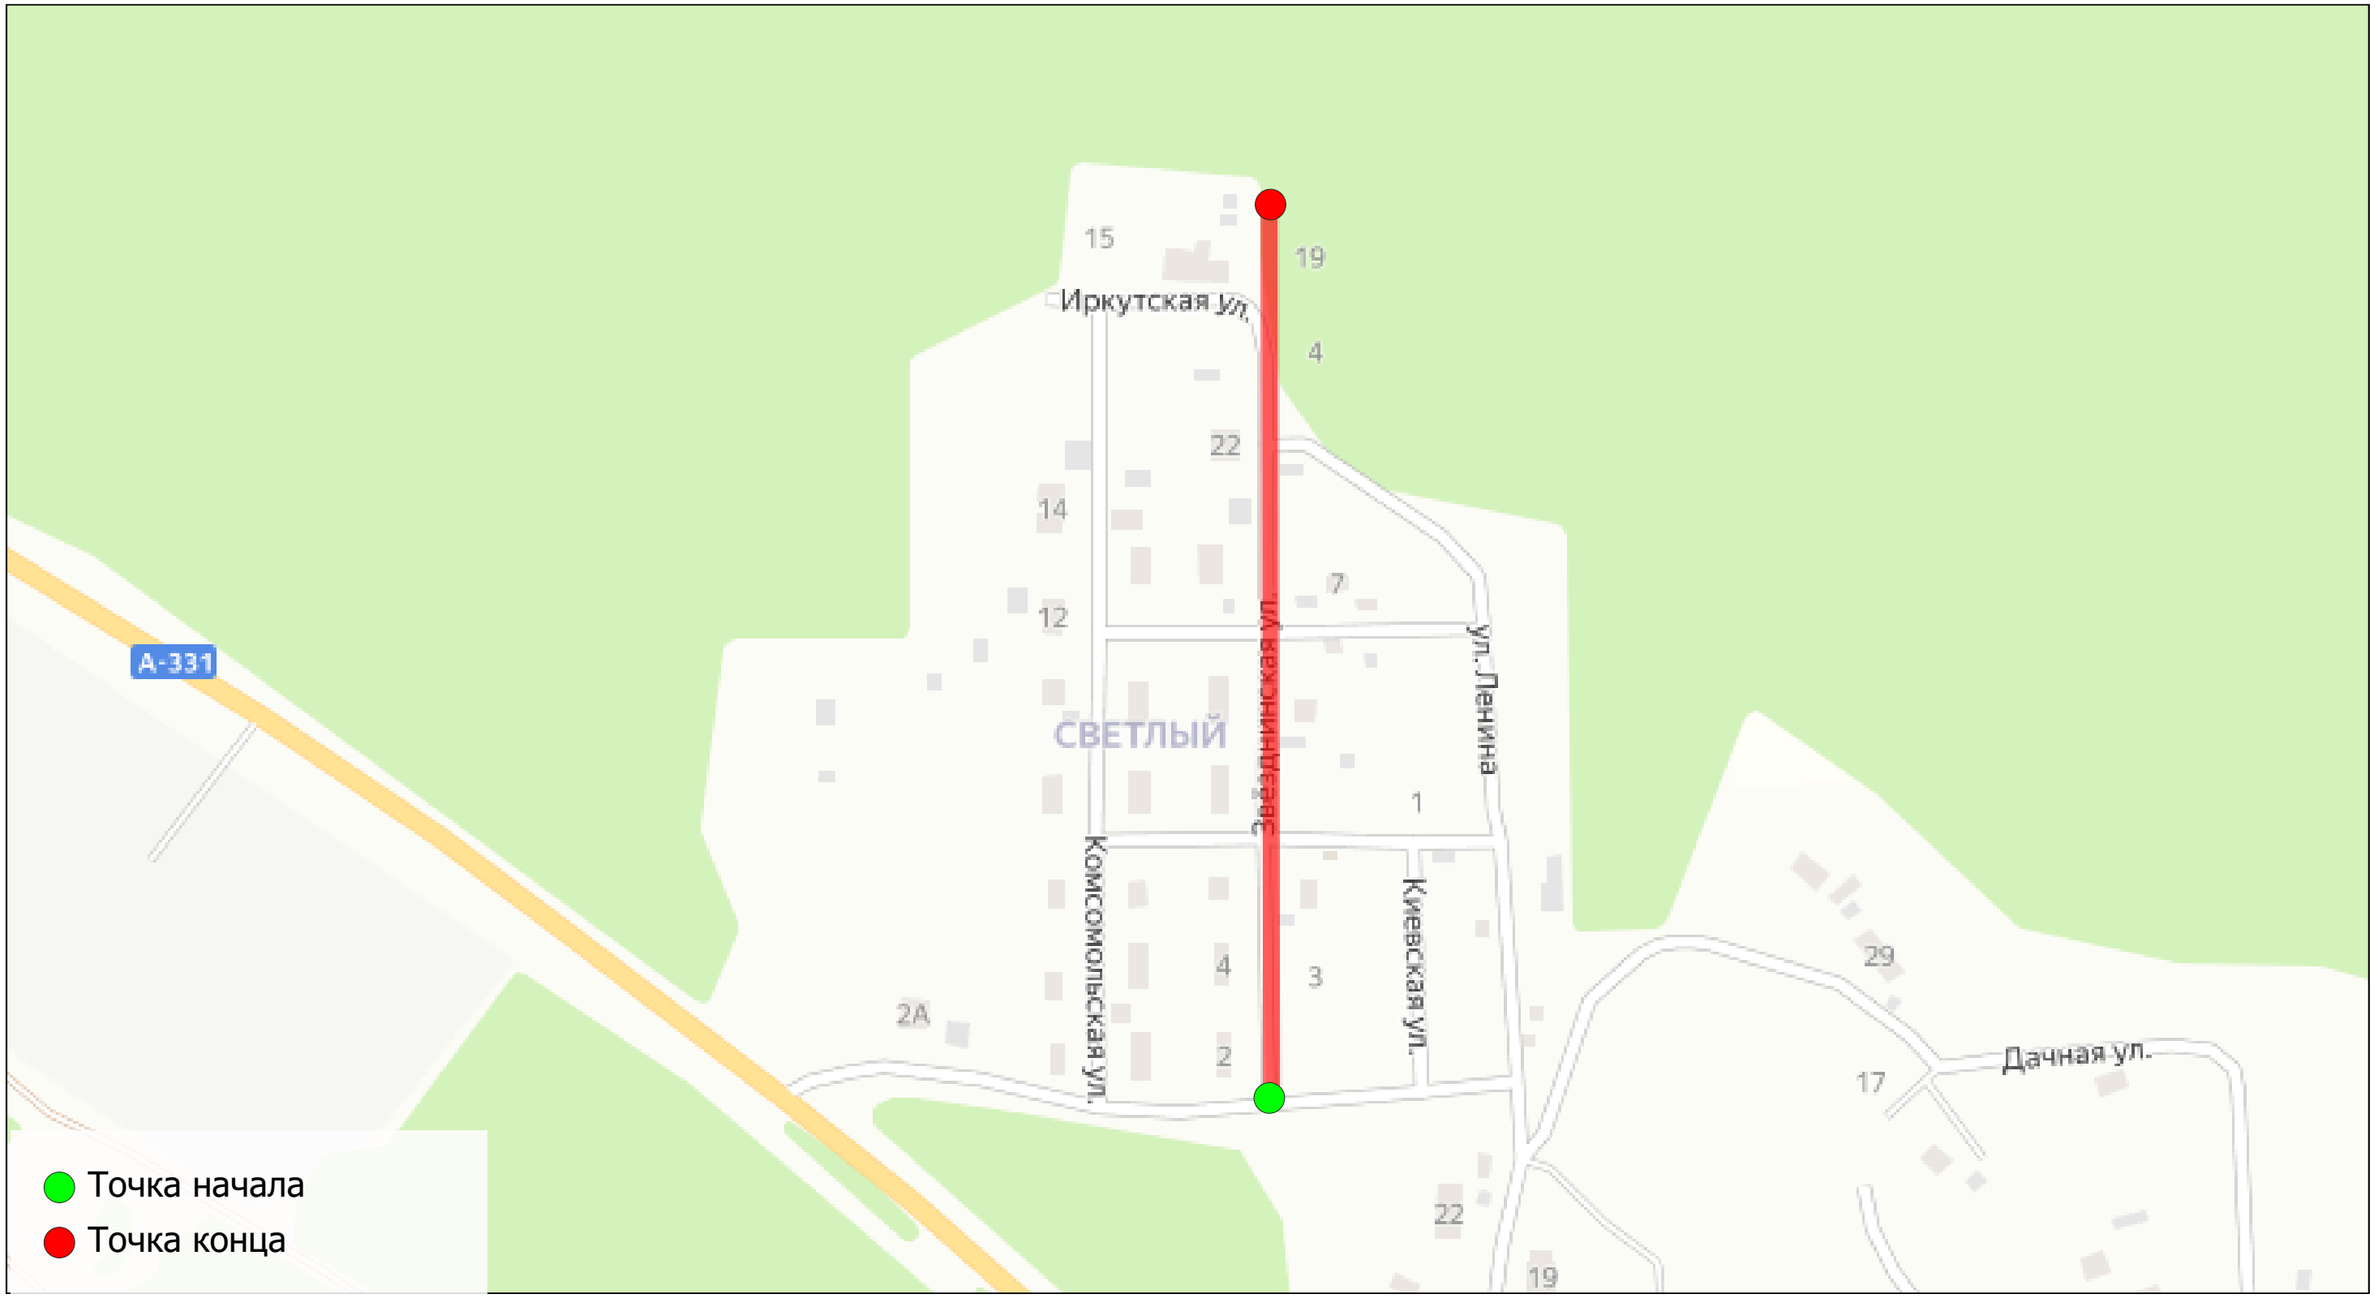

Автодорога от жилого дома по ул. Иркутская, д.17 до жилого дома по ул. Звезднинская д.2

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	96	
Кривые в плане		
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 120	
Характеристики проезжей части	0 4,00	120 3,50

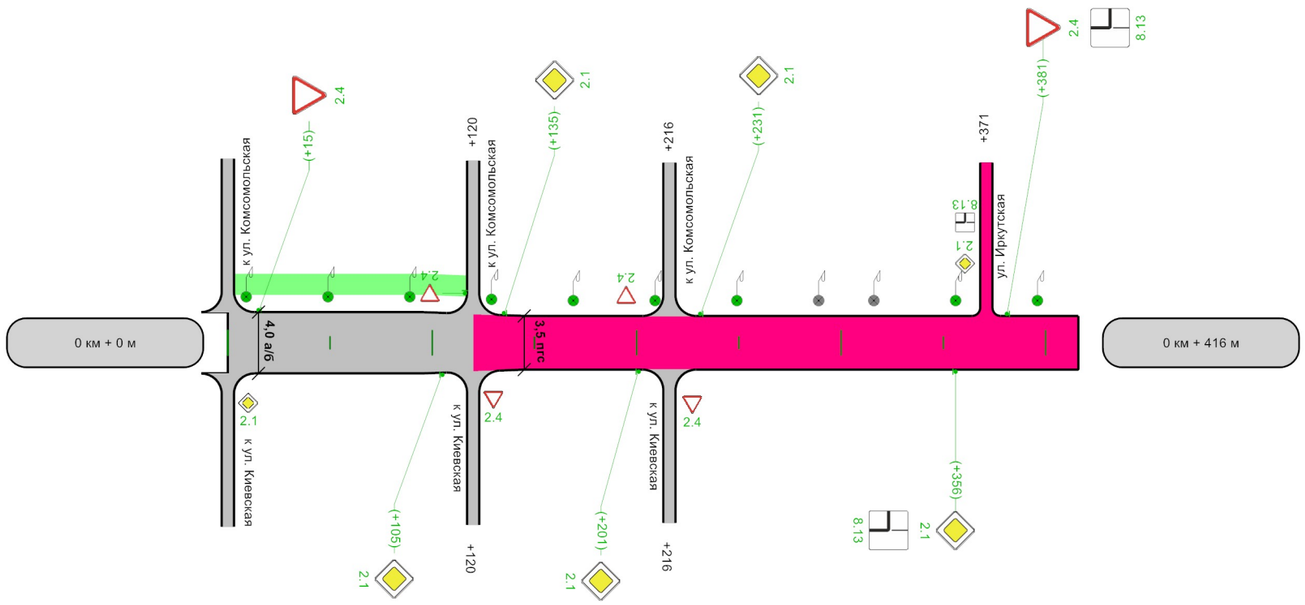

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+201	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+231	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+356	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+381	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**7**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.13	Направление главной дороги			0+356	Требуется установить	1	справа
9	8.13	Направление главной дороги			0+381	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					9	
		Всего:					9	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+249	Населенный пункт	7/7	240	0	Слева
2	0+289	0+316	Населенный пункт	2/2	0	27	Слева
3	0+356	0+396	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**11/11**	**280**	**27**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+120	Жилая застройка	Слева	120	
Итого:					**120**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Зеленая от дома по ул. Су-81, д.1а до жилого дома по ул. Зелёная, 30а

км 0+000 - км 0+720

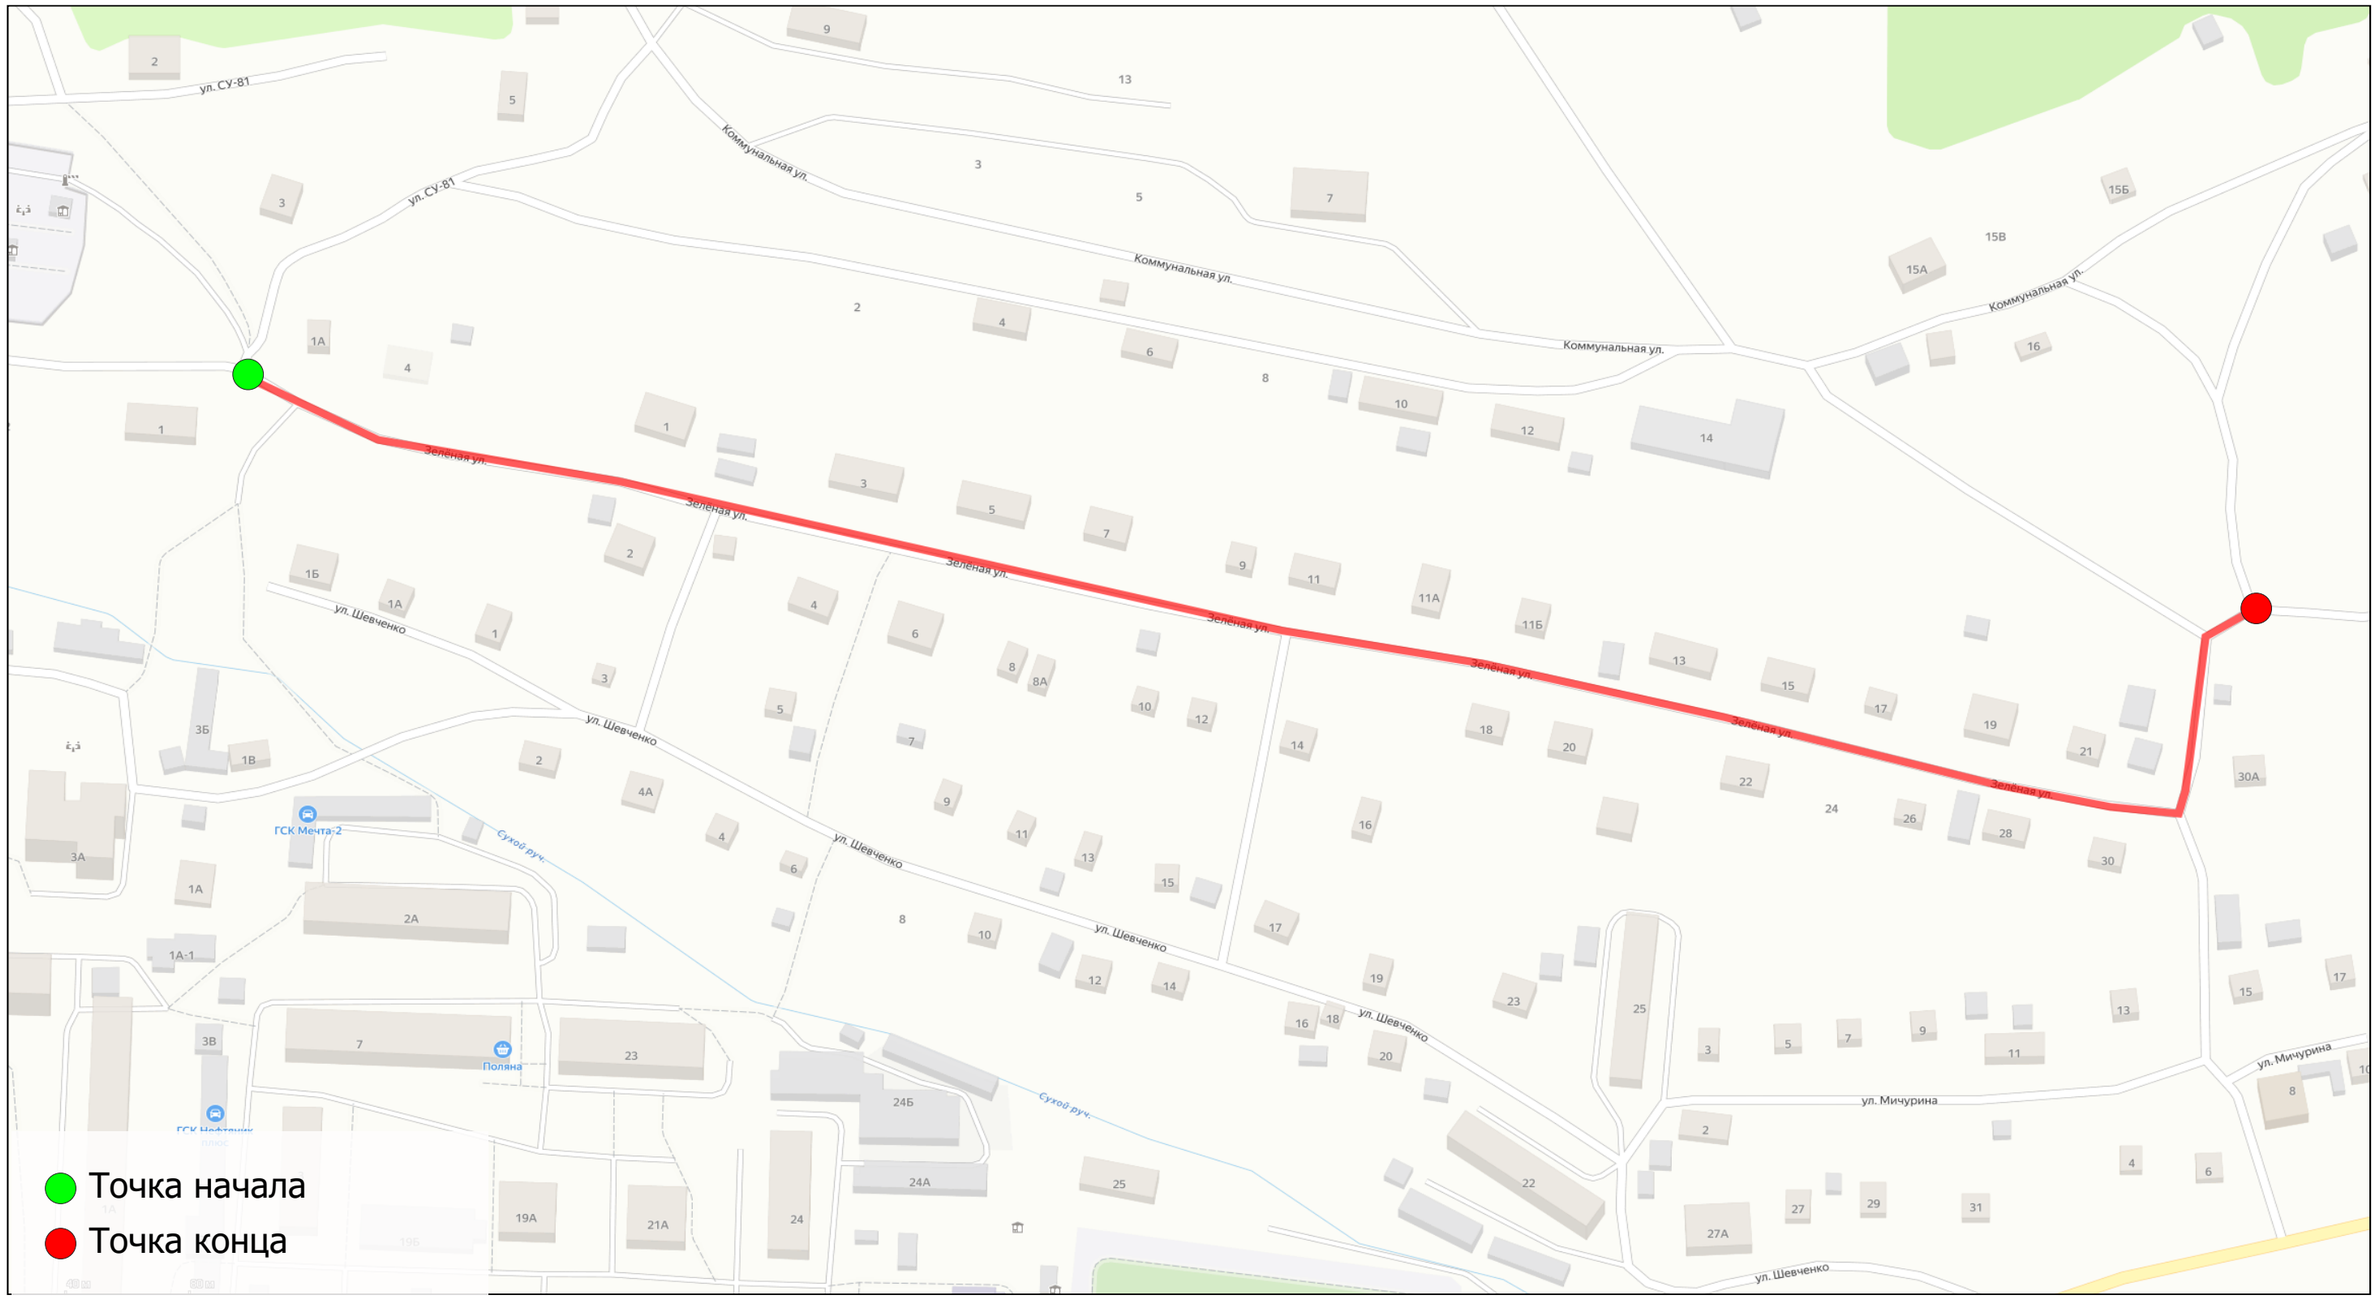

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	29 — 23 (88) — R=3787м — 41 (157) — 42 (180) — R=2187м — 27 (214) — 36 (480) — R=2409м — 79 (583) — 76 (604) — R=688м — 80 (711)
Кривые в плане	109 — 119; 231 R=390м, P=48, a=5° — 263; 592 — R=34м, P=0, a=101° — 678
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 260 — 3,50 — 400 — 3,00

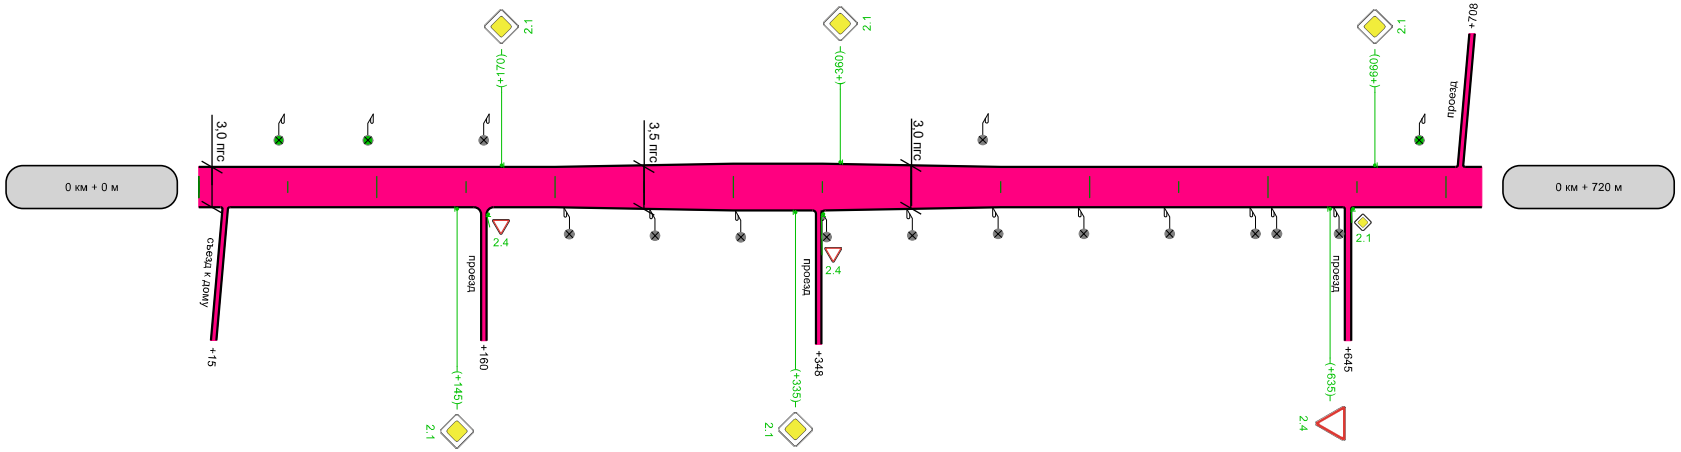

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+145	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+170	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+335	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+360	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+660	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+635	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+045	0+095	Населённый пункт	2/2	50	0	Слева
2	0+160	0+160	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+208	0+593	Населённый пункт	9/9	0	385	Справа
4	0+440	0+440	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+605	0+640	Населённый пункт	2/2	0	35	Справа
6	0+685	0+685	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**16/16**	**50**	**420**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Красногвардейская, д. 5 до жилого дома по ул. Красной Звезды, д. 21
км 0+000 - км 0+129

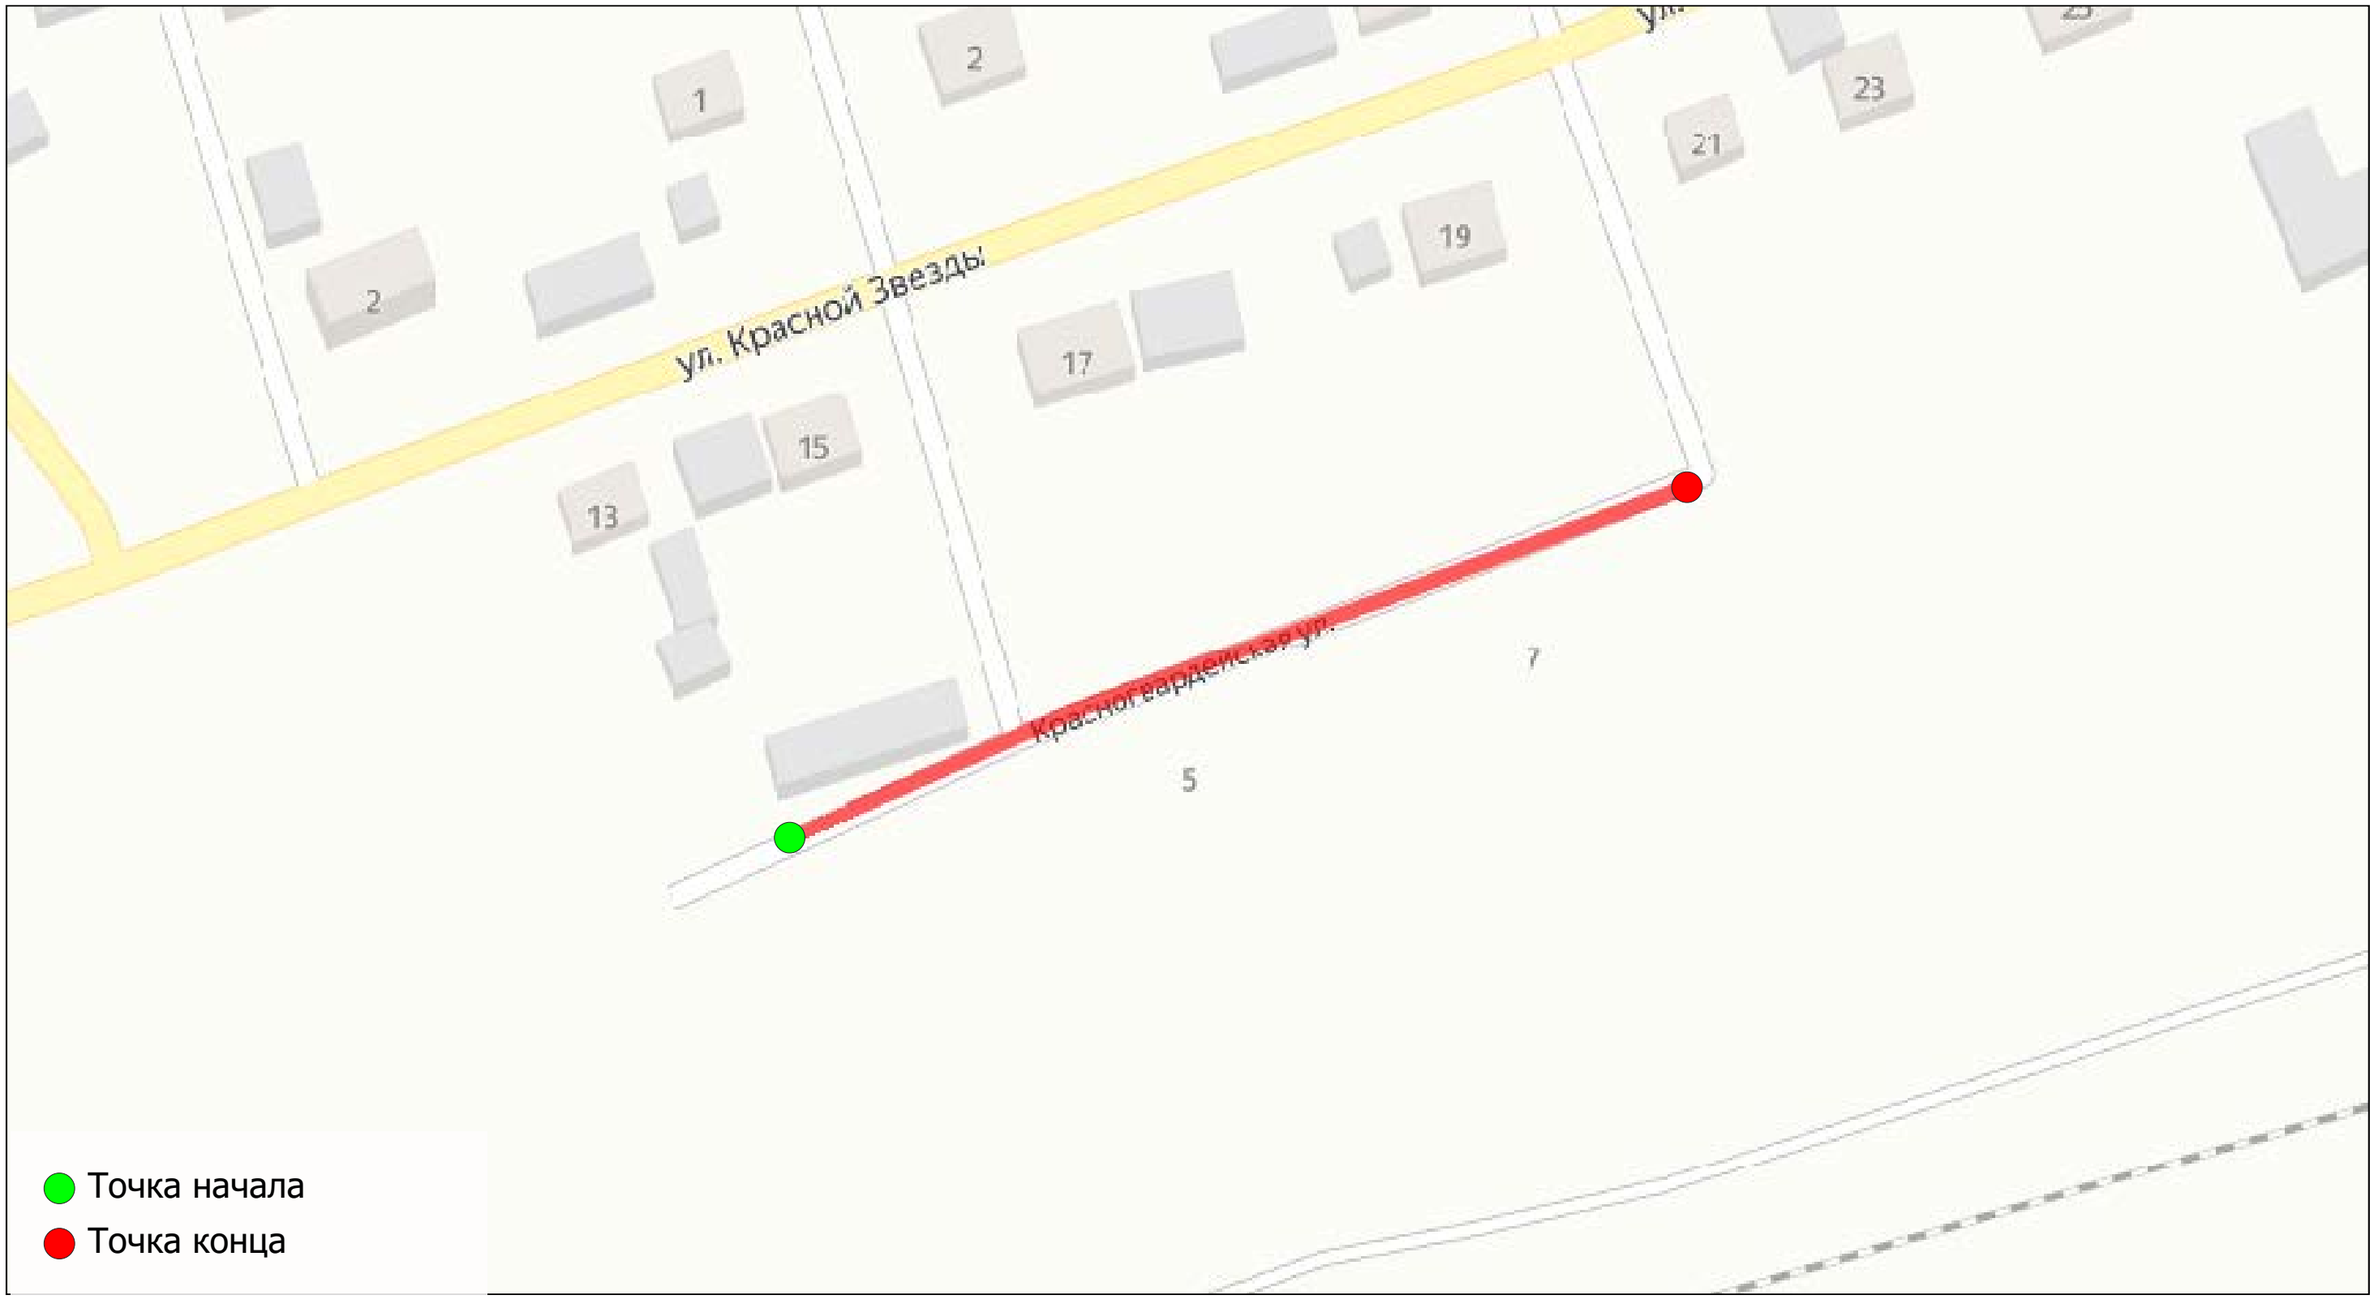

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	82
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

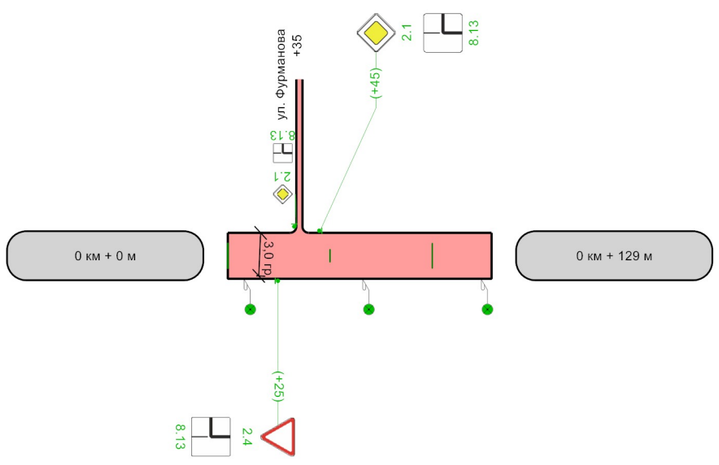

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+033	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+013	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+033	Требуется установить	1	слева
4	8.13	Направление главной дороги			0+013	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+113	Населённый пункт	3/3	103	0	Справа
Итого:				**3/3**	**103**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Крылова: от жилого дома ул. Пушкина, д. 38 б до жилого дома по ул. Горького, д. 29
км 0+000 - км 0+304

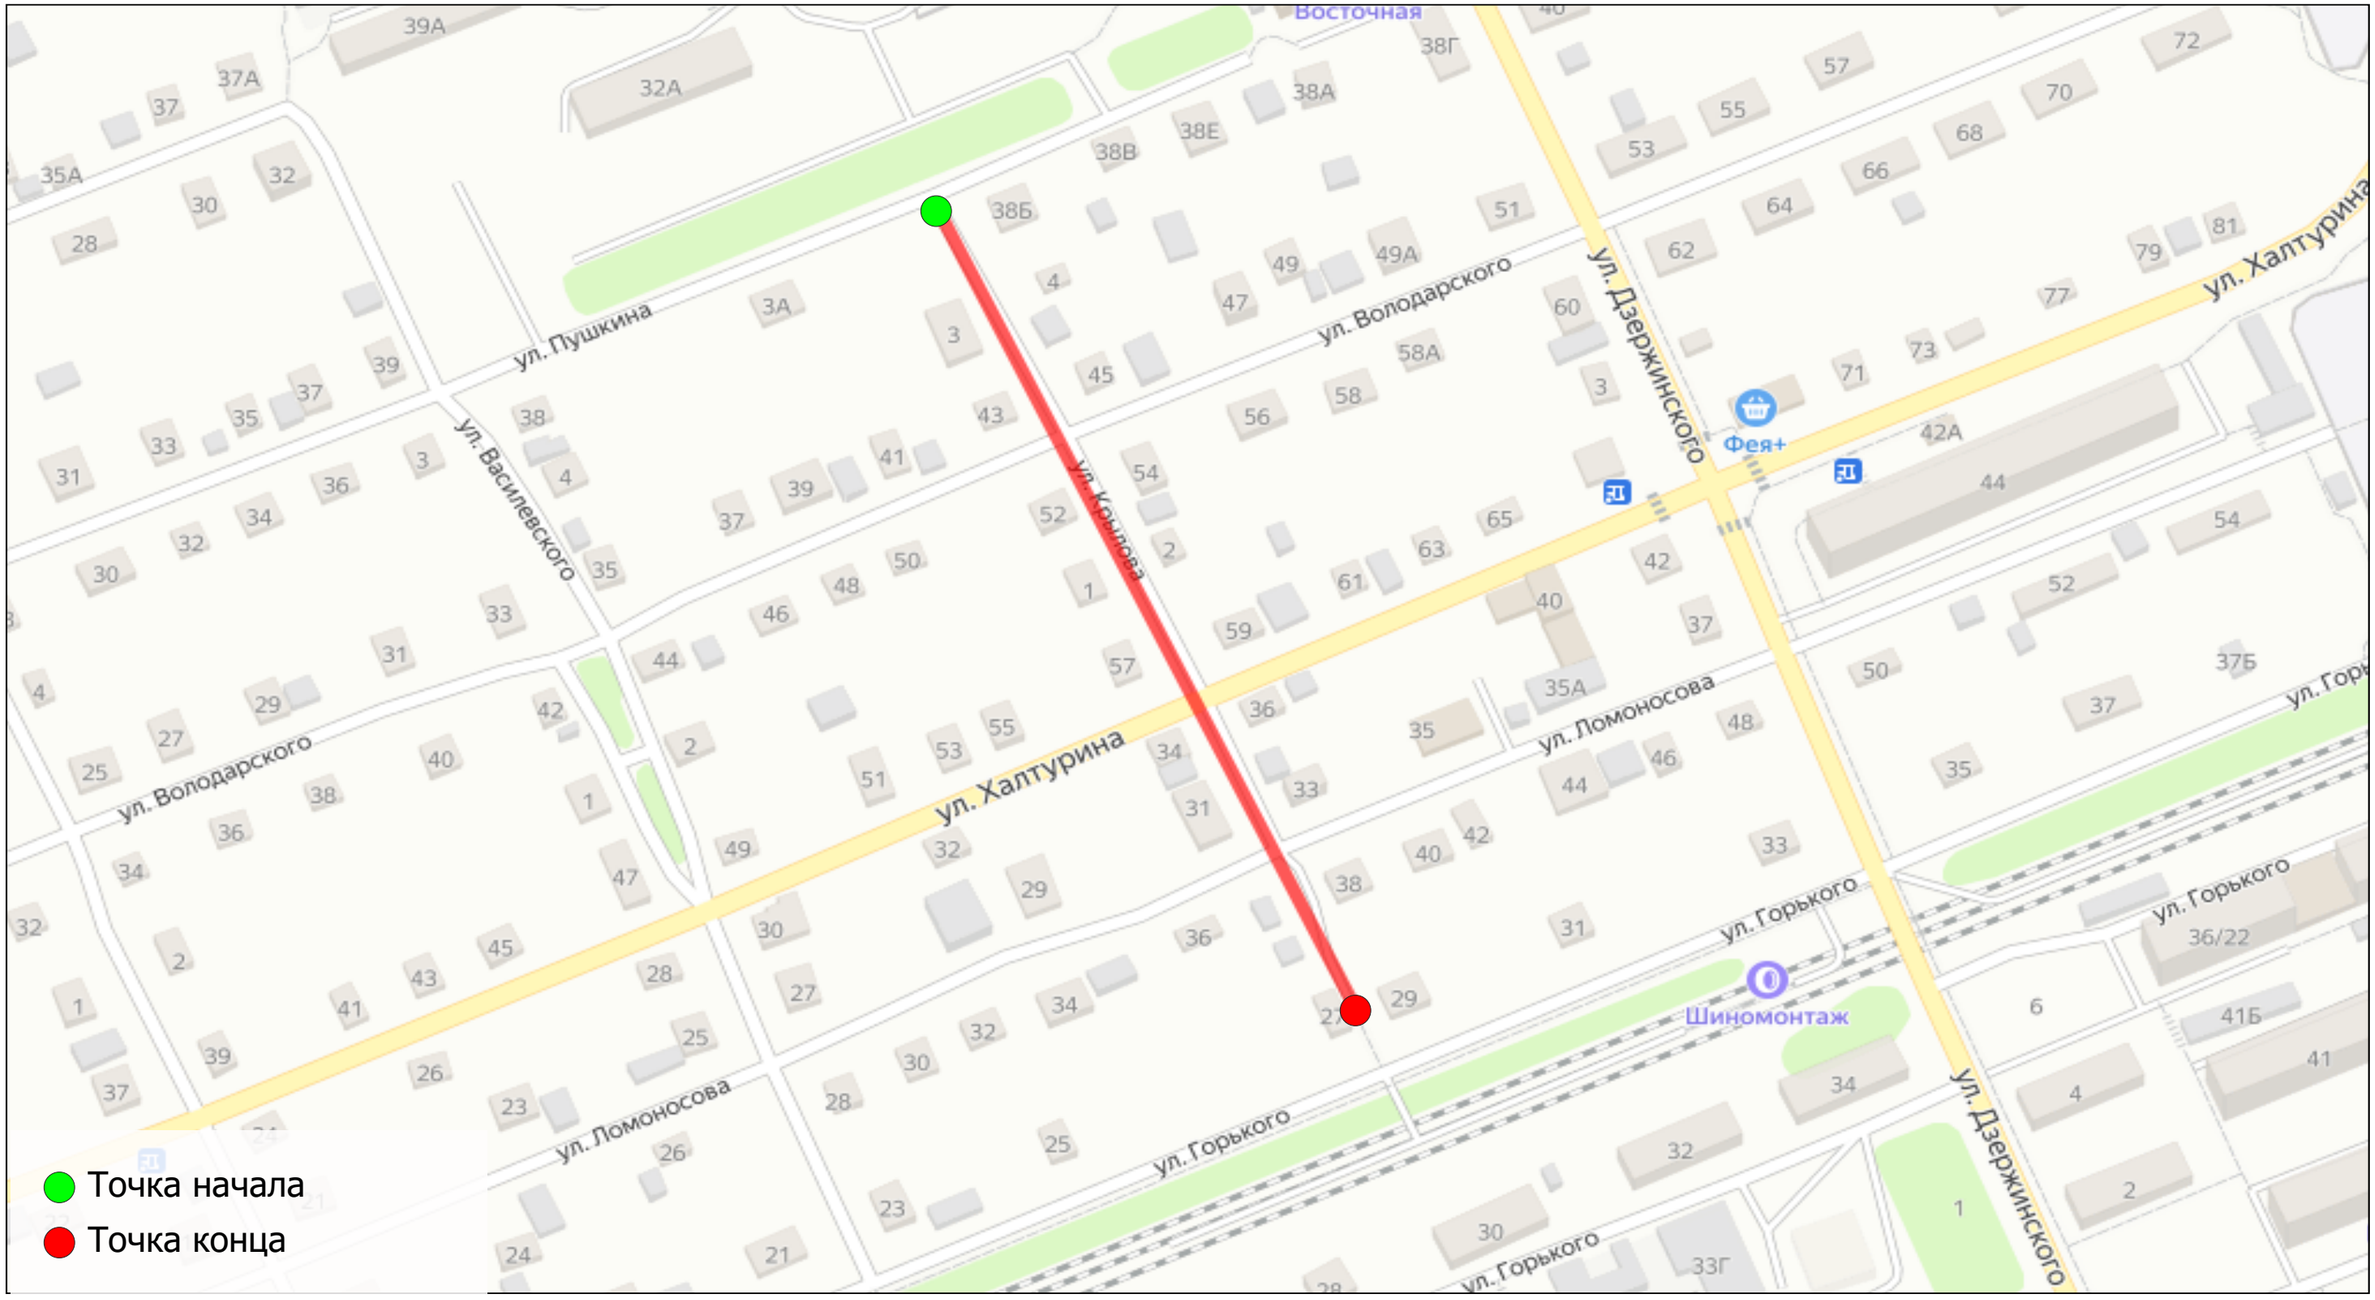

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	137 / 2 / R=4220м / 100 / 155
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00 | 4,50 | 4,00 | 110 | 4,50

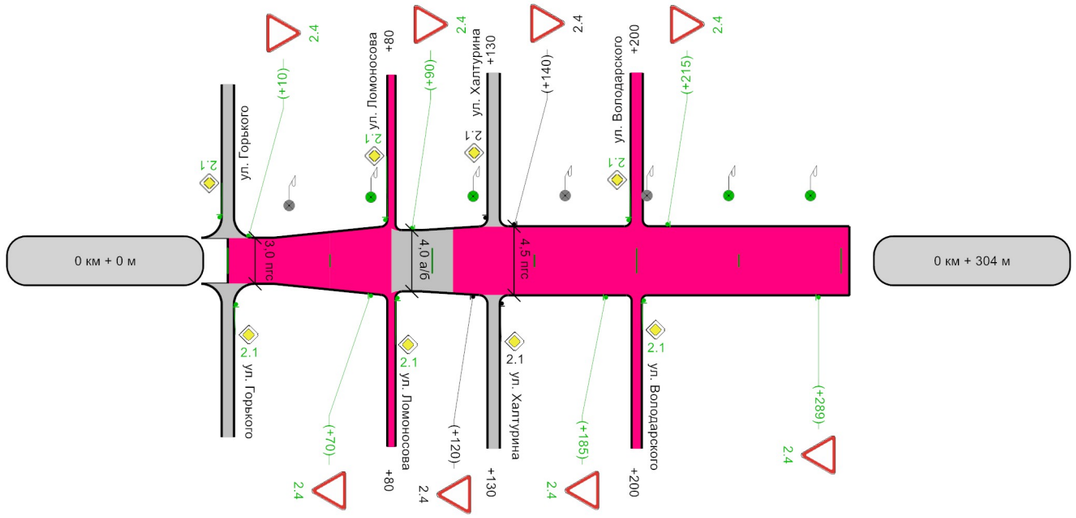

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+200	Требуется установить	2	справа на примыкании
2	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+070	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+090	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+120	Установлено	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+140	Установлено	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+185	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+215	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+289	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**10**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+030	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+070	0+070	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+120	0+120	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+165	0+165	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+205	0+205	Населённый пункт	1/1	0	0	Слева
6	0+245	0+285	Населённый пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**7/7**	**40**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Куйбышева, д. 1а до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»


1-й участок: км 0+000 - км 0+423
2-й участок: км 0+000 - км 0+335
3-й участок: км 0+000 - км 0+133
4-й участок: км 0+000 - км 0+133

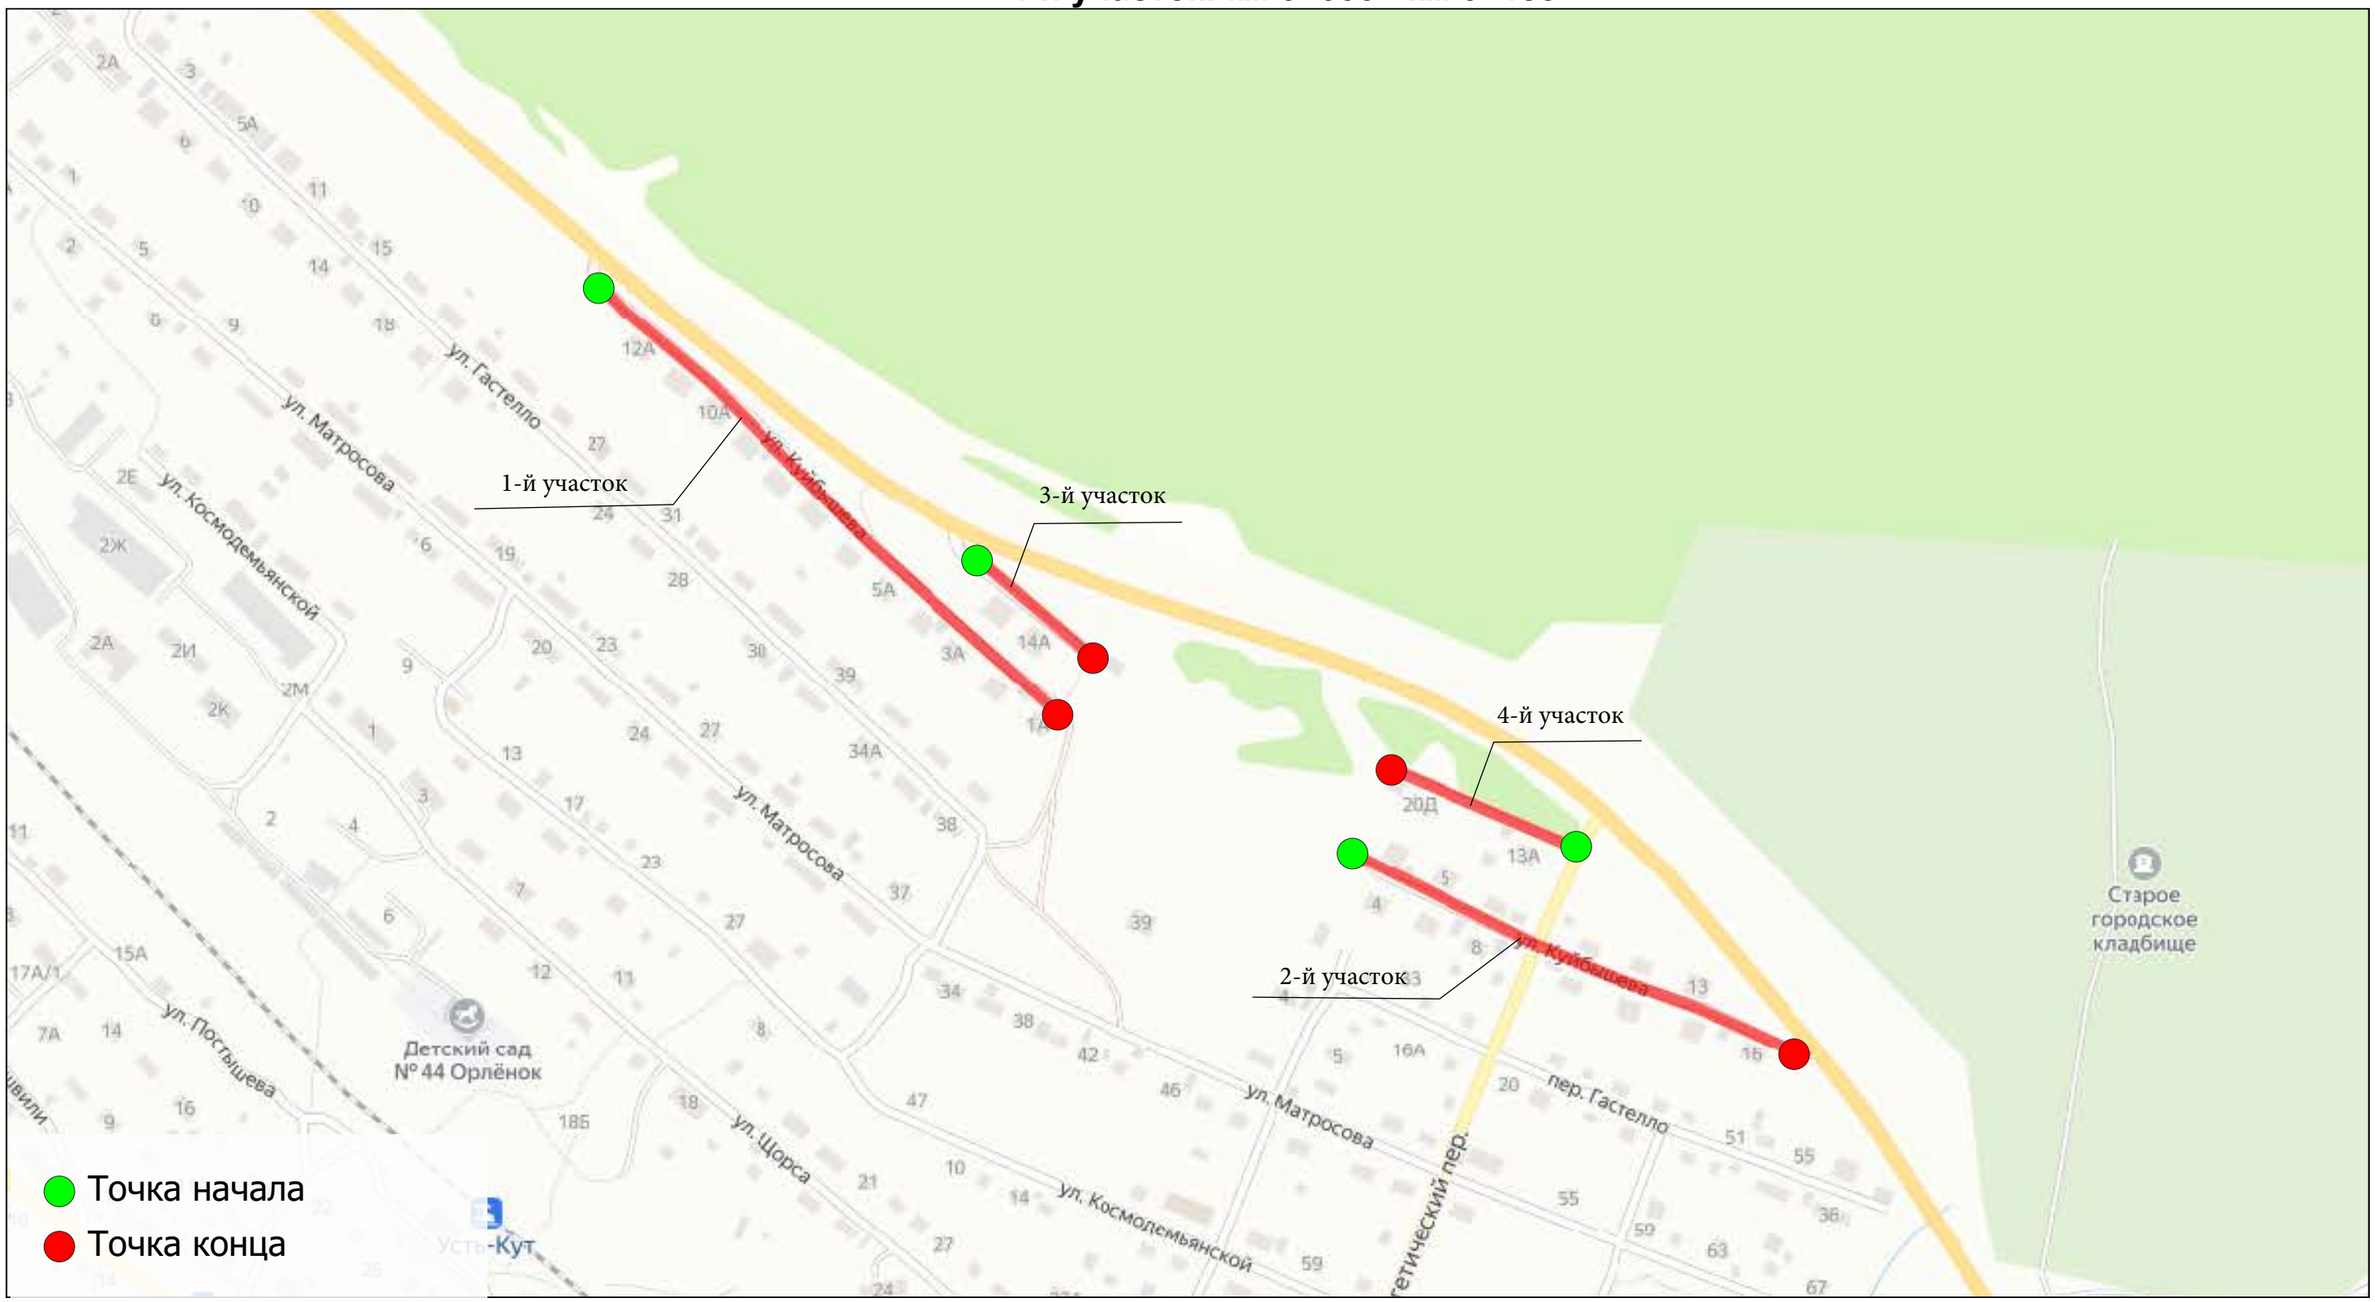

М 1:3000


Горизонтальная дорожная разметка слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
Кривые в плане
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
41
2
R=1708м
13
94
13
127
R=4615м
27
311
28
R=141м
P=17, a=6°
70
4,00

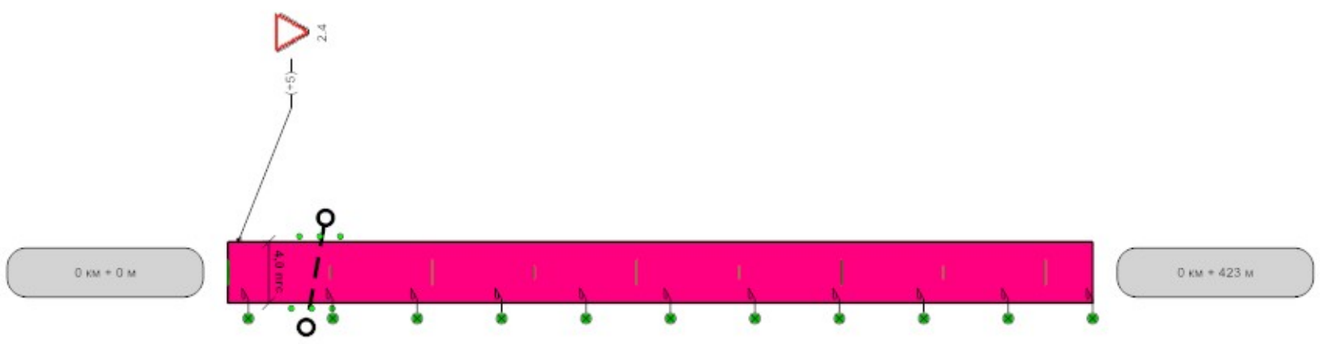
2,4
4,0 пгс
0 км + 0 м
0 км + 423 м


Горизонтальная дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+031	0+051	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+035	0+055	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+423	Населенный пункт	11/11	413	0	Справа
Итого:				**11/11**	**413**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 61 — 11 — R=4802м — 137 — 5 — 262 — 6 — R=1313м
Кривые в плане	131 — R=522м, P=59; a=5° — 189
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50

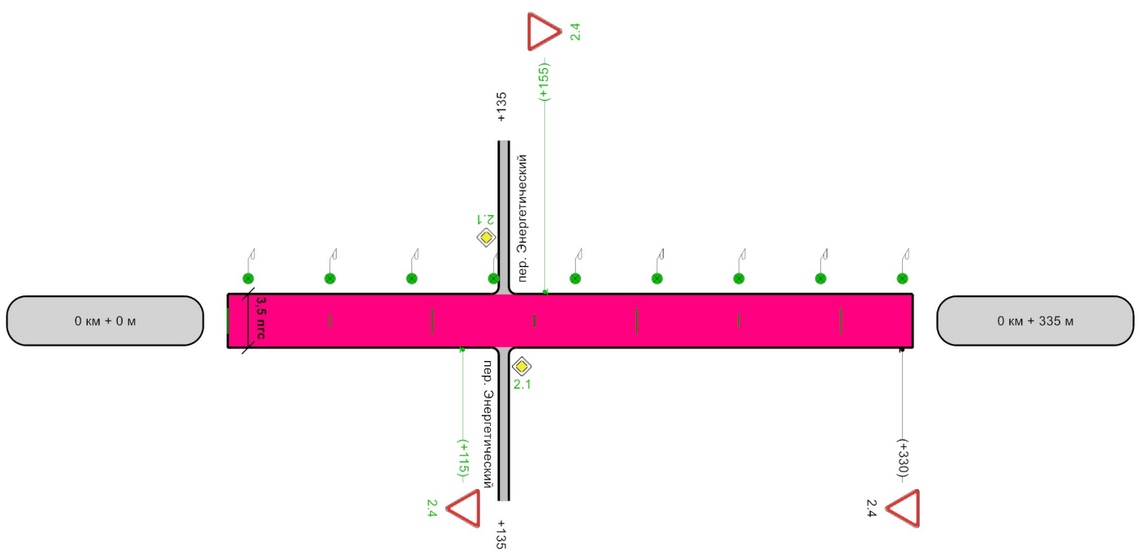

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+115	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+155	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+330	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+330	Населенный пункт	9/9	320	0	Слева
Итого:				**9/9**	**320**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	135 R=886м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

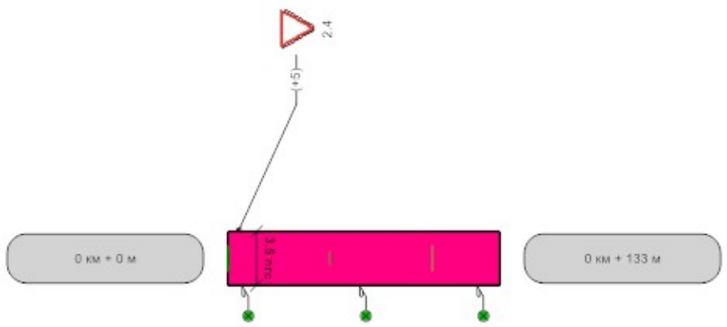

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+125		3/3	115	0	Справа
Итого:				**3/3**	**115**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	5,00 | 44 | 3,50

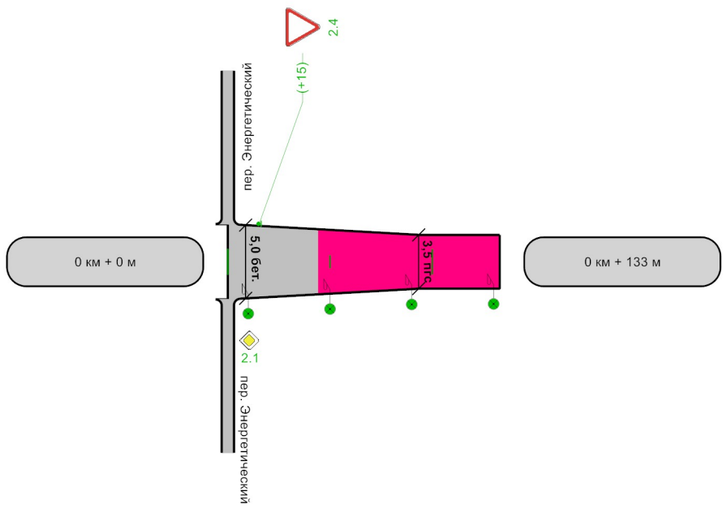

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+130	Населенный пункт	4/4	120	0	Справа
Итого:				**4/4**	**120**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Кутская, д. 40 до автодороги ул. Благополучная


1-й участок: км 0+000 - км 0+868
2-й участок: км 0+000 - км 0+640

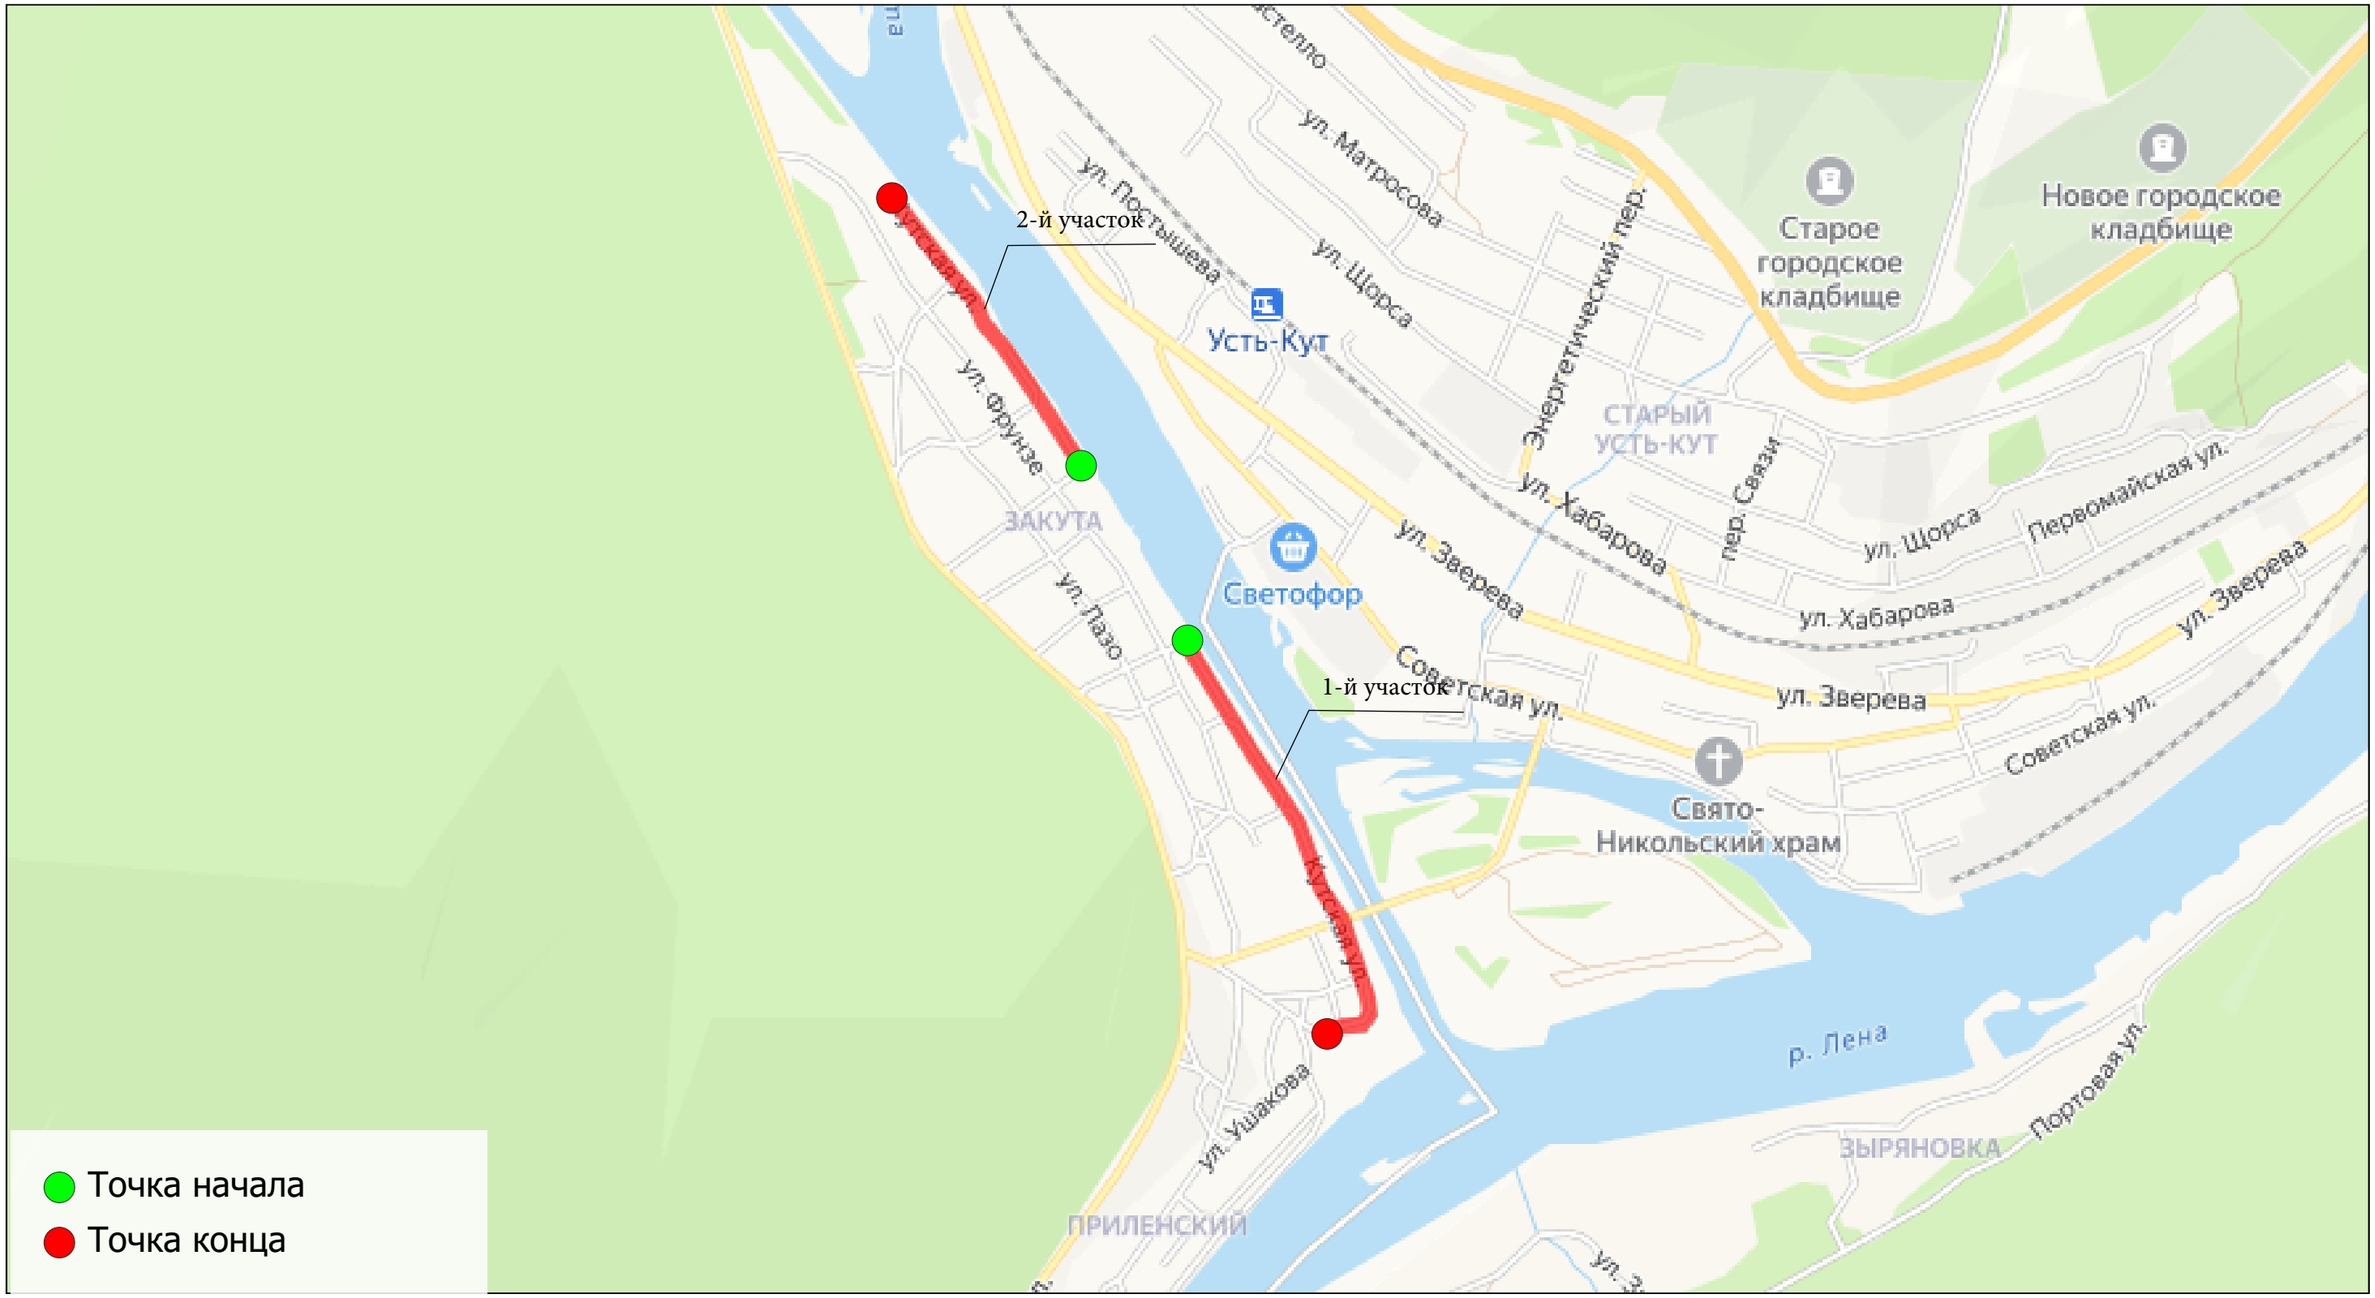


М 1:3000

Автодорога от жилого дома по ул. Кутская, д. 40 до автодороги ул. Благополучная, 1-й участок



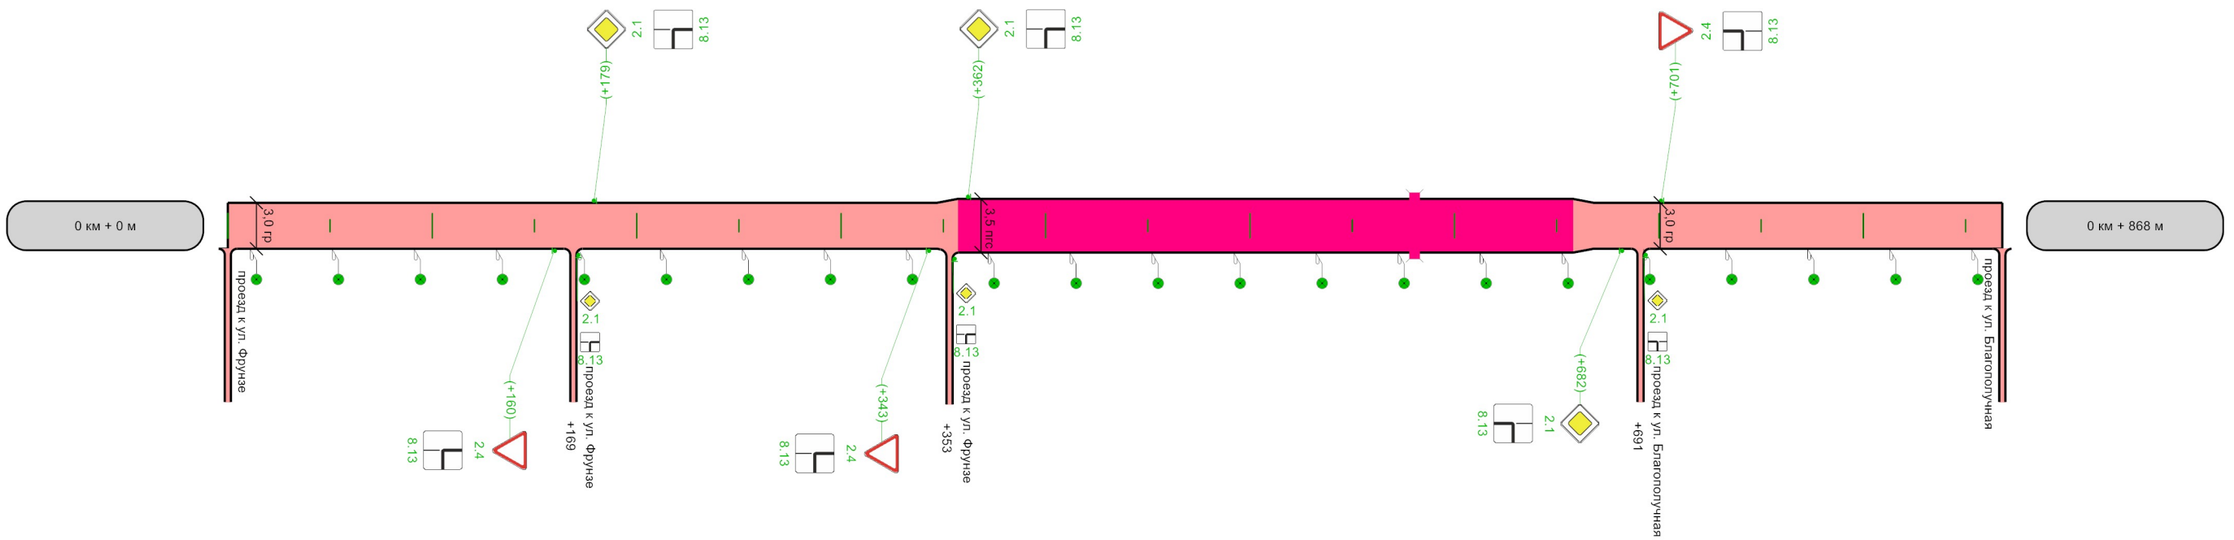



СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+179	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+362	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+682	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+160	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+343	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+701	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+682	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+179	Требуется установить	1	слева
9	8.13	Направление главной дороги			0+362	Требуется установить	1	слева
10	8.13	Направление главной дороги			0+701	Требуется установить	1	слева
11	8.13	Направление главной дороги			0+160	Требуется установить	1	справа
12	8.13	Направление главной дороги			0+343	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+014	0+856	Населенный пункт	22/22	842	0	Справа
Итого:				**22/22**	**842**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	29 27 14 5 7 17 8 R=7389м 102109 160 367 R=13048м 498
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00 400 3,20

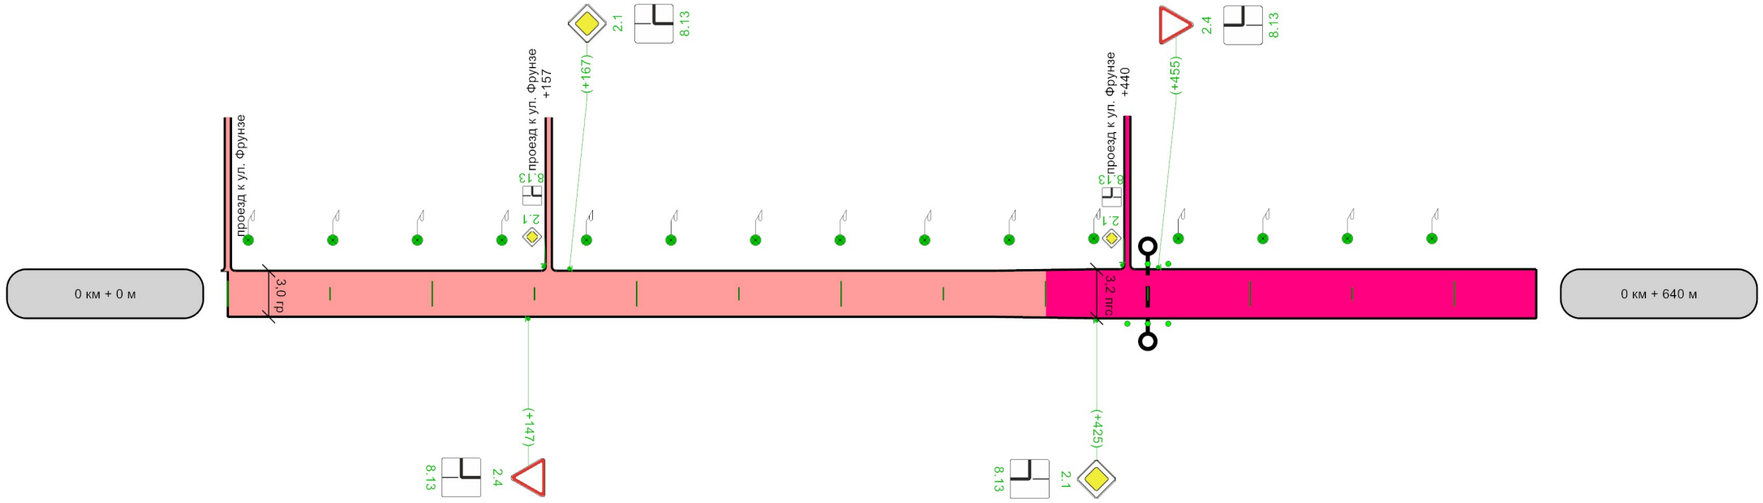

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+167	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+425	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+147	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+455	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.13	Направление главной дороги			0+167	Требуется установить	1	слева
6	8.13	Направление главной дороги			0+425	Требуется установить	1	справа
7	8.13	Направление главной дороги			0+147	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+455	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+440	0+460	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+450	0+460	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**30/5**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+589	Населённый пункт	15/15	579	0	Слева
Итого:				**15/15**	**579**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Есенина, д. 8 до жилого дома по ул. Есенина, д. 4

1-й участок: км 0+000 - км 0+158
2-й участок: км 0+000 - км 0+102



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Зуст.,
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	106 87 117 R=3229м 143 97	
Кривые в плане	10 R=421м P=16; a=15° 106	
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части	5,00	4,00

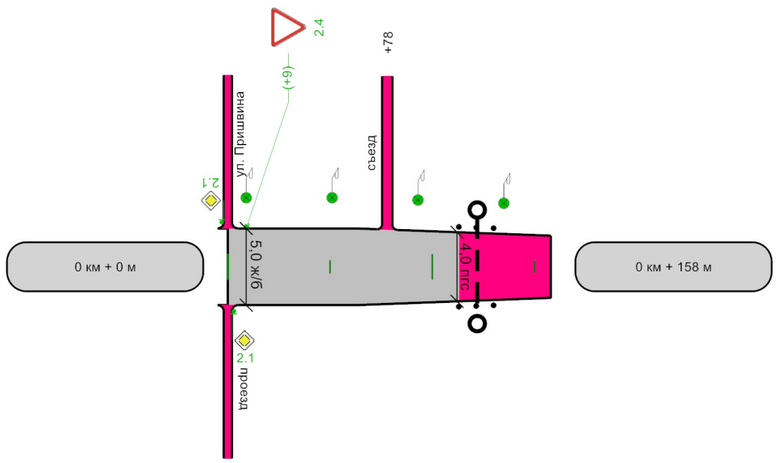

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		Зуст.,
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+000	Требуется установить	1	слева на пересечении
2	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+135	Населённый пункт	4/4	126	0	Слева
Итого:				**4/4**	**126**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	32 / 2 R=1903м
Кривые в плане	
Тротуары слева	

Характеристики проезжей части		
	3,00	3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+090	Населённый пункт	3/3	80	0	Слева
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Ковпака, д. 5 до магазина по ул. Трудовая, д. 19а
км 0+000 - км 0+270

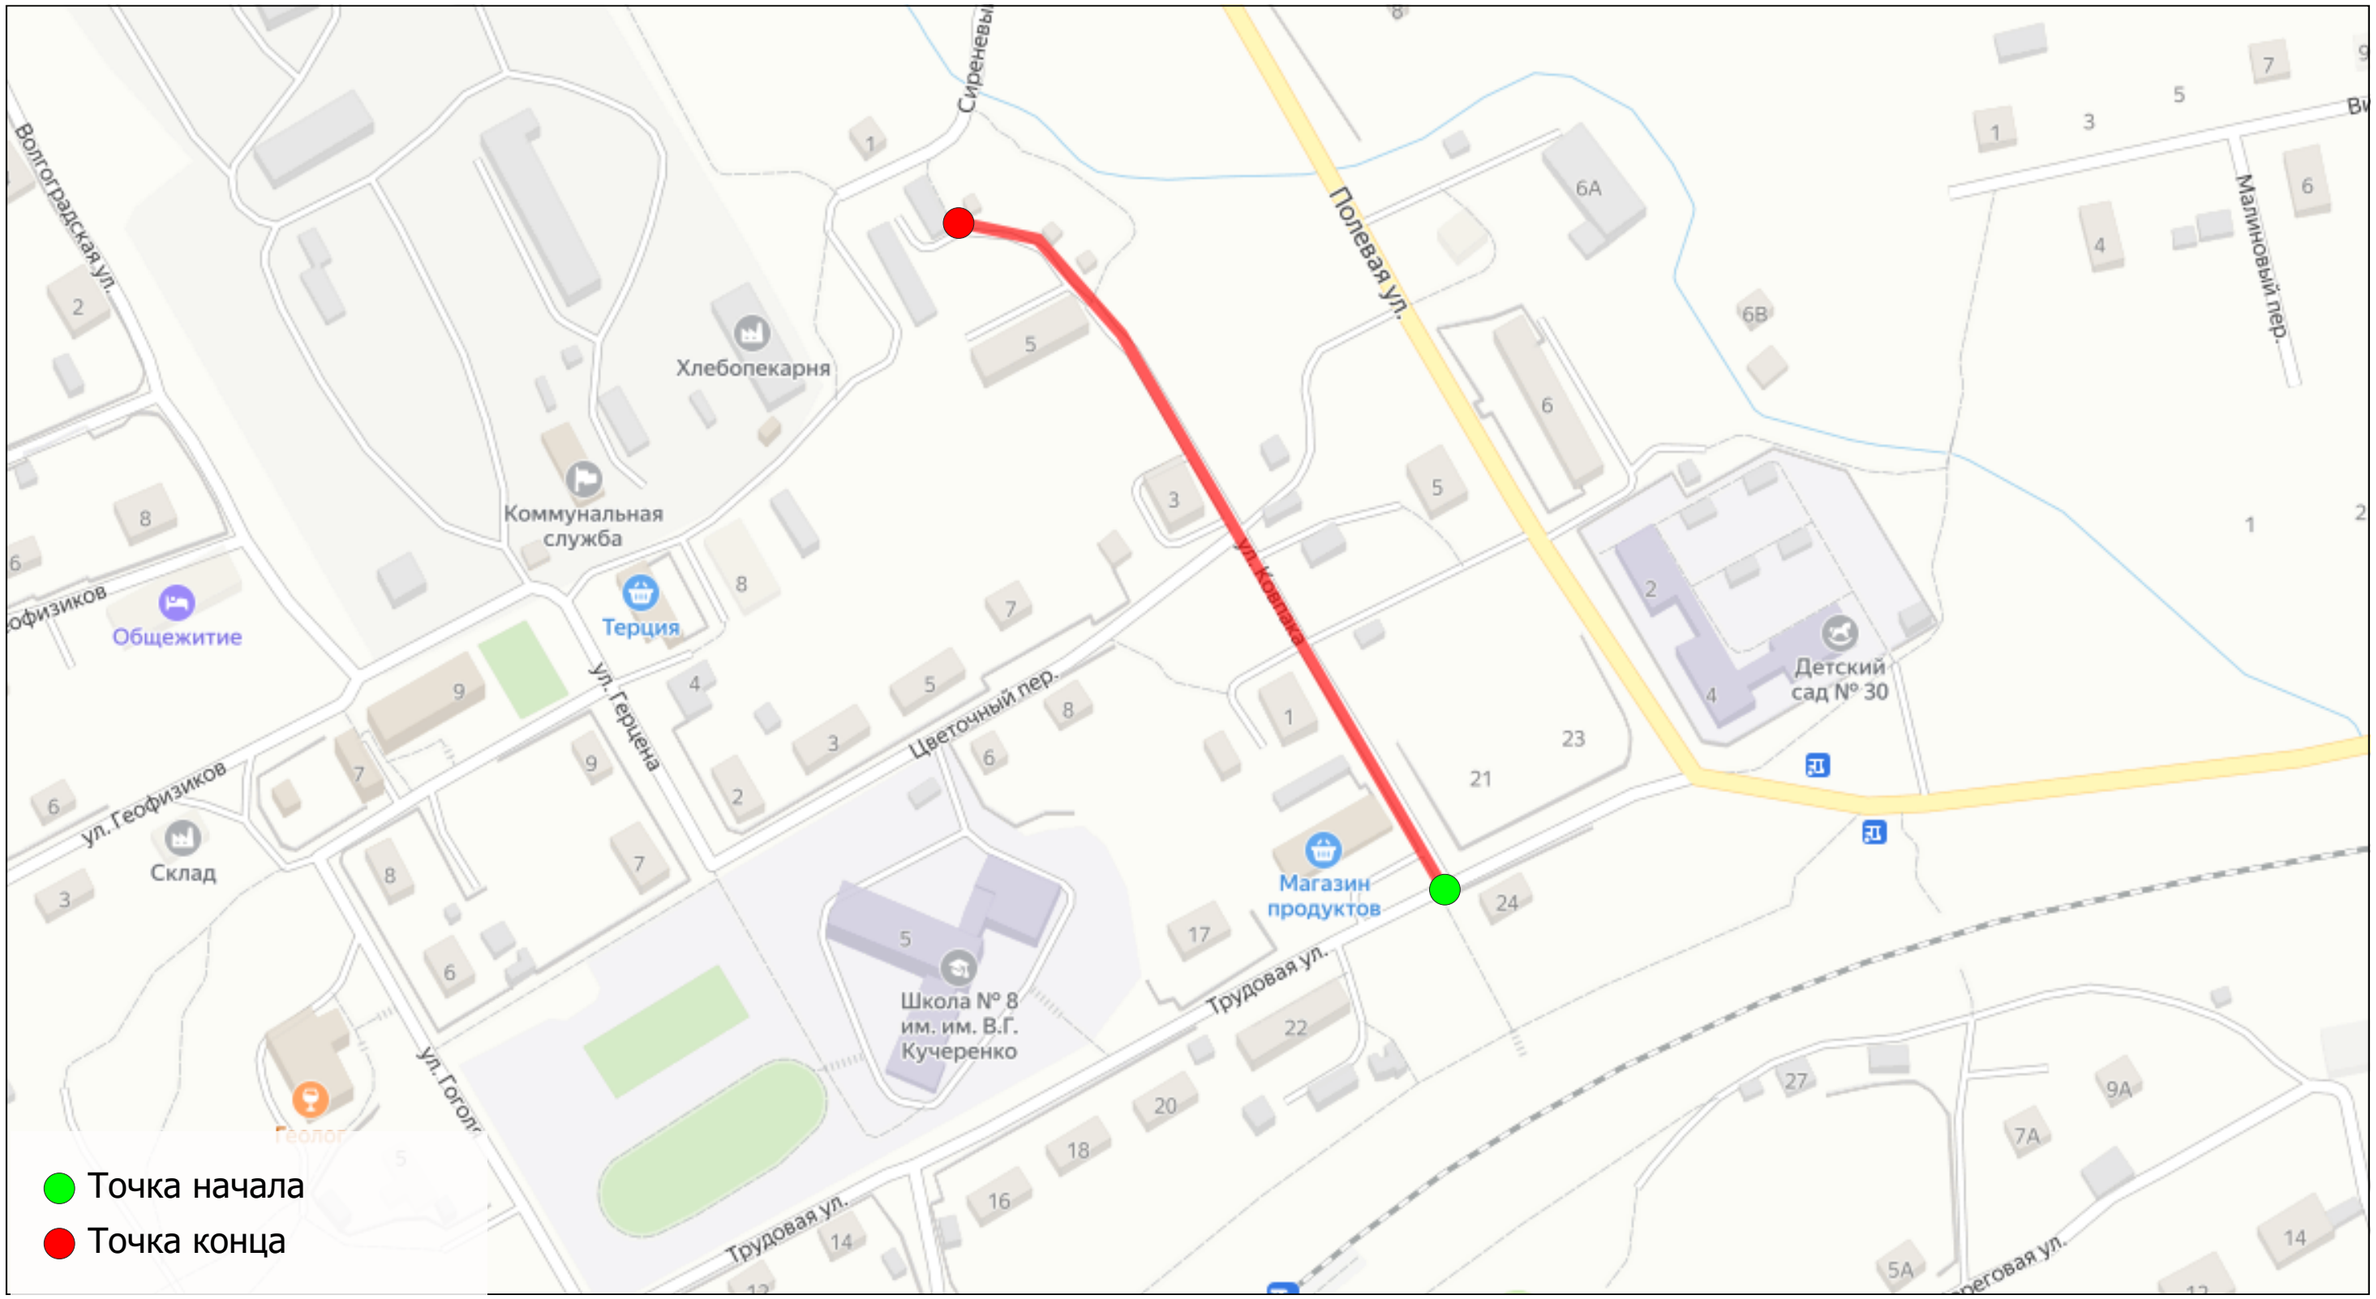

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Элементы дороги в продольном профиле	13 12 7 R=4963м 162 44		
Кривые в плане	185 R=151м P=2; a=38°		
Тротуары слева	ширина 1м, ж/б пл, 0 - 160		
Характеристики проезжей части	0 6,00	4,00	3,00

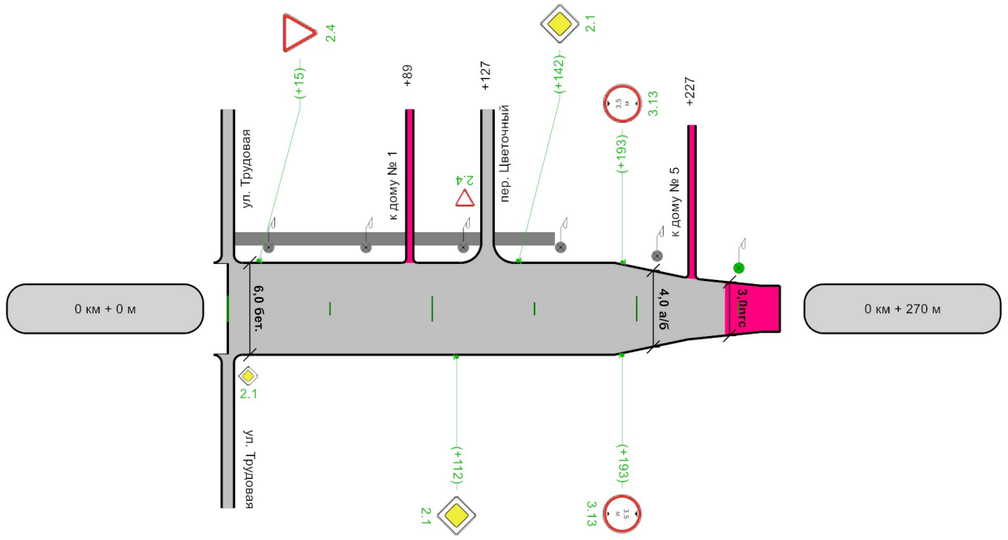

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+112	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+142	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
4	3.13	Ограничение высоты			0+193	Требуется установить	1	слева
5	3.13	Ограничение высоты			0+193	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+210	Населенный пункт	5/5	0	190	Слева
2	0+250	0+250	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**6/6**	**0**	**190**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+160	Жилая застройка	Слева		160
Итого:					**0**	**160**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Коммунальная, д.3 до автомобильной дороги А-331 "Вилюй"

км 0+000 - км 1+662

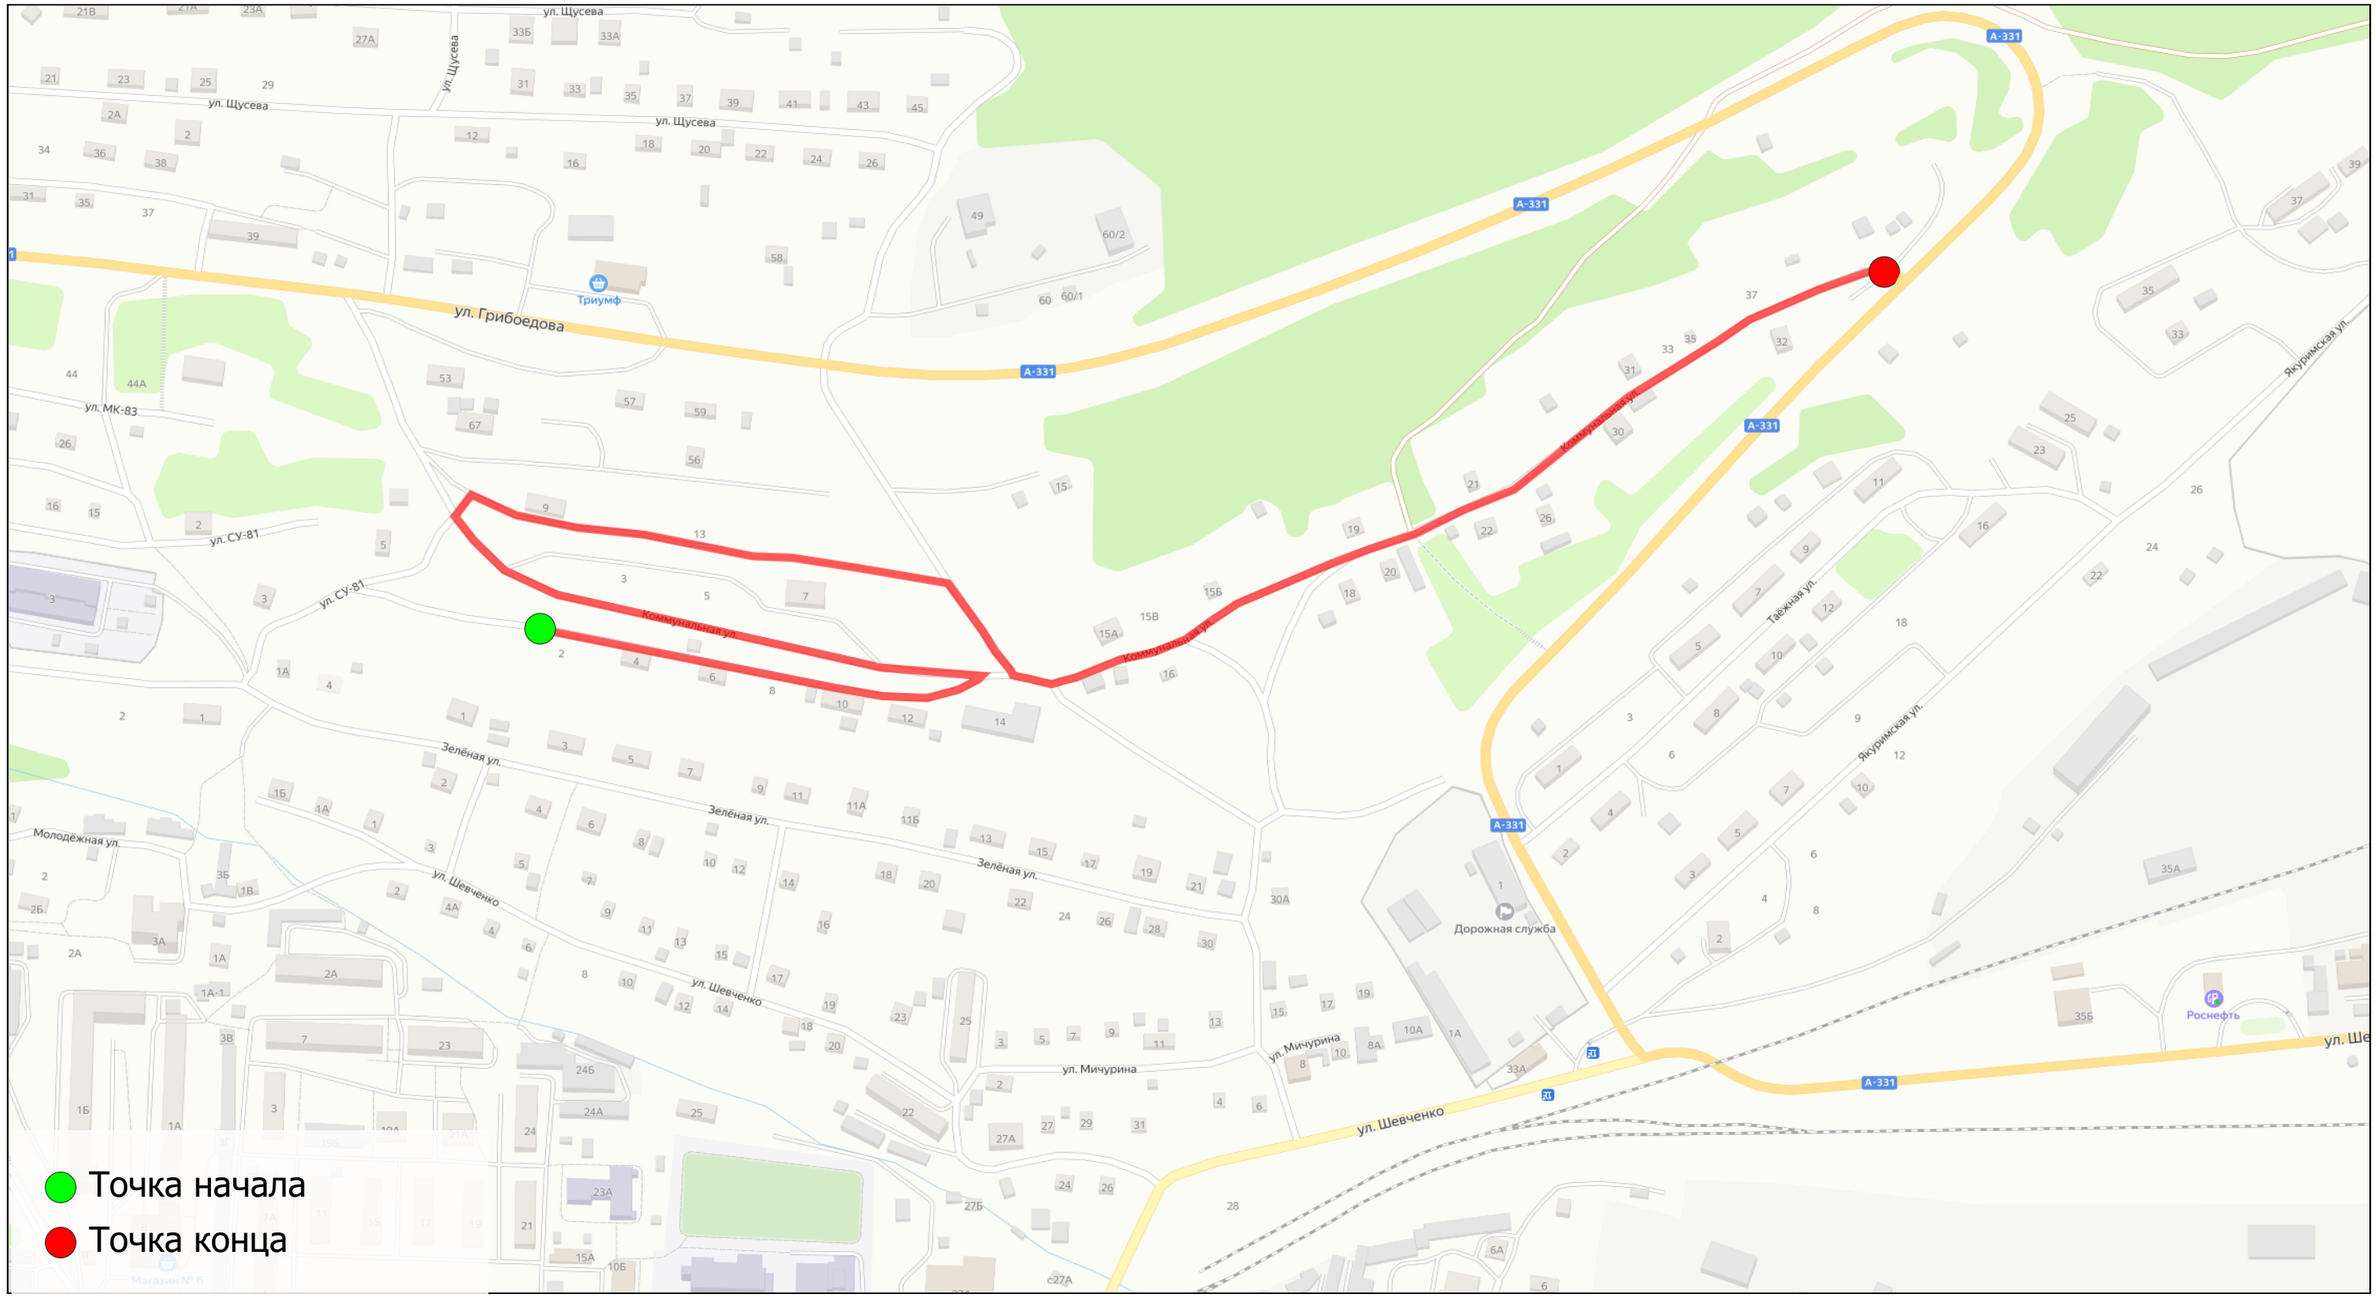


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 139 R=2932м 412 1 485 3 R=5258м 579 21 615 21 R=1976м 675 9 712 9 R=2034м 785 26 825 25 R=3121м 960 17 990 18
Кривые в плане	285294 427 R=55м P=7; a=5° 593 R=280м 710 P=8; a=16° 740 R=1088м 972 P=138; a=5°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50 136 4,00 255 3,00 4

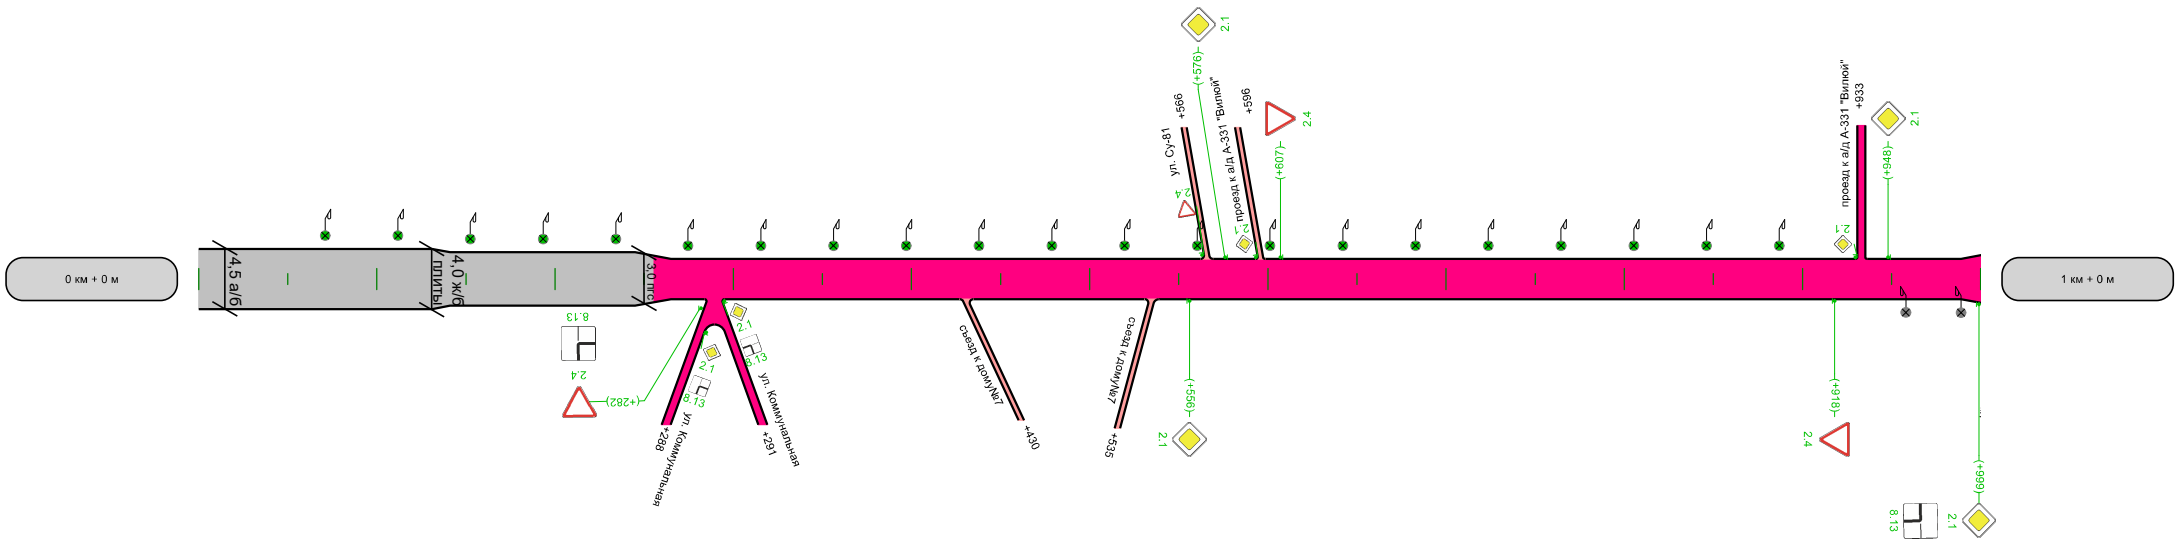

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	18 — R=3799м
Кривые в плане	R=1088м P=138; a=5° 59 — 468 — R=618м — 605
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	666 — 4,00

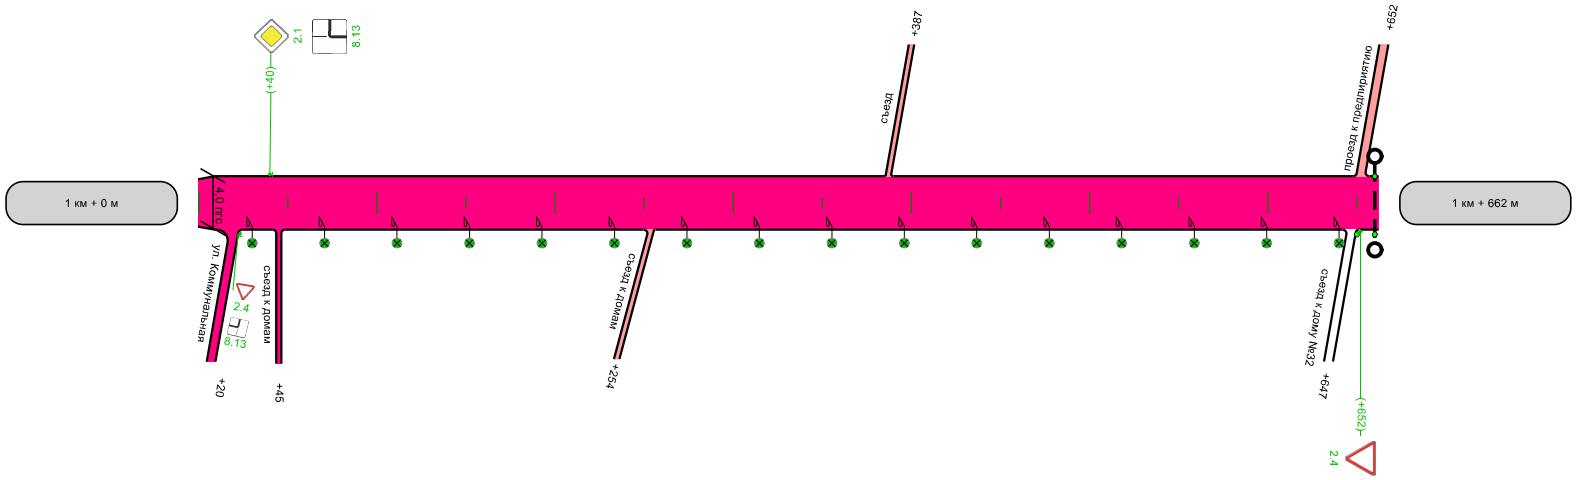

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+556	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+576	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+948	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+999	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			1+040	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+282	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+607	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+918	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			1+652	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги			0+282	Требуется установить	1	справа
11	8.13	Направление главной дороги			0+999	Требуется установить	1	справа
12	8.13	Направление главной дороги			1+040	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**12**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+071	0+887	Населённый пункт	21/21	816	0	Слева
2	0+958	0+989	Населённый пункт	2/2	0	31	Справа
3	1+030	1+640	Населённый пункт	16/16	610	0	Справа
Итого:				**39/39**	**1426**	**31**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+650	1+660	10/2		Справа	Пластик	Водопропускная труба
2	1+660	1+660	10/2		Слева	Пластик	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**				


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от многоквартирного дома по переулку Комсомольский д. 1 до жилого дома по переулку Комсомольский д. 2
км 0+000 - км 0+196

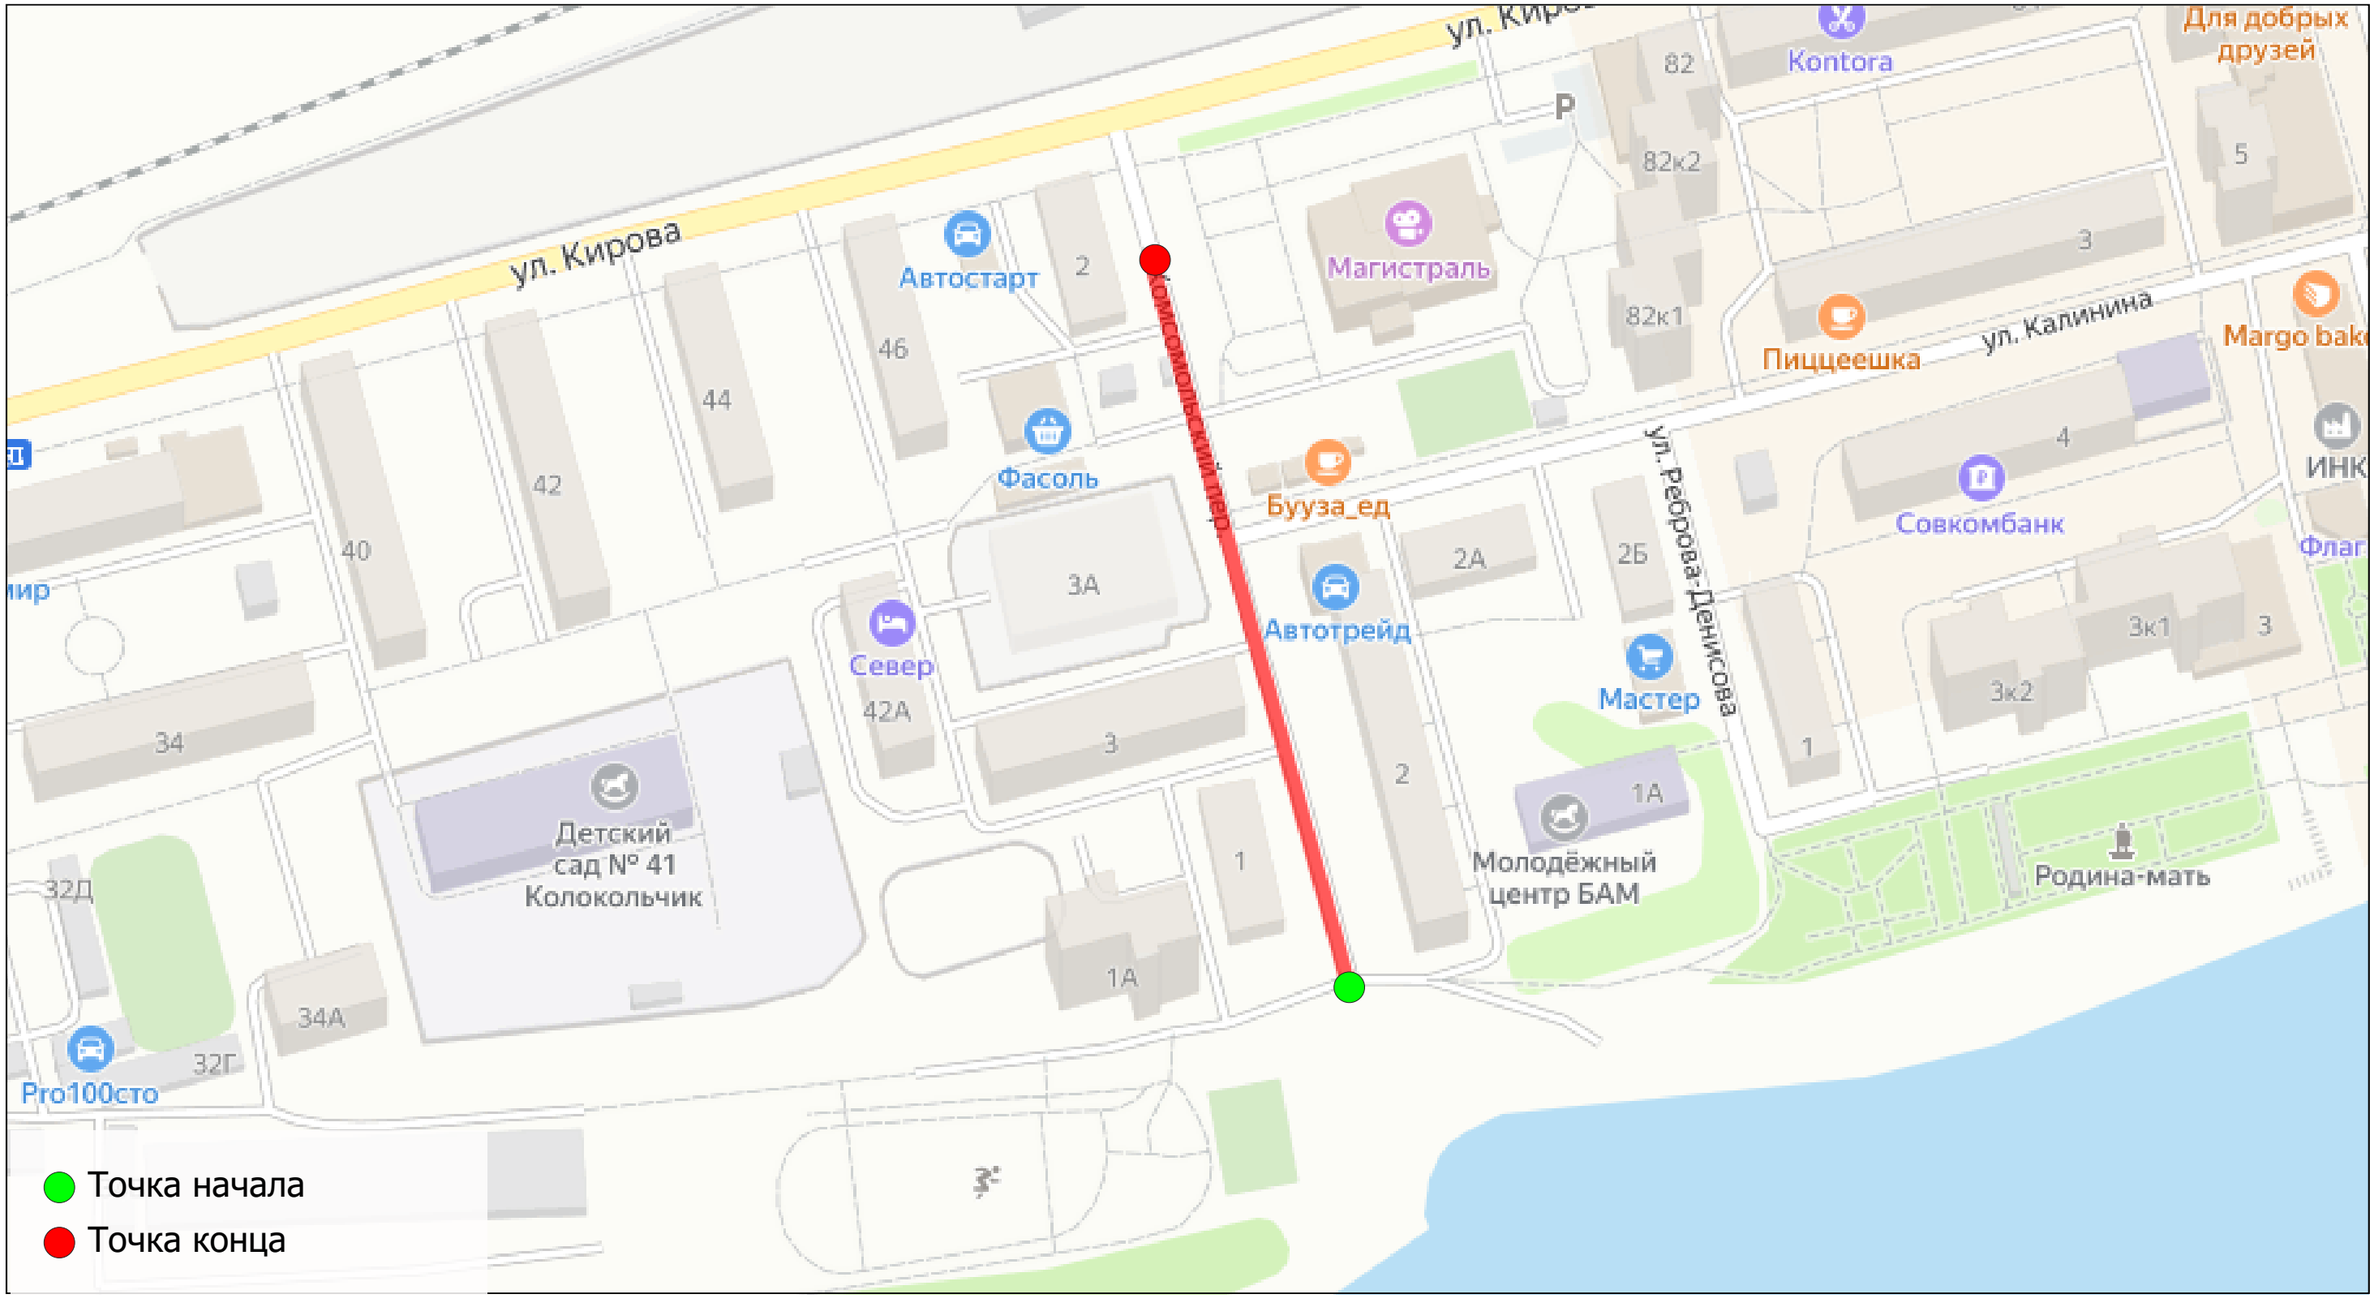

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8 — 53 — 7 — R=8770м
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 170
Характеристики проезжей части	0 — 5,70 — 5,40

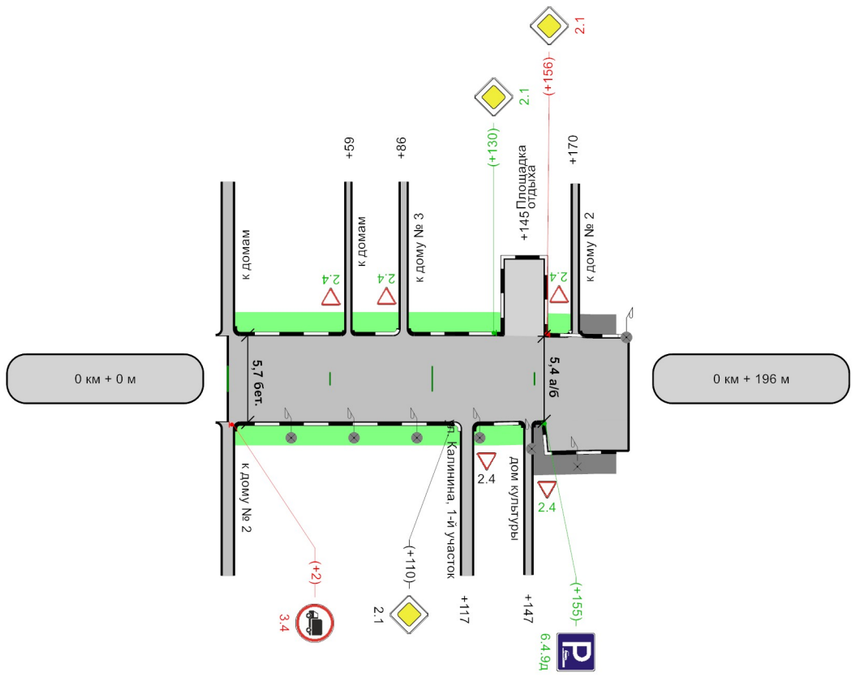

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 147 — ширина 1,5м, а/б, 147 - 190

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+110	Установлено	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+130	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+156	Демонтировать	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+059	Требуется установить	1	слева на примыкании
5	2.4	Уступите дорогу			0+086	Требуется установить	1	слева на примыкании
6	2.4	Уступите дорогу			0+147	Требуется установить	1	справа на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+170	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
8	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+002	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
9	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+155	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+031	0+171	Населенный пункт	6/6	0	140	Справа
Итого:				**6/6**	**0**	**140**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+147	Жилая застройка	Справа	147	
2	0+000	0+170	Жилая застройка	Слева	170	
3	0+147	0+196	Жилая застройка	Справа		49
4	0+162	0+191	Жилая застройка	Справа	29	
5	0+170	0+196	Жилая застройка	Слева		26
Итого:					**346**	**75**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Дачная, д. 30 до автомобильной дороги А-331 «Вилюй»

1-й участок: км 0+000 - км 0+360
2-й участок: км 0+000 - км 0+743
3-й участок: км 0+000 - км 0+374
4-й участок: км 0+000 - км 0+231
5-й участок: км 0+000 - км 0+172
6-й участок: км 0+000 - км 0+117

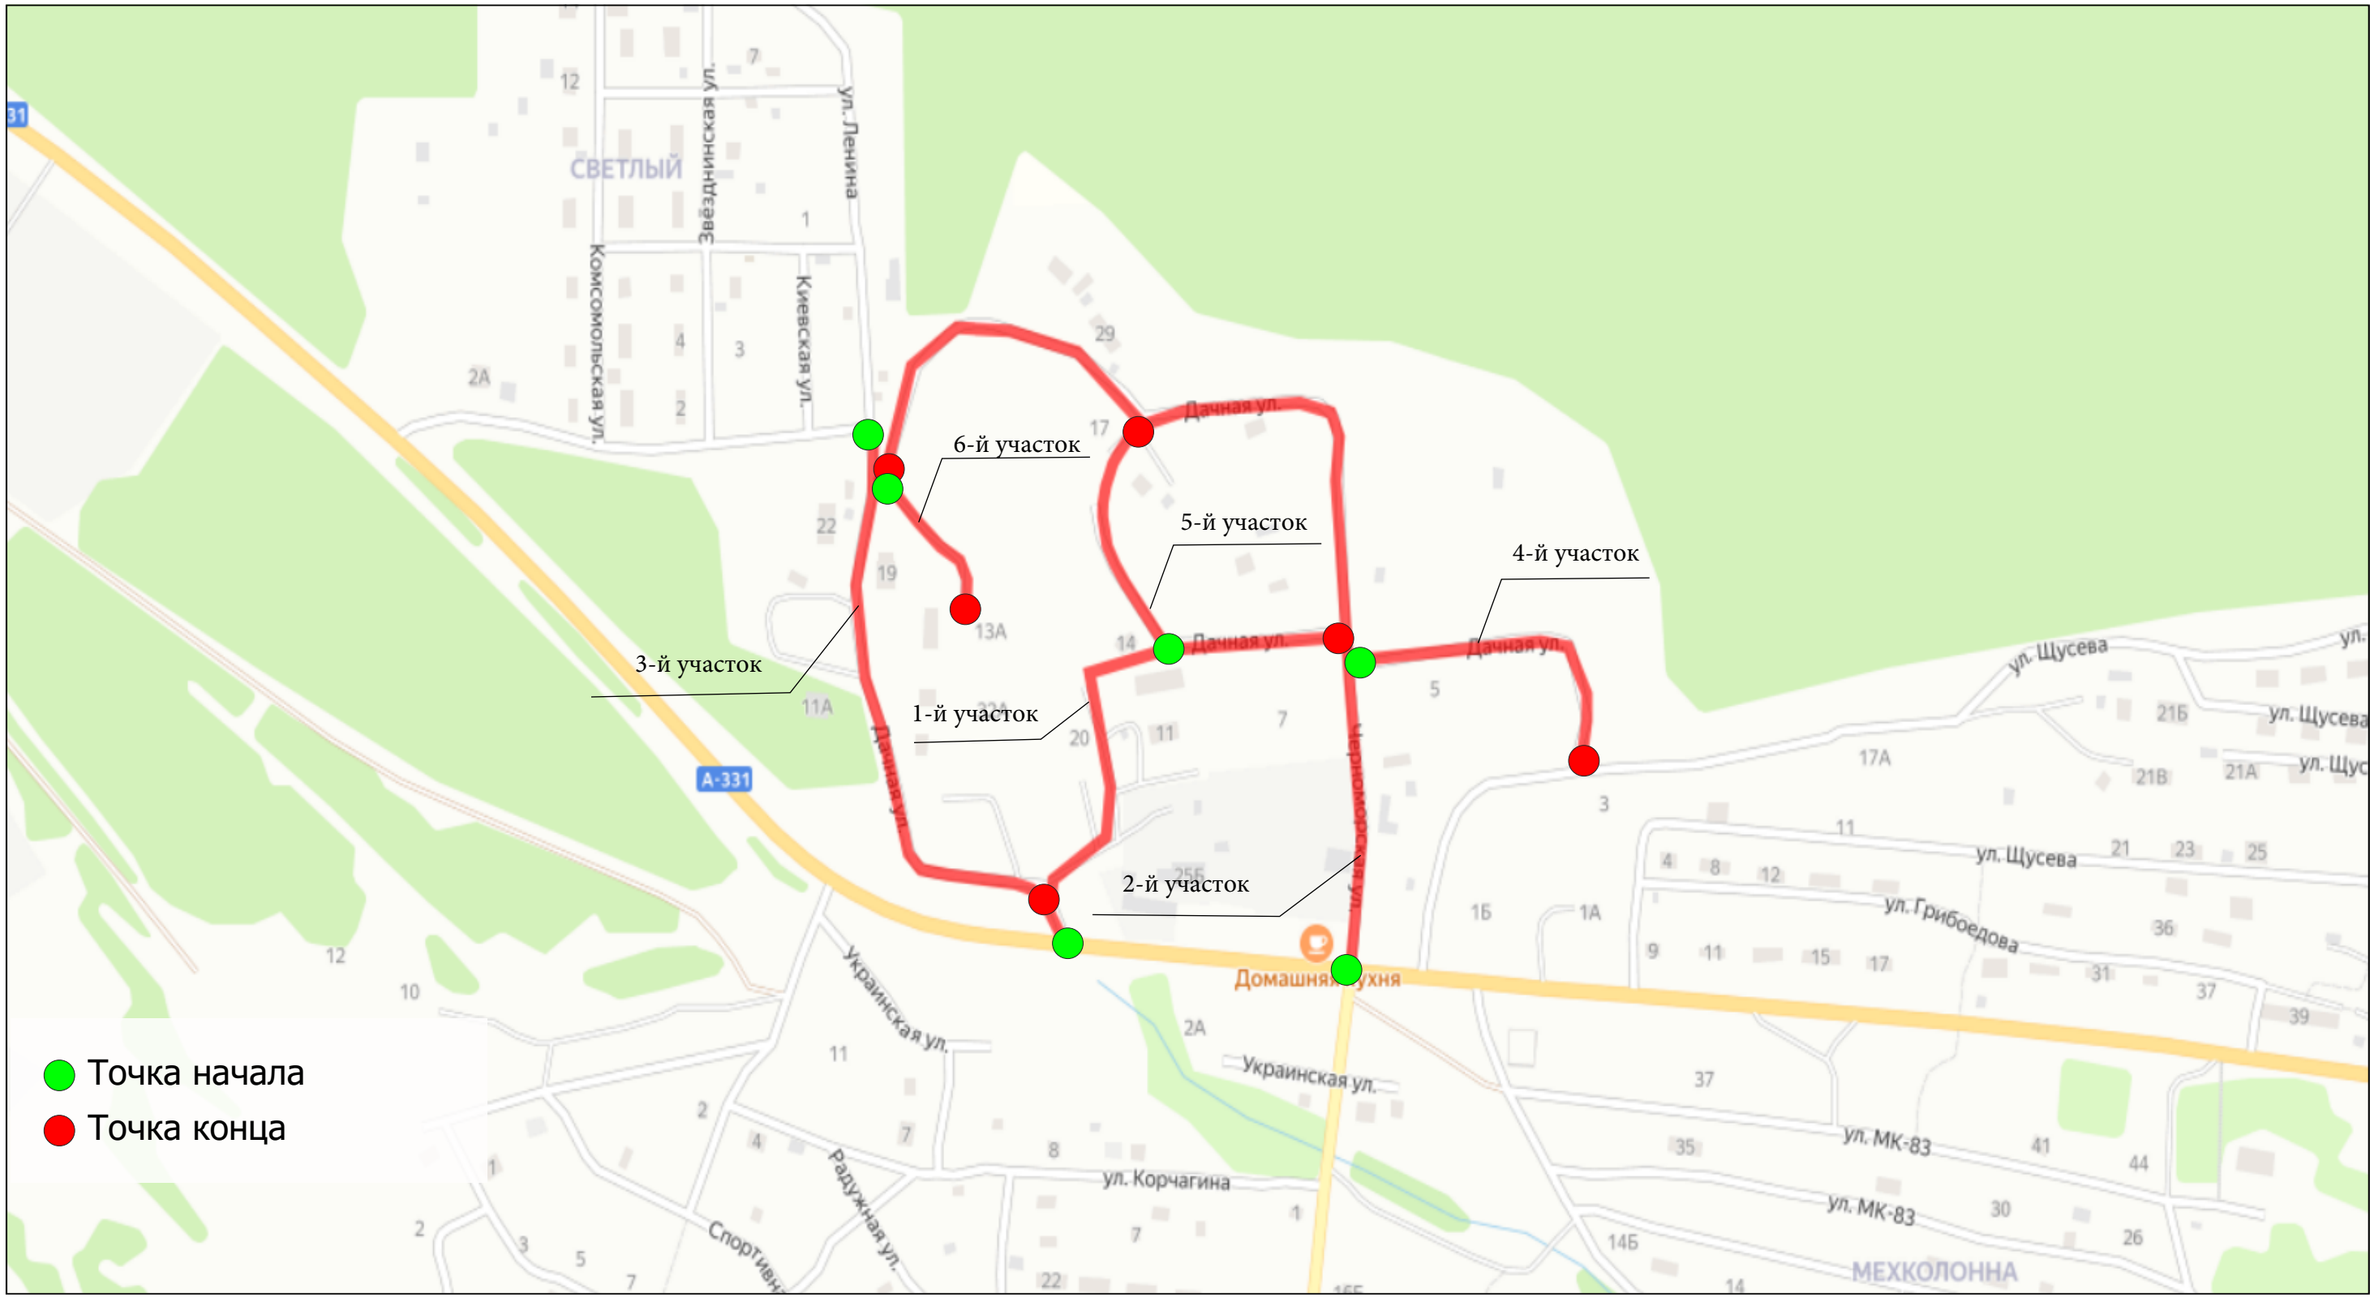

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	50; 52; 225
Кривые в плане	R=24м; 20; =0; а=124; 50; 70; R=9м; =0; а=90°; 90; R=18м; 170; =0; а=10°; 190
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0; 4,50; 225; 3,00

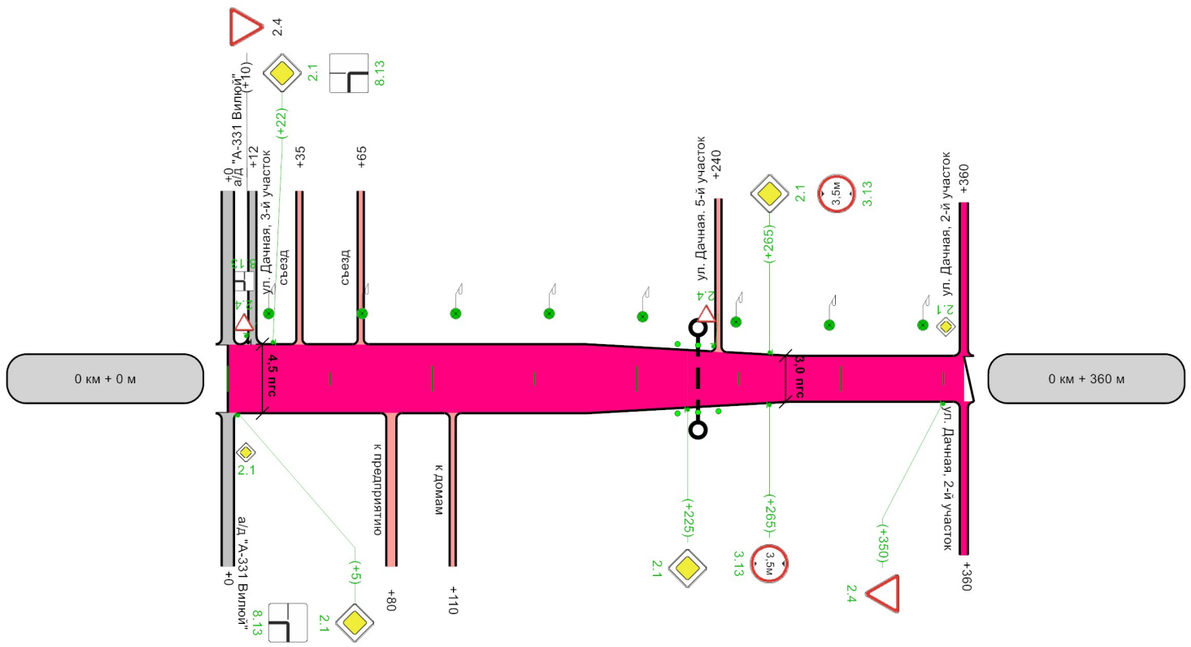

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+005	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+022	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+225	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+265	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+350	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
7	3.13	Ограничение высоты			0+265	Требуется установить	1	слева
8	3.13	Ограничение высоты			0+265	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
9	8.13	Направление главной дороги			0+005	Требуется установить	1	справа
10	8.13	Направление главной дороги			0+022	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**10**	


Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+220	0+230	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+220	0+240	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**30/5**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+340	Населенный пункт	8/8	320	0	Слева
Итого:				**8/8**	**320**	**0**	

М 1:3000


1-ая от осевой
1.2
5 - 205
1.2
215 - 255
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
2
91
R=5090м
101
110
134
110
R=1985м
414
31
Кривые в плане
31
R=269м
P=10; a=16°
107
320
R=66м
P=0; a=91°
380
440
R=102м
P=1; a=85°
510
R=116м
P=1; a=85°
560
590
R=94м
P=1; a=74°
680
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
0
7,00
255
4,00
360
3,00

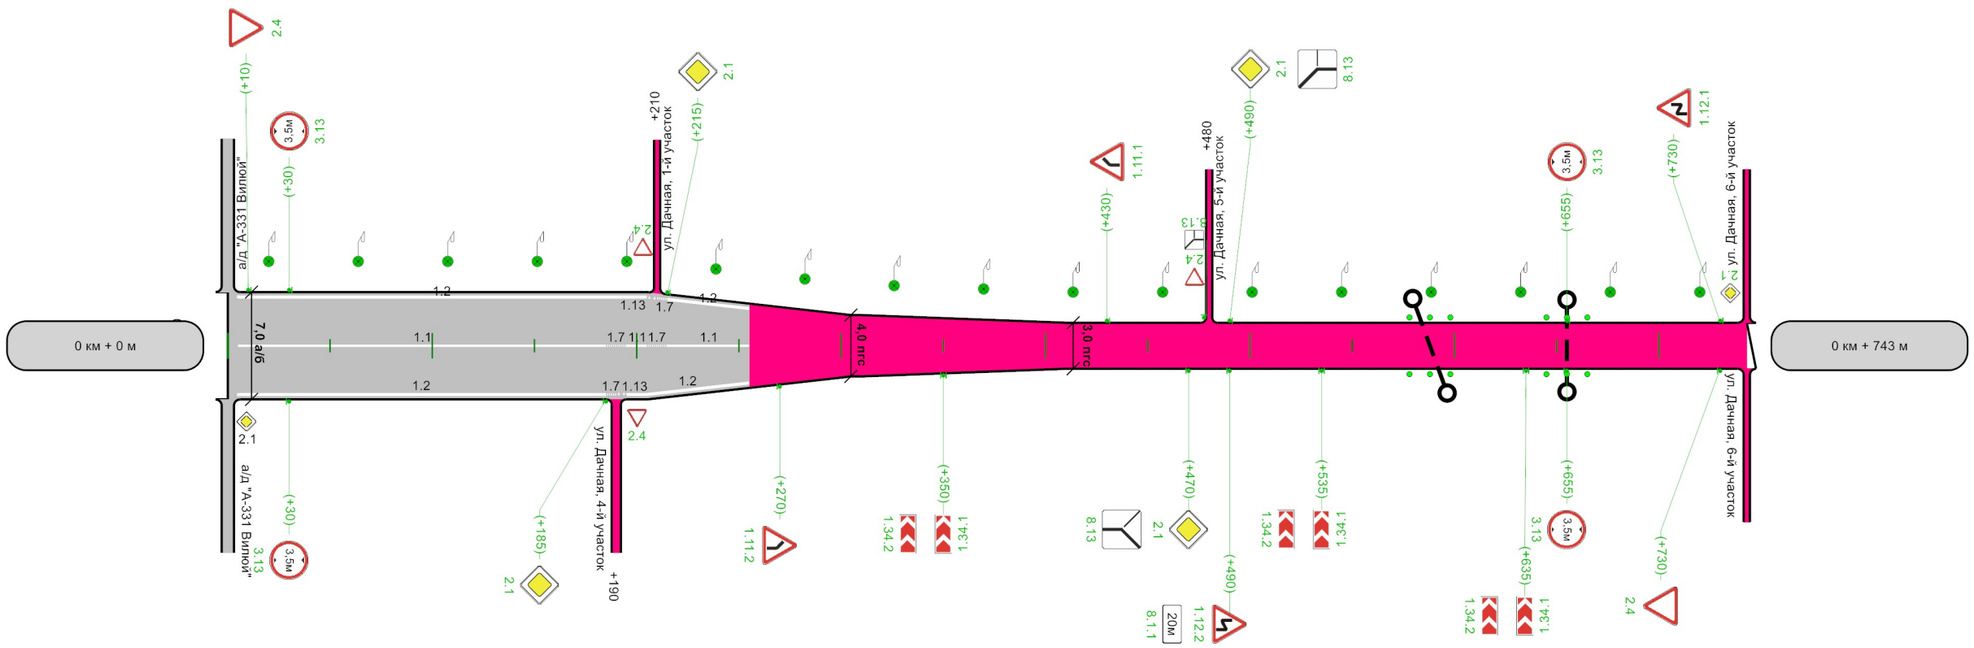
0 км + 0 м
0 км + 743 м
а/д "А-331 Вилюй"
ул. Дачная, 1-й участок
ул. Дачная, 4-й участок
ул. Дачная, 5-й участок
ул. Дачная, 6-й участок
7,0 а/б
4,0 пгс
3,0 пгс
1.1
1.2
1.7
1.13
1.11.1
1.11.2
1.12.1
1.12.2
1.34.1
1.34.2
2.1
2.4
3.13
8.13
8.1.1
20м
3,5м
+190
+210
+480


осевая
1.1
5 - 185
1.1
215 - 255
1-ая от осевой
1.2
5 - 185
1.2
195 - 255
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)(бел)	1.2(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.13(м)(бел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	230,000	480,000	30,000	10,000	72,750
ИТОГО	230,000	480,000	30,000	10,000	72,750
ЛИН.КМ	0,230	0,480	0,030	0,010	
ПРИВЕД.КМ	0,230	0,480	0,015	0,003	
ПЛОЩАДЬ	23,000	48,000	1,500	0,250	72,750

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+430	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+270	Требуется установить	1	справа
3	1.12.1	Опасные повороты			0+730	Требуется установить	1	слева
4	1.12.2	Опасные повороты			0+490	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+350	Требуется установить	1	справа
6	1.34.1	Направление поворота			0+535	Требуется установить	1	справа
7	1.34.1	Направление поворота			0+635	Требуется установить	1	справа
8	1.34.2	Направление поворота			0+350	Требуется установить	1	справа
9	1.34.2	Направление поворота			0+535	Требуется установить	1	справа
10	1.34.2	Направление поворота			0+635	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога			0+185	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+215	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+470	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+490	Требуется установить	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
16	2.4	Уступите дорогу			0+730	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
17	3.13	Ограничение высоты			0+030	Требуется установить	1	слева
18	3.13	Ограничение высоты			0+030	Требуется установить	1	справа
19	3.13	Ограничение высоты			0+655	Требуется установить	1	слева
20	3.13	Ограничение высоты			0+655	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
21	8.1.1	Расстояние до объекта			0+490	Требуется установить	1	справа
22	8.13	Направление главной дороги			0+470	Требуется установить	1	справа
23	8.13	Направление главной дороги			0+490	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**23**	
		Всего:					**23**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+578	0+598	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+578	0+598	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+645	0+665	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+645	0+665	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**80/12**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+720	Населенный пункт	17/17	700	0	Слева
Итого:				**17/17**	**700**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	52 — 23 — 50 — R=13294м — 158 — 40 — 270 — 35 — R=3085м
Кривые в плане	70 — R=153м P=15; a=6° — 170 — 255 — R=12м P=0; a=81° — 295
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,00

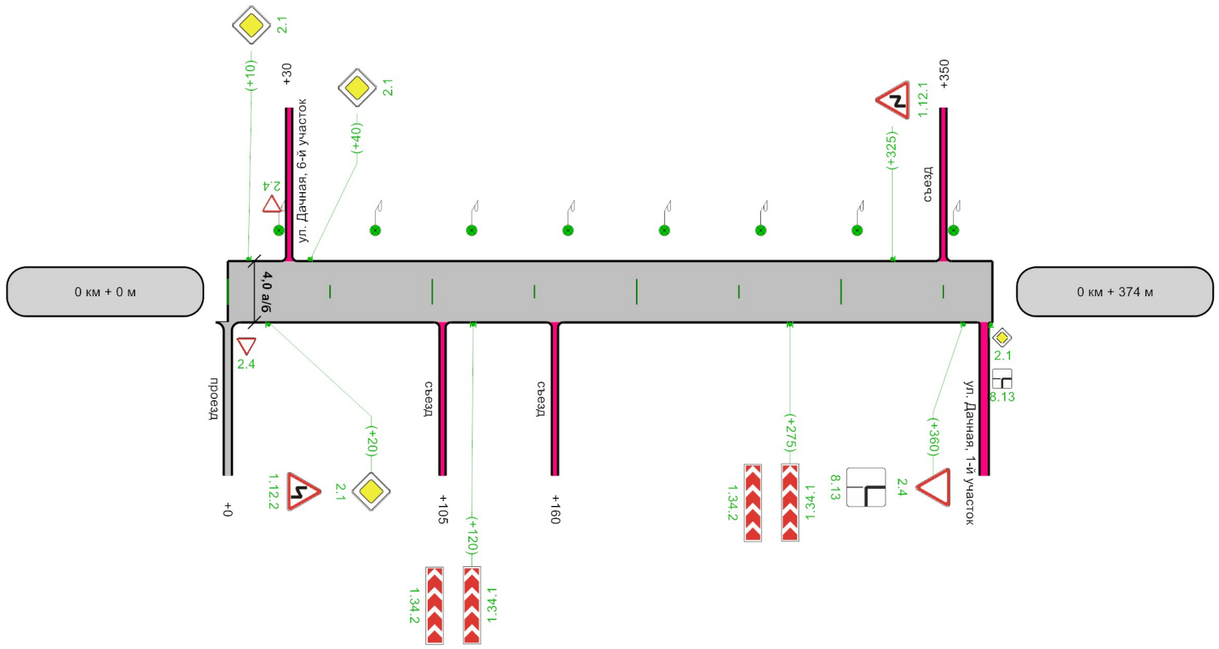

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+325	Требуется установить	1	слева
2	1.12.2	Опасные повороты			0+020	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+120	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+275	Требуется установить	1	справа
5	1.34.2	Направление поворота			0+120	Требуется установить	1	справа
6	1.34.2	Направление поворота			0+275	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+360	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.13	Направление главной дороги			0+360	Требуется установить	1	справа


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+355	Населенный пункт	8/8	330	0	Слева
Итого:				**8/8**	**330**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	47 — 19 — 48 — R=1410м
Кривые в плане	130 — R=85м P=1; a=96° — 170
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,50 — 150 — 3,00

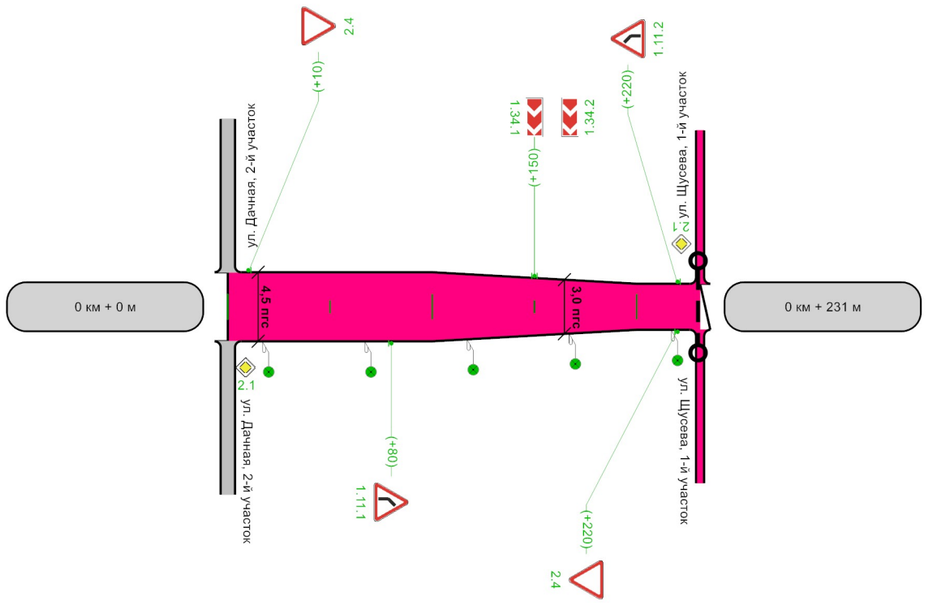

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+080	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+220	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+150	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+150	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+220	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего:					6	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+220	Населенный пункт	5/5	200	0	Справа
2	0+223	0+231	Населенный пункт	3/3	8	0	Слева
Итого:				8/8	208	0	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	81 R=610м 138
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

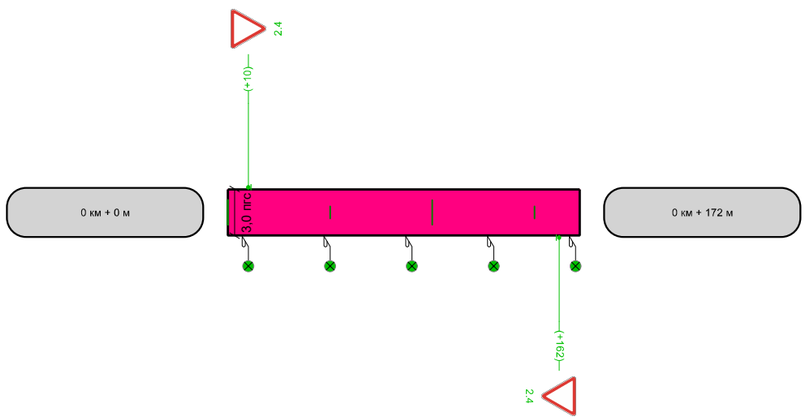

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+162	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+170	Жилая засиройка	5/5	160	0	Справа
Итого:				**5/5**	**160**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	67 R=850м 86
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	> 3,00

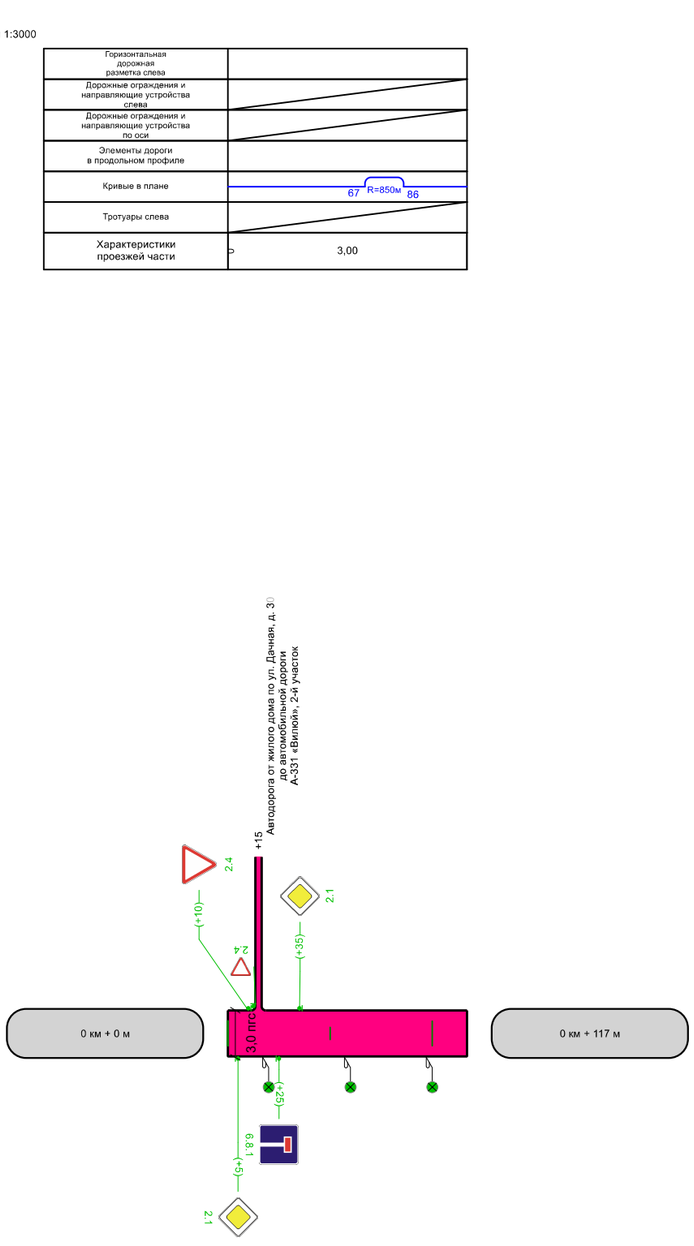

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+005	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+035	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Информационные знаки						
4	6.8.1	Тупик			0+025	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+100	Жилая застройка	1/1	80	0	Справа
Итого:				**1/1**	**80**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Декабристов, д. 3 до жилого дома по ул. Декабристов, д. 21
км 0+000 - км 0+437

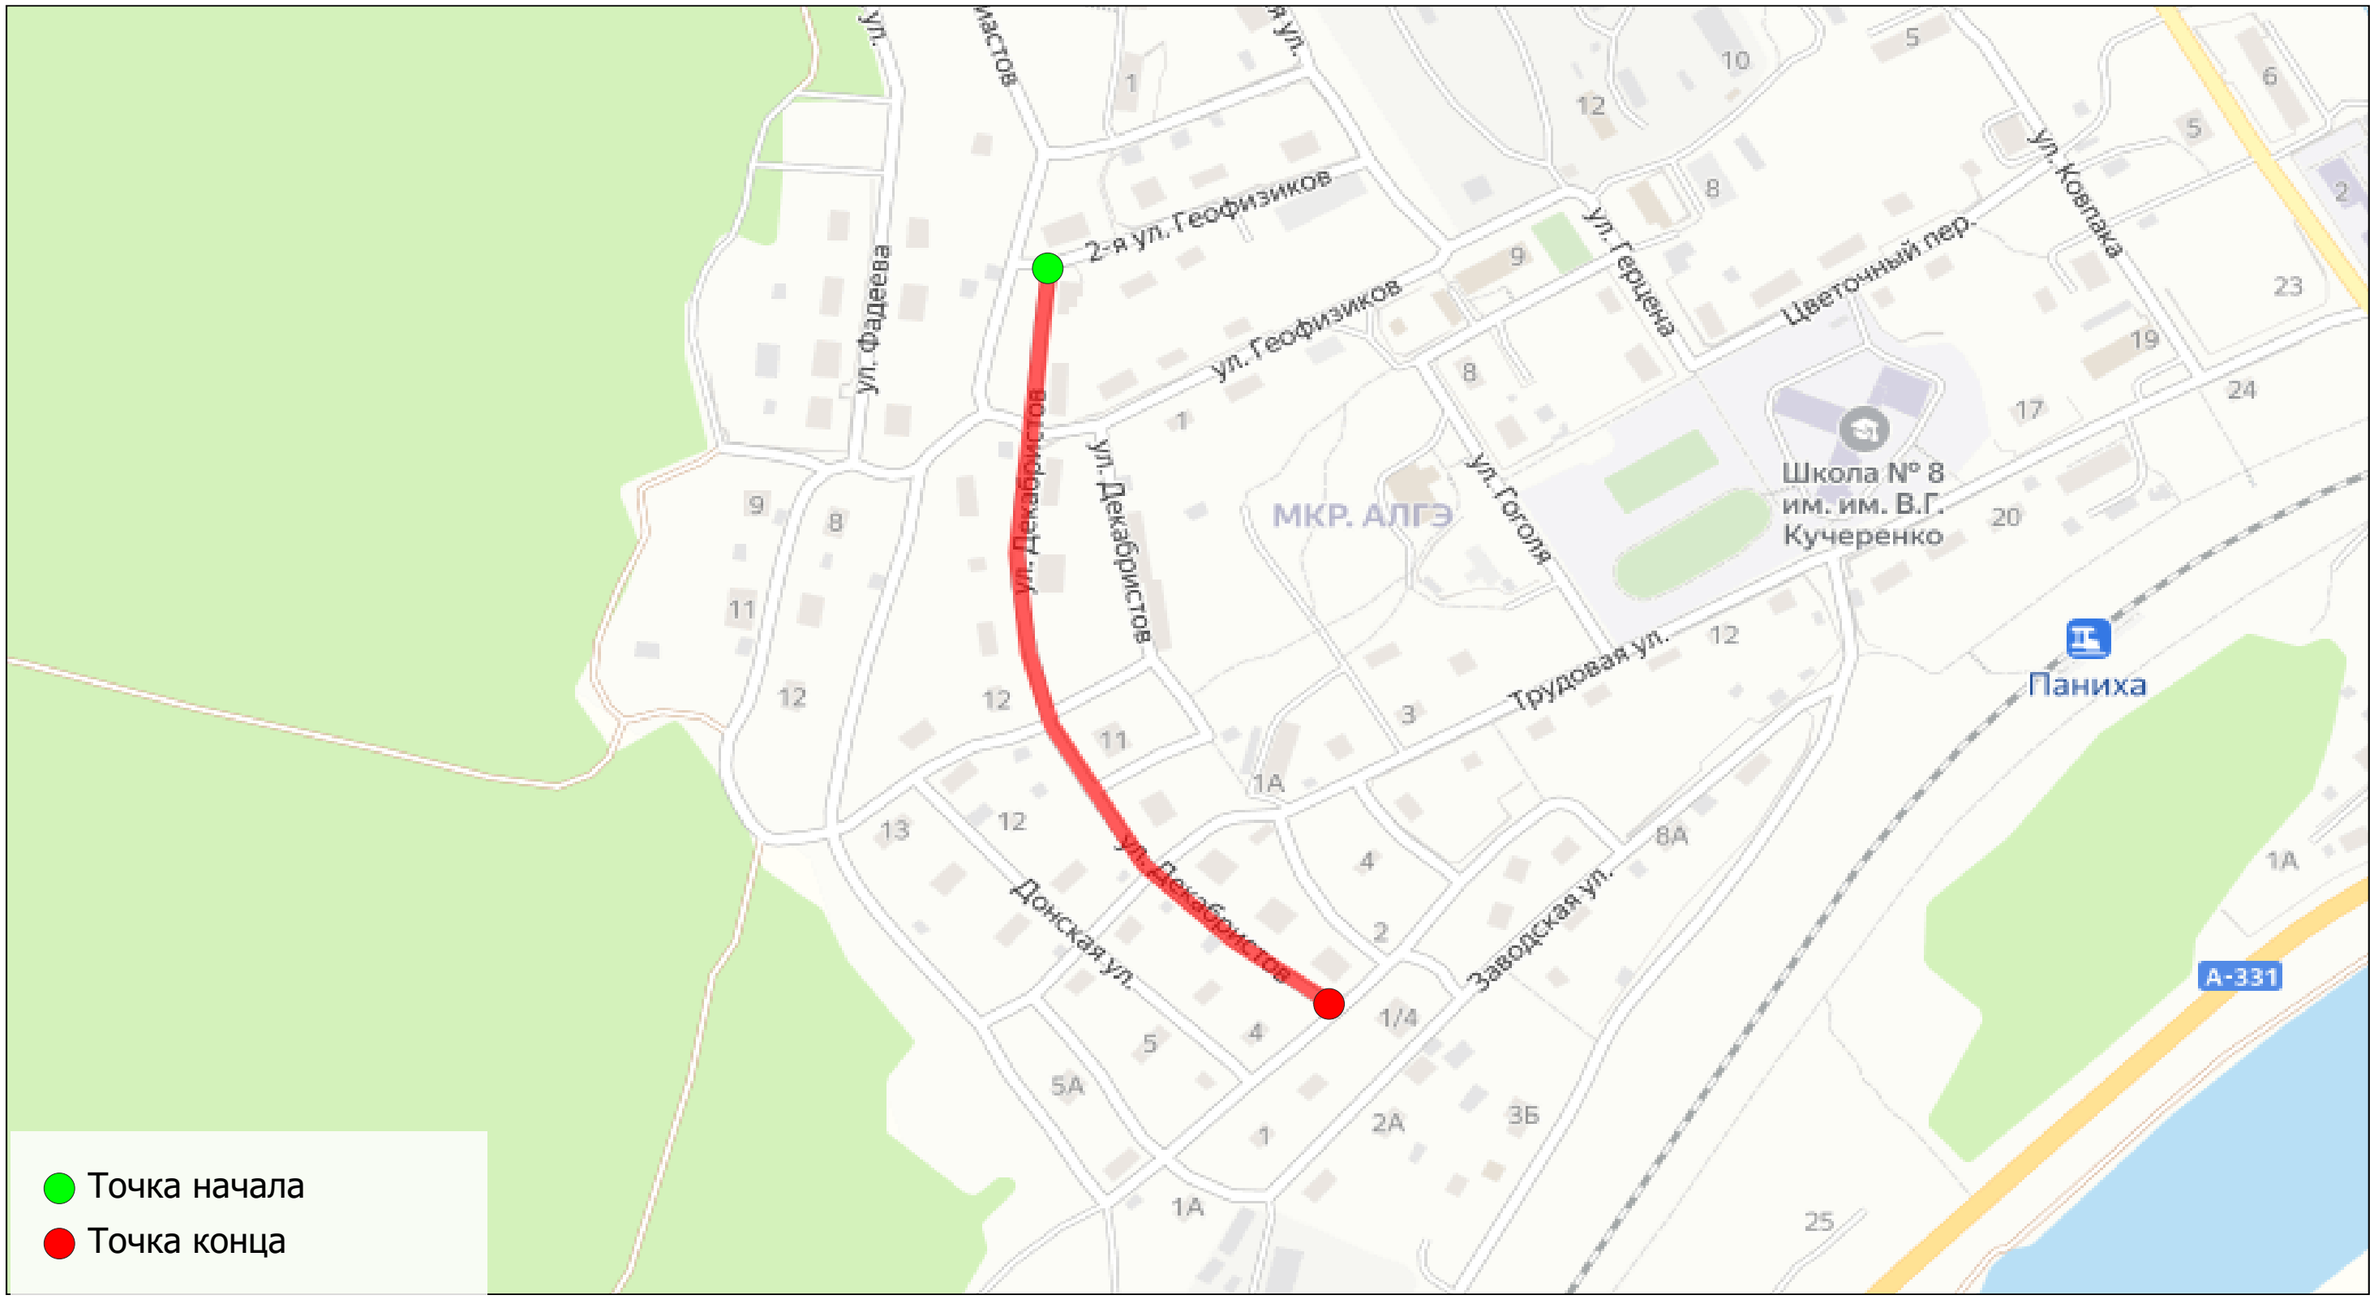

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	141 — 85 — 139 — R=1693м — 358 — 23
Кривые в плане	237 — R=289м, P=13, a=13° — 337
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0: 3,50 | 93: 3,20 | 340: 3,00

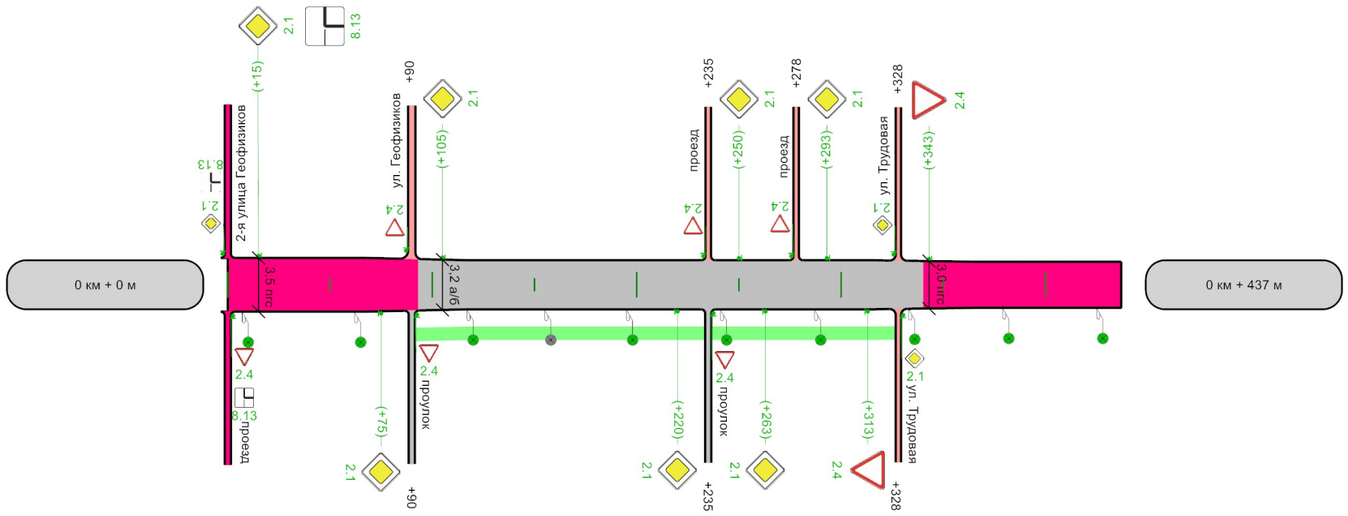

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, 90 - 328

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+015	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+075	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+220	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+250	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+263	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+293	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
9	2.4	Уступите дорогу			0+090	Требуется установить	1	слева на примыкании
10	2.4	Уступите дорогу			0+235	Требуется установить	2	слева на примыкании
11	2.4	Уступите дорогу			0+278	Требуется установить	1	слева на примыкании
12	2.4	Уступите дорогу			0+313	Требуется установить	1	справа
13	2.4	Уступите дорогу			0+343	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**14**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
14	8.13	Направление главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
15	8.13	Направление главной дороги			0+000	Требуется установить	1	справа на пересечении
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+120	Населенный пункт	3/3	110	0	Справа
2	0+158	0+158	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+198	0+428	Населенный пункт	6/6	230	0	Справа
Итого:				**10/10**	**340**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+090	0+328	Жилая застройка	Справа	238	
Итого:					**238**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Зеленая Поляна, д.2 до жилого дома по ул. Зеленая Поляна, д.13
км 0+000 - км 0+141

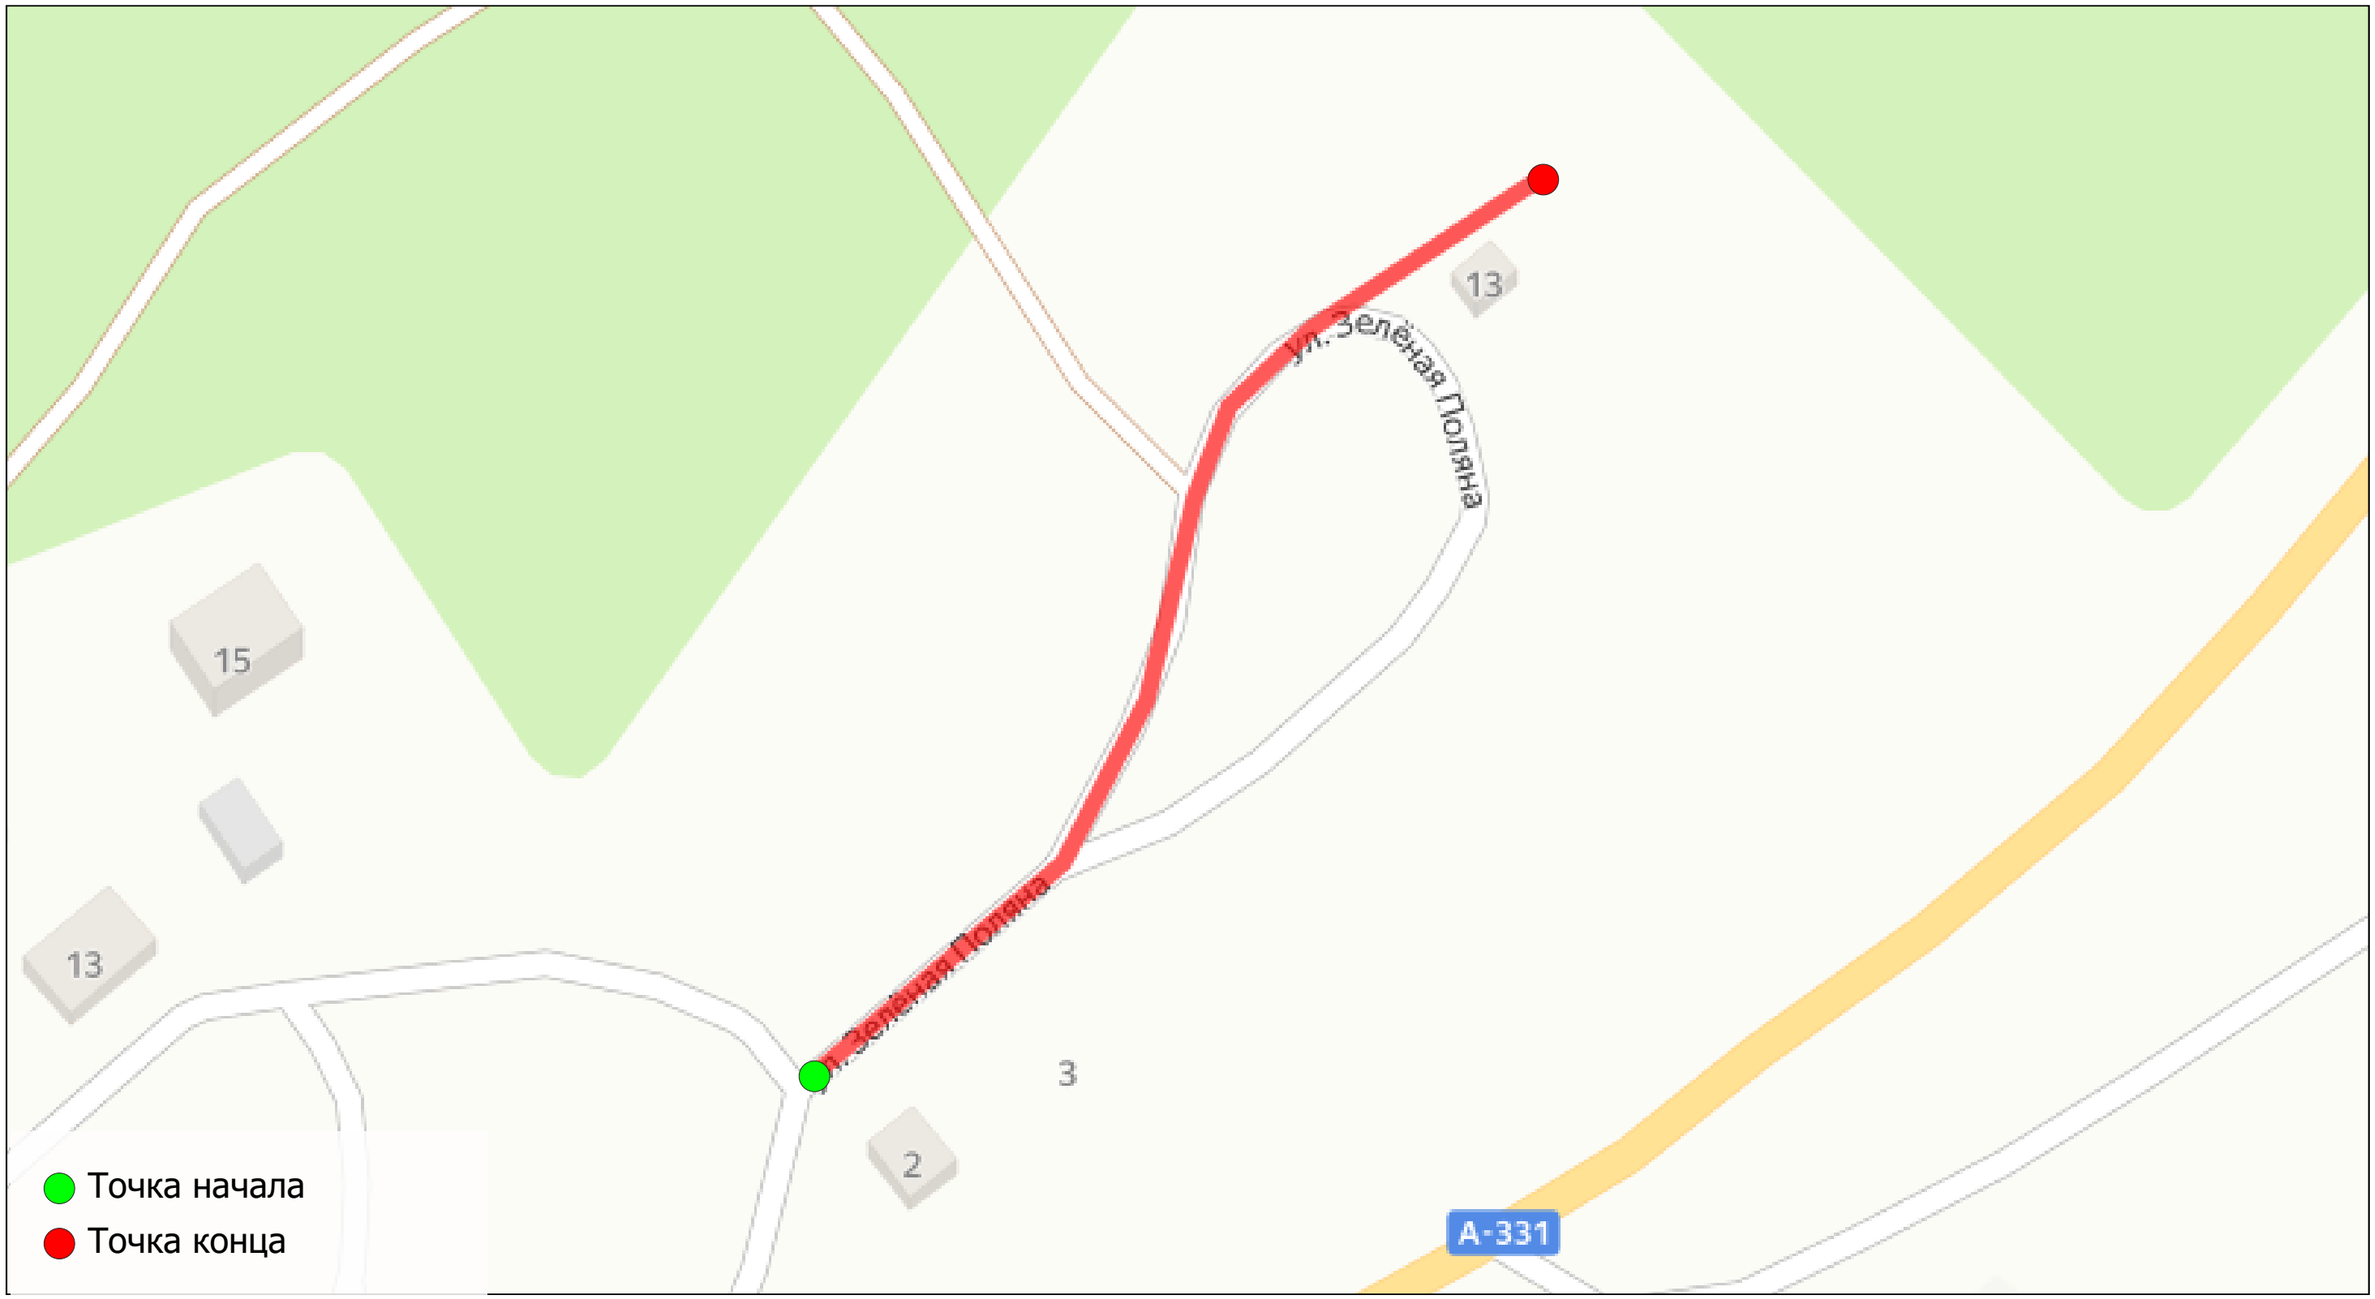

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 25 R=1155м 45 62 2
Кривые в плане	31 R=169м P=3; a=28° 65 R=151м 92 P=6; a=14 120
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

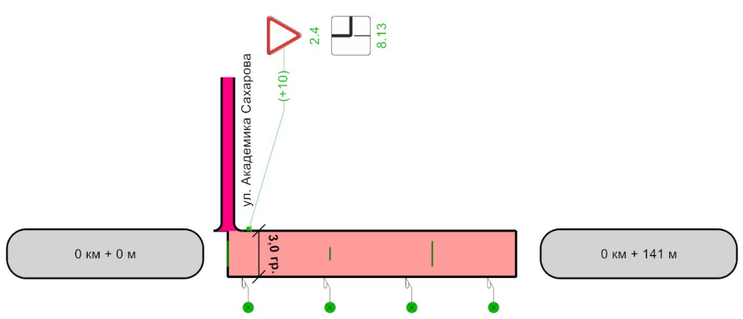

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
2	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+130	Населенный пункт	4/4	120	0	Справа
Итого:				**4/4**	**120**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Майская, от примыкания ул. Солнечная до пер. Сиреневый
км 0+000 - км 0+464

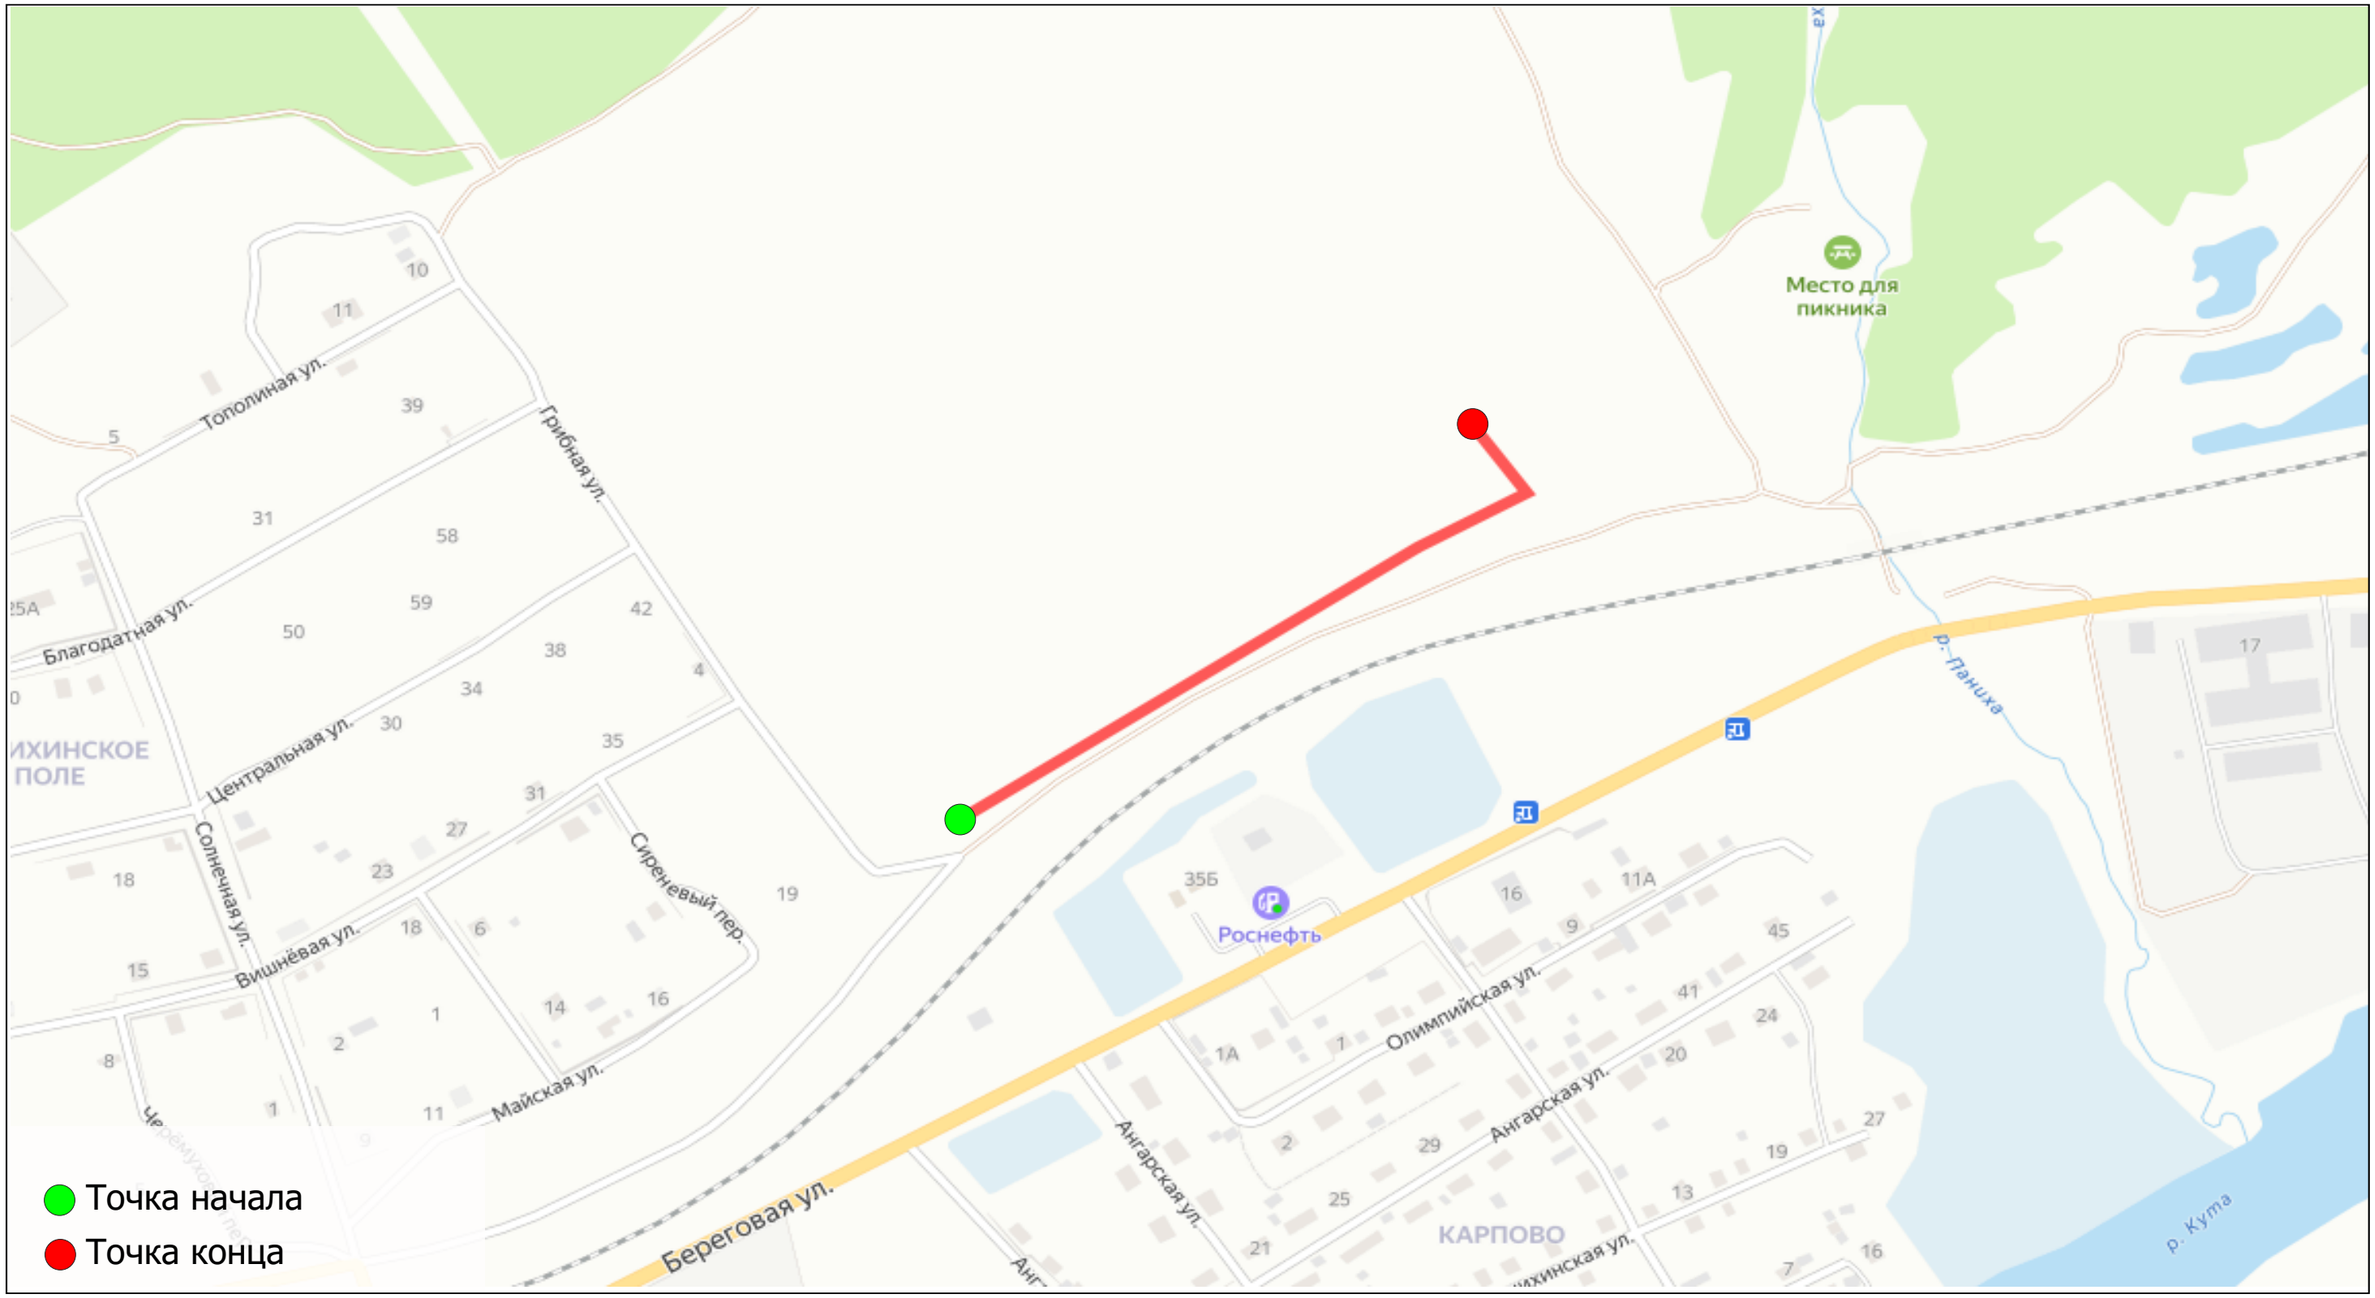

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	17
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

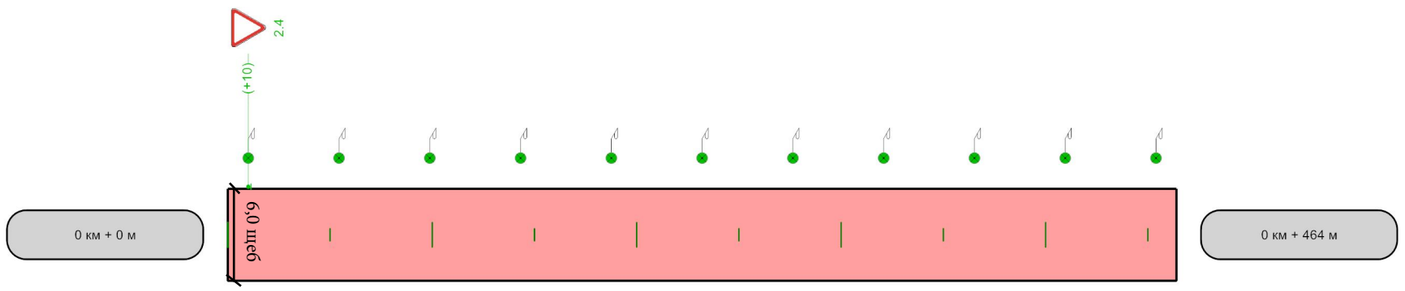

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+454	Населенный пункт	11/11	444	0	Слева
Итого:				**11/11**	**444**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Постышева, д. 6 до жилого дома по ул. Каландарашвили, д. 12
км 0+000 - км 0+347

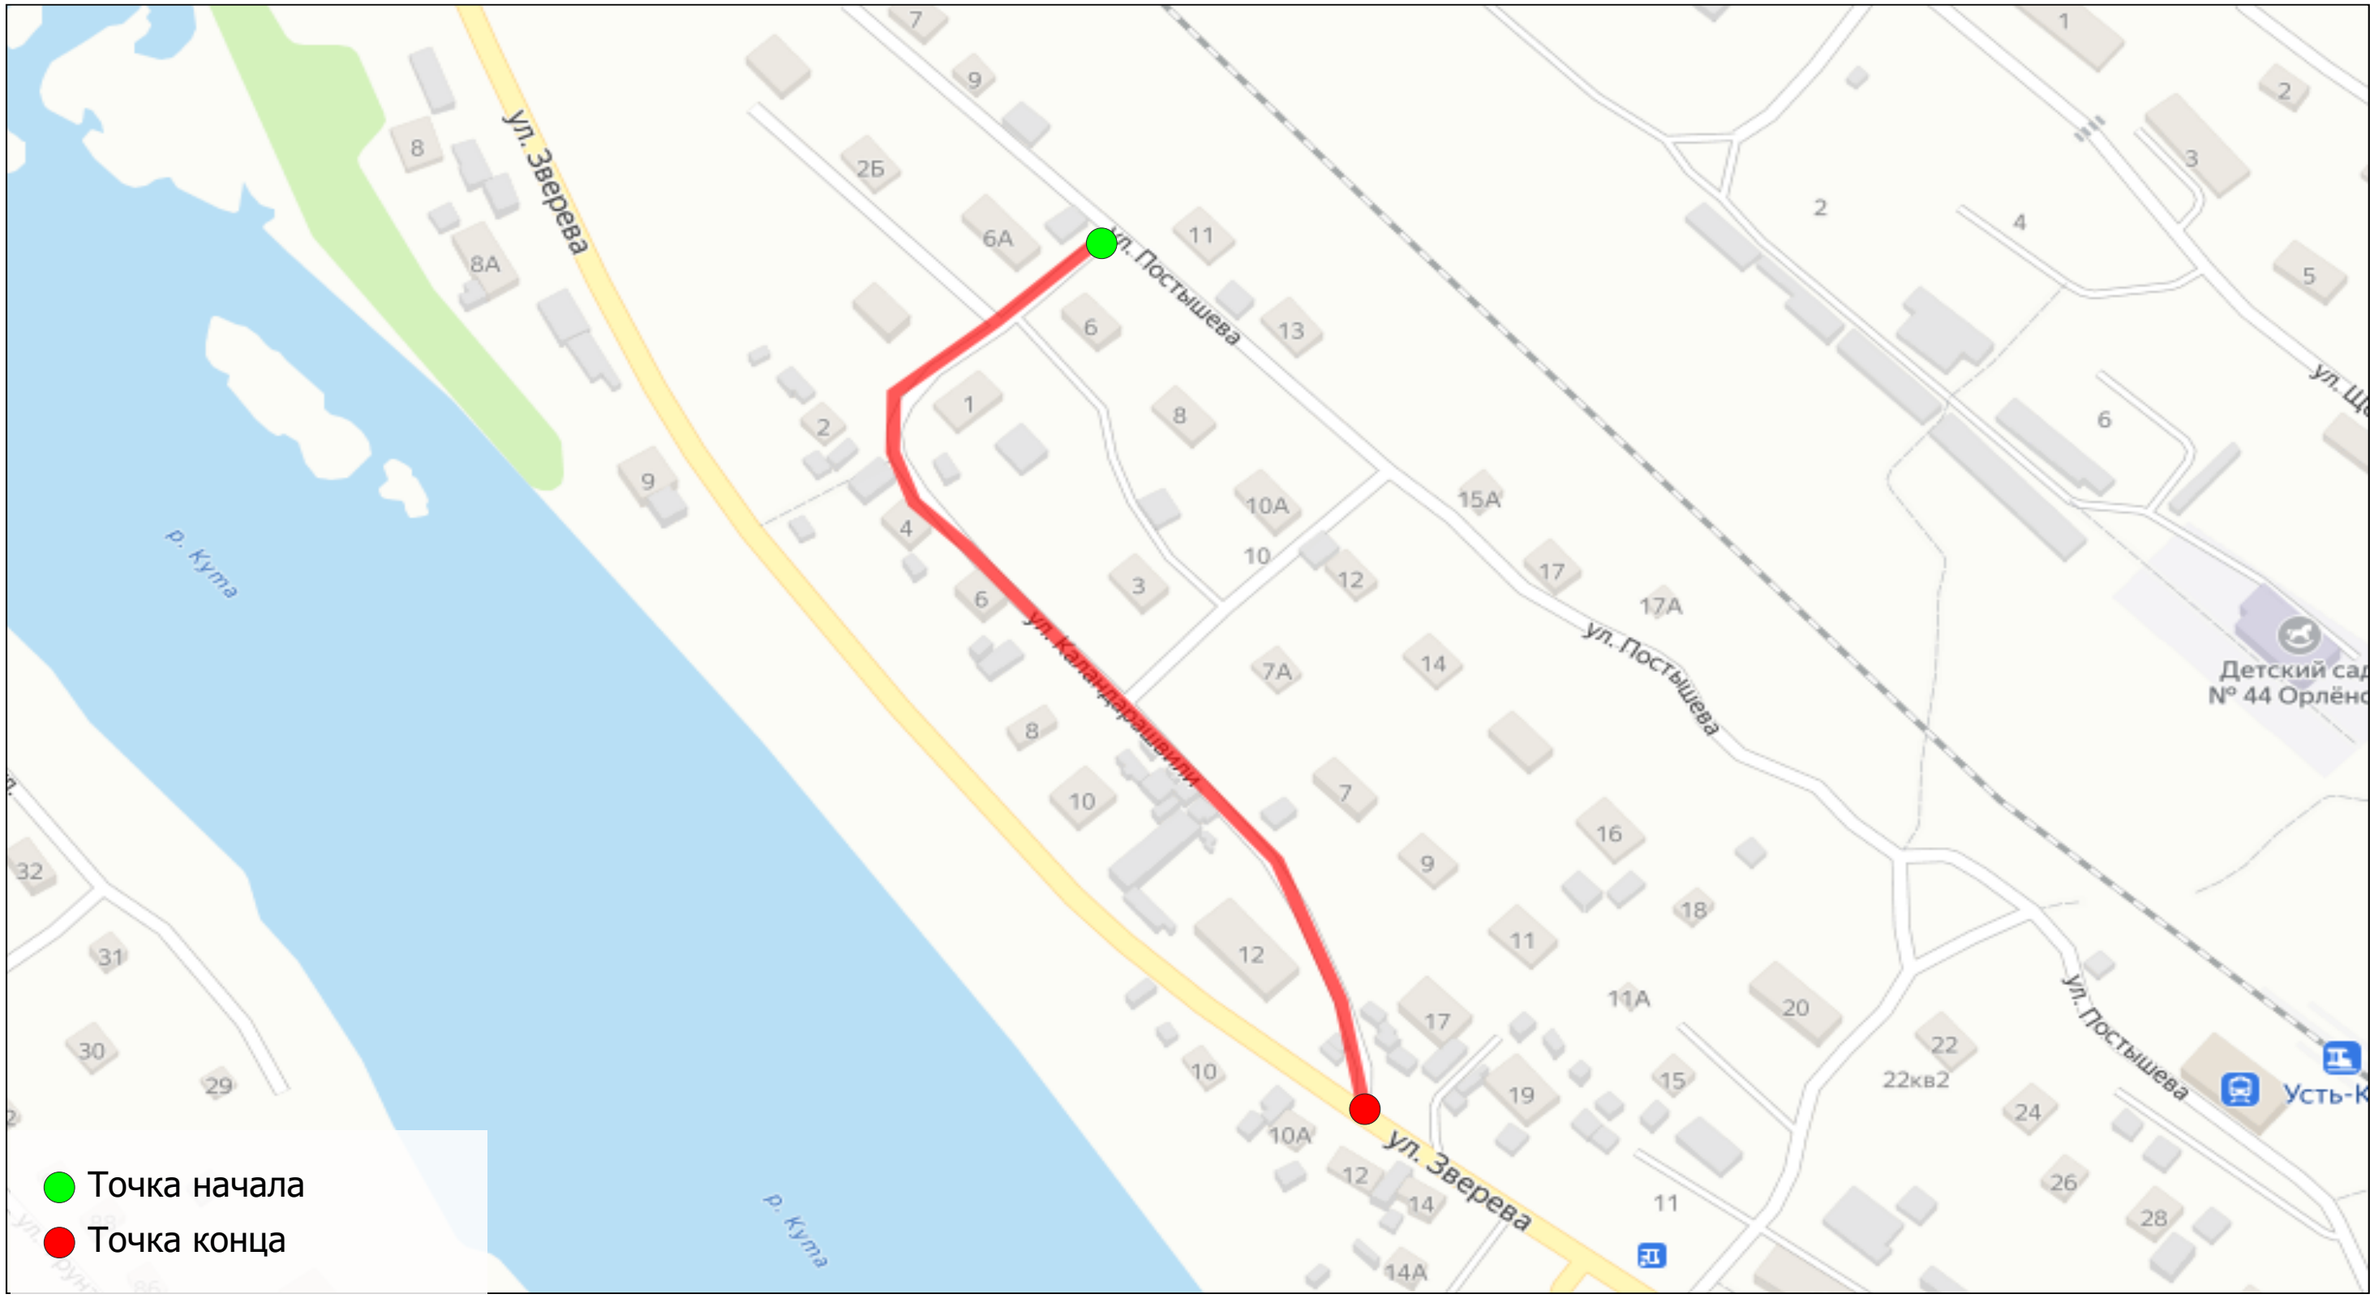

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 64 R=1254м 100 14 125 14 R=4959м 8
Кривые в плане	5 R=27м P=0; a=94° 99 241 R=59м P=1; a=54° 297
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,60 100 4,50

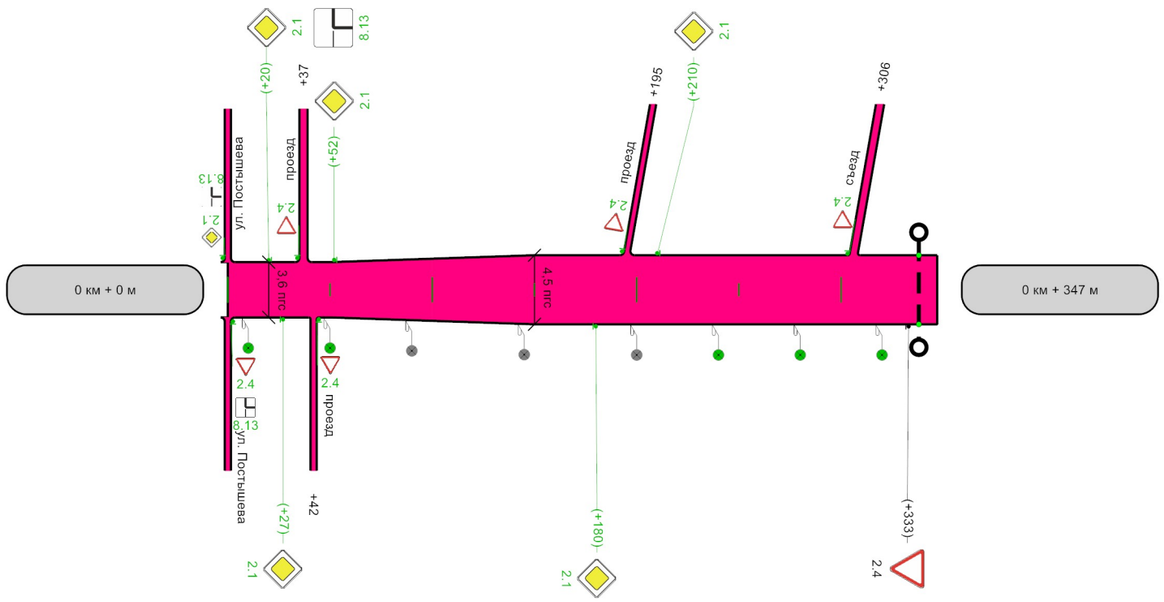

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+027	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+052	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+180	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+210	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+037	Требуется установить	1	слева на примыкании
7	2.4	Уступите дорогу			0+042	Требуется установить	1	справа на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу			0+195	Требуется установить	1	слева на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу			0+306	Требуется установить	1	слева на примыкании
10	2.4	Уступите дорогу			0+333	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**10**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
11	8.13	Направление главной дороги			0+020	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Д


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+338	0+338	0/1			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+338	0+338	0/1			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**0/2**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+050	Населенный пункт	2/2	40	0	Справа
2	0+090	0+200	Населенный пункт	3/3	0	110	Справа
3	0+240	0+320	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
Итого:				**8/8**	**120**	**110**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по пер. Каменный от жилого дома по ул. Хабарова, д. 12 до жилого дома по пер. Каменный, д.2
км 0+000 - км 0+384

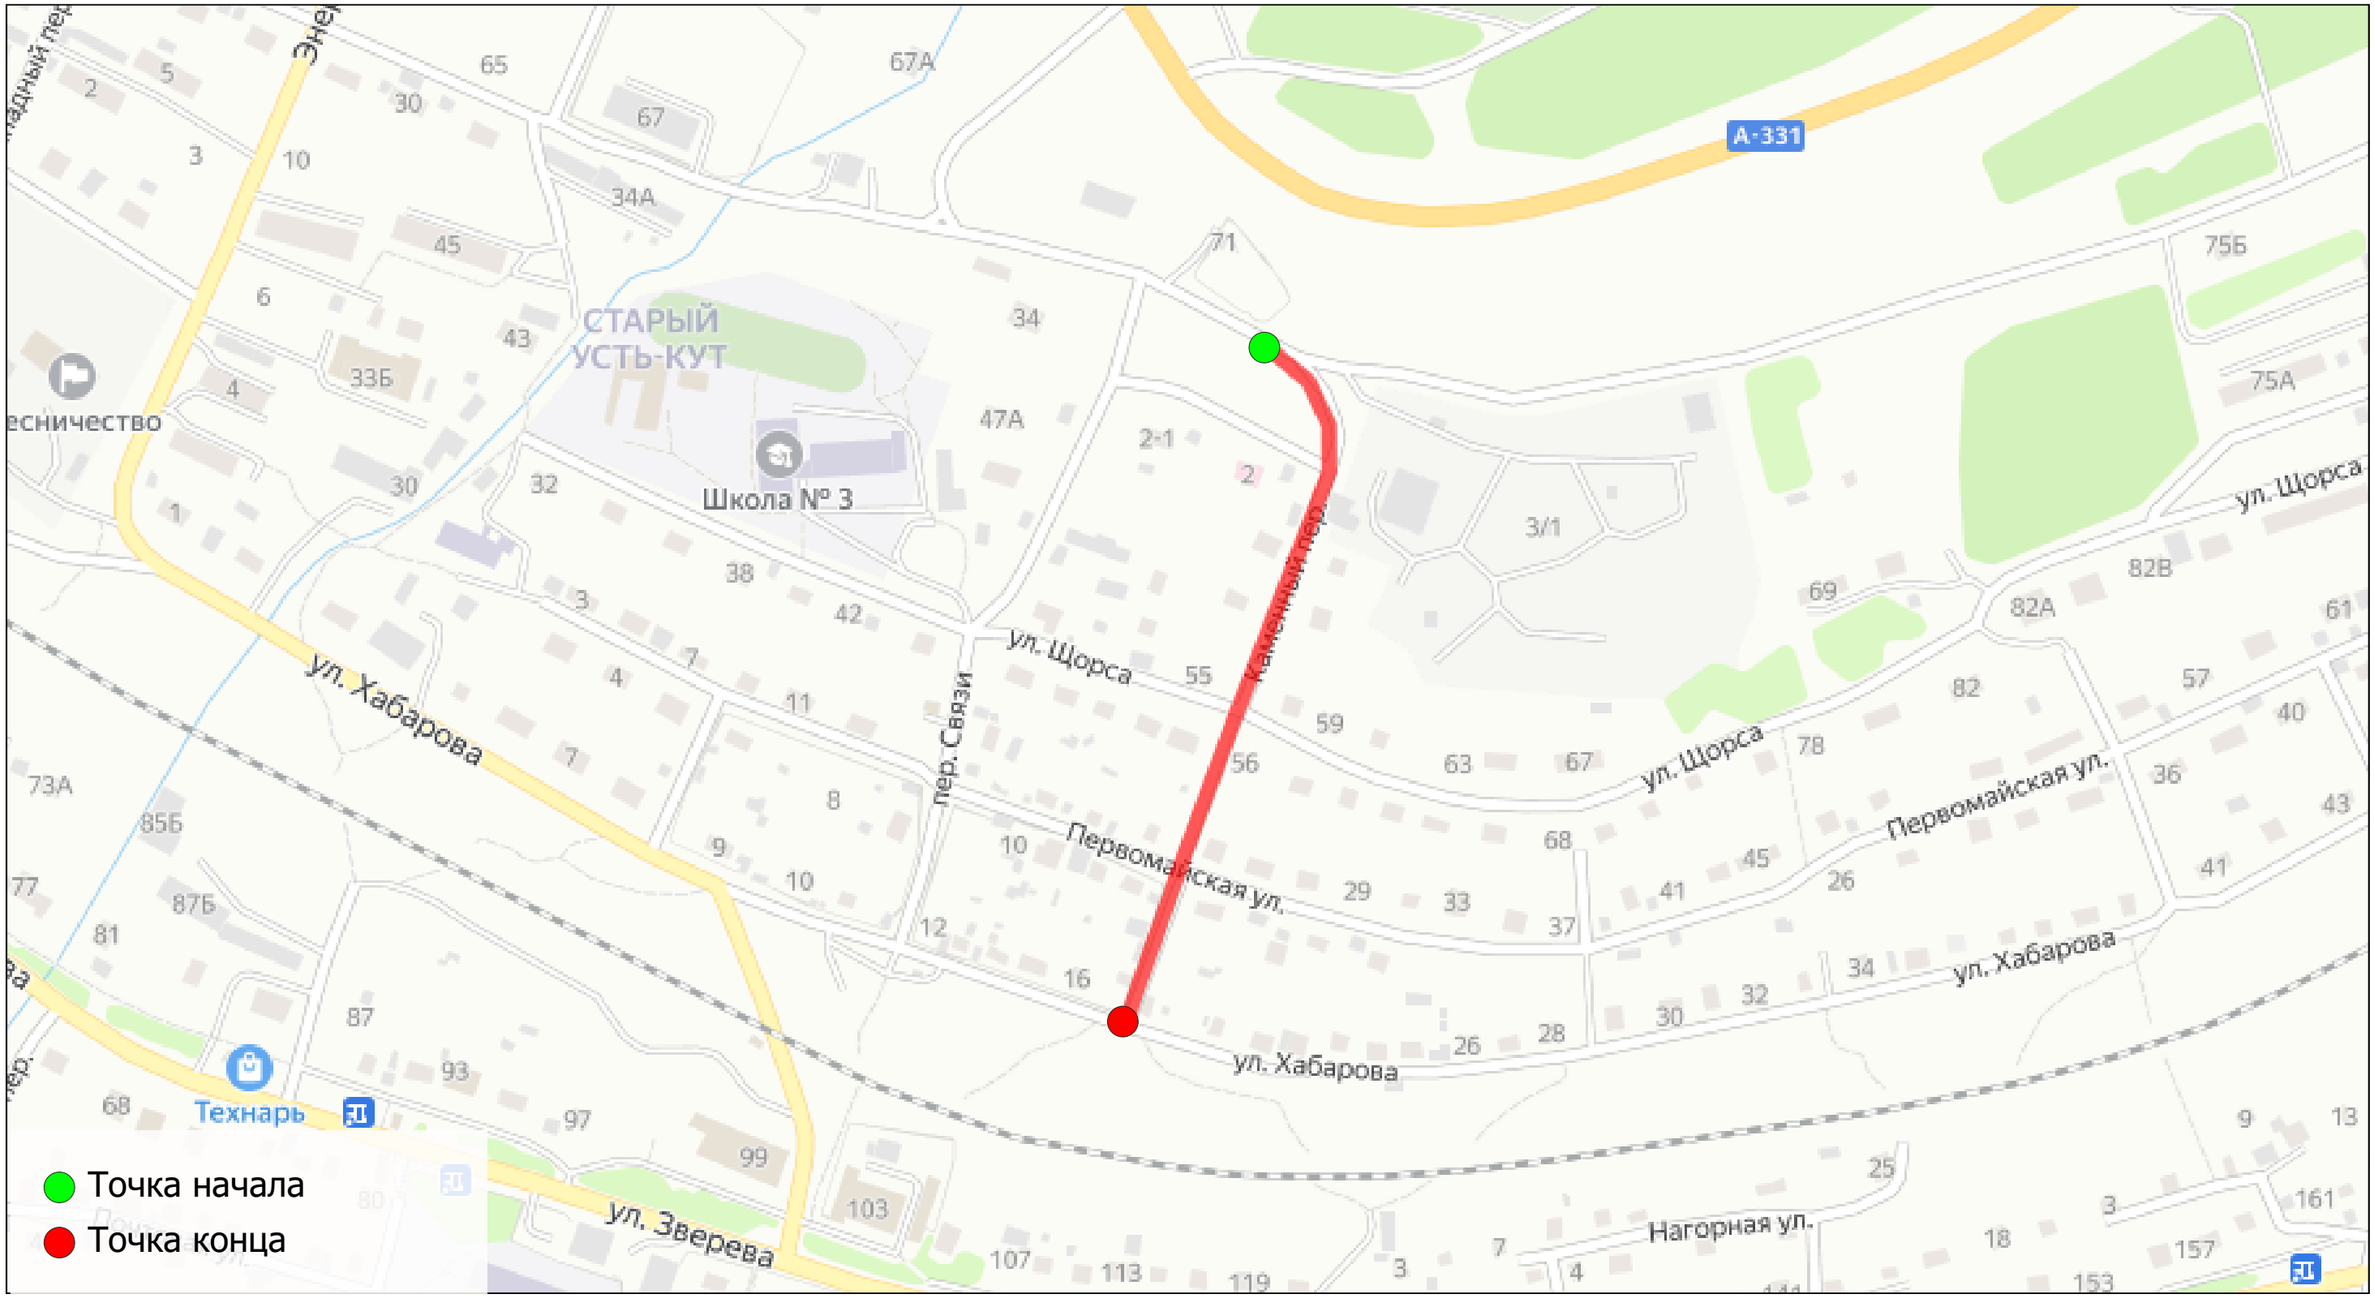

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	153 — 92 — 154 — R=3416м — 146 — 171
Кривые в плане	32 — R=29м — 52
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50

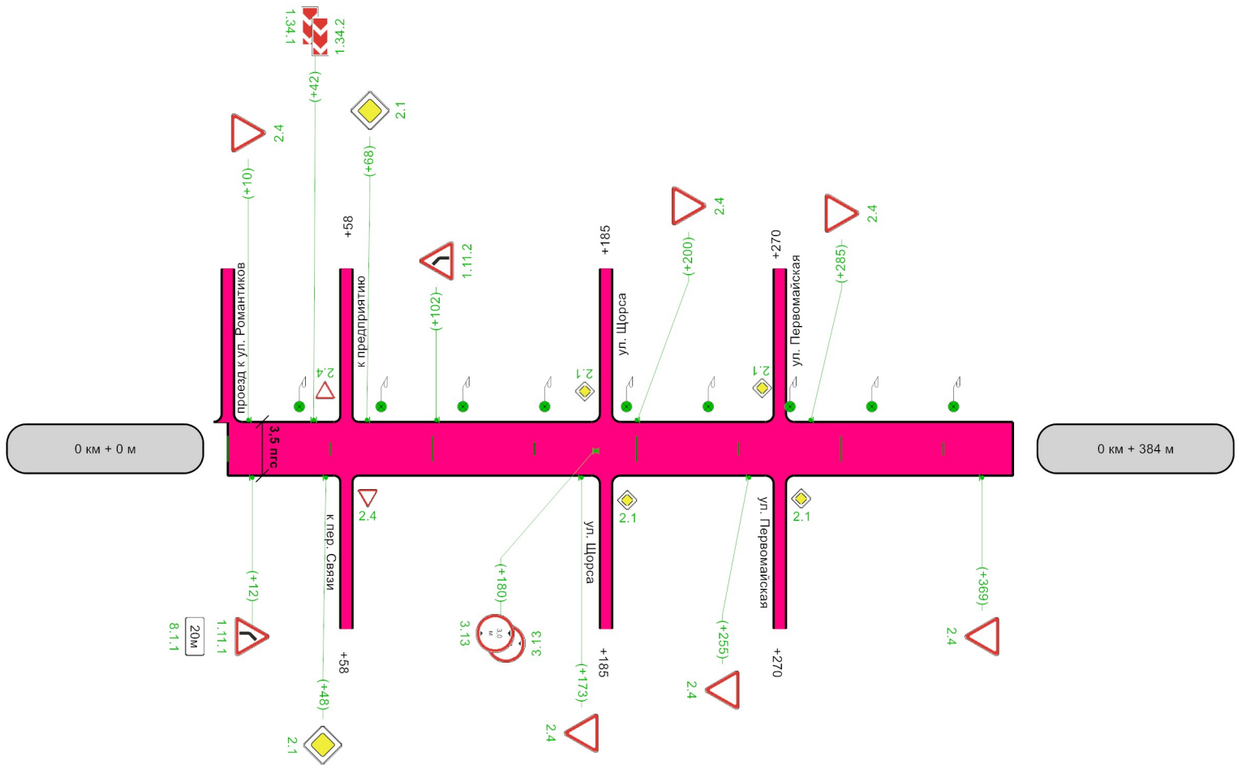

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+012	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			0+102	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+042	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+042	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+048	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+068	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+058	Требуется установить	1	слева на пересечении
9	2.4	Уступите дорогу			0+173	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+200	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+255	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+285	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+369	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**9**	


№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
14	3.13	Ограничение высоты			0+180	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.1.1	Расстояние до объекта			0+012	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**16**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+035	0+355	Населенный пункт	9/9	320	0	Слева
Итого:				**9/9**	**320**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от здания магазина по ул. Гайдара, 2 до жилого дома по ул. Гайдара, д.10
км 0+000 - км 0+269

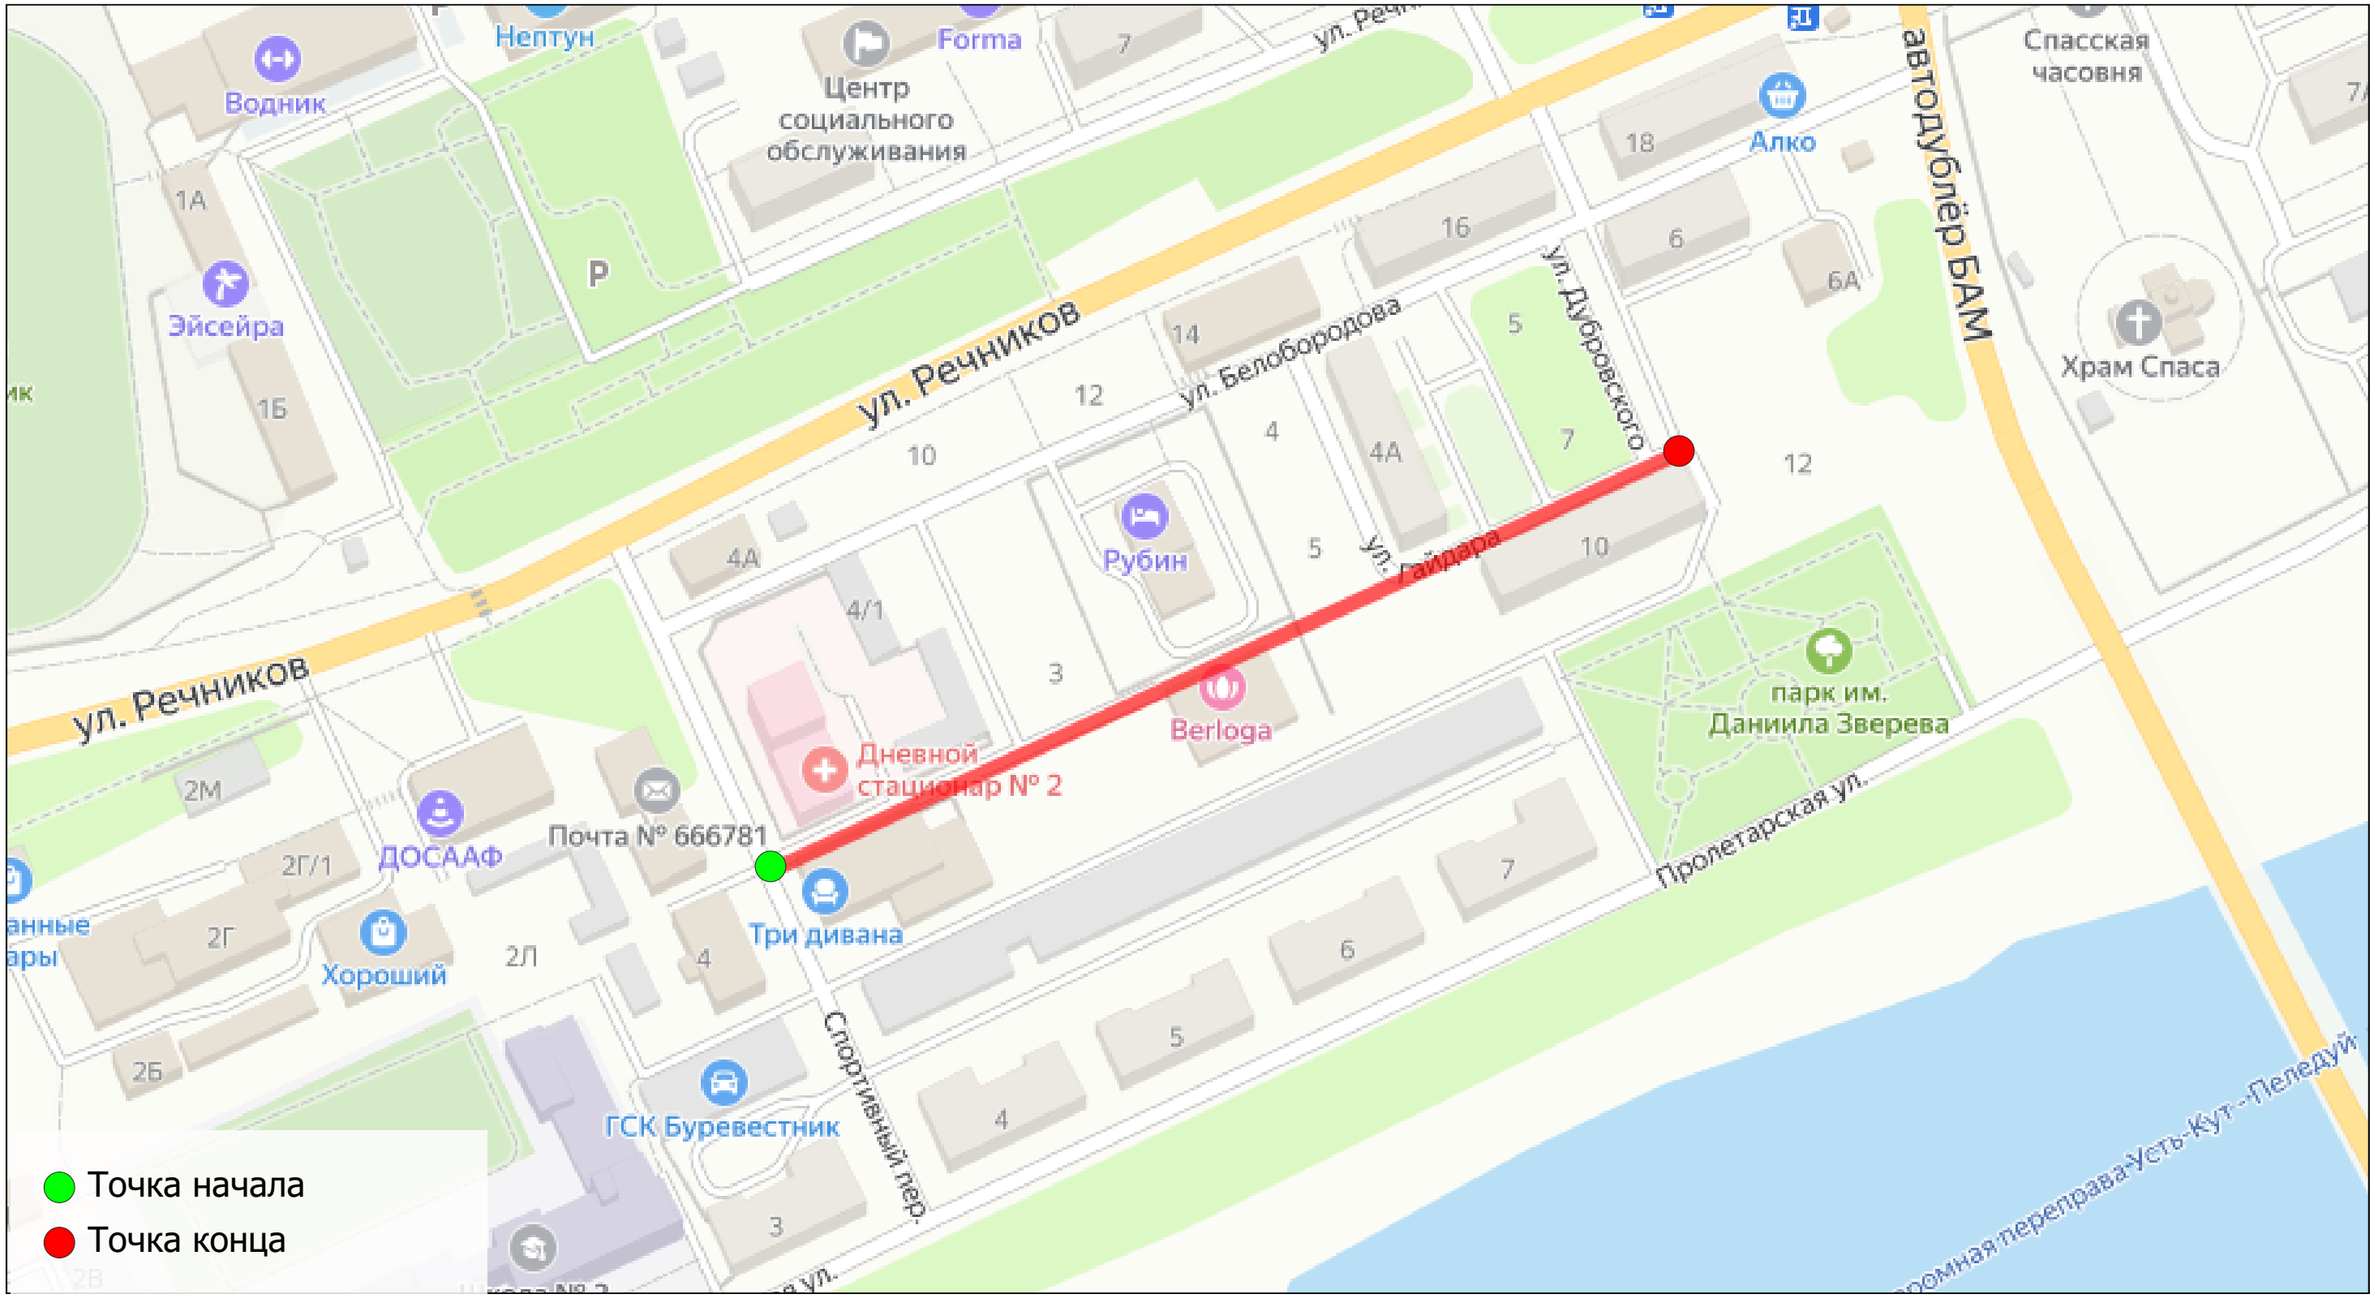

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	81
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 2м, 0 - 83
Характеристики проезжей части	0 4,50 5,20

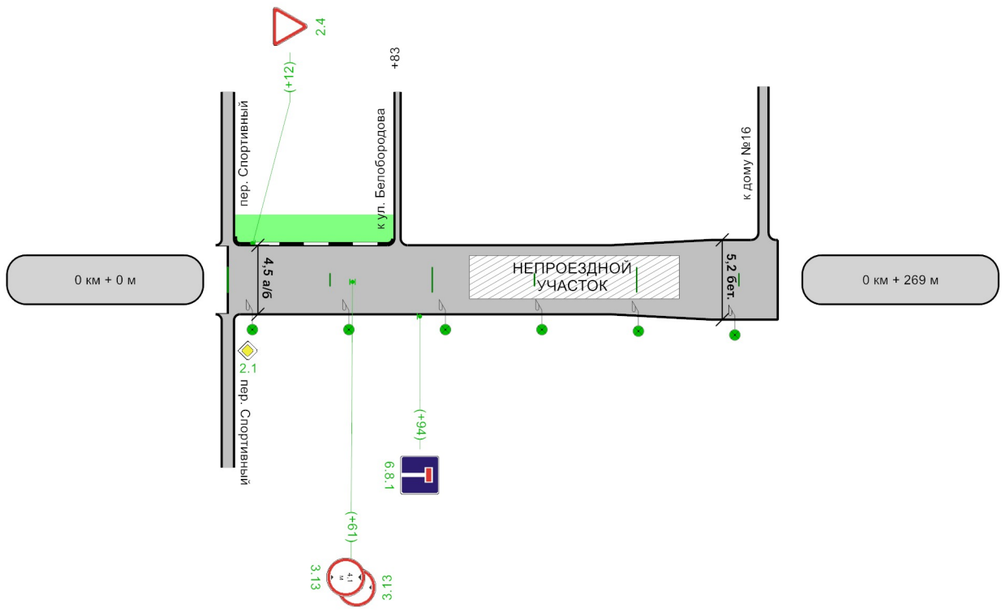

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
2	3.13	Ограничение высоты			0+052	Требуется установить	2	по центру
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Информационные знаки						
3	6.8.1	Тупик			0+080	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+012	0+248	Населенный пункт	6/6	200	0	Справа
Итого:				**6/6**	**200**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+083	Жилая застройка	Слева	83	
Итого:					**83**	**0**

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
