394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 10, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Внутриквартальная дорога на городском кладбище, находится в 330 м. на северо-восток от ориентира	6
5.	Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Новое»	17
6.	Автодорога пер. Путейский, стр. 2а, участок находится ориентировочно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира	24
7.	Автодорога от границы г. Усть-Кут км 0+000 до границы г. Усть-Кут км 3+873	28
8.	Автодорога в 80 м на юго-восток от здания по ул. Кирова, 18, вдоль здания по ул. Кирова, 20а (ФОК)	43
9.	Автодорога по ул. Володарского, от пересечения с ул. Белинского, Ориентир: жилой дом Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Белинского д. 4, до д. 72	47
10.	Автодорога от ул. Володарского, д. 79, до пересечения с ул. Пушкина	56
11.	Автодорога от ул. Матросова, стр. 2, участок находится ориентировочно в 450 м по направлению на северо-запад от ориентира до мостового сооружение через р. Кута	63
12.	Автодорога от примыкания автодороги общего пользования на км 1+200 до примыкания а/д ул. Советская	69
13.	Автодорога от пер. Рабочий до ул. Геологической	83
14.	Автодорога по ул. Речников, от д. №2 по ул. Речников (СПТУ), до ул. Речников, д. №15А	87
15.	Автодорога от перекрестка с ул. Солнечная до пер. Сиреневый	114
16.	Автодорога от ул. Майской до водозабора Слопешный	121
17.	Автодорога от д.2 по ул. Кравченко до пересечения с ул. Зимней, вблизи д. 10	133
18.	Автодорога от дома №128 по ул. Кировадо до пересечения с автодорогой по ул. Реброва-Денисова	136
19.	Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Старое»	139
20.	Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Старое»	142
21.	Внутриквартальная дорога «Якуримское кладбище»	148
22.	Внутриквартальная дорога входящая в состав сооружения «Городское кладбище «Новое»	151
23.	Автодорога от здания 54а по ул. Пушкина до примыкания к автодороге с кадастровым № 38:18:040202:1527	154
24.	Автодорога от пересечения с автодорогой по ул. Пушкина до примыкания автодороги с кадастровым № 38:18:000000:1255	157
25.	Автодорога по ул. Тополиная от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная	161
26.	Автодорога по ул. Благодатная, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная	166
27.	Автодорога от автодороги А-331 Вилюй до примыкания с земельным участком с кадастровым № 38:18:040105:15 по ул. Высоцкого, 22	171
28.	Обосновывающая часть ПОДД	175

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги

Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования внутрихозяйственного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Внутриквартальная дорога на городском кладбище, находится в 330 м. на северо-восток от ориентира


1-й участок: км 0+000 - км 0+337 3-й участок: км 0+000 - км 0+316
2-й участок: км 0+000 - км 0+327 4-й участок: км 0+000 - км 0+427
5-й участок: км 0+000 - км 0+237



Внутриквартальная дорога на городском кладбище находится в 330 м. на северо-восток от ориентира уч. №1

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 — 39 — R=4981м — 173 — 7
Кривые в плане	11 — R=645м, P=14; a=26° — 81
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,50

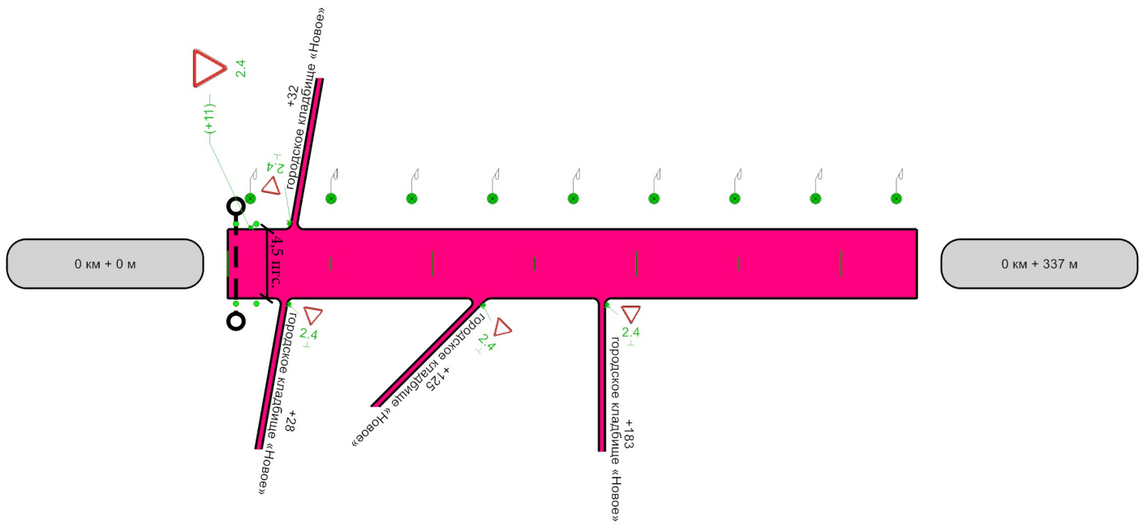

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+004	0+014	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+004	0+014	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+327	Населенный пункт	9/9	316	0	Слева
Итого:				**9/9**	**316**	**0**	

М 1:3000

Внутриквартальная дорога на городском кладбище находится в 330 м. на северо-восток от ориентира уч. №2

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	108 — 128 — 131 — R=3243м
Кривые в плане	119 R=680м P=35; a=11° 156 — 173 R=630м P=6; a=56 205 — 264 R=619м P=34; a=10°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,50 | 54 | 4,70

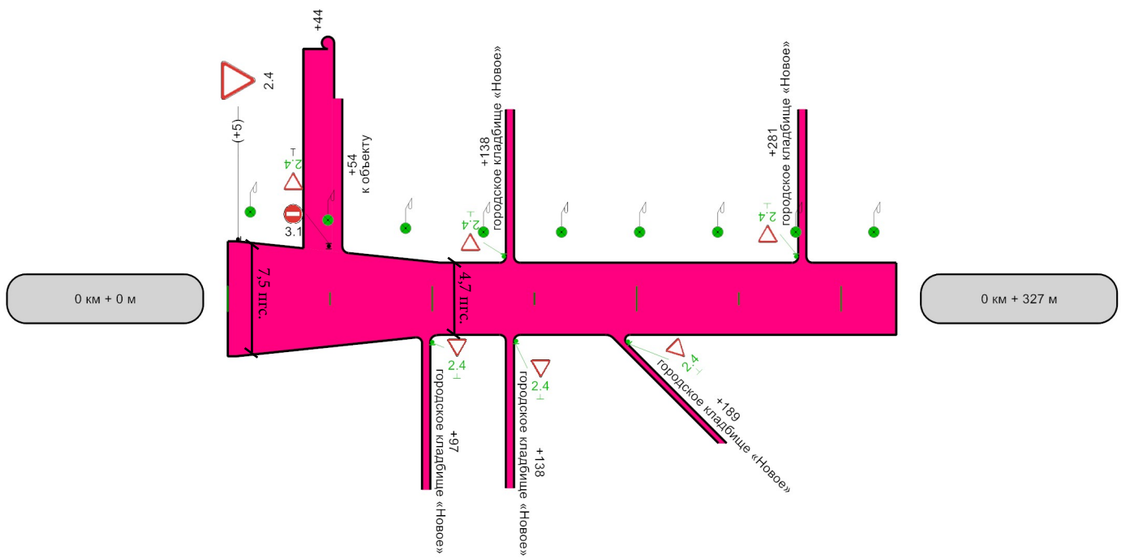

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+316	Населенный пункт	9/9	305	0	Слева
Итого:				**9/9**	**305**	**0**	

Внутриквартальная дорога на городском кладбище находится в 330 м. на северо-восток от ориентира уч. №3

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	125
Кривые в плане	R=612м P=4; a=13° 76 94 152 R=637м P=5; a=76° 206 217 R=684м P=23; a=12° 244 255 R=665м P=24; a=16° 304
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

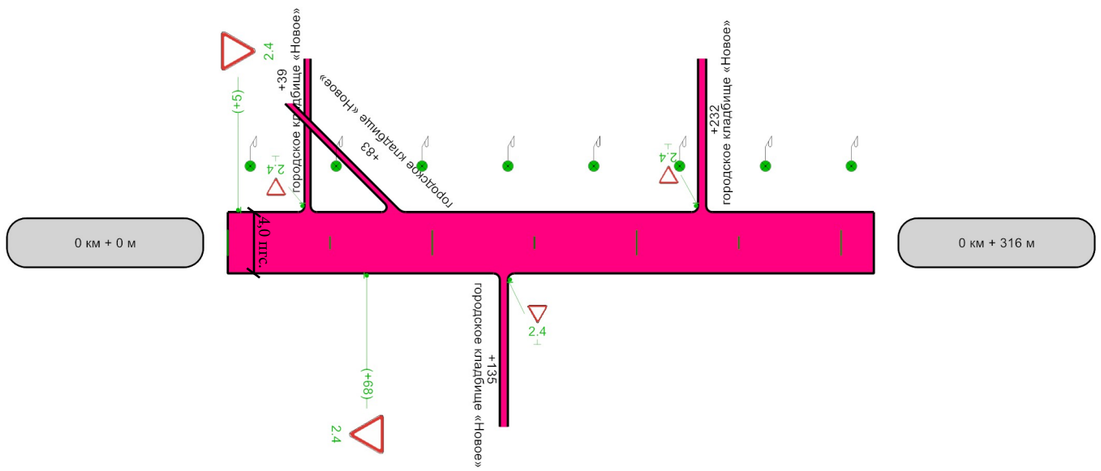

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+068	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+305	Населенный пункт	8/8	294	0	Слева
Итого:				**8/8**	**294**	**0**	

Внутриквартальная дорога на городском кладбище находится в 330 м. на северо-восток от ориентира уч. №4

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 124 (7) R=2787м — 244 (47) — 284 (46) R=2771м
Кривые в плане	238 R=646м P=5; a=68° — 307 (297) R=623м P=5; a=74° — 339
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

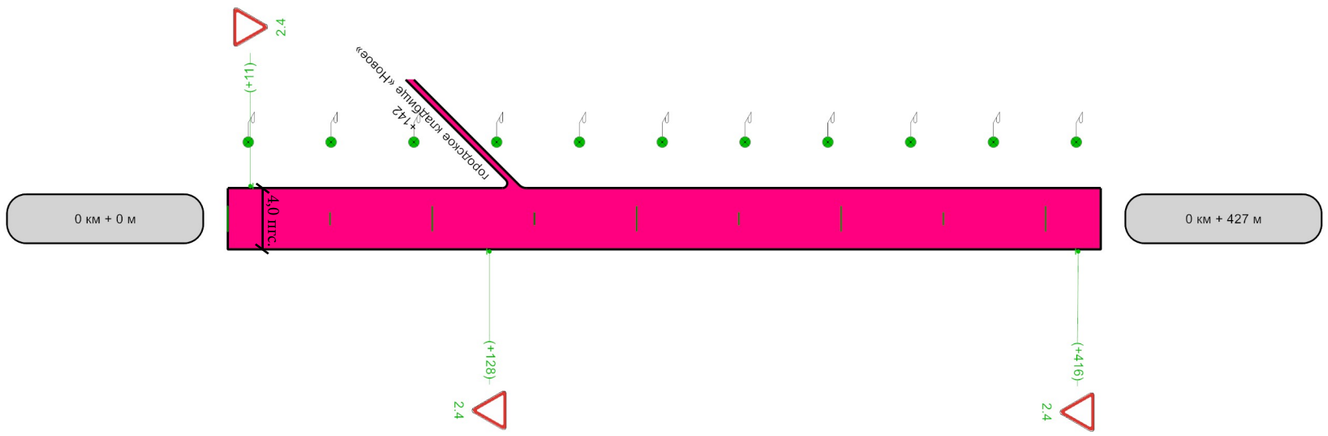

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+128	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+416	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+415	Населенный пункт	11/11	405	0	Слева
Итого:				**11/11**	**405**	**0**	

Внутриквартальная дорога на городском кладбище находится в 330 м. на северо-восток от ориентира уч. №5

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	13
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

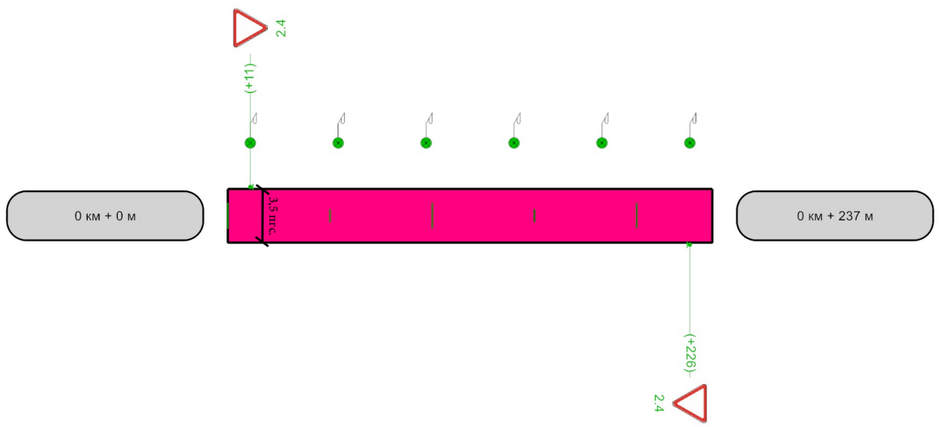

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+226	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+011	0+226	Автобусная остановка	6/6	215	0	Слева
Итого:				**6/6**	**215**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Новое»

1-й участок: км 0+000 - км 0+527
2-й участок: км 0+000 - км 0+213
3-й участок: км 0+000 - км 0+080

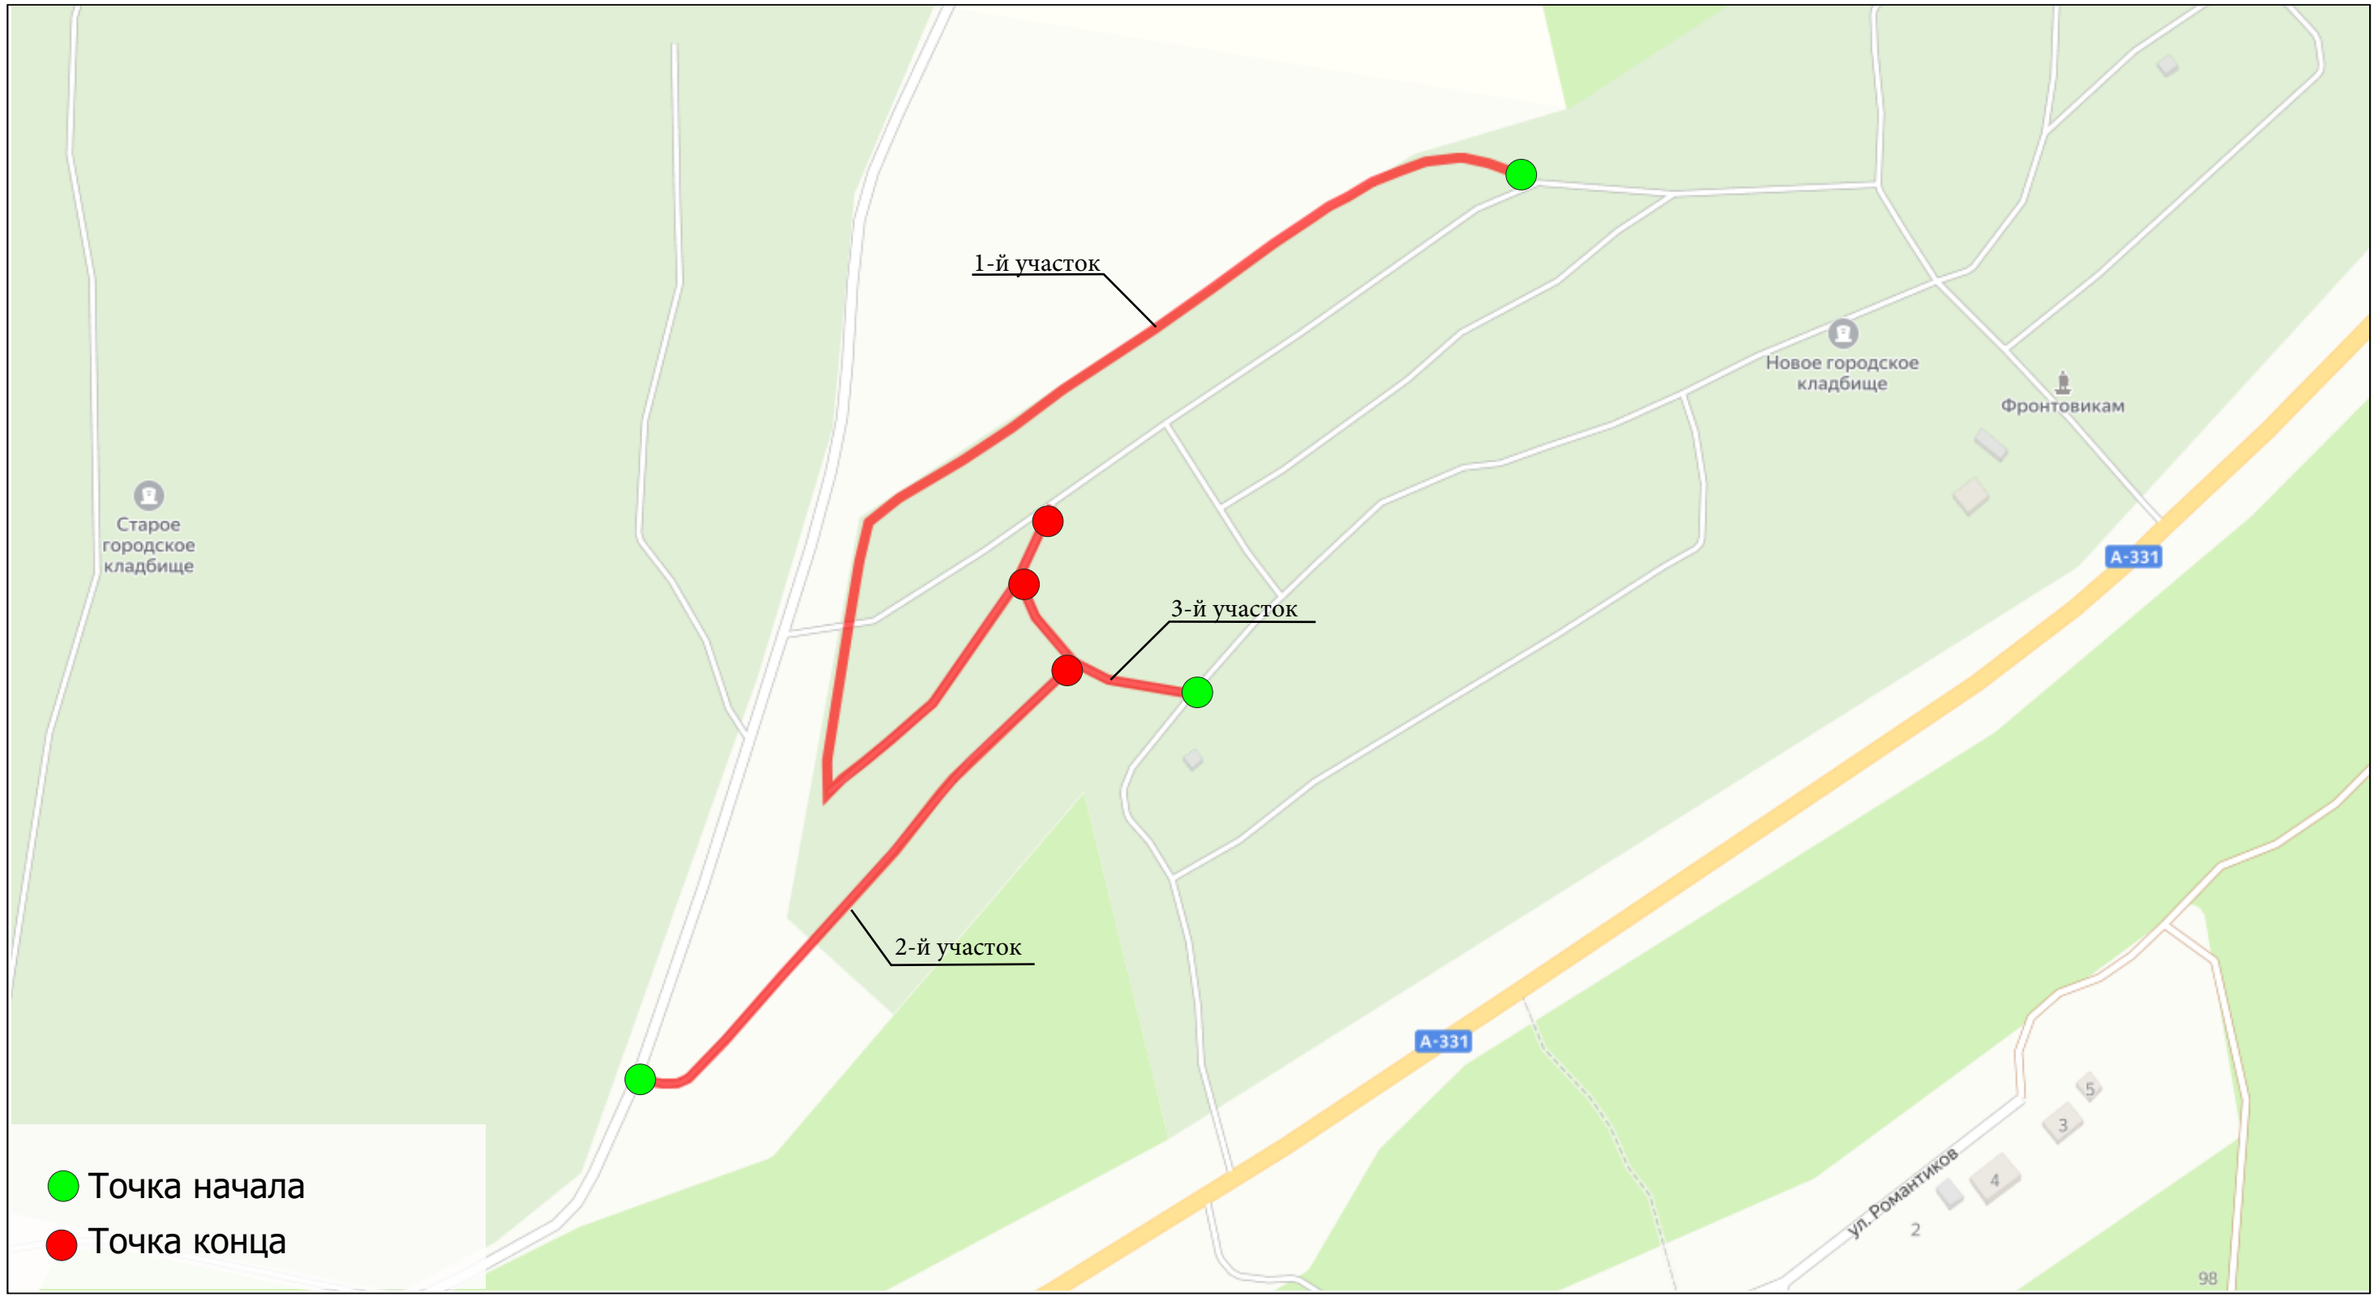

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	73 (2–311), R=2125м; 77 (311–341); 77 (341–502), R=1225м; 62
Кривые в плане	273 R=606м P=9; a=37° 301; 374 R=31м P=0; a=135° 400
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

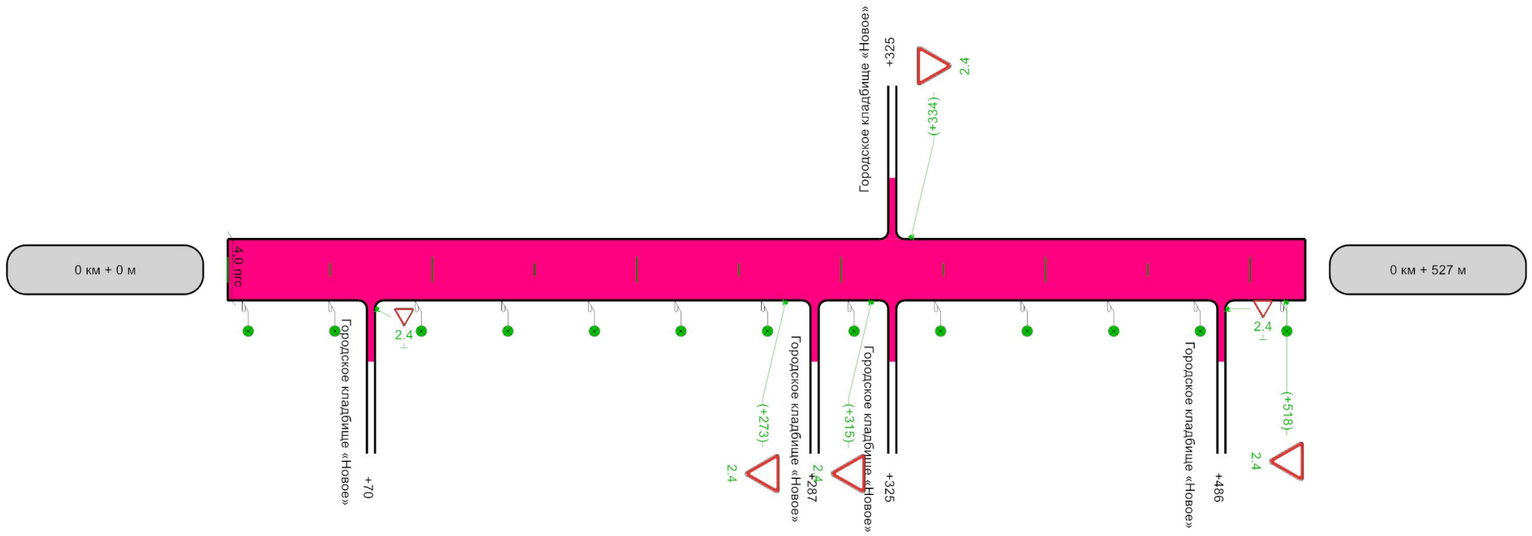

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+273	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+315	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+334	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+518	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+541	Населенный пункт	13/13	531	0	Справа
Итого:				**13/13**	**531**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	21 / 2 R=7998м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

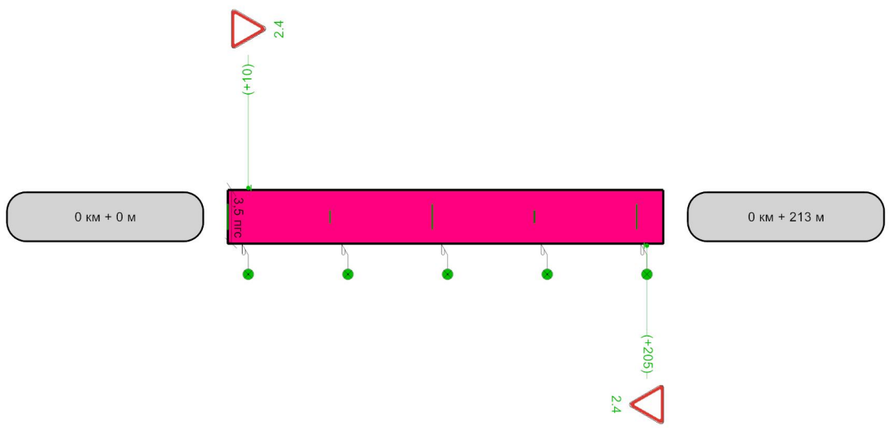

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+205	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+205	Населенный пункт	5/5	195	0	Справа
Итого:				**5/5**	**195**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	109
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

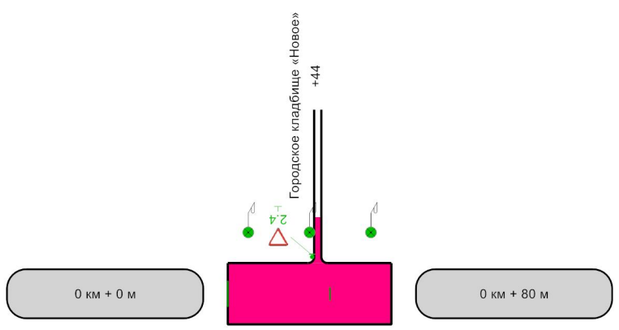

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+070	Населенный пункт	3/3	60	0	Слева
Итого:				**3/3**	**60**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога пер. Путейский, стр. 2а, участок находится ориентировочно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира
км 0+000 - км 0+225

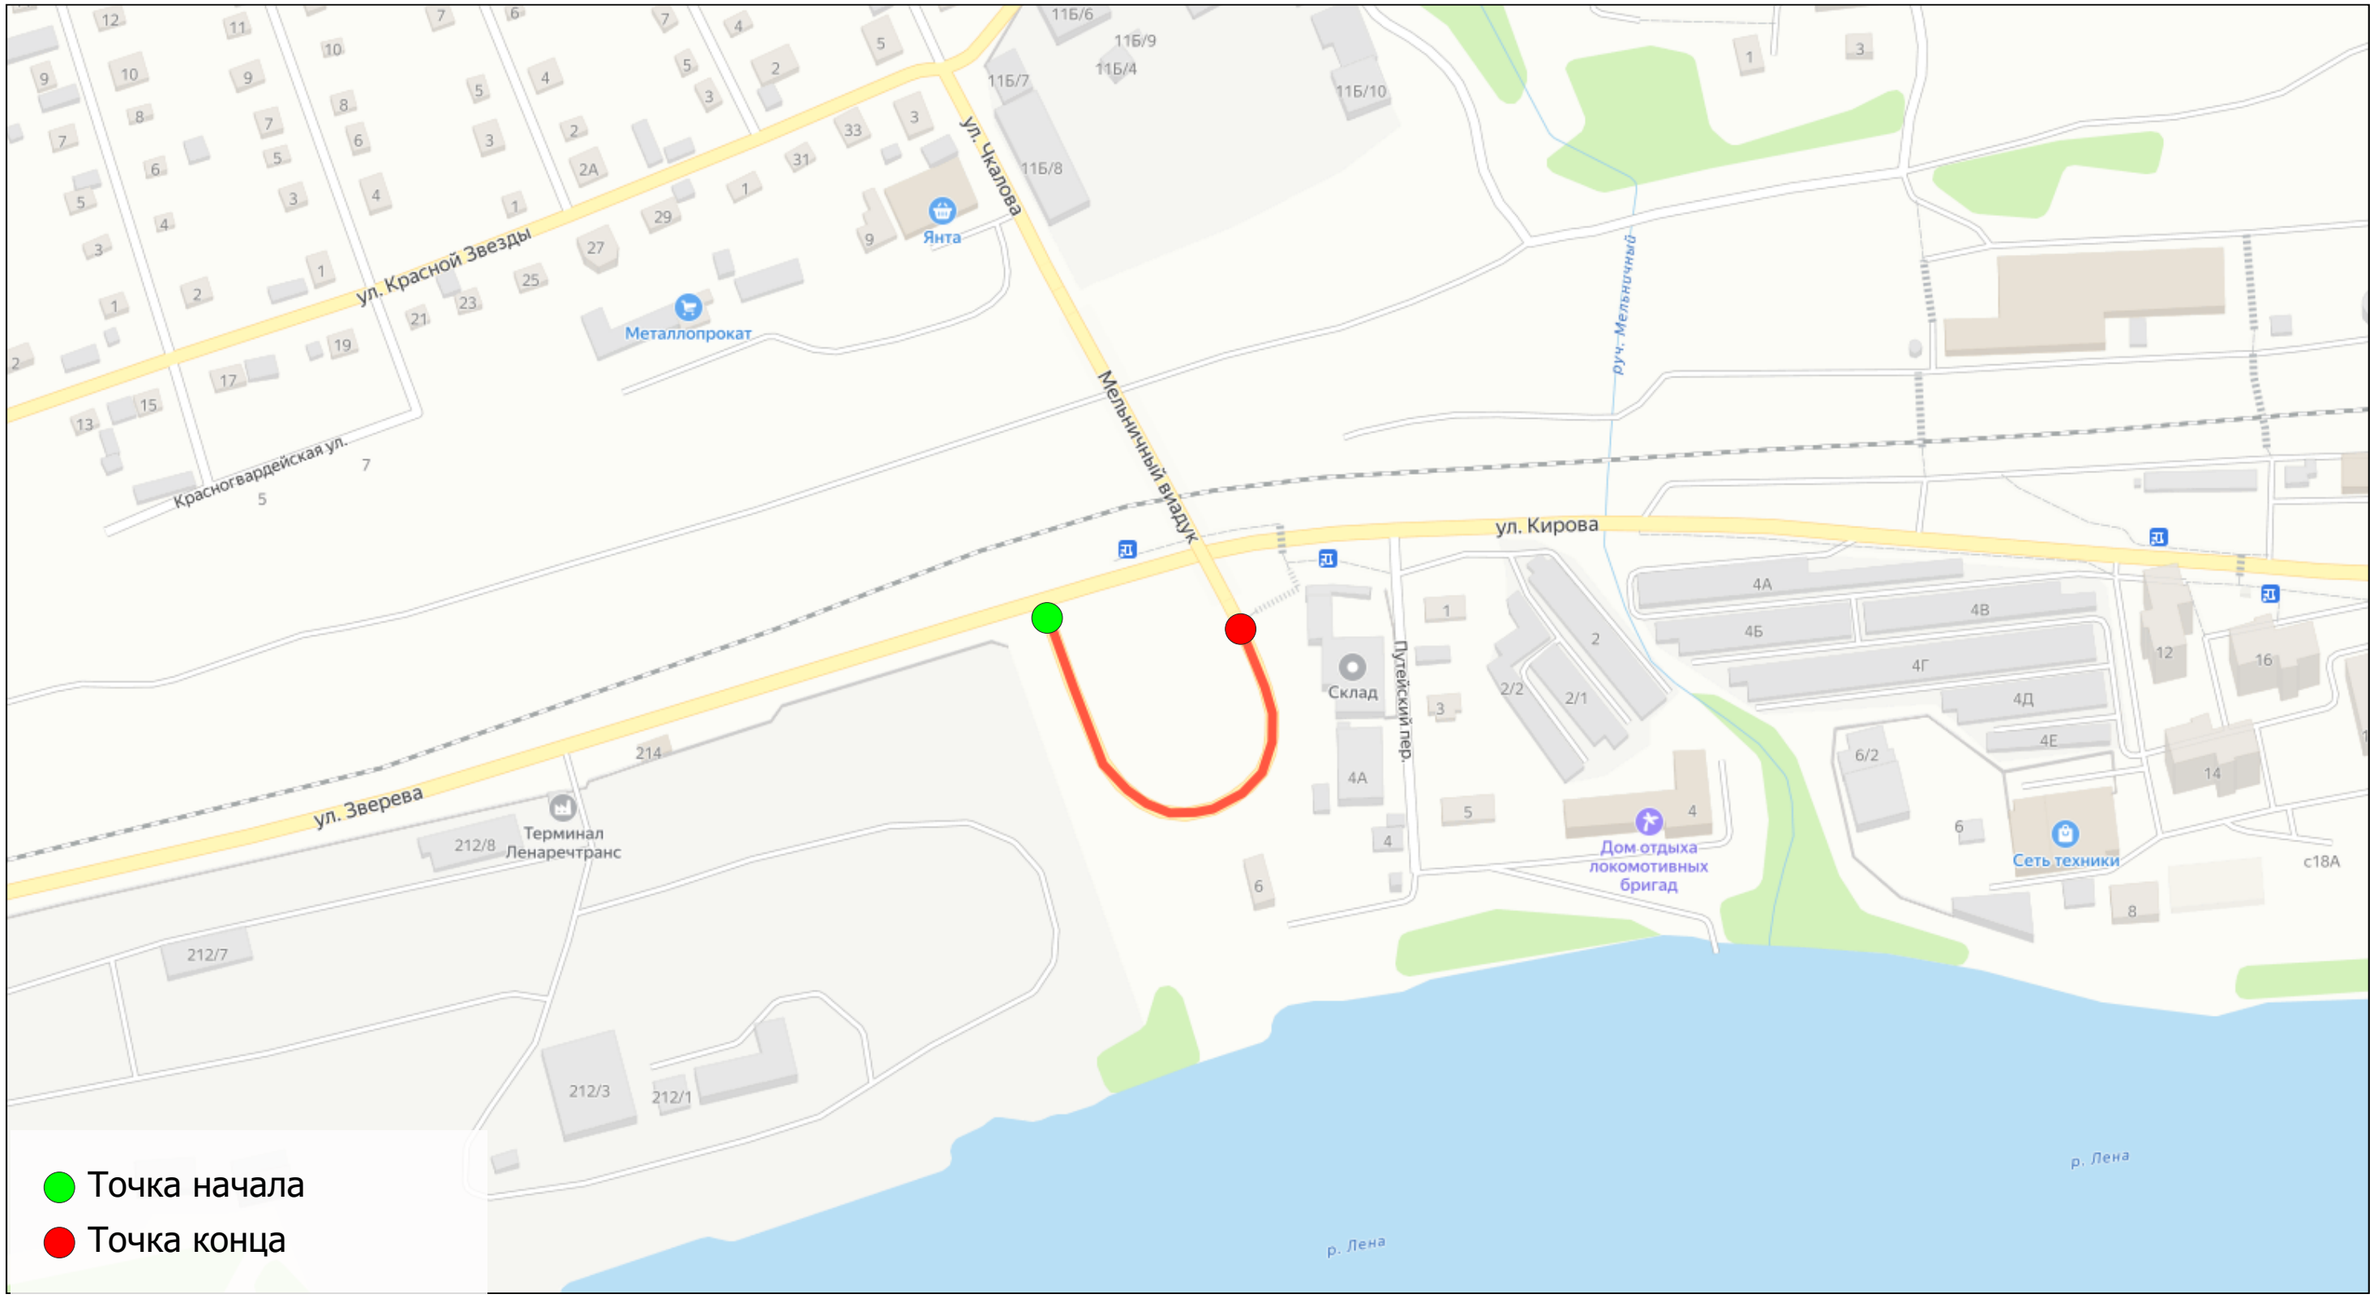

Автомобильная дорога пер. Путейский, стр. 2а, участок находится ориентировочно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 225
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Бетон, 125 - 225 н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 125 - 225
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 14 R=3987м 155 52
Кривые в плане	50 R=61м P=0; a=177°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 1,50-6,00-1,50

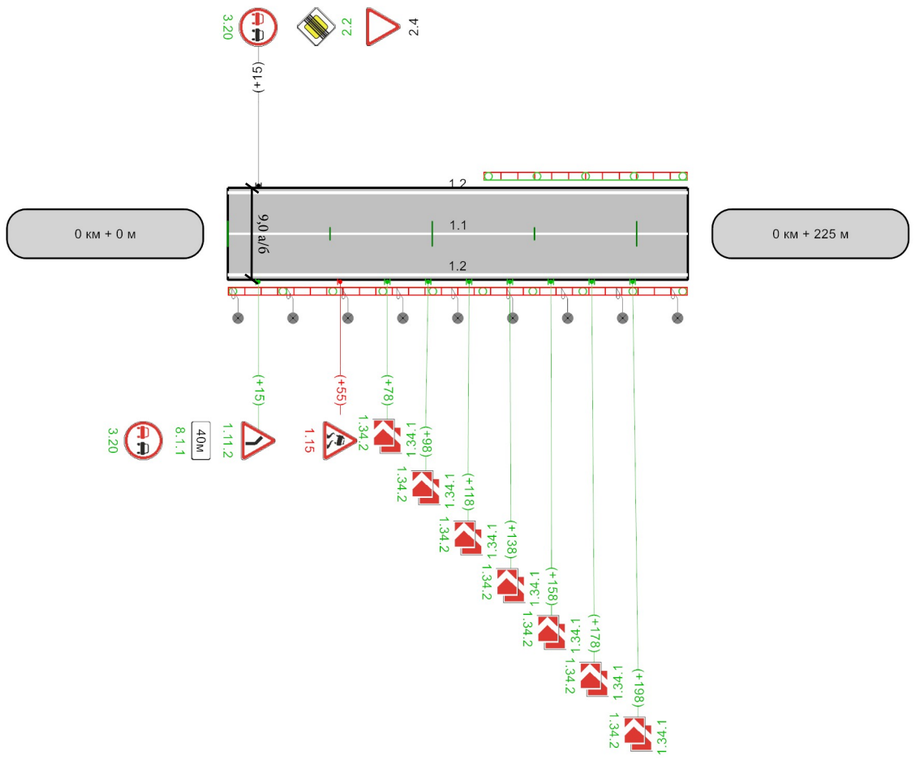

осевая	1.1 0 - 225
1-ая от осевой	1.2 0 - 225
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: 11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 225 Бетон, 0 - 225
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	225,000	450,000	**67,500**
ИТОГО	**225,000**	**450,000**	**67,500**
ЛИН.КМ	**0,225**	**0,450**	
ПРИВЕД.КМ	**0,225**	**0,450**	
ПЛОЩАДЬ	**22,500**	**45,000**	**67,500**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+015	Требуется установить	1	справа
2	1.15	Скользкая дорога			0+055	Демонтировать	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+078	Требуется установить	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+098	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+118	Требуется установить	1	справа
6	1.34.1	Направление поворота			0+138	Требуется установить	1	справа
7	1.34.1	Направление поворота			0+158	Требуется установить	1	справа
8	1.34.1	Направление поворота			0+178	Требуется установить	1	справа
9	1.34.1	Направление поворота			0+198	Требуется установить	1	справа
10	1.34.2	Направление поворота			0+078	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			0+098	Требуется установить	1	справа
12	1.34.2	Направление поворота			0+118	Требуется установить	1	справа
13	1.34.2	Направление поворота			0+138	Требуется установить	1	справа
14	1.34.2	Направление поворота			0+158	Требуется установить	1	справа
15	1.34.2	Направление поворота			0+178	Требуется установить	1	справа
16	1.34.2	Направление поворота			0+198	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**15**	
		Итого:					**15**	
		Знаки приоритета						
17	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
18	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
19	3.20	Обгон запрещен			0+015	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	3.20	Обгон запрещен			0+015	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
21	8.1.1	Расстояние до объекта			0+015	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**19**	
		Всего:					**20**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+000	0+225	225			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
2	0+125	0+225	100			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
Итого:			**325**							

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+220	Населенный пункт	9/9	0	215	Справа
Итого:				**9/9**	**0**	**215**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от границы г. Усть-Кут км 0+000 до границы г. Усть-Кут км 3+873


км 0+000 - км 3+873



М 1:3000

Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873

1-ая от осевой	1.2 0 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	41 · 44 · 14 · 17 · 11 · 6 · 19 · 19 52 · 229 · 428 · 583 · 679 · 819 · 854 R=3030м · R=5477м · R=10330м · R=9255м
Кривые в плане	48 · 182 · 284 · 414 · 661 · 891 R=1709м P=218; a=4° · R=997м P=77; a=7° · R=1420м P=88; a=9° · R=442м P=8; a=32°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0,10-6,00-0,10

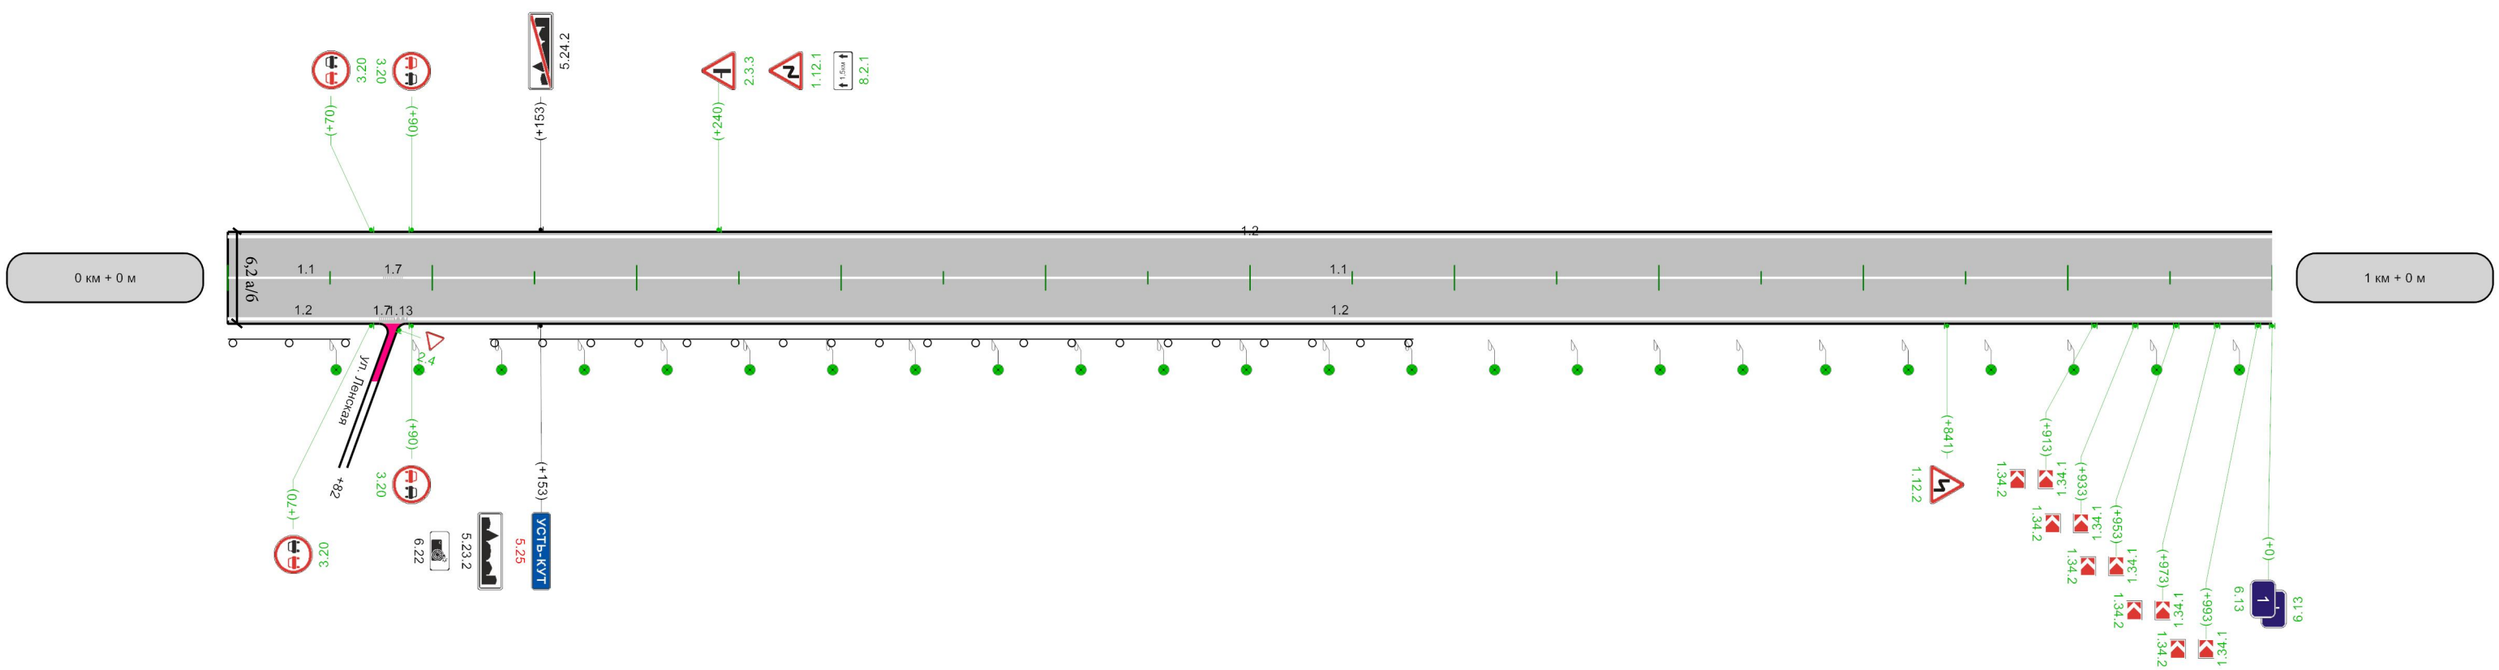


осевая	1.1 0 - 76	1.7 76 - 86	1.1 86 - 1000
1-ая от осевой	1.2 0 - 74	1.13 74 - 88	1.2 88 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 0 - 60		11 ДО-ММ, Оцинкованный металл, 128 - 580
Тротуары справа			

М 1:3000

Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873

Горизонтальная планировка и высотное положение	1-ая от осевой	1.2 0 - 120
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		19 1 0 11 6 58 R=9255 21 174 273 537 766 R=8628м R=4382м
Кривые в плане		R=442м P=8; a=32° 135 377 R=589м P=10; a=35° 739
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части	0,10-6,00-0,10	120 8,00

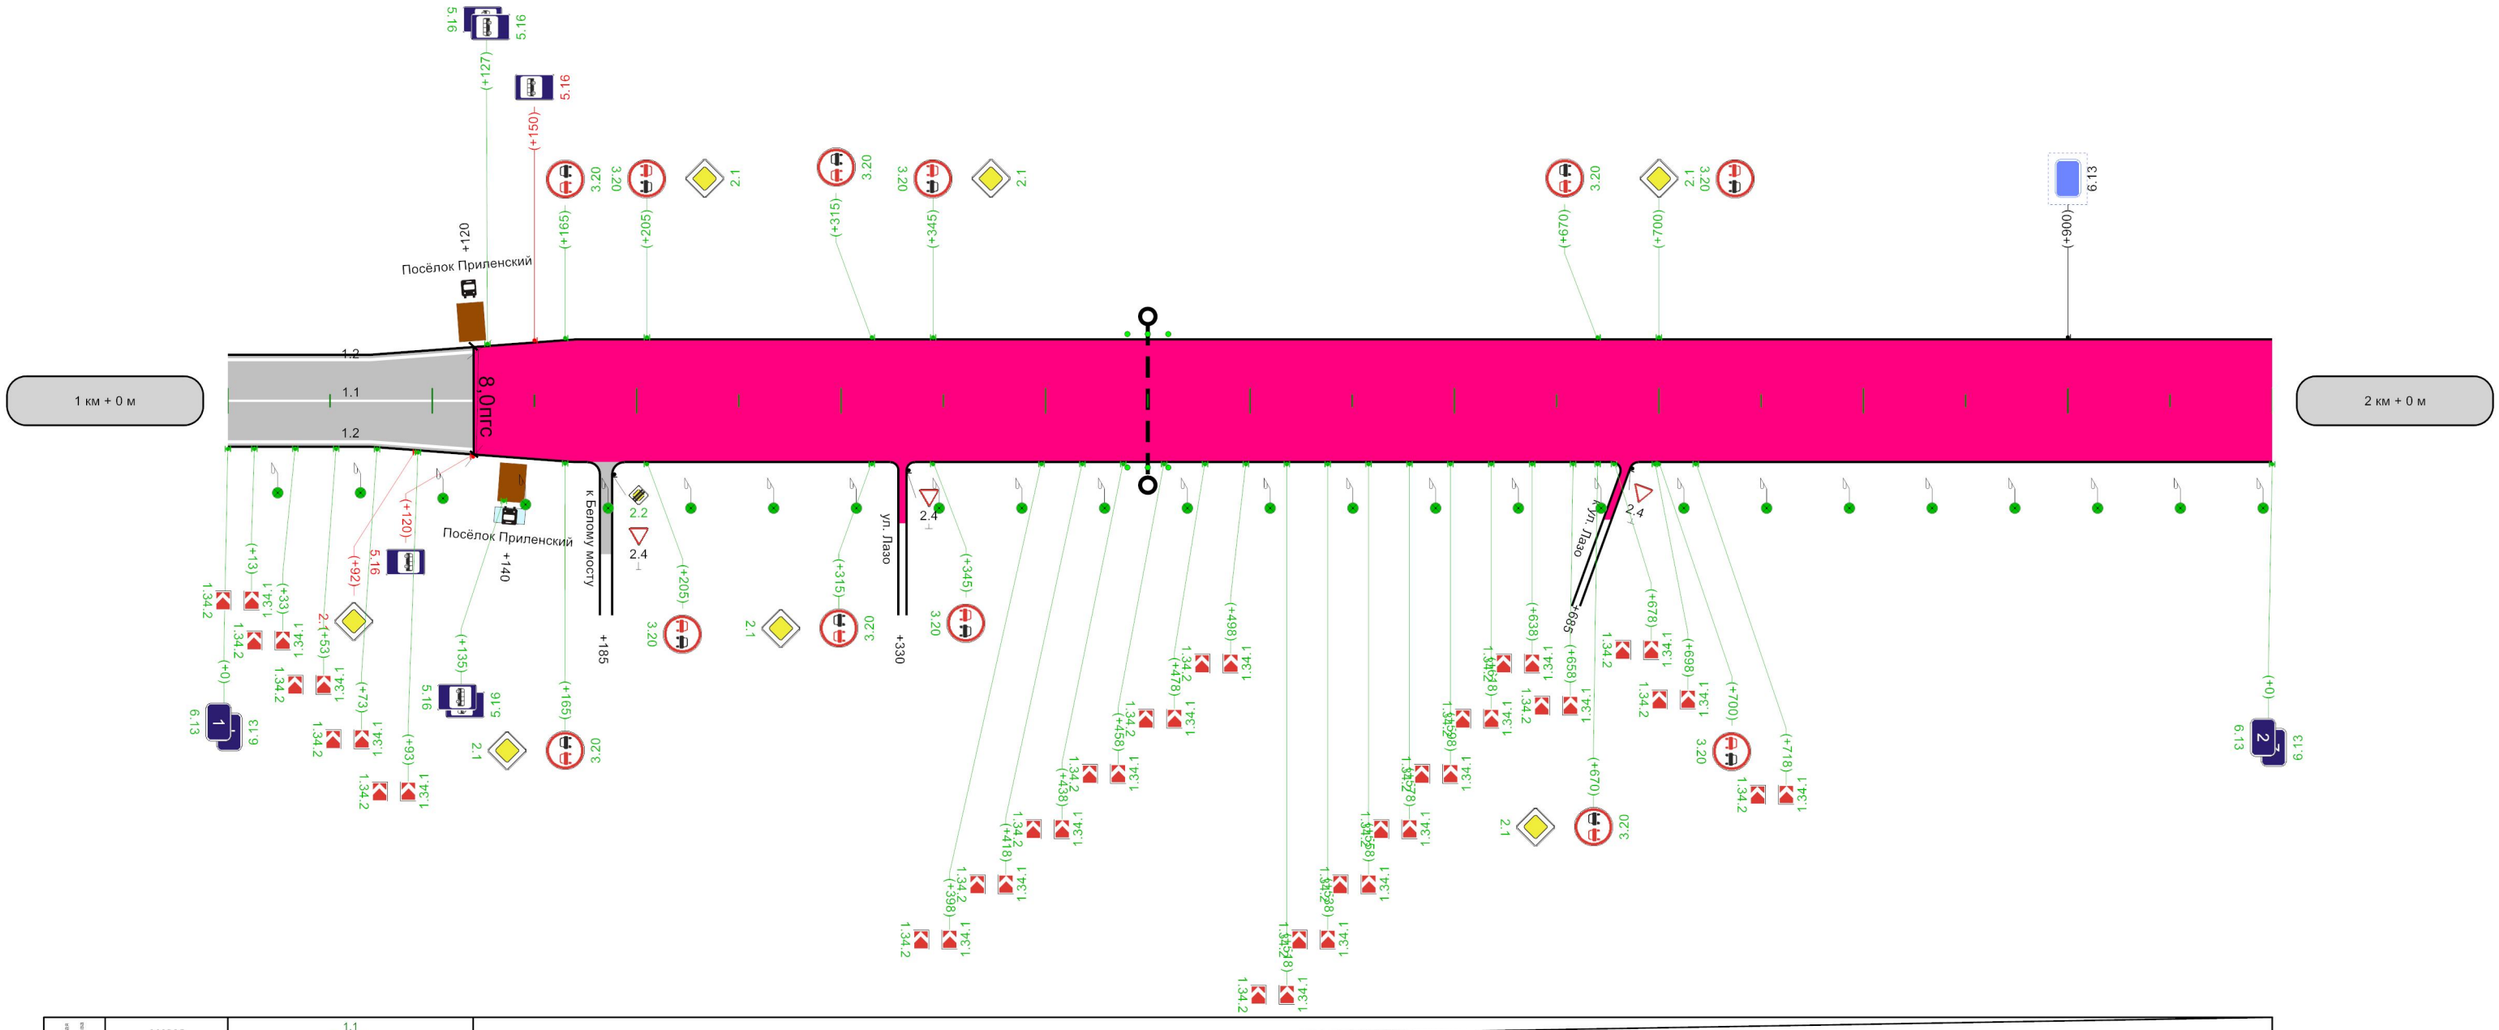


Горизонтальная планировка и высотное положение	осевая	1.1 0 - 120
	1-ая от осевой	1.2 0 - 120
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

М 1:3000

Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	58 | 54 (8) — R=2441м — 51 (263) — 54 (476) — R=5472м — 19 (669)
Кривые в плане	63 — R=454м P=10; a=25° — 250
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	8,00

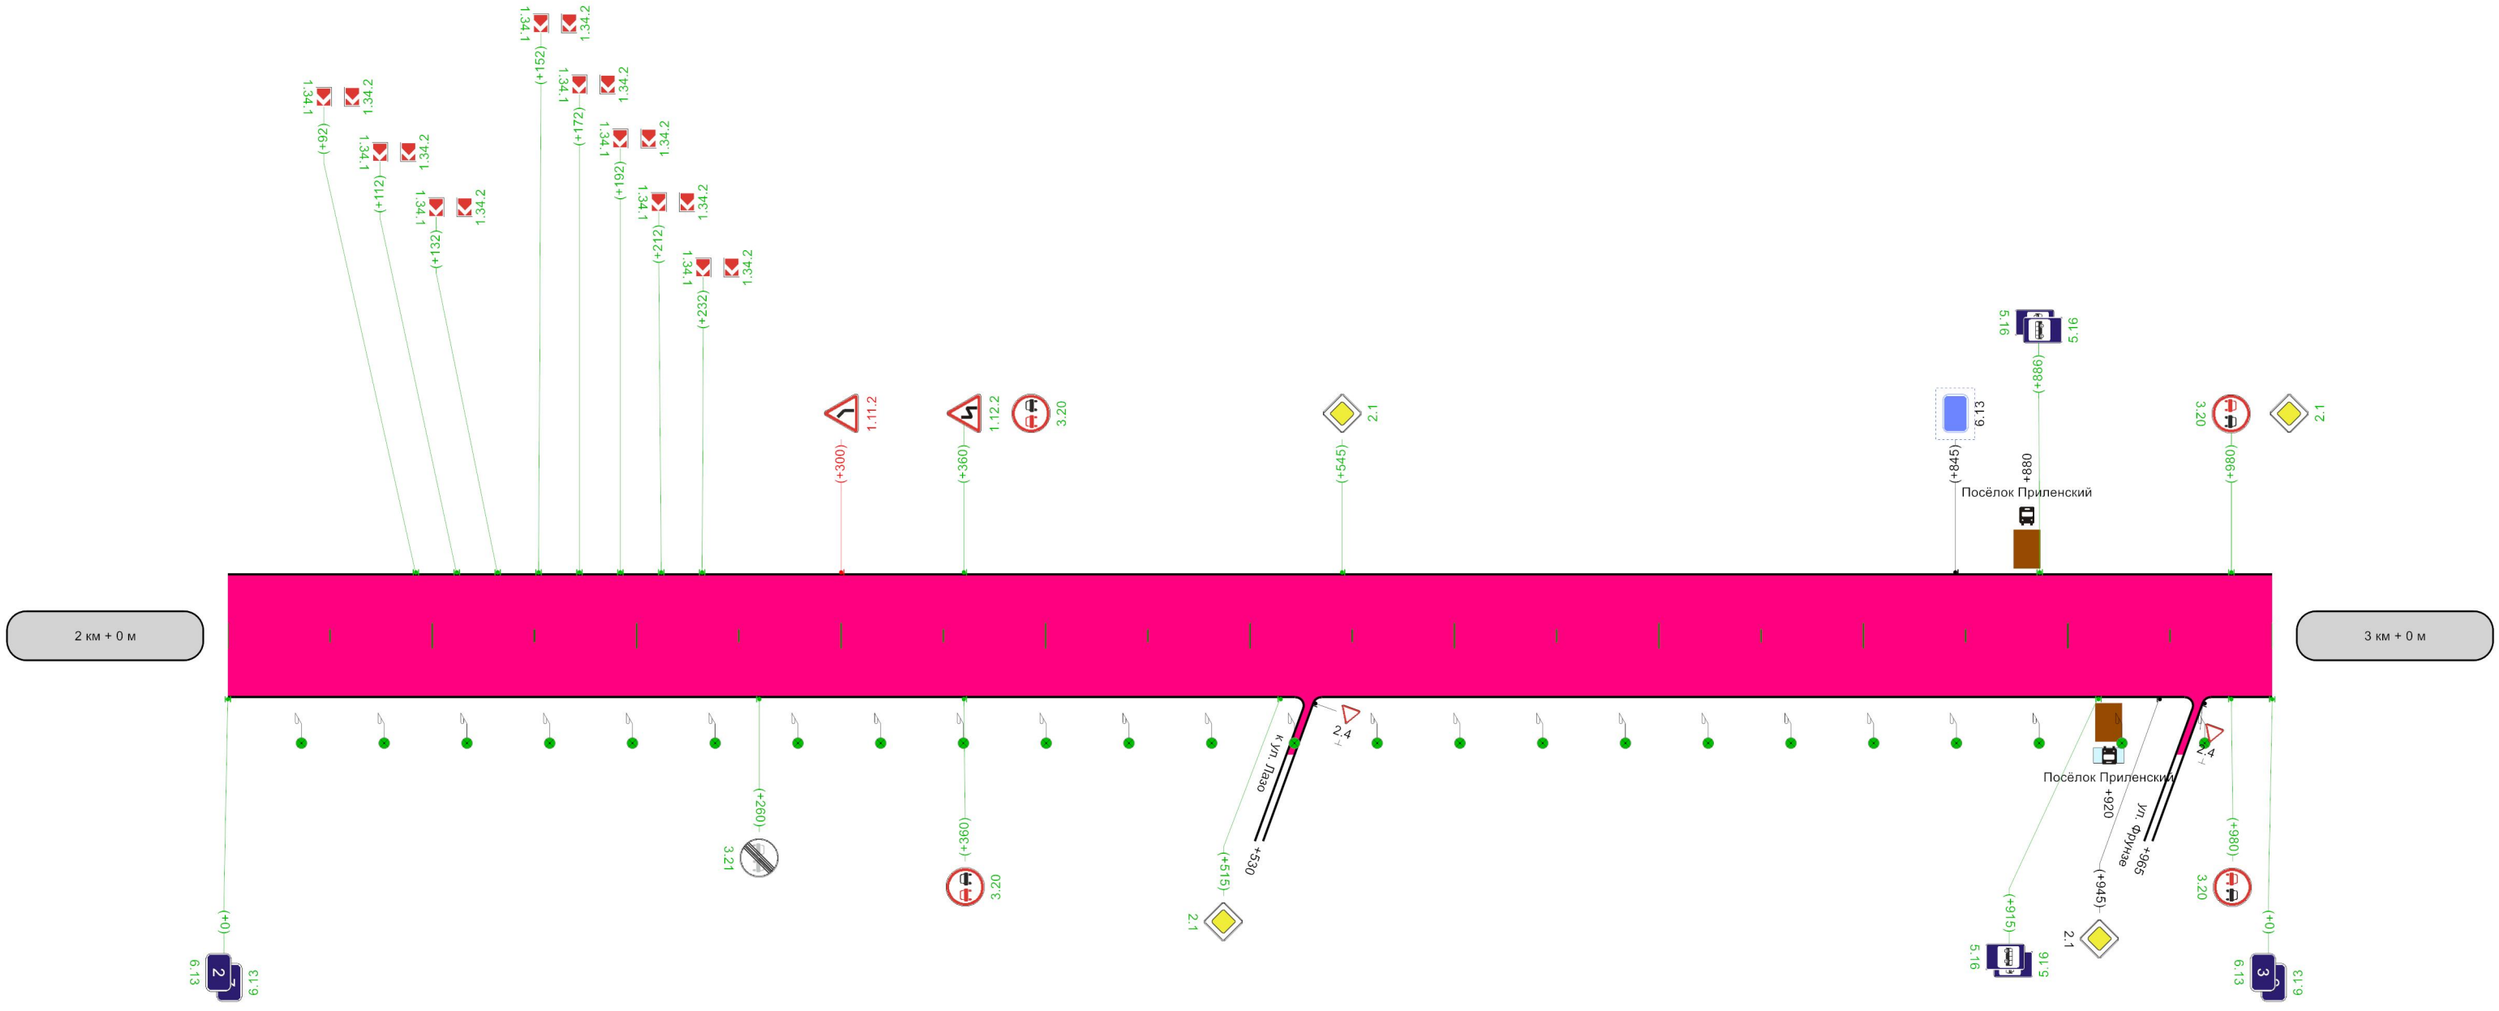


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000


Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873

| | | |

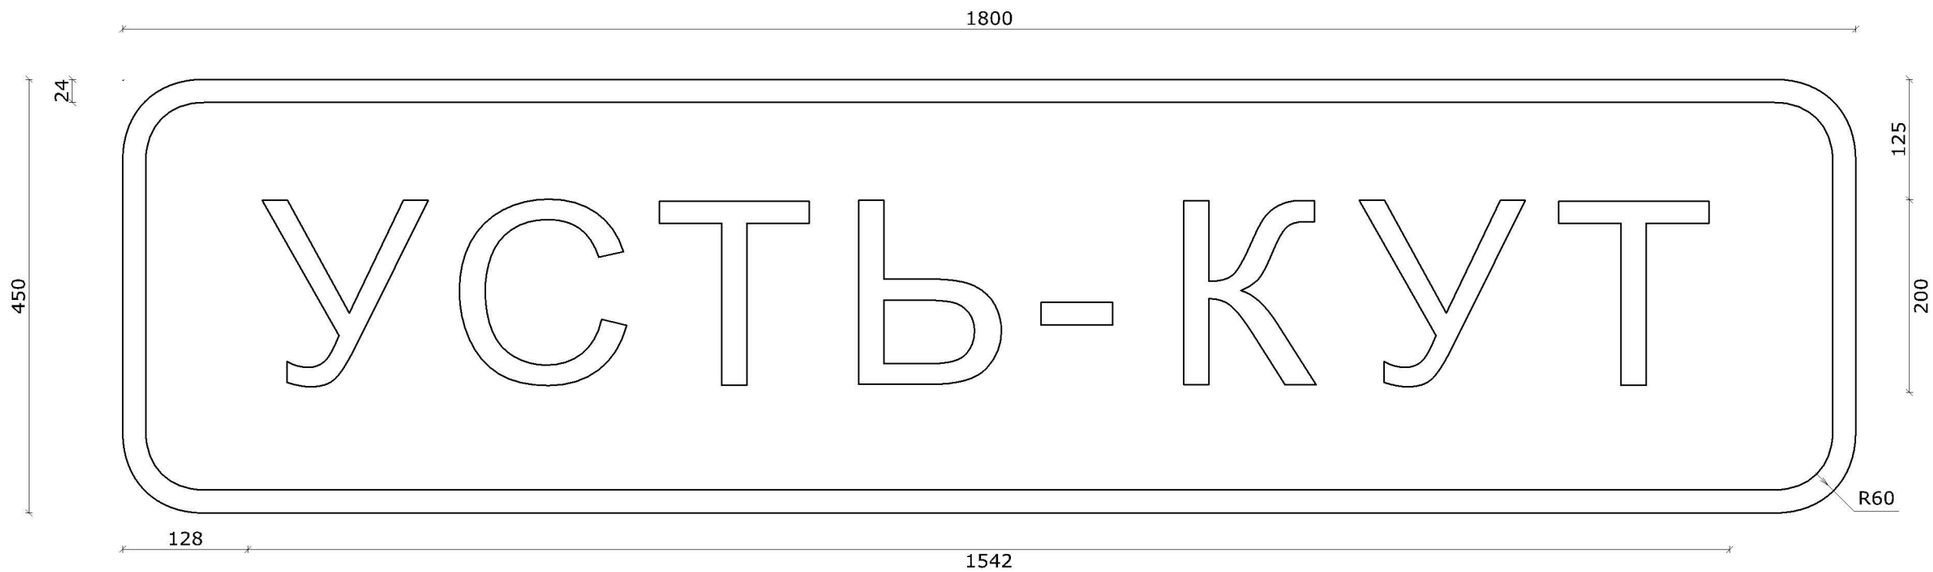


Номер знака: 5.25. "Начало населенного пункта"
Площадь: 0,81 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+153 Справа
Дорога: Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873
Фон знака: синий
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



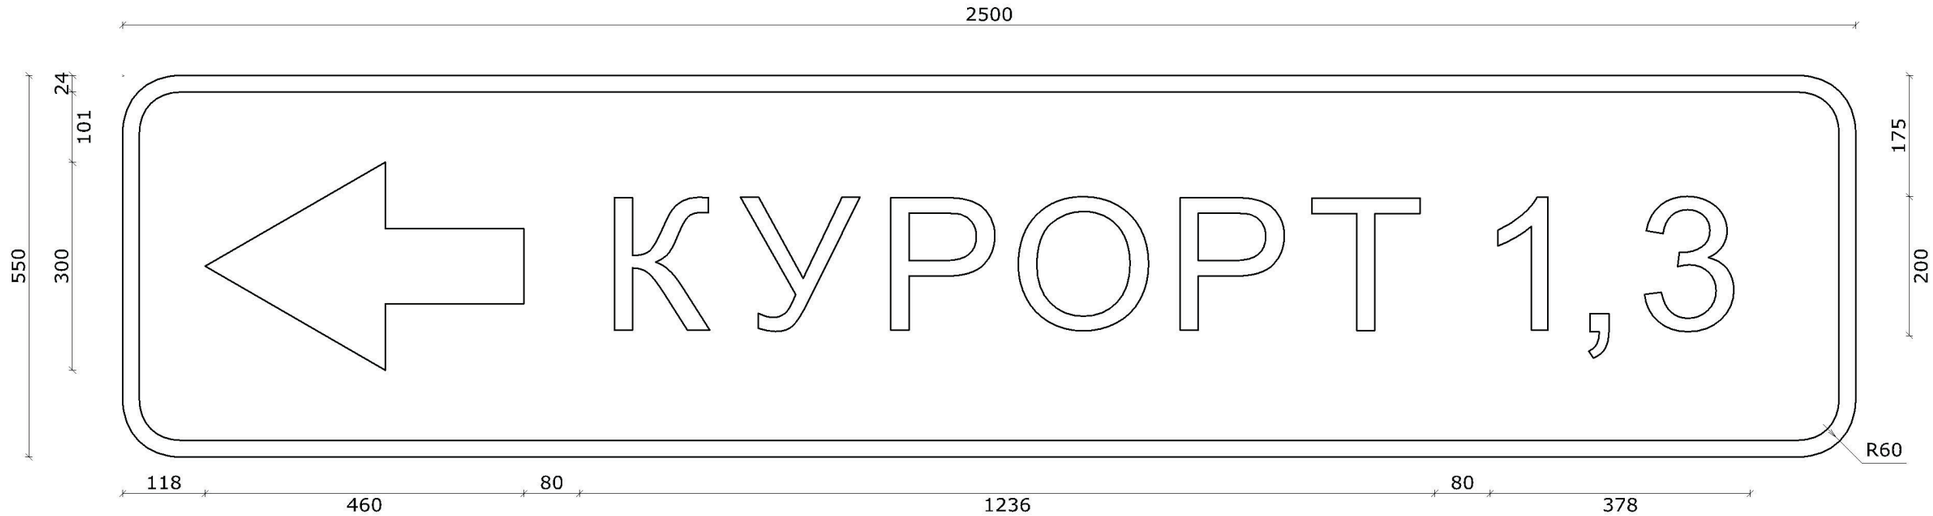



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"
Площадь: 1,38 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 3+750 Справа
Дорога: Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873
Фон знака: синий
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

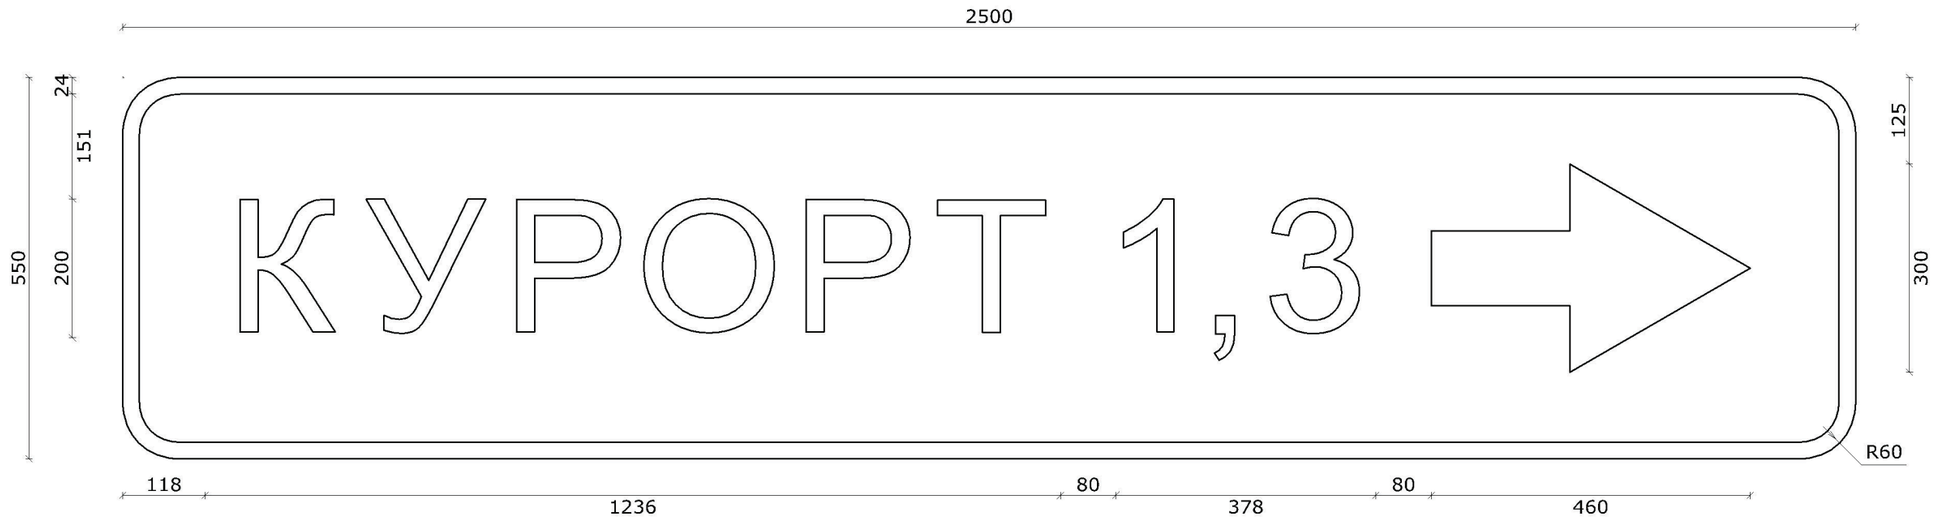



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"
Площадь: 1,38 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 3+785 Слева
Дорога: Автомобильная дорога от границы г.Усть-Кут км 0+000 до границы г.Усть-Кут км 3+873
Фон знака: синий
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	990,000	1986,000	17,000	7,000	**298,625**
1 - 2	120,000	240,000	0,000	0,000	**36,000**
2 - 3	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
3 - 4	740,000	1498,000	27,000	9,000	**225,375**
ИТОГО	**1850,000**	**3724,000**	**44,000**	**16,000**	**560,000**
ЛИН.КМ	**1,850**	**3,724**	**0,044**	**0,016**	
ПРИВЕД.КМ	**1,850**	**3,724**	**0,022**	**0,004**	
ПЛОЩАДЬ	**185,000**	**372,400**	**2,200**	**0,400**	**560,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			3+375	Требуется установить	1	справа
2	1.11.2	Опасный поворот			2+300	Демонтировать	1	слева
3	1.11.2	Опасный поворот			3+736	Демонтировать	1	слева
4	1.12.1	Опасные повороты			0+240	Требуется установить	1	слева
5	1.12.2	Опасные повороты			0+841	Требуется установить	1	справа
6	1.12.2	Опасные повороты			2+360	Требуется установить	1	слева
7	1.34.1	Направление поворота			0+913	Требуется установить	1	справа
8	1.34.1	Направление поворота			0+933	Требуется установить	1	справа
9	1.34.1	Направление поворота			0+953	Требуется установить	1	справа
10	1.34.1	Направление поворота			0+973	Требуется установить	1	справа
11	1.34.1	Направление поворота			0+993	Требуется установить	1	справа
12	1.34.1	Направление поворота			1+013	Требуется установить	1	справа
13	1.34.1	Направление поворота			1+033	Требуется установить	1	справа
14	1.34.1	Направление поворота			1+053	Требуется установить	1	справа
15	1.34.1	Направление поворота			1+073	Требуется установить	1	справа
16	1.34.1	Направление поворота			1+093	Требуется установить	1	справа
17	1.34.1	Направление поворота			1+398	Требуется установить	1	справа
18	1.34.1	Направление поворота			1+418	Требуется установить	1	справа
19	1.34.1	Направление поворота			1+438	Требуется установить	1	справа
20	1.34.1	Направление поворота			1+458	Требуется установить	1	справа
21	1.34.1	Направление поворота			1+478	Требуется установить	1	справа
22	1.34.1	Направление поворота			1+498	Требуется установить	1	справа
23	1.34.1	Направление поворота			1+518	Требуется установить	1	справа
24	1.34.1	Направление поворота			1+538	Требуется установить	1	справа
25	1.34.1	Направление поворота			1+558	Требуется установить	1	справа
26	1.34.1	Направление поворота			1+578	Требуется установить	1	справа
27	1.34.1	Направление поворота			1+598	Требуется установить	1	справа
28	1.34.1	Направление поворота			1+618	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	1.34.1	Направление поворота			1+638	Требуется установить	1	справа
30	1.34.1	Направление поворота			1+658	Требуется установить	1	справа
31	1.34.1	Направление поворота			1+678	Требуется установить	1	справа
32	1.34.1	Направление поворота			1+698	Требуется установить	1	справа
33	1.34.1	Направление поворота			1+718	Требуется установить	1	справа
34	1.34.1	Направление поворота			2+092	Требуется установить	1	слева
35	1.34.1	Направление поворота			2+112	Требуется установить	1	слева
36	1.34.1	Направление поворота			2+132	Требуется установить	1	слева
37	1.34.1	Направление поворота			2+152	Требуется установить	1	слева
38	1.34.1	Направление поворота			2+172	Требуется установить	1	слева
39	1.34.1	Направление поворота			2+192	Требуется установить	1	слева
40	1.34.1	Направление поворота			2+212	Требуется установить	1	слева
41	1.34.1	Направление поворота			2+232	Требуется установить	1	слева
42	1.34.1	Направление поворота			3+554	Требуется установить	1	слева
43	1.34.1	Направление поворота			3+574	Требуется установить	1	слева
44	1.34.1	Направление поворота			3+594	Требуется установить	1	слева
45	1.34.1	Направление поворота			3+614	Требуется установить	1	слева
46	1.34.1	Направление поворота			3+634	Требуется установить	1	слева
47	1.34.1	Направление поворота			3+654	Требуется установить	1	слева
48	1.34.1	Направление поворота			3+674	Требуется установить	1	слева
49	1.34.1	Направление поворота			3+694	Требуется установить	1	слева
50	1.34.1	Направление поворота			3+714	Требуется установить	1	слева
51	1.34.1	Направление поворота			3+734	Требуется установить	1	слева
52	1.34.1	Направление поворота			3+754	Требуется установить	1	слева
53	1.34.1	Направление поворота			3+774	Требуется установить	1	слева
54	1.34.1	Направление поворота			3+794	Требуется установить	1	слева
55	1.34.2	Направление поворота			0+913	Требуется установить	1	справа
56	1.34.2	Направление поворота			0+933	Требуется установить	1	справа
57	1.34.2	Направление поворота			0+953	Требуется установить	1	справа
58	1.34.2	Направление поворота			0+973	Требуется установить	1	справа
59	1.34.2	Направление поворота			0+993	Требуется установить	1	справа
60	1.34.2	Направление поворота			1+013	Требуется установить	1	справа
61	1.34.2	Направление поворота			1+033	Требуется установить	1	справа
62	1.34.2	Направление поворота			1+053	Требуется установить	1	справа
63	1.34.2	Направление поворота			1+073	Требуется установить	1	справа
64	1.34.2	Направление поворота			1+093	Требуется установить	1	справа
65	1.34.2	Направление поворота			1+398	Требуется установить	1	справа
66	1.34.2	Направление поворота			1+418	Требуется установить	1	справа
67	1.34.2	Направление поворота			1+438	Требуется установить	1	справа
68	1.34.2	Направление поворота			1+458	Требуется установить	1	справа
69	1.34.2	Направление поворота			1+478	Требуется установить	1	справа
70	1.34.2	Направление поворота			1+498	Требуется установить	1	справа
71	1.34.2	Направление поворота			1+518	Требуется установить	1	справа
72	1.34.2	Направление поворота			1+538	Требуется установить	1	справа
73	1.34.2	Направление поворота			1+558	Требуется установить	1	справа
74	1.34.2	Направление поворота			1+578	Требуется установить	1	справа
75	1.34.2	Направление поворота			1+598	Требуется установить	1	справа
76	1.34.2	Направление поворота			1+618	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1.34.2	Направление поворота			1+638	Требуется установить	1	справа
78	1.34.2	Направление поворота			1+658	Требуется установить	1	справа
79	1.34.2	Направление поворота			1+678	Требуется установить	1	справа
80	1.34.2	Направление поворота			1+698	Требуется установить	1	справа
81	1.34.2	Направление поворота			1+718	Требуется установить	1	справа
82	1.34.2	Направление поворота			2+092	Требуется установить	1	слева
83	1.34.2	Направление поворота			2+112	Требуется установить	1	слева
84	1.34.2	Направление поворота			2+132	Требуется установить	1	слева
85	1.34.2	Направление поворота			2+152	Требуется установить	1	слева
86	1.34.2	Направление поворота			2+172	Требуется установить	1	слева
87	1.34.2	Направление поворота			2+192	Требуется установить	1	слева
88	1.34.2	Направление поворота			2+212	Требуется установить	1	слева
89	1.34.2	Направление поворота			2+232	Требуется установить	1	слева
90	1.34.2	Направление поворота			3+554	Требуется установить	1	слева
91	1.34.2	Направление поворота			3+574	Требуется установить	1	слева
92	1.34.2	Направление поворота			3+594	Требуется установить	1	слева
93	1.34.2	Направление поворота			3+614	Требуется установить	1	слева
94	1.34.2	Направление поворота			3+634	Требуется установить	1	слева
95	1.34.2	Направление поворота			3+654	Требуется установить	1	слева
96	1.34.2	Направление поворота			3+674	Требуется установить	1	слева
97	1.34.2	Направление поворота			3+694	Требуется установить	1	слева
98	1.34.2	Направление поворота			3+714	Требуется установить	1	слева
99	1.34.2	Направление поворота			3+734	Требуется установить	1	слева
100	1.34.2	Направление поворота			3+754	Требуется установить	1	слева
101	1.34.2	Направление поворота			3+774	Требуется установить	1	слева
102	1.34.2	Направление поворота			3+794	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**100**	
		Итого:					**100**	
		Знаки приоритета						
103	2.1	Главная дорога			1+092	Демонтировать	1	справа
104	2.1	Главная дорога			1+165	Требуется установить	1	справа
105	2.1	Главная дорога			1+205	Требуется установить	1	слева
106	2.1	Главная дорога			1+315	Требуется установить	1	справа
107	2.1	Главная дорога			1+345	Требуется установить	1	слева
108	2.1	Главная дорога			1+670	Требуется установить	1	справа
109	2.1	Главная дорога			1+700	Требуется установить	1	слева
110	2.1	Главная дорога			2+515	Требуется установить	1	справа
111	2.1	Главная дорога			2+545	Требуется установить	1	слева
112	2.1	Главная дорога			2+945	Установлено	1	справа
113	2.1	Главная дорога			2+980	Требуется установить	1	слева
114	2.1	Главная дорога			3+785	Требуется установить	1	слева
115	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги			0+240	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги			3+625	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**13**	
		Запрещающие знаки						
117	3.11	Ограничение массы			3+863	Установлено	1	справа
118	3.20	Обгон запрещен			0+070	Требуется установить	1	слева
119	3.20	Обгон запрещен			0+070	Требуется установить	1	справа
120	3.20	Обгон запрещен			0+090	Требуется установить	1	слева
121	3.20	Обгон запрещен			0+090	Требуется установить	1	справа
122	3.20	Обгон запрещен			1+165	Требуется установить	1	слева
123	3.20	Обгон запрещен			1+165	Требуется установить	1	справа
124	3.20	Обгон запрещен			1+205	Требуется установить	1	слева
125	3.20	Обгон запрещен			1+205	Требуется установить	1	справа
126	3.20	Обгон запрещен			1+315	Требуется установить	1	слева
127	3.20	Обгон запрещен			1+315	Требуется установить	1	справа
128	3.20	Обгон запрещен			1+345	Требуется установить	1	слева
129	3.20	Обгон запрещен			1+345	Требуется установить	1	справа
130	3.20	Обгон запрещен			1+670	Требуется установить	1	слева
131	3.20	Обгон запрещен			1+670	Требуется установить	1	справа
132	3.20	Обгон запрещен			1+700	Требуется установить	1	слева
133	3.20	Обгон запрещен			1+700	Требуется установить	1	справа
134	3.20	Обгон запрещен			2+360	Требуется установить	1	слева
135	3.20	Обгон запрещен			2+360	Требуется установить	1	справа
136	3.20	Обгон запрещен			2+980	Требуется установить	1	слева
137	3.20	Обгон запрещен			2+980	Требуется установить	1	справа
138	3.20	Обгон запрещен			3+750	Требуется установить	1	слева
139	3.20	Обгон запрещен			3+750	Требуется установить	1	справа
140	3.20	Обгон запрещен			3+785	Требуется установить	1	слева
141	3.20	Обгон запрещен			3+785	Требуется установить	1	справа
142	3.21	Конец зоны запрещения обгона			2+260	Требуется установить	1	справа
143	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+525	Требуется установить	1	справа
144	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+625	Требуется установить	1	справа
145	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+750	Требуется установить	1	справа
146	3.24	Ограничение максимальной скорости			3+863	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**28**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**30**	
		Знаки особых предписаний						
147	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+120	Демонтировать	1	справа
148	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+127	Требуется установить	2	слева
149	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+135	Требуется установить	2	справа
150	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+150	Демонтировать	1	слева
151	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+886	Требуется установить	2	слева
152	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+915	Требуется установить	2	справа
153	5.23.2	Начало населенного пункта			0+153	Установлено	1	справа
154	5.23.2	Начало населенного пункта			3+200	Требуется установить	1	слева
155	5.24.2	Конец населенного пункта			0+153	Установлено	1	слева
156	5.24.2	Конец населенного пункта			3+200	Требуется установить	1	справа
157	5.25	Начало населенного пункта		0,81	0+153	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**12**	
		Информационные знаки						
158	6.10.1	Указатель направлений		1,38	3+750	Требуется установить	1	справа
159	6.10.1	Указатель направлений		1,38	3+785	Требуется установить	1	слева
160	6.13	Километровый знак			1+000	Требуется установить	2	справа
161	6.13	Километровый знак			1+900	Демонтировать	1	слева
162	6.13	Километровый знак			2+000	Требуется установить	2	справа
163	6.13	Километровый знак			2+845	Демонтировать	1	слева
164	6.13	Километровый знак			3+000	Требуется установить	2	справа
165	6.22	Фотовидеофиксация			0+153	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
166	8.2.1	Зона действия			0+240	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**5**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**9**	
		Всего требуется установить:					**159**	
		Всего:					**164**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+440	1+460	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	1+440	1+460	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	3+545	3+825		280/23	Справа	Пластмасса	Кривая в плане
4	3+590	3+755		165/14	Слева	Пластмасса	Кривая в плане
Итого:			**40/6**	**445/37**			

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+053	3+250	Населенный пункт	80/80	3197	0	Справа
Итого:				**80/80**	**3197**	**0**	


Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1+120	Слева	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				
2	1+140	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
3	2+880	Слева	посадочная площадка	павильон, заездной карман	нет				
4	2+920	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога в 80 м на юго-восток от здания по ул. Кирова, 18, вдоль здания по ул. Кирова, 20а (ФОК)

км 0+000 - км 0+228

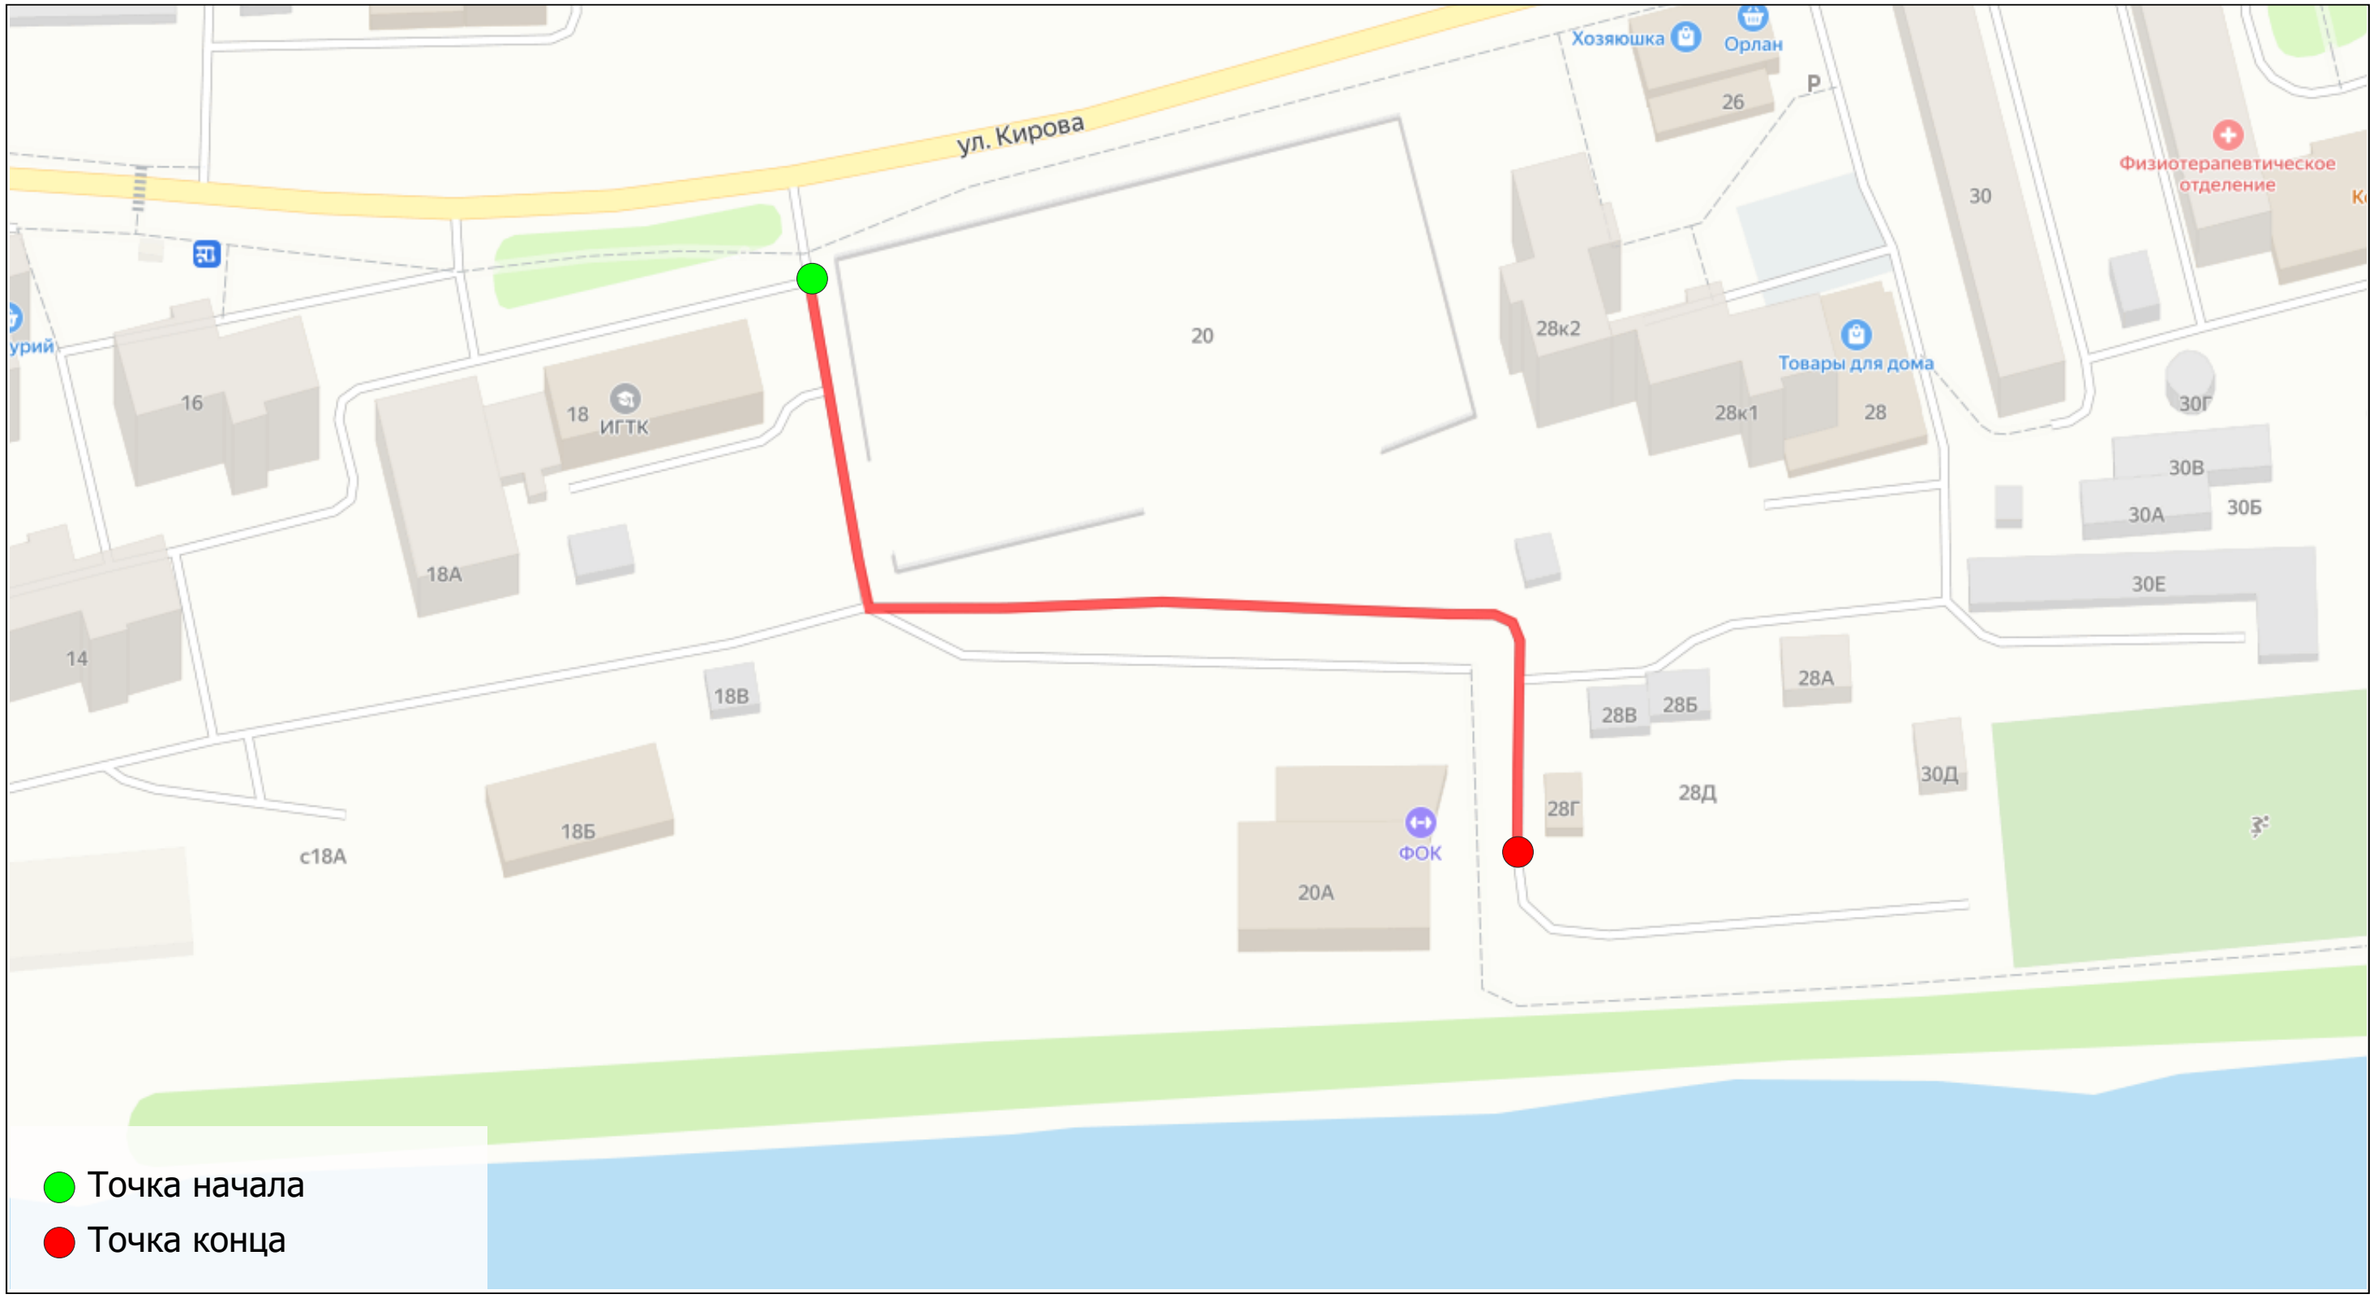

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 10 11 R=13949м 185 2
Кривые в плане	45 R=33м P=6; a=3° 75 R=45м 170 190
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,70 | 60 | 4,50

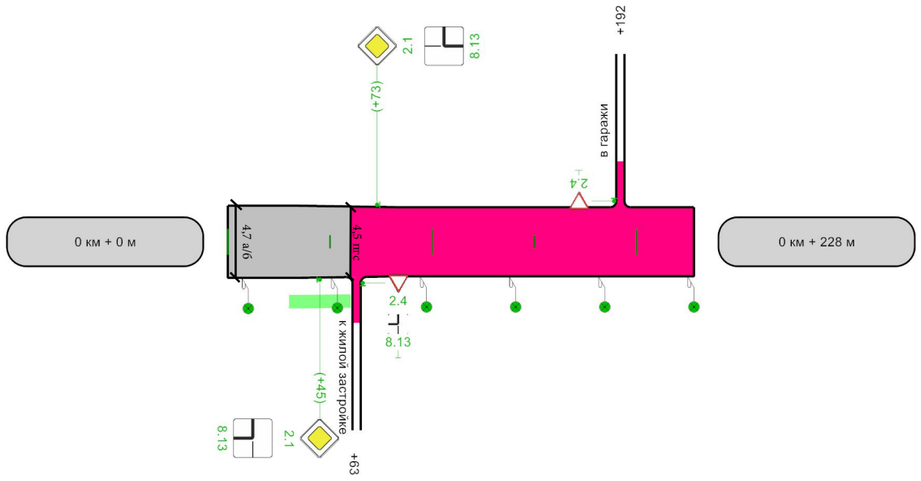

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+045	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+073	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+045	Требуется установить	1	справа
4	8.13	Направление главной дороги			0+073	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+228	Населенный пункт	6/6	218	0	Справа
Итого:				**6/6**	**218**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+030	0+060	Жилая застройка	Справа	30	
Итого:					**30**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Володарского, от пересечения с ул. Белинского, Ориентир: жилой дом Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Белинского д. 4 , до д. 72

1-й участок: км 0+000 - км 0+107
2-й участок: км 0+000 - км 0+293
3-й участок: км 0+000 - км 0+610
4-й участок: км 0+000 - км 0+190

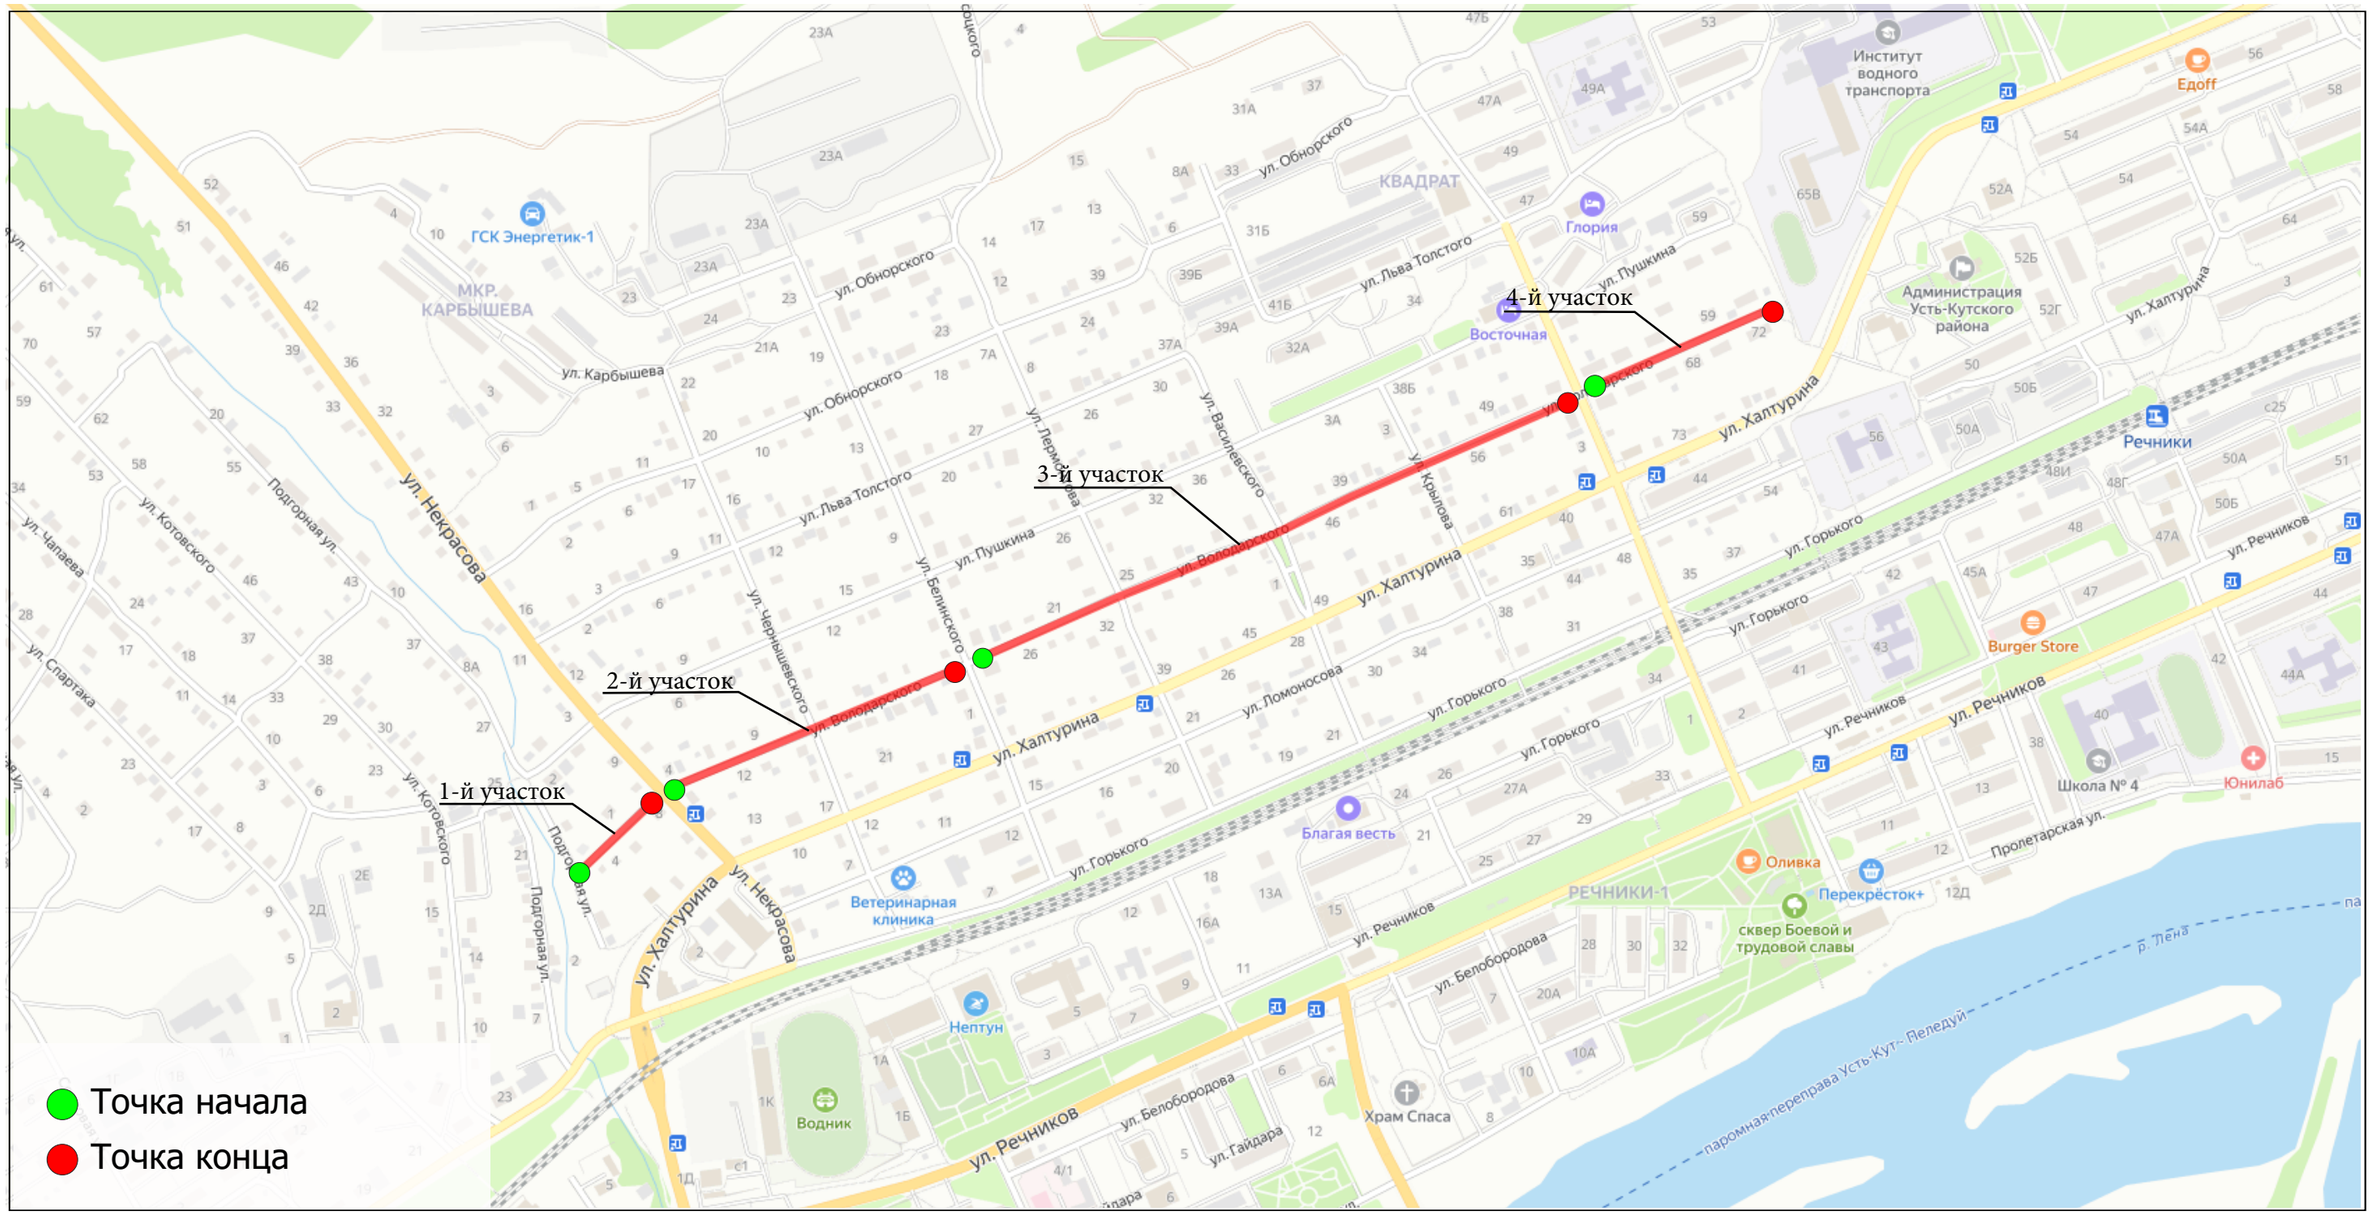

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	39 5 R=2566м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

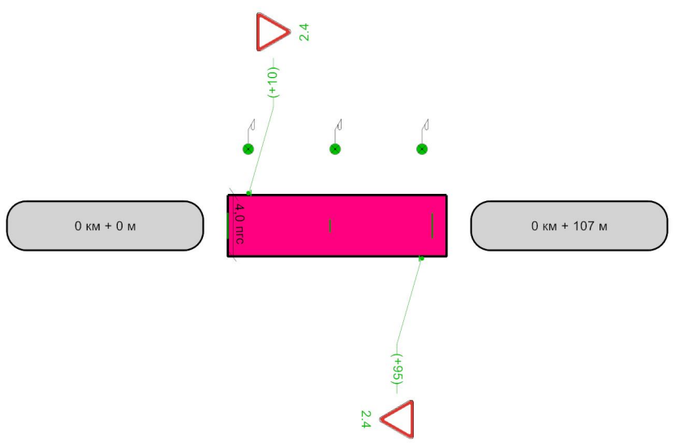

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+095	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+095	Населенный пункт	3/3	85	0	Слева
Итого:				**3/3**	**85**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	84 86 85 5 40 R=3666м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

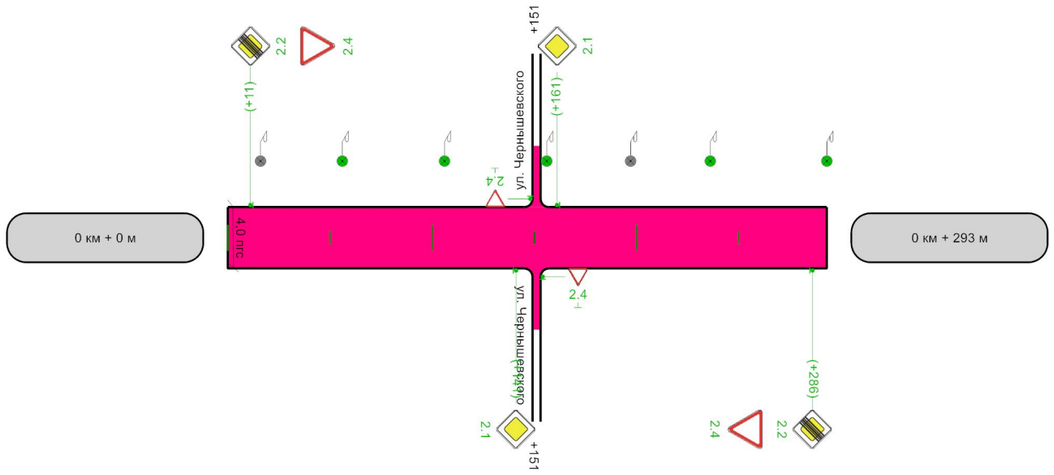

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+141	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+161	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+011	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+286	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+011	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+286	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+016	0+016	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+056	0+156	Населенный пункт	3/3	100	0	Слева
3	0+197	0+197	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+236	0+293	Населенный пункт	2/6	57	0	Слева
Итого:				**7/11**	**157**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00

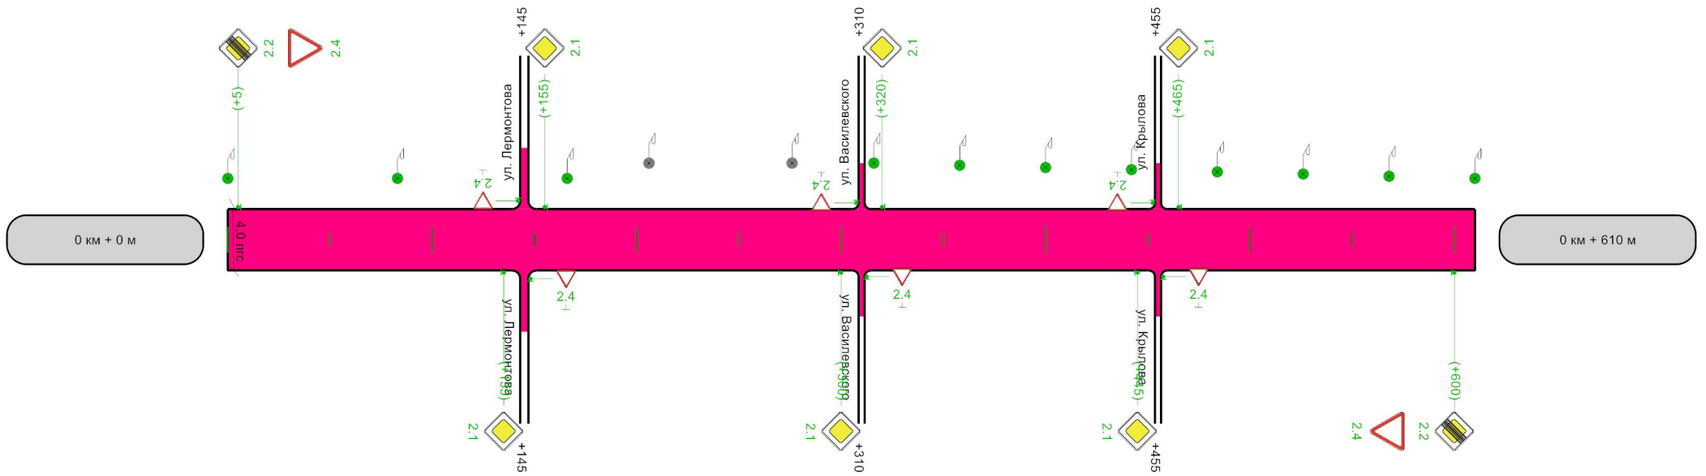

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+155	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+300	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+320	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+445	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+465	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги			0+600	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+600	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+166		3/6	166	0	Слева
2	0+206	0+276	Населенный пункт	2/2	0	70	Слева
3	0+316	0+610	Населенный пункт	8/9	294	0	Слева
Итого:				**13/17**	**460**	**70**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

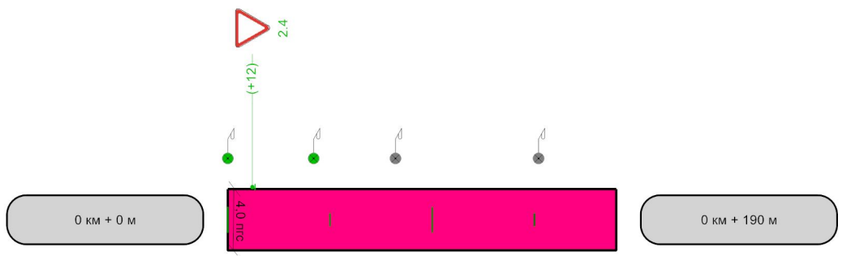

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+012	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+042	Населенный пункт	2/2	42	0	Слева
2	0+082	0+152	Населенный пункт	2/2	0	70	Слева
Итого:				**4/4**	**42**	**70**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ул. Володарского, д. 79, до пересечения с ул. Пушкина

1-й участок: км 0+000 - км 0+360
2-й участок: км 0+000 - км 0+116

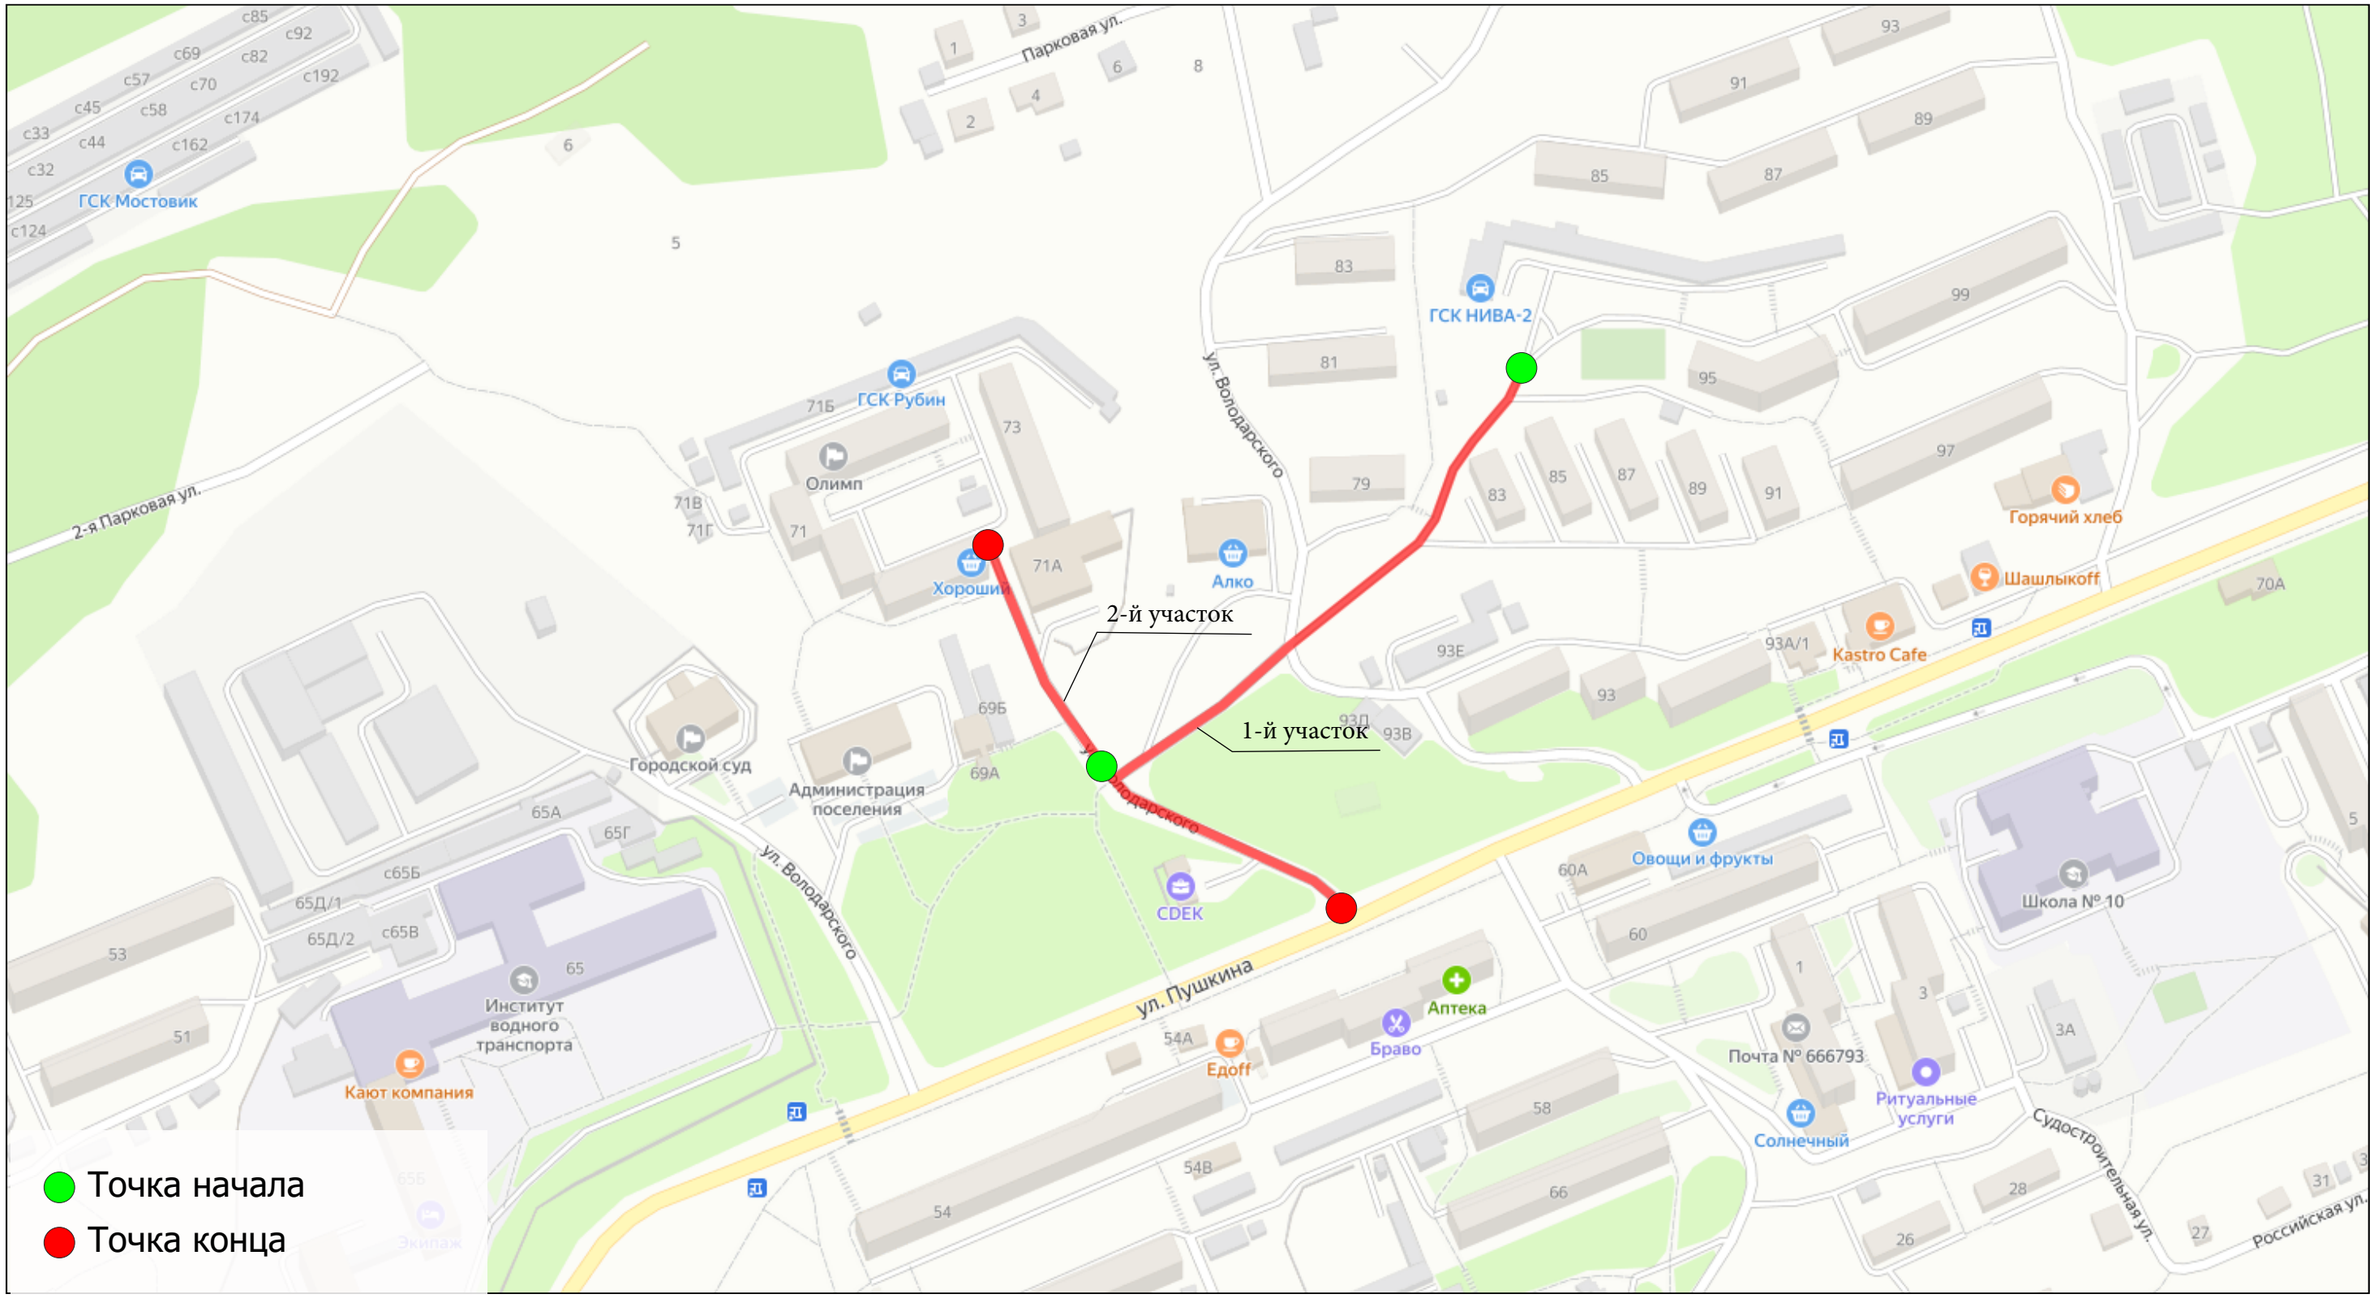

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	70
Кривые в плане	50 R=653м P=20; a=18° 82 R=684м P=13; a=29° 125 — 250 R=18м P=0; a=114° 286
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 4,00 — 160 — 7,00 — 260 — 4,90

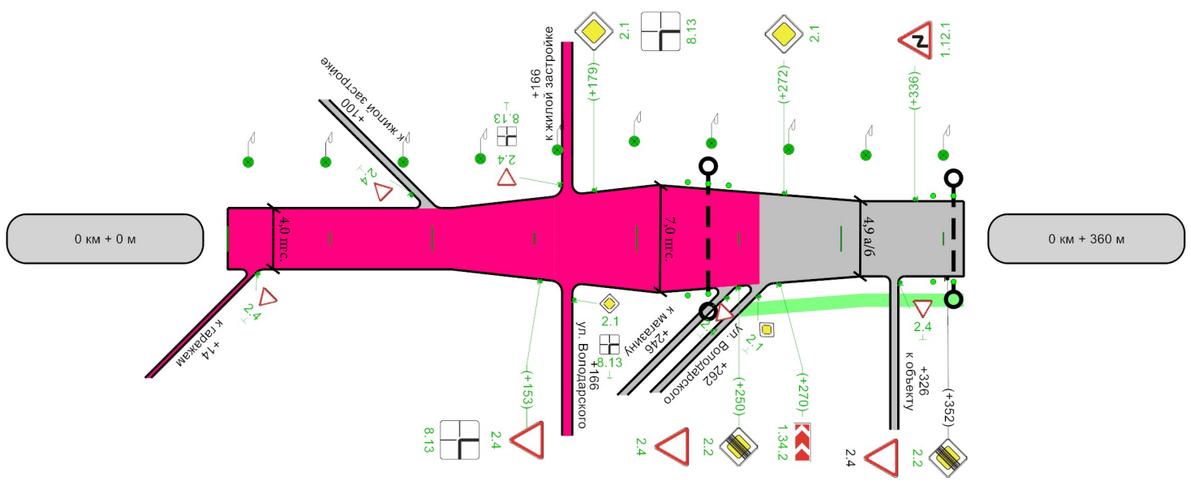

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 250 - 324

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+336	Требуется установить	1	слева
2	1.34.2	Направление поворота			0+270	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+179	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+272	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+250	Требуется установить	1	справа
6	2.2	Конец главной дороги			0+352	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+153	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+250	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+352	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**7**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.13	Направление главной дороги			0+179	Требуется установить	1	слева
11	8.13	Направление главной дороги			0+153	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**10**	
		Всего:					**11**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+225	0+235	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+225	0+245	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+345	0+355	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+345	0+355	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**50/9**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+350	Населенный пункт	10/10	340	0	Слева
Итого:				**10/10**	**340**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+250	0+324	Жилая застройка	Справа	74	
2	0+328	0+360	Жилая застройка	Справа	32	
Итого:					**106**	**0**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 137 2 R=2393м
Кривые в плане	R=102м P=3; a=19° 35 45 R=274м P=14; a=11° 95
Тротуары слева	ширина 1м, бет, 10 - 75 / н/д: ширина 1м, бет, 75 - 116
Характеристики проезжей части	4,80

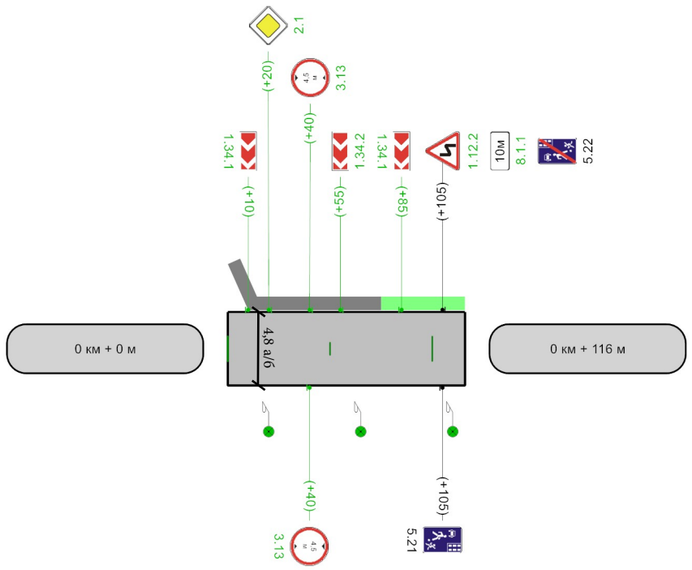

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+105	Требуется установить	1	слева
2	1.34.1	Направление поворота			0+010	Требуется установить	1	слева
3	1.34.1	Направление поворота			0+085	Требуется установить	1	слева
4	1.34.2	Направление поворота			0+055	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+020	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Запрещающие знаки						
6	3.13	Ограничение высоты			0+040	Требуется установить	1	слева
7	3.13	Ограничение высоты			0+040	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
8	5.21	Жилая зона			0+105	Установлено	1	справа
9	5.22	Конец жилой зоны			0+105	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
10	8.1.1	Расстояние до объекта			0+105	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+110	Населенный пункт	3/3	90	0	Справа
Итого:				**3/3**	**90**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+010	Жилая застройка	Слева		10
2	0+010	0+075	Жилая застройка	Слева		65
3	0+075	0+116	Жилая застройка	Слева	41	
Итого:					**41**	**75**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ул. Матросова, стр. 2, участок находится ориентировочно в 450 м по направлению на северо-запад от ориентира до мостового сооружение через р. Кута
км 0+000 - км 0+192

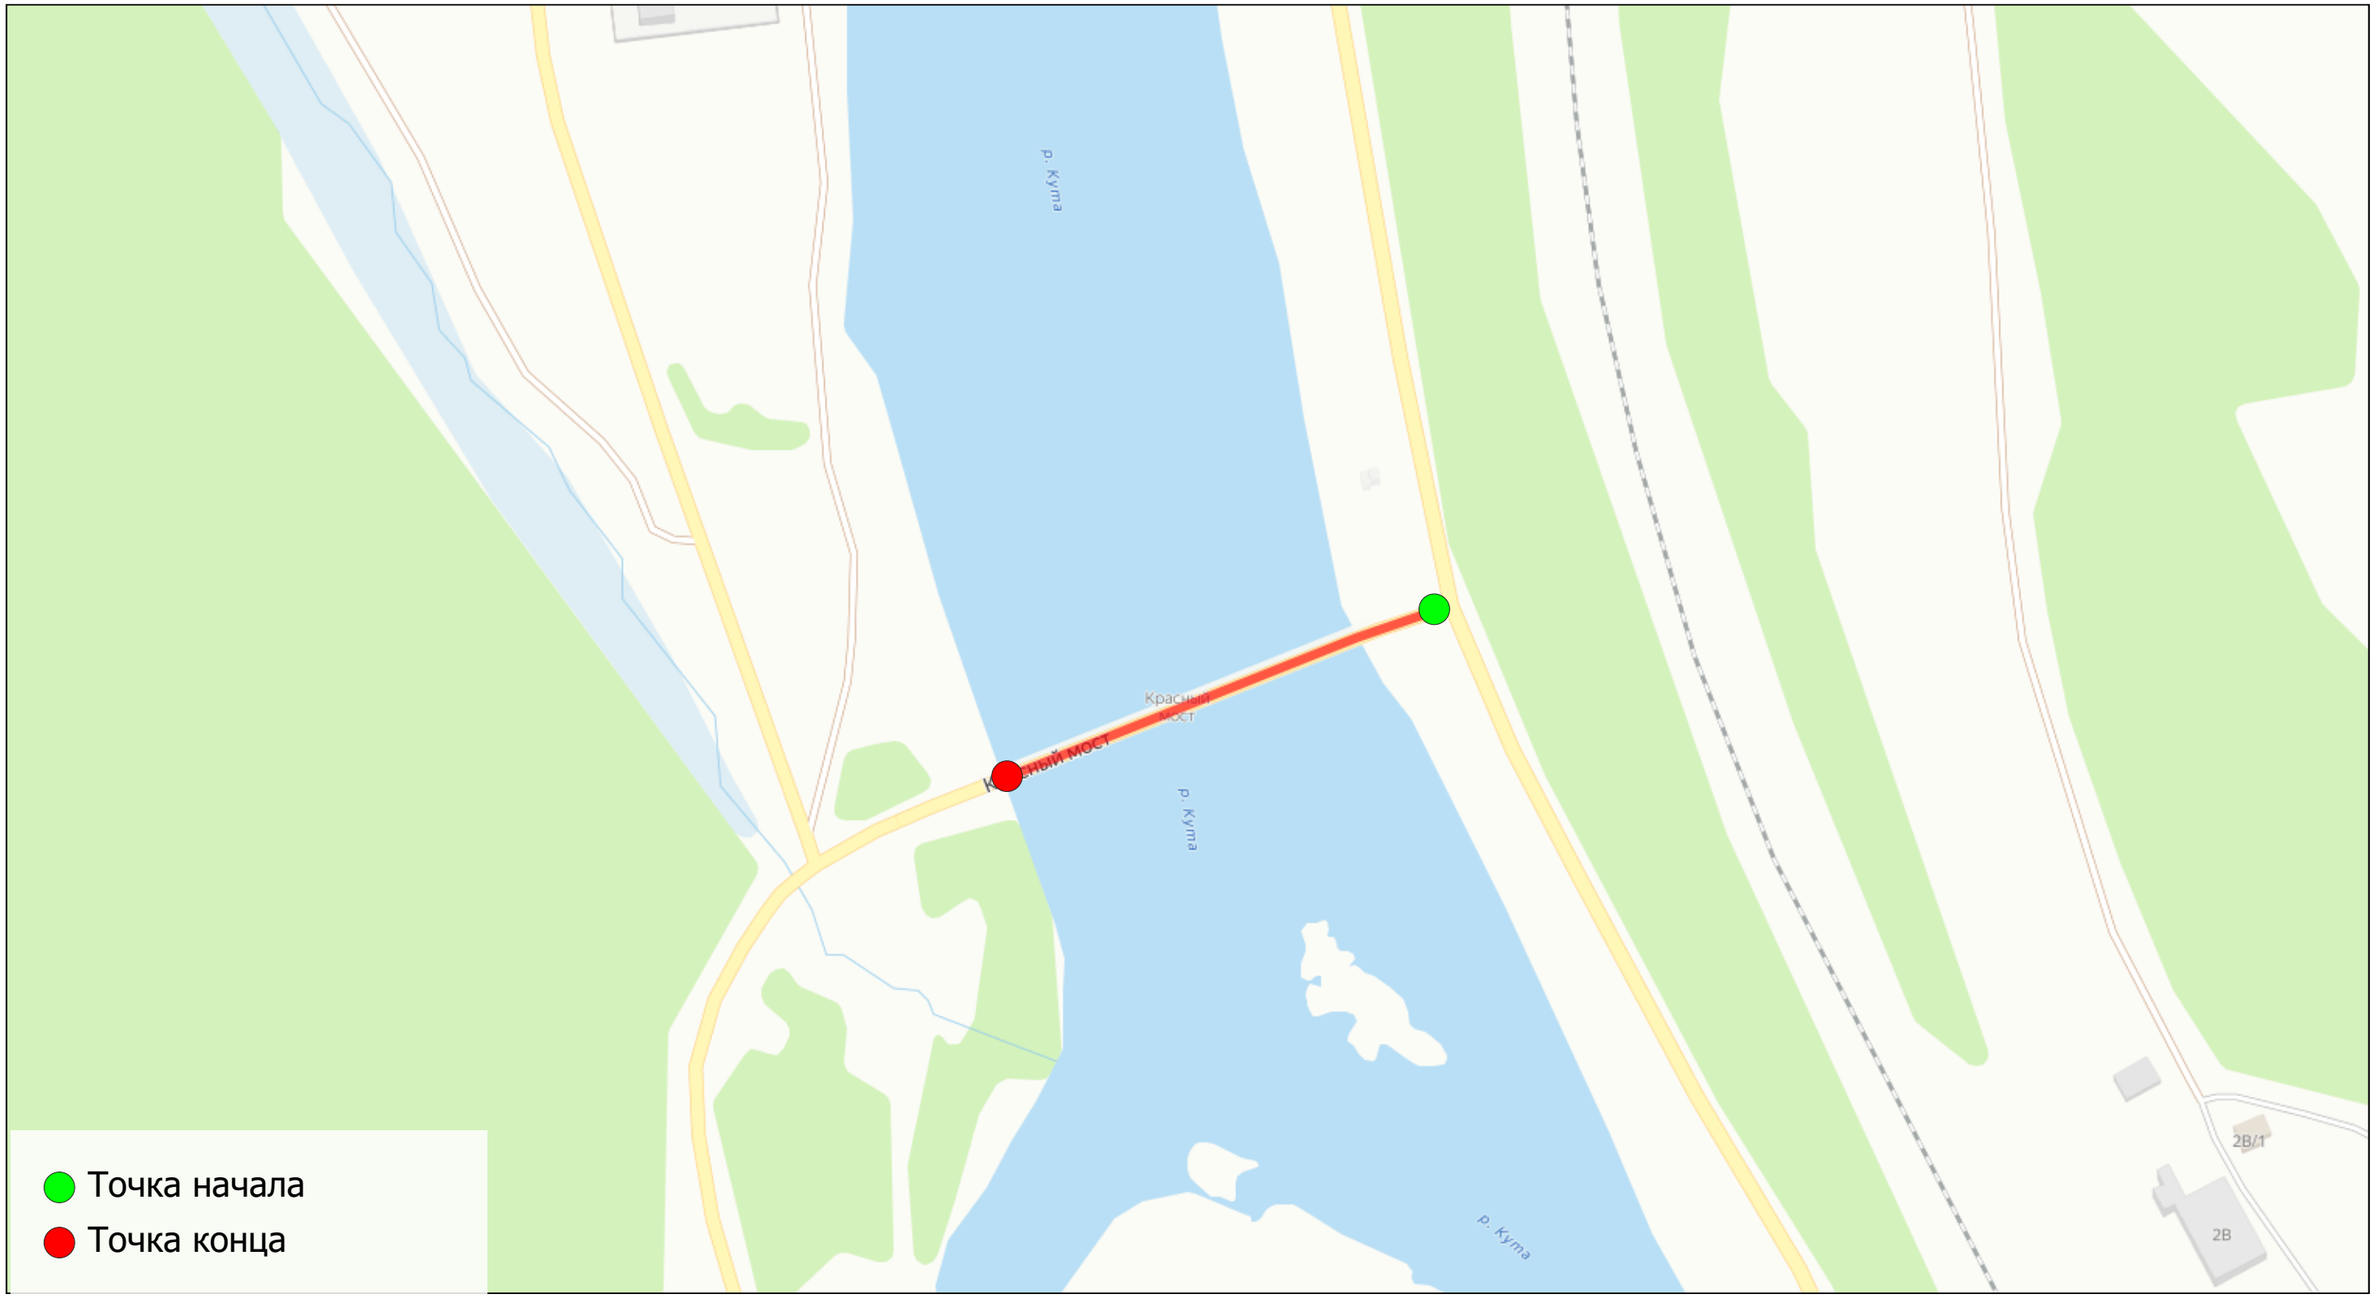


Автомобильная дорога от ул. Матросова, стр. 2, участок находится ориентировочно в 450 м по направлению на северо-запад от ориентира до мостового соор

М 1:3000

Геометрические элементы элементы благоустройства	1-ая от осевой	1.2 0 - 30	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			Железобетон, 30 - 192 Древесина, 29 - 192 ид. 17.0034А Оцинкованный металл, 30 - 192 инд. 17.0034А Оцинкованный металл, 30 - 192
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			
Тротуары слева			ширина 0,8м, Деревянный продольный настил, 30 - 192
Характеристики проезжей части		-6,00-0,10	30 8,00

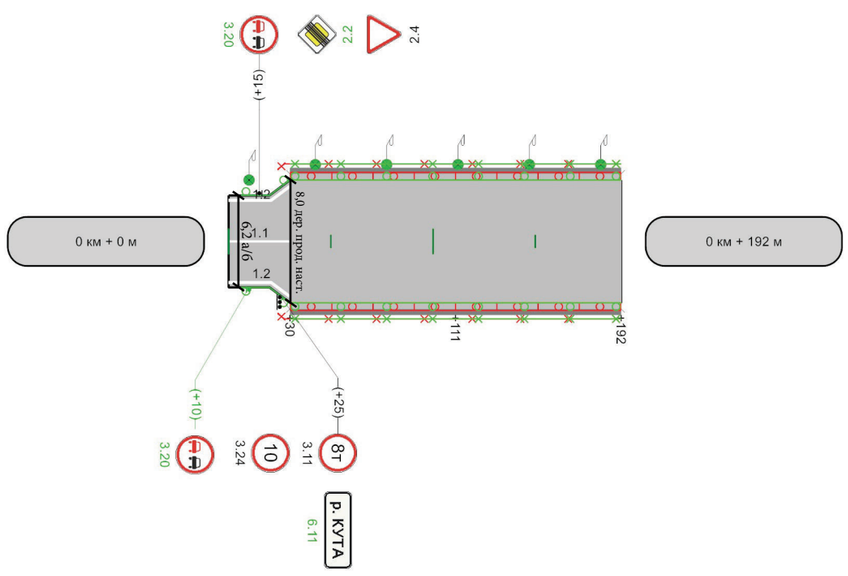

Геометрические элементы элементы благоустройства	осевая	1.1 0 - 30	
	1-ая от осевой	1.2 0 - 30	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			ид. 17.0034А Оцинкованный металл, 30 - 192 Древесина, 29 - 192 Железобетон, 30 - 192 инд. 17.0034А Оцинкованный металл, 30 - 192
Тротуары справа			ширина 0,8м, Деревянный продольный настил, 30 - 192

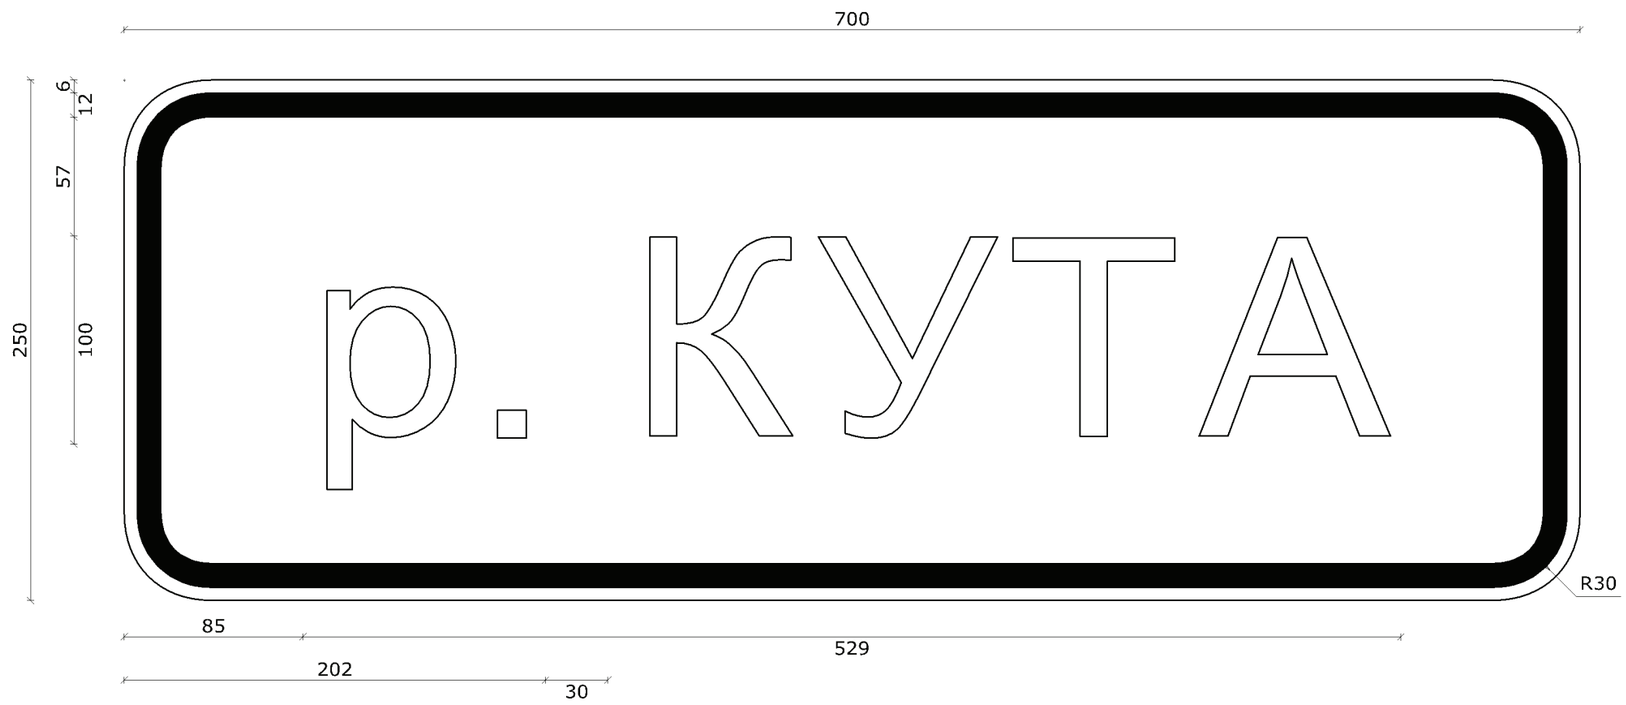



Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"
Площадь: 0,18 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+025, Справа
Дорога: Автомобильная дорога от ул. Матросова, стр. 2, участок находится ориентировочно в 450 м по направлению на северо-запад от ориентира до мостового сооружение через р. Кута
Фон знака: белый
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)
Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	30,000	60,000	**9,000**
ИТОГО	**30,000**	**60,000**	**9,000**
ЛИН.КМ	**0,030**	**0,060**	
ПРИВЕД.КМ	**0,030**	**0,060**	
ПЛОЩАДЬ	**3,000**	**6,000**	**9,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
3	3.11	Ограничение массы			0+025	Установлено	1	справа
4	3.20	Обгон запрещен			0+010	Требуется установить	1	справа
5	3.20	Обгон запрещен			0+015	Требуется установить	1	слева
6	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+025	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**4**	
		Информационные знаки						
7	6.11	Наименование объекта		0,18	0+025	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+006	0+030	24			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
2	0+006	0+030	24			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
3	0+030	0+192	162			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
5	0+030	0+192	162			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
Итого:			**372**							

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+182	Населенный пункт	6/6	172	0	Слева
Итого:				**6/6**	**172**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+025	0+192			167		Справа	Деревянные	Древесина	1,00	Мост или путепровод
2	0+025	0+192			167		Слева	Деревянные	Древесина	1,00	Мост или путепровод
3	0+030	0+192	162				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Мост или путепровод
4	0+030	0+192	162				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Мост или путепровод
Итого:			**324**		**334**						

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+030	0+192	Мост или путепровод	Слева		162
2	0+030	0+192	Мост или путепровод	Справа		162
Итого:					**0**	**324**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от примыкания автодороги общего пользования на км 1+200 до примыкания а/д ул. Советская

1-й участок: км 0+000 - км 0+313
2-й участок: км 0+000 - км 0+194
3-й участок: км 0+000 - км 0+054



М 1:3000

Горизонтальная разметка дорожных знаков	1-ая от осевой	1.2 0 - 94 | 1.7 94 - 112 | 1.2 112 - 313
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		Оцинкованный металл, 267 - 313
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		103 | R=4278м
Кривые в плане		23 | R=103м P=1; a=41° | 98
Тротуары слева		ширина 1,5м, а/б, 267 - 313
Характеристики проезжей части		0,75-6,00-0,75

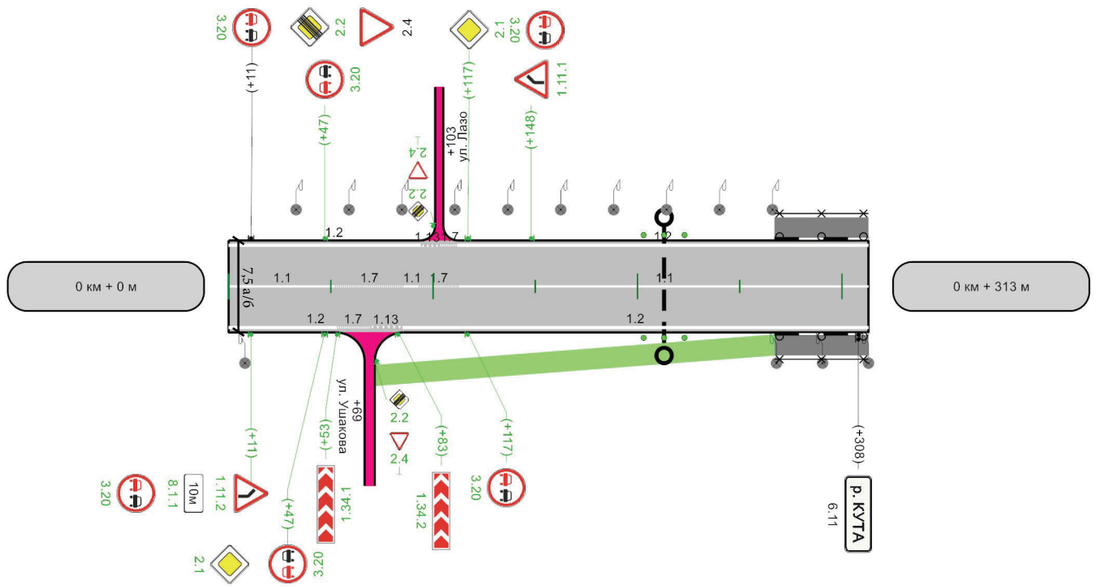

Горизонтальная разметка дорожных знаков	осевая	1.1 0 - 52 | 1.7 52 - 86 | 1.1 86 - 93 | 1.7 93 - 113 | 1.1 113 - 313
	1-ая от осевой	1.2 0 - 53 | 1.7 53 - 85 | 1.2 85 - 313
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		Оцинкованный металл, 267 - 313
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 71 - 267 | ширина 1,5м, а/б, 267 - 313

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	259,000	576,000	79,000	25,000	**88,075**
ИТОГО	**259,000**	**576,000**	**79,000**	**25,000**	**88,075**
ЛИН.КМ	**0,259**	**0,576**	**0,079**	**0,025**	
ПРИВЕД.КМ	**0,259**	**0,576**	**0,040**	**0,006**	
ПЛОЩАДЬ	**25,900**	**57,600**	**3,950**	**0,625**	**88,075**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+148	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+011	Требуется установить	1	справа
3	1.34.1	Направление поворота			0+053	Требуется установить	1	справа
4	1.34.2	Направление поворота			0+083	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога			0+047	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+117	Требуется установить	1	слева
7	2.2	Конец главной дороги			0+011	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+011	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
9	3.20	Обгон запрещен			0+011	Требуется установить	1	слева
10	3.20	Обгон запрещен			0+011	Требуется установить	1	справа
11	3.20	Обгон запрещен			0+047	Требуется установить	1	слева
12	3.20	Обгон запрещен			0+047	Требуется установить	1	справа
13	3.20	Обгон запрещен			0+117	Требуется установить	1	слева
14	3.20	Обгон запрещен			0+117	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
15	6.11	Наименование объекта		0,18	0+308	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.1.1	Расстояние до объекта			0+011	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**16**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+203	0+223	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+203	0+223	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008	0+008	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+033	0+266	Населенный пункт	10/10	0	233	Слева
3	0+268	0+313	Населенный пункт	3/3	0	45	Справа
Итого:				**14/14**	**0**	**278**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+267	0+313		46			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Подход в конце моста
2	0+267	0+313		46			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Подход в конце моста
Итого:				**92**							

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+071	0+267	Жилая застройка	Справа	196	
2	0+267	0+313	Подход в конце моста	Справа		46
3	0+267	0+313	Подход в конце моста	Слева		46
Итого:					**196**	**92**

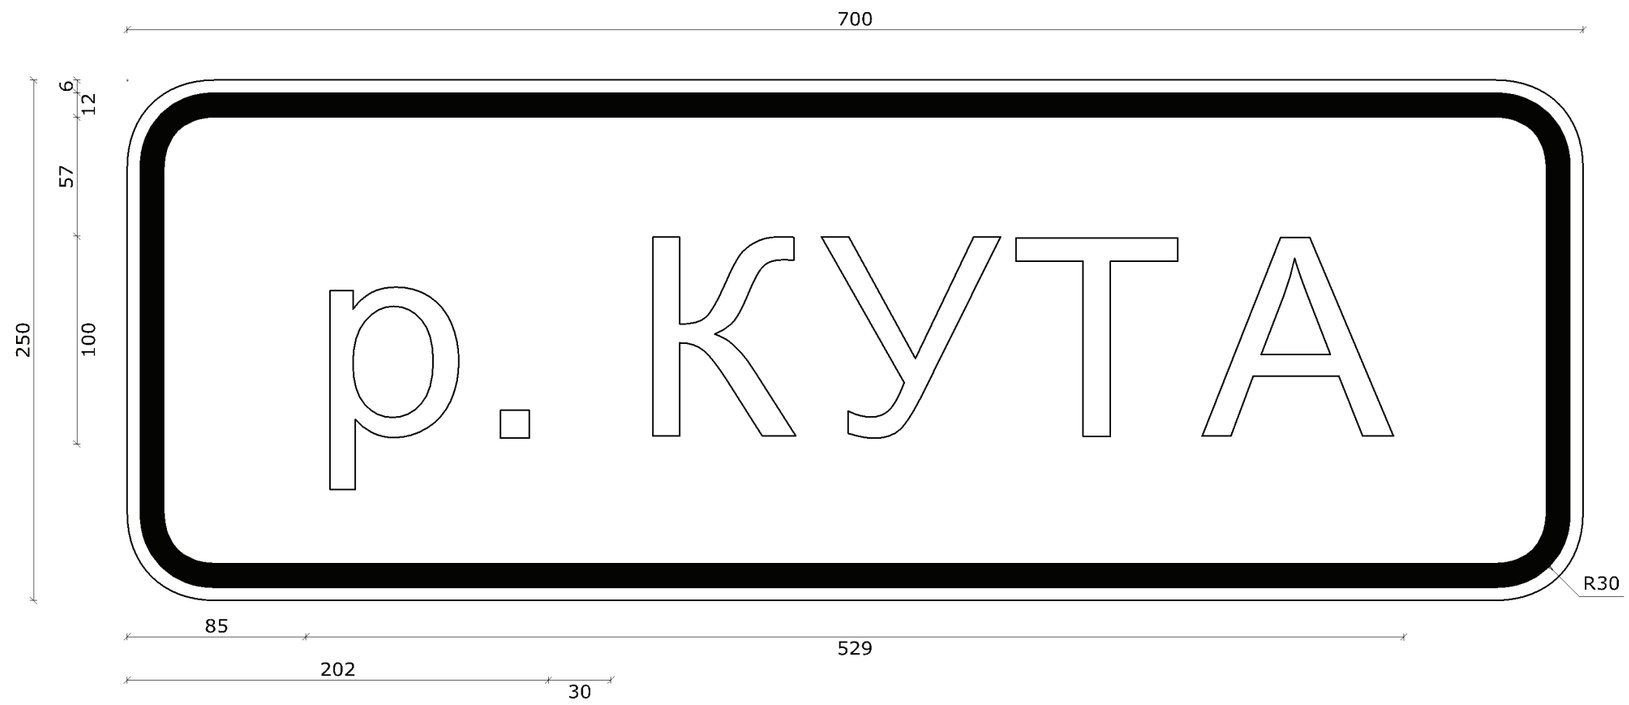




Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"
Площадь: 0,18 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+308, Справа
Дорога: Автомобильная дорога от примыкания автодороги общего пользования на км 1+200 до примыкания а/д ул. Советская уч. №1
Фон знака: белый
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)
Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

М 1:3000

Горизонтальная разметка	1-ая от осевой	1.2 0 - 194
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Оцинкованный металл, 0 - 54 11 ДО ММ, Оцинкованный металл, 0 - 54	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле	15	
Кривые в плане	94	R=118м P=1; a=51°
Тротуары слева	ширина 1,5м, а/б, 0 - 54	
Характеристики проезжей части	0,90-6,00-0,90	

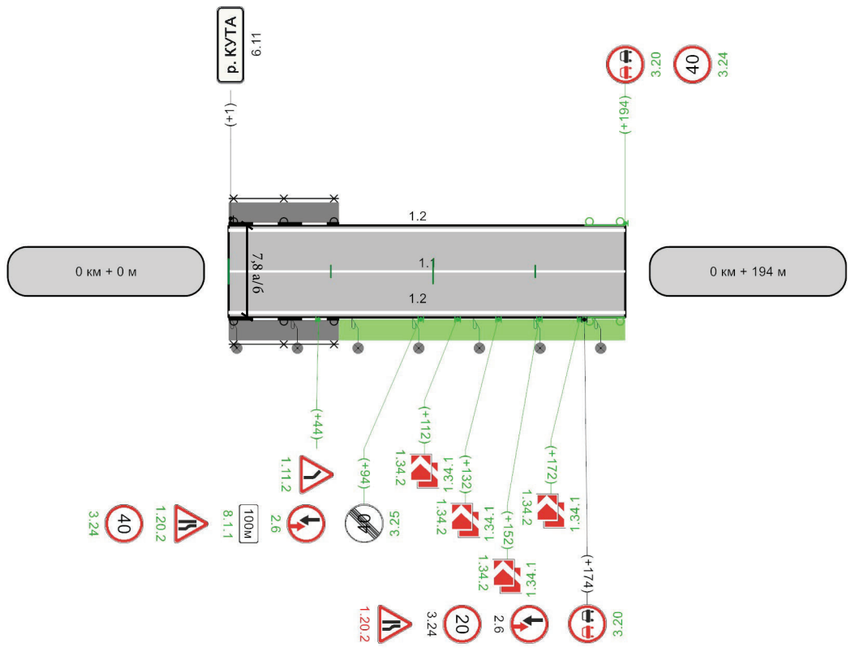

Горизонтальная разметка	осевая	1.1 0 - 194
	1-ая от осевой	1.2 0 - 194
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Оцинкованный металл, 0 - 54 11 ДО ММ, Оцинкованный металл, 0 - 54	
Тротуары справа	ширина 1,5м, а/б, 0 - 54	н/д: ширина 1,5м, а/б, 54 - 194

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	194,000	388,000	**58,200**
ИТОГО	**194,000**	**388,000**	**58,200**
ЛИН.КМ	**0,194**	**0,388**	
ПРИВЕД.КМ	**0,194**	**0,388**	
ПЛОЩАДЬ	**19,400**	**38,800**	**58,200**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+044	Требуется установить	1	справа
2	1.20.2	Сужение дороги			0+094	Требуется установить	1	справа
3	1.20.2	Сужение дороги			0+174	Демонтировать	1	справа
4	1.34.1	Направление поворота			0+112	Требуется установить	1	справа
5	1.34.1	Направление поворота			0+132	Требуется установить	1	справа
6	1.34.1	Направление поворота			0+152	Требуется установить	1	справа
7	1.34.1	Направление поворота			0+172	Требуется установить	1	справа
8	1.34.2	Направление поворота			0+112	Требуется установить	1	справа
9	1.34.2	Направление поворота			0+132	Требуется установить	1	справа
10	1.34.2	Направление поворота			0+152	Требуется установить	1	справа
11	1.34.2	Направление поворота			0+172	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
12	2.6	Преимущество встречного движения			0+094	Требуется установить	1	справа
13	2.6	Преимущество встречного движения			0+174	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
14	3.20	Обгон запрещен			0+174	Требуется установить	1	справа
15	3.20	Обгон запрещен			0+194	Требуется установить	1	слева
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+094	Требуется установить	1	справа
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+174	Установлено	1	справа
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+194	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3.25	Конец ограничения максимальной скорости			0+094	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
20	6.11	Наименование объекта		0,18	0+001	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
21	8.1.1	Расстояние до объекта			0+094	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	
		Всего требуется установить:					**17**	
		Всего:					**20**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+174	0+194	20			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
2	0+174	0+194	20			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
Итого:			**40**							

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+004	0+182	Населенный пункт	7/7	0	178	Справа
Итого:				**7/7**	**0**	**178**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	0+000	0+054		54			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Подход в начале моста
2	0+000	0+054		54			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Подход в начале моста
Итого:				**108**							

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+054	Подход в конце моста	Справа		54
2	0+000	0+054	Подход в начале моста	Слева		54
3	0+054	0+194	Жилая застройка	Справа	140	
Итого:					**140**	**108**

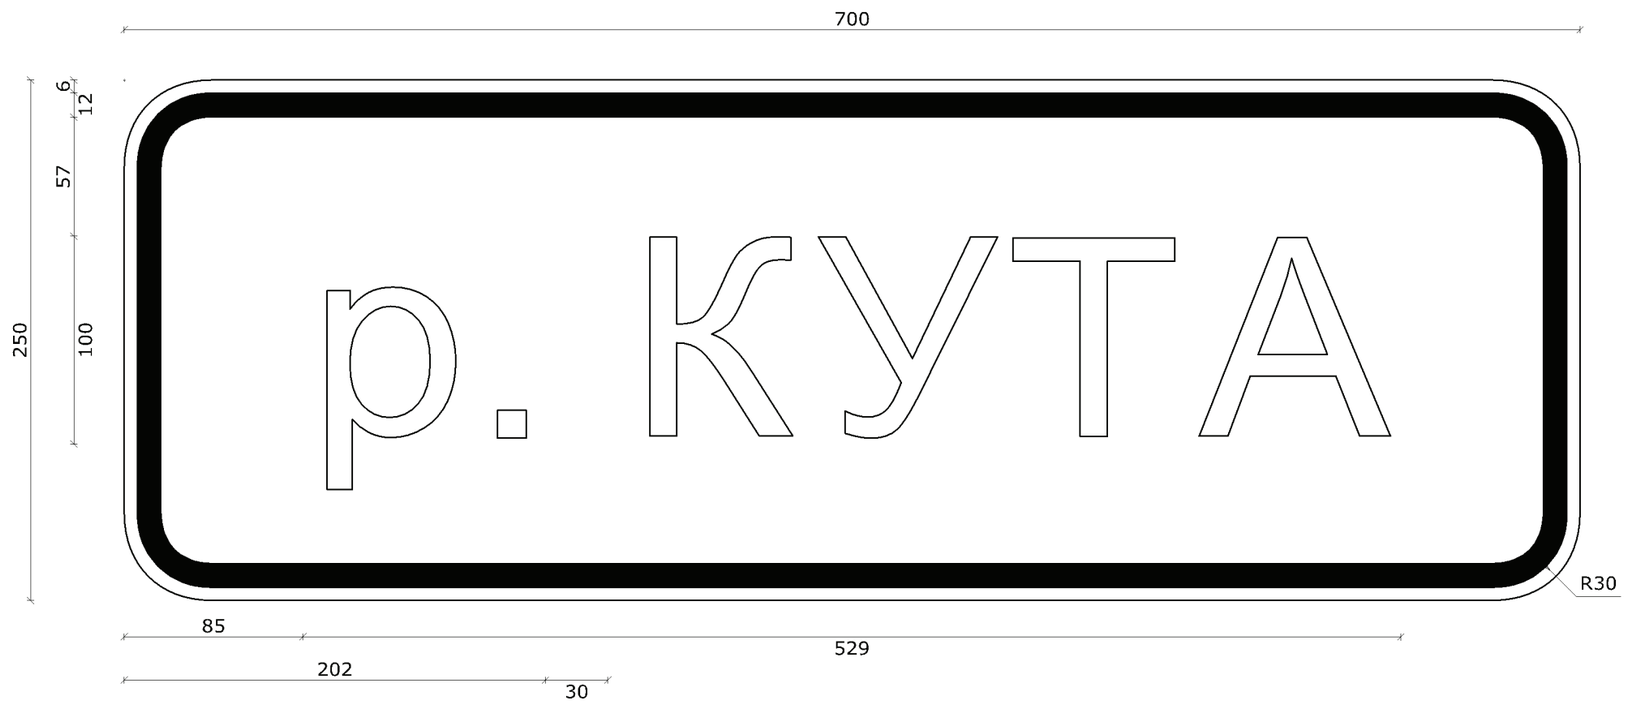




Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"
Площадь: 0,18 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+001, Слева
Дорога: Автомобильная дорога от примыкания автодороги общего пользования на км 1+200 до примыкания а/д ул. Советская уч. №2
Фон знака: белый
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)
Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 54
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0,80-6,00-0,80

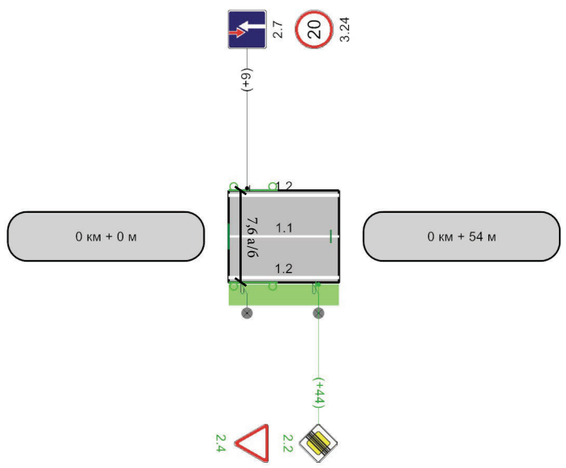

Горизонтальная разметка справа	осевая	1.1 0 - 54
	1-ая от осевой	1.2 0 - 54
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 54

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	54,000	108,000	**16,200**
ИТОГО	**54,000**	**108,000**	**16,200**
ЛИН.КМ	**0,054**	**0,108**	
ПРИВЕД.КМ	**0,054**	**0,108**	
ПЛОЩАДЬ	**5,400**	**10,800**	**16,200**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.2	Конец главной дороги			0+044	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+044	Требуется установить	1	справа
3	2.7	Преимущество перед встречным движением			0+009	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Запрещающие знаки						
4	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+009	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+000	0+024	24			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
2	0+000	0+024	24			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
Итого:			**48**							

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+044	Населенный пункт	2/2	0	35	Справа
Итого:				**2/2**	**0**	**35**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+054	Жилая застройка	Справа	54	
Итого:					**54**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от пер. Рабочий до ул. Геологической
км 0+000 - км 0+318



Автомобильная дорога от пер Рабочий до ул. Геологической

М 1:3000

	1-ая от осевой
	1.7 0 - 25 | 1.7 30 - 62 | 1.10 62 - 190 | 1.10 198 - 245 | 1.10 256 - 270 | 1.2 270 - 318
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2 16 3 R=7935м 13 137 12 175 R=2314м
Кривые в плане	270 R=120м P=3; a=22°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 0,50-6,00-0,50

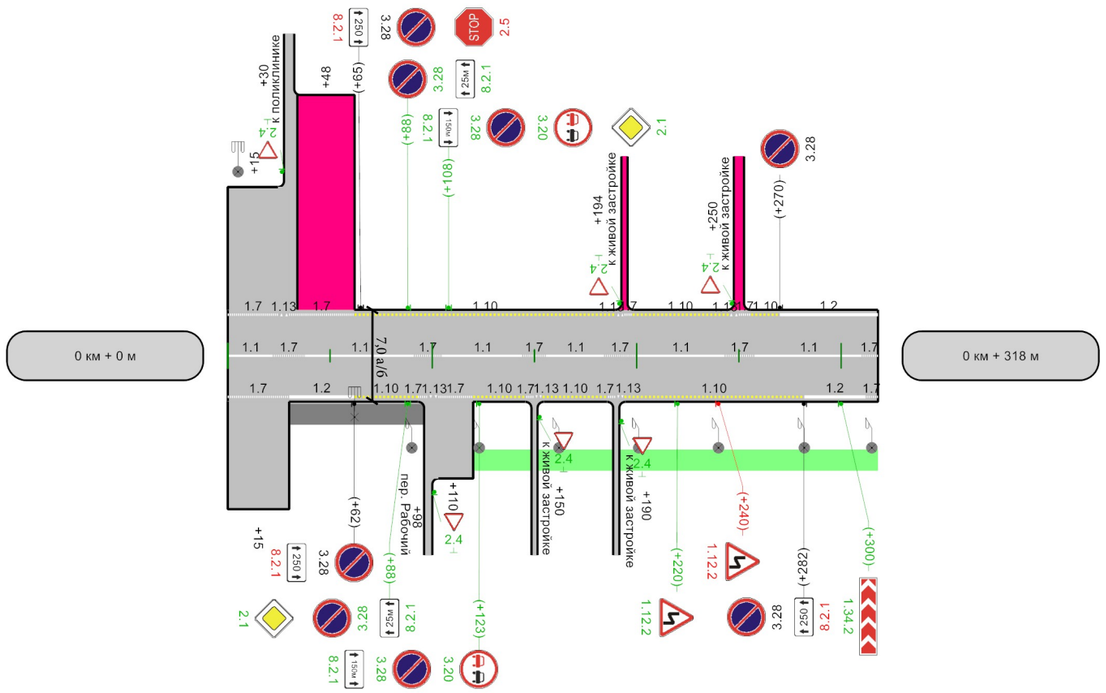

	осевая	1-ая от осевой
	1.1 0 - 22 | 1.7 22 - 38 | 1.1 38 - 91 | 1.7 91 - 105 | 1.1 105 - 144 | 1.7 144 - 156 | 1.1 156 - 184 | 1.7 184 - 200 | 1.1 200 - 243 | 1.7 243 - 258 | 1.1 258 - 310 | 1.7 310 - 318	1.7 0 - 30 | 1.2 30 - 62 | 1.10 62 - 93 | 1.7 93 - 103 | 1.7 103 - 120 | 1.10 120 - 146 | 1.7 146 - 154 | 1.10 154 - 186 | 1.7 186 - 194 | 1.10 194 - 282 | 1.2 282 - 312 | 1.7 312 - 318
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		ширина 1,5м, а/б, 30 - 96 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 96 - 120 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 151 - 169 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 169 - 192 | н/д: ширина 1,5м, а/б, 192 - 318

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.10(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	237,000	110,000	214,000	366,000	27,000	**64,375**
ИТОГО	**237,000**	**110,000**	**214,000**	**366,000**	**27,000**	**64,375**
ЛИН.КМ	**0,237**	**0,110**	**0,214**	**0,366**	**0,027**	
ПРИВЕД.КМ	**0,237**	**0,110**	**0,107**	**0,183**	**0,007**	
ПЛОЩАДЬ	**23,700**	**11,000**	**10,700**	**18,300**	**0,675**	**64,375**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.2	Опасные повороты			0+220	Требуется установить	1	справа
2	1.12.2	Опасные повороты			0+240	Демонтировать	1	справа
3	1.34.2	Направление поворота			0+300	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
4	2.1	Главная дорога			0+088	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+108	Требуется установить	1	слева
6	2.5	Движение без остановки запрещено			0+065	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Запрещающие знаки						
7	3.20	Обгон запрещен			0+108	Требуется установить	1	слева
8	3.20	Обгон запрещен			0+123	Требуется установить	1	справа
9	3.28	Стоянка запрещена			0+062	Установлено	1	справа
10	3.28	Стоянка запрещена			0+065	Установлено	1	слева
11	3.28	Стоянка запрещена			0+088	Требуется установить	1	слева
12	3.28	Стоянка запрещена			0+088	Требуется установить	1	справа
13	3.28	Стоянка запрещена			0+108	Требуется установить	1	слева
14	3.28	Стоянка запрещена			0+123	Требуется установить	1	справа
15	3.28	Стоянка запрещена			0+270	Установлено	1	слева
16	3.28	Стоянка запрещена			0+282	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**10**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
17	8.2.1	Зона действия			0+062	Демонтировать	1	справа
18	8.2.1	Зона действия			0+065	Демонтировать	1	слева
19	8.2.1	Зона действия			0+088	Требуется установить	1	слева
20	8.2.1	Зона действия			0+088	Требуется установить	1	справа
21	8.2.1	Зона действия			0+108	Требуется установить	1	слева
22	8.2.1	Зона действия			0+123	Требуется установить	1	справа
23	8.2.1	Зона действия			0+282	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**5**	
		Всего требуется установить:					**14**	
		Всего:					**18**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+005	0+005	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+062	0+062	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+090	0+090	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+123	0+240	Населенный пункт	4/4	0	117	Справа
5	0+282	0+315	Населенный пункт	2/2	0	33	Справа
Итого:				**9/9**	**0**	**150**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+030	0+096	Жилая застройка	Справа		66
2	0+120	0+149	Жилая застройка	Справа	29	
3	0+151	0+189	Жилая застройка	Справа	38	
4	0+192	0+318	Жилая застройка	Справа	126	
Итого:					**193**	**66**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога по ул. Речников, от д. №2 по ул. Речников (СПТУ), до ул. Речников, д. №15А

км 0+000 - км 0+800




М 1:1500

Автомобильная дорога от ул. Речников от дома № 2 по ул. Речников (СПТУ), по ул. Речников до дома № 15А


| Горизонтальная ось разметки слева | | |

М 1:1500

Горизонтальная кривая малого радиуса	1-ая от осевой	1.2 500 - 560	1.7 560 - 604	1.2 604 - 696	1.7 696 - 698	1.2 696 - 727	1.11 727 - 735	1.1 735 - 748	1.11 748 - 755	1.2 755 - 800
	Дорожные ограждения и направляющие устройства слева									
	Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси									
	Элементы дороги в продольном профиле	31	R=11052м			1 / 702				
	Кривые в плане									
	Тротуары слева	ширина 1,7м, а/б, 500 - 689				ширина 1,7м, а/б, 694 - 800				
	Характеристики проезжей части	0,75-6,00-0,75								

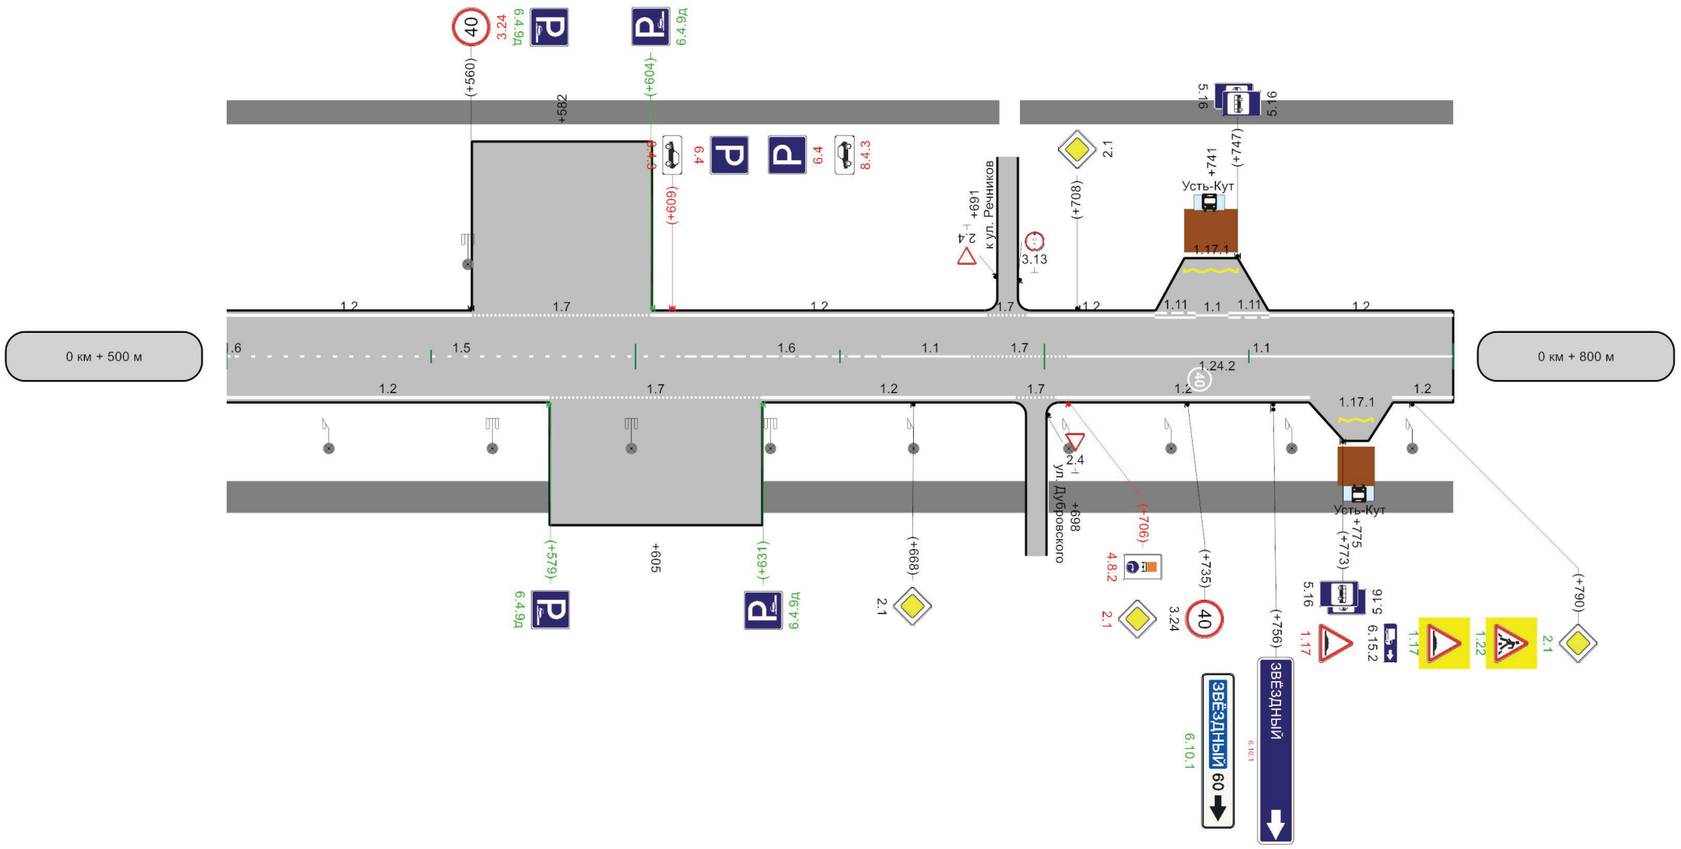

Горизонтальная кривая малого радиуса	осевая	1.5 503 - 612	1.6 612 - 662	1.1 662 - 682	1.7 682 - 706	1.1 706 - 800			
	1-ая от осевой	1.2 500 - 579	1.7 579 - 631	1.2 631 - 693	1.7 693 - 703	1.2 703 - 765	1.17.1 772 - 785	1.2 785 - 800	
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
	Тротуары справа	ширина 2,2м, а/б, 500 - 696				ширина 2,2м, а/б, 701 - 800			

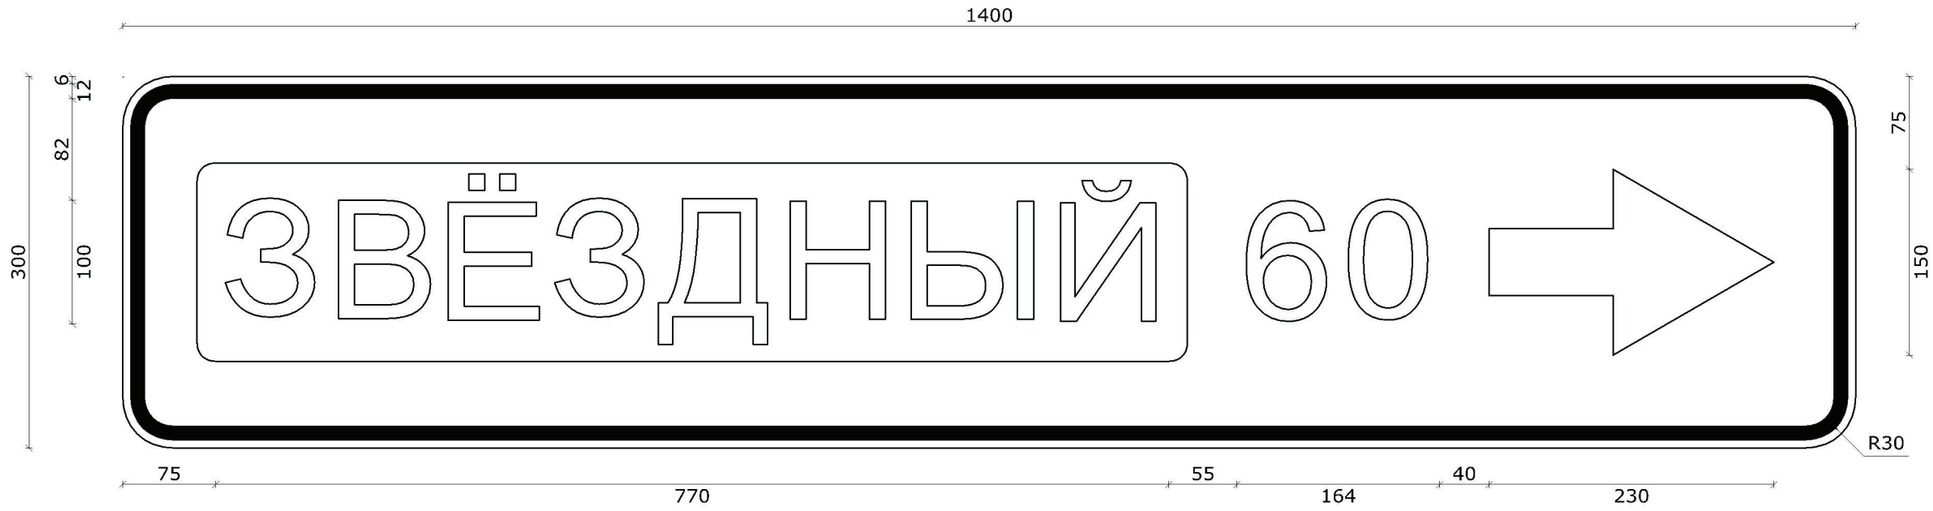



Номер знака: 6.10.1. "Указатель направлений"
Площадь: 0,42 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+756, Справа
Дорога: Автомобильная дорога от ул. Речников от дома № 2 по ул. Речников (СПТУ), по ул. Речников до дома № 15А
Фон знака: белый
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.8(м)	1.11(м)	1.12(м)	1.13(м)	1.14.1(м)	1.17.1(м)	1.18(шт)		1.24.1(шт)		1.24.2(шт)		1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.500	1.750	4.000	0.250	16.000	1.750	1.210	1.500	1.540	1.550	1.860	1.910	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.40	0.60	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0 - 1	567,000	1200,000	109,000	100,000	298,000	73,000	72,000	21,000	46,000	15,000	38,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	3,000	12,000	**291,433**
ИТОГО	**567,000**	**1200,000**	**109,000**	**100,000**	**298,000**	**73,000**	**72,000**	**21,000**	**46,000**	**15,000**	**38,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**2,000**	**3,000**	**12,000**	**291,433**
ЛИН.КМ	**0,567**	**1,200**	**0,109**	**0,100**	**0,298**	**0,073**	**0,072**	**0,021**	**0,046**	**0,015**	**0,038**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,567**	**1,200**	**0,027**	**0,075**	**0,149**	**0,037**	**0,126**	**0,084**	**0,012**	**0,240**	**0,070**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**56,700**	**120,000**	**2,725**	**7,500**	**14,900**	**3,650**	**12,600**	**8,400**	**1,150**	**24,000**	**6,966**	**4,840**	**6,000**	**6,160**	**6,200**	**3,720**	**5,730**	**0,192**	**291,433**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+016	Демонтировать	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот			0+231	Требуется установить	1	слева
3	1.17	Искусственная неровность			0+283	Требуется установить	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность			0+342	Демонтировать	1	справа
5	1.17	Искусственная неровность			0+447	Демонтировать	1	слева
6	1.17	Искусственная неровность			0+447	Требуется установить	1	слева
7	1.17	Искусственная неровность			0+790	Демонтировать	1	справа
8	1.17	Искусственная неровность			0+790	Требуется установить	1	справа
9	1.22	Пешеходный переход			0+120	Требуется установить	1	справа
10	1.22	Пешеходный переход			0+247	Требуется установить	1	слева
11	1.22	Пешеходный переход			0+324	Требуется установить	1	справа
12	1.22	Пешеходный переход			0+447	Требуется установить	1	слева
13	1.22	Пешеходный переход			0+790	Требуется установить	1	справа
14	1.23	Дети			0+283	Установлено	1	справа
15	1.23	Дети			0+342	Требуется установить	1	справа
16	1.23	Дети			0+416	Требуется установить	1	слева
17	1.23	Дети			0+468	Требуется установить	1	слева
18	1.34.2	Направление поворота			0+084	Требуется установить	1	слева
19	1.34.3	Направление поворота			0+111	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	

		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**4**	
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**15**	
		Знаки приоритета						
20	2.1	Главная дорога			0+073	Установлено	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	справа
22	2.1	Главная дорога			0+178	Требуется установить	1	слева
23	2.1	Главная дорога			0+219	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+247	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+324	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+342	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+416	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога			0+447	Требуется установить	1	слева
29	2.1	Главная дорога			0+668	Установлено	1	справа
30	2.1	Главная дорога			0+708	Установлено	1	слева
31	2.1	Главная дорога			0+735	Демонтировать	1	справа
32	2.1	Главная дорога			0+790	Требуется установить	1	справа
33	2.2	Конец главной дороги			0+136	Требуется установить	1	слева
34	2.4	Уступите дорогу			0+136	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**4**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**14**	
		Запрещающие знаки						
35	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+070	Установлено	1	слева
36	3.13	Ограничение высоты			0+391	Установлено	1	слева
37	3.13	Ограничение высоты			0+391	Установлено	1	справа
38	3.20	Обгон запрещен			0+031	Демонтировать	1	слева
39	3.20	Обгон запрещен			0+070	Установлено	1	слева
40	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+070	Установлено	1	слева
41	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+283	Демонтировать	1	слева
42	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+283	Демонтировать	1	справа
43	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+283	Требуется установить	1	справа

44	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+325	Демонтировать	1	слева
45	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+342	Демонтировать	1	справа
46	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+342	Требуется установить	1	справа
47	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+416	Требуется установить	1	слева
48	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+447	Демонтировать	1	слева
49	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+468	Требуется установить	1	слева
50	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+560	Демонтировать	1	слева
51	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+735	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**6**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**7**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**10**	
		Предписывающие знаки						
52	4.8.2	Направление движения транспортных средств с опасными грузами			0+706	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
53	5.15.1	Направление движения по полосам			0+047	Требуется установить	1	справа
54	5.15.1	Направление движения по полосам			0+199	Требуется установить	1	слева
55	5.15.3	Начало полосы			0+231	Требуется установить	1	слева
56	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+165	Требуется установить	2	слева
57	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+187	Требуется установить	2	справа
58	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+747	Установлено	2	слева
59	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+773	Установлено	2	справа
60	5.19.1	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	справа
61	5.19.1	Пешеходный переход			0+178	Установлено	1	слева
62	5.19.1	Пешеходный переход			0+380	Установлено	1	справа
63	5.19.1	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	слева
64	5.19.2	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	справа
65	5.19.2	Пешеходный переход			0+178	Установлено	1	слева

66	5.19.2	Пешеходный переход			0+380	Установлено	1	справа
67	5.19.2	Пешеходный переход			0+388	Установлено	1	слева
68	5.20	Искусственная неровность			0+380	Демонтировать	1	справа
69	5.20	Искусственная неровность			0+380	Требуется установить	1	справа
70	5.20	Искусственная неровность			0+388	Демонтировать	1	слева
71	5.20	Искусственная неровность			0+388	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**12**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**21**	
		Информационные знаки						
72	6.4	Парковка (парковочное место)			0+357	Установлено	1	слева
73	6.4	Парковка (парковочное место)			0+609	Демонтировать	2	слева
74	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+342	Требуется установить	1	слева
75	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+380	Требуется установить	1	слева
76	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+560	Требуется установить	1	слева
77	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+579	Требуется установить	1	справа
78	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+604	Требуется установить	1	слева
79	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+631	Требуется установить	1	справа
80	6.10.1	Указатель направлений		0,42	0+756	Требуется установить	1	справа
81	6.10.1	Указатель направлений			0+756	Демонтировать	1	справа
82	6.15.2	Направление движения для грузовых автомобилей			0+790	Установлено	1	справа
83	6.16	Стоп-линия			0+068	Требуется установить	1	справа
84	6.16	Стоп-линия			0+073	Демонтировать	1	справа
85	6.16	Стоп-линия			0+136	Демонтировать	1	слева
86	6.16	Стоп-линия			0+142	Требуется установить	1	слева
87	6.16	Стоп-линия			0+169	Требуется установить	1	справа
88	6.16	Стоп-линия			0+174	Демонтировать	1	справа
89	6.16	Стоп-линия			0+178	Демонтировать	1	слева
90	6.16	Стоп-линия			0+184	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**7**	
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**13**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
91	8.2.1	Зона действия			0+283	Демонтировать	1	справа
92	8.2.1	Зона действия			0+342	Требуется установить	1	справа
93	8.2.1	Зона действия			0+416	Требуется установить	1	слева
94	8.4.3	Вид транспортного средства			0+609	Демонтировать	2	слева
95	8.13	Направление главной дороги			0+073	Установлено	1	справа
96	8.13	Направление главной дороги			0+136	Установлено	1	слева
97	8.17	Инвалиды			0+357	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**3**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**3**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**28**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**25**	
		Всего требуется установить:					**50**	
		Всего:					**78**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+023	0+097	Населенный пункт	3/3	74	0	Справа
2	0+133	0+178	Населенный пункт	2/4	0	45	Слева
3	0+174	0+315	Населенный пункт	5/5	0	141	Справа
4	0+357	0+525	Населенный пункт	5/5	0	168	Справа
5	0+559	0+559	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
6	0+565	0+633	Населенный пункт	3/6	0	68	Справа
7	0+668	0+706	Населенный пункт	2/2	0	38	Справа
8	0+731	0+790	Населенный пункт	3/3	0	59	Справа
Итого:				**24/30**	**74**	**519**	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+162	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
2	0+194	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
3	0+741	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
4	0+775	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+034	0+145	111				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Перекресток
2	0+047	0+073	26				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Перекресток
3	0+073	0+106		33			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Перекресток
4	0+117	0+148	31				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Перекресток
5	0+149	0+174	25				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
6	0+165	0+174		9			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Автобусная остановка
7	0+178	0+185		7			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
8	0+178	0+187		9			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Автобусная остановка
9	0+185	0+211	26				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
10	0+211	0+228	17				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
11	0+217	0+231	14				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
12	0+339	0+366	27				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
13	0+372	0+382		10			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
14	0+373	0+380	7				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
15	0+388	0+391		3			Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
16	0+388	0+441	53				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
17	0+391	0+424	33				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**370**	**71**							

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+073	Перекресток	1	0	-	Справа
2	0+111	Перекресток	2	0	-	Справа
3	0+133	Перекресток	1	0	-	Слева
4	0+136	Перекресток	1	0	-	Слева
5	0+174	Пешеходный переход	0	1	-	Справа
6	0+174	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
7	0+178	Пешеходный переход	0	1	-	Слева
8	0+178	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
9	0+380	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
10	0+388	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**9**	**2**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+037	Жилая застройка	Слева		37
2	0+000	0+145	Жилая застройка	Справа		145
3	0+047	0+105	Жилая застройка	Слева		58
4	0+118	0+211	Жилая застройка	Слева		93
5	0+150	0+228	Жилая застройка	Справа		78
6	0+217	0+689	Жилая застройка	Слева		472
7	0+234	0+333	Жилая застройка	Справа		99
8	0+339	0+366	Жилая застройка	Справа		27
9	0+373	0+424	Жилая застройка	Справа		51
10	0+384	0+384	Пешеходный переход	Слева		12
11	0+384	0+384	Пешеходный переход	Справа		5
12	0+429	0+696	Жилая застройка	Справа		267
13	0+694	0+800	Жилая застройка	Слева		106
14	0+701	0+800	Жилая застройка	Справа		99
Итого:					**0**	**1549**


Ведомость размещения пешеходных переходов

№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	0+176	регулируемый наземный	в одном уровне	нет
2	0+384	регулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		
Итого:	**наземных**	**2**		
	надземных в разных уровнях	**0**		
	подземных в разных уровнях	**0**		

Ведомость размещения искусственных неровностей


№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+380	8,00	6,00	0,07	3,36	Без изменений

Схема расстановки оборудования на светофорном объекте по адресу:
г. Усть-Кут, перекресток ул. Речников - ул. Халтунина

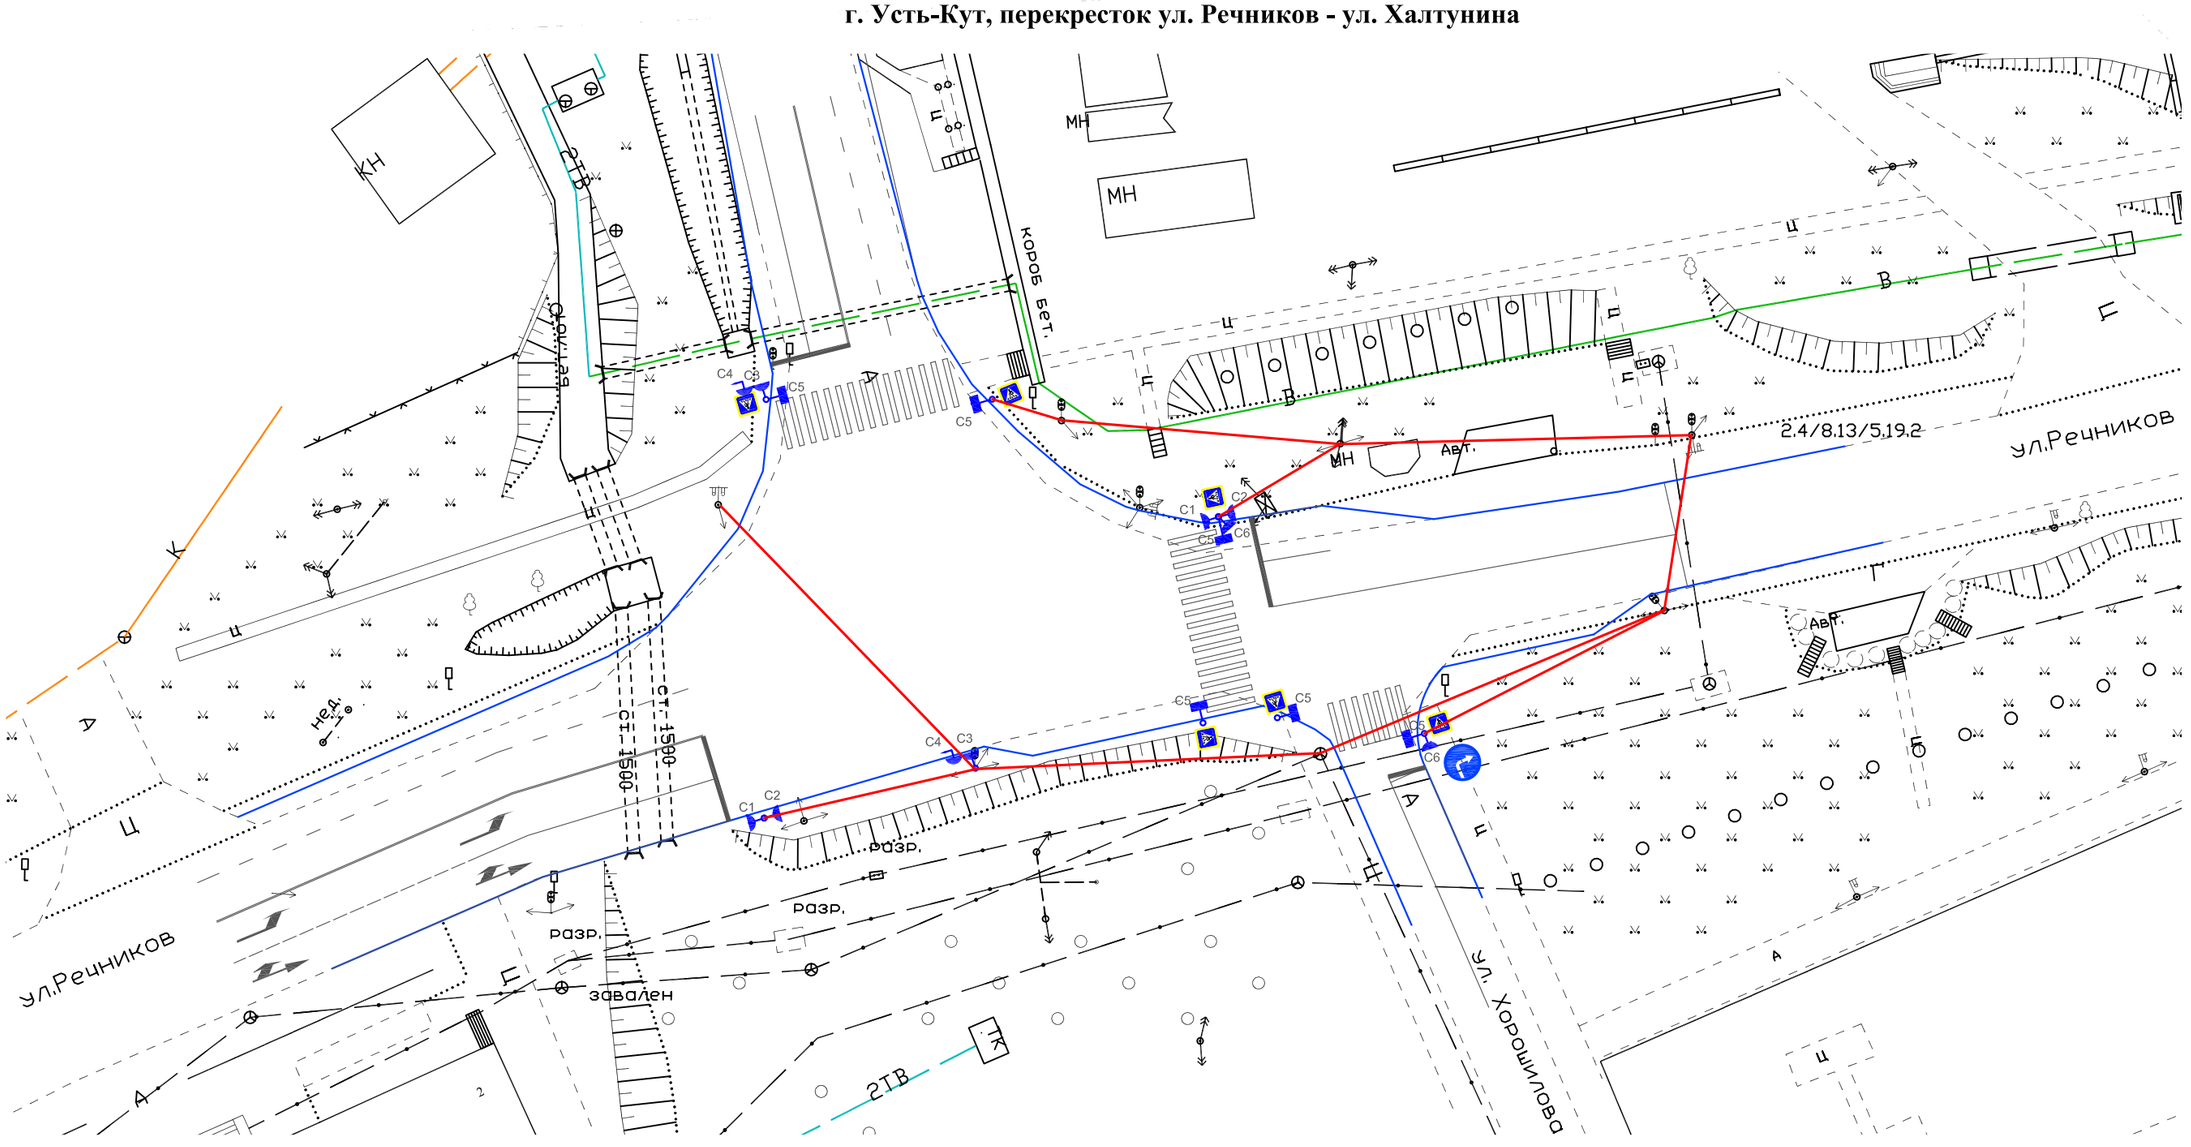
КН
МН
МН
МН
короб бет.
2ТВ
С4
С3
С5
С5
С1
С2
С5
С6
Авт.
2.4/8.13/5.19.2
ул.Речников
Ц
В
Г
Д
Ц
Ц
Ц


Организация движения по фазам

Фаза 1

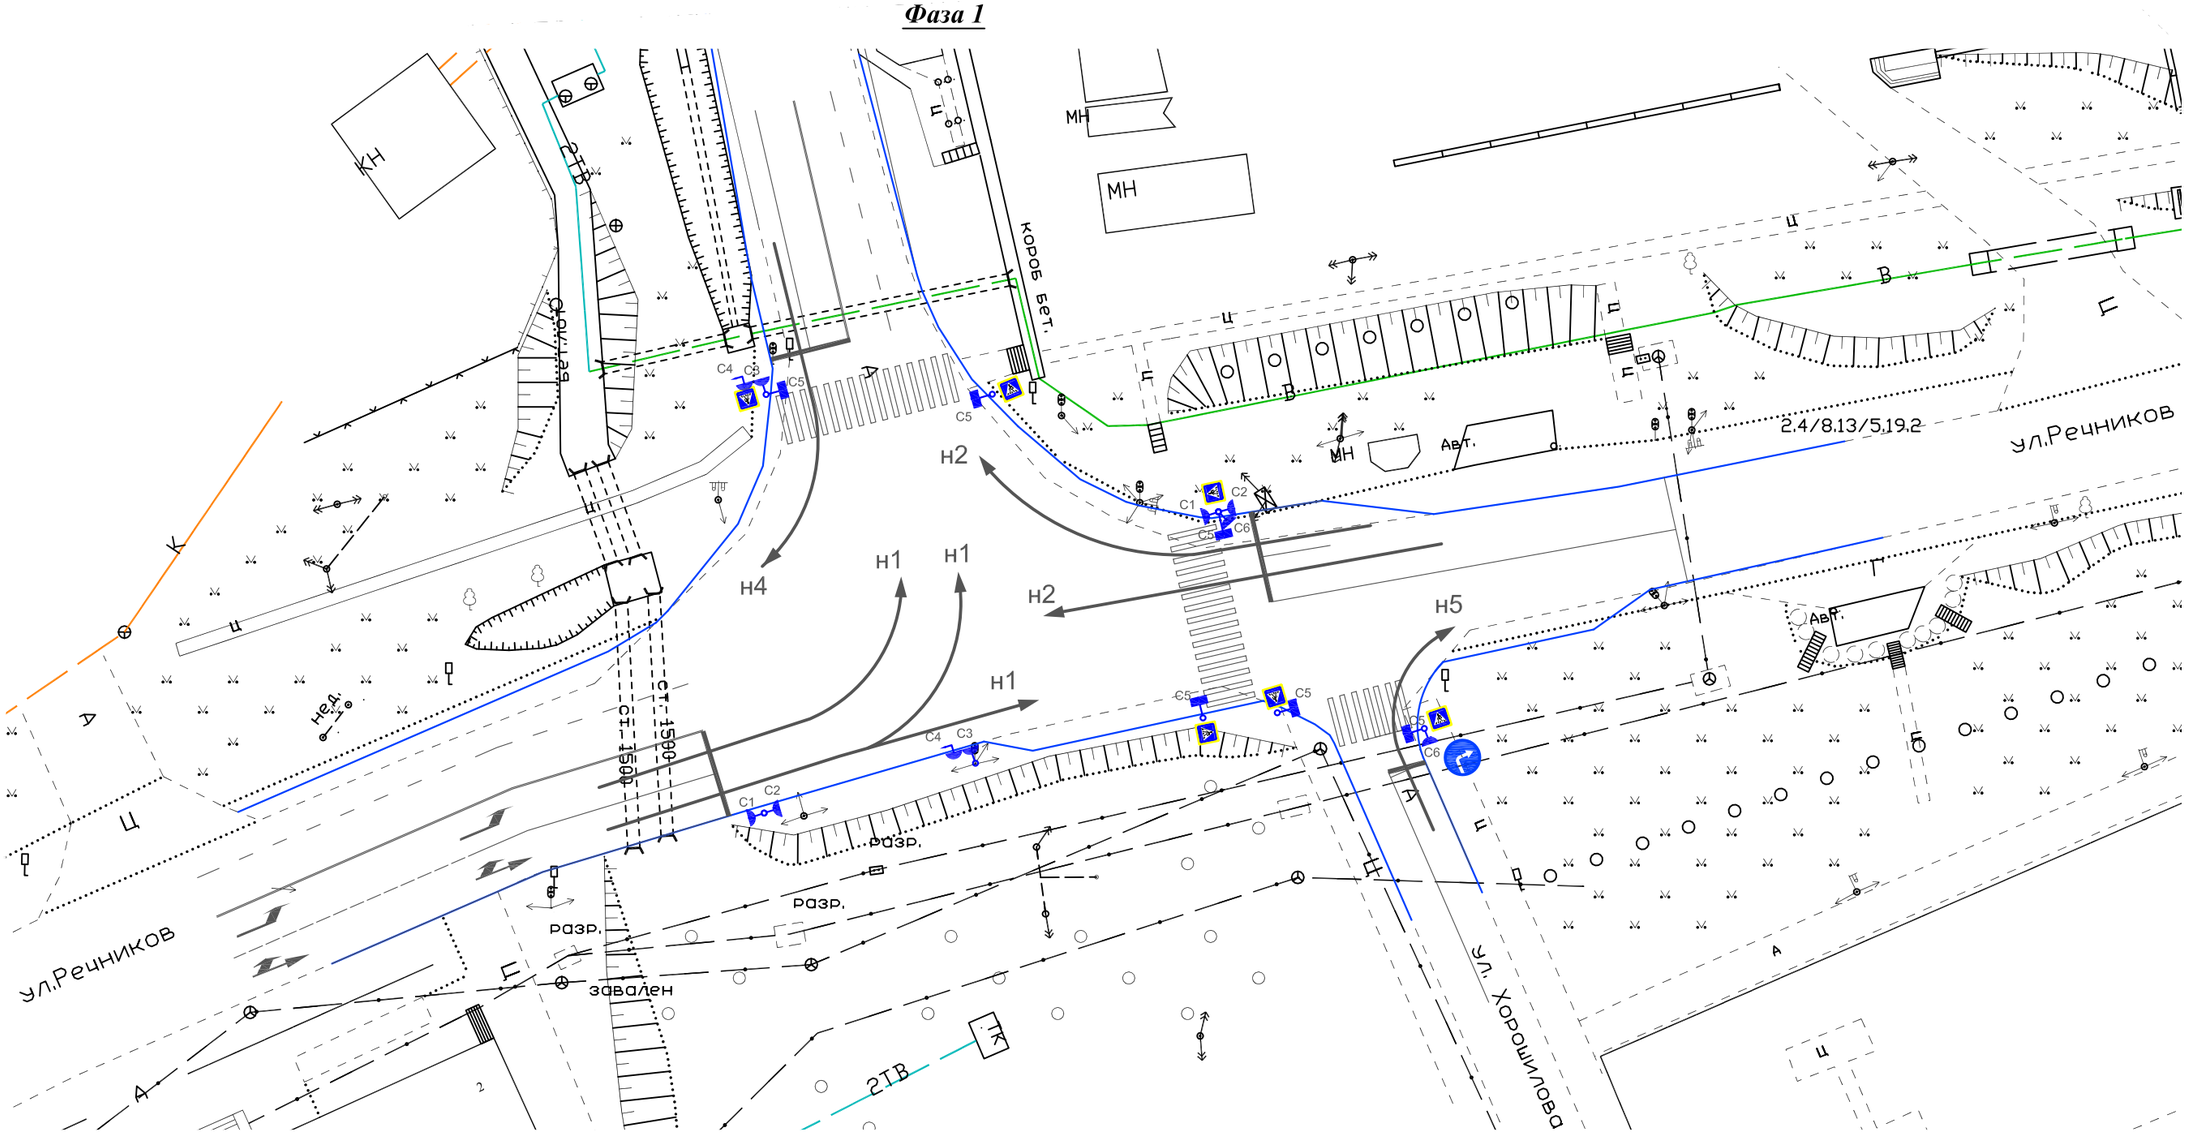


Организация движения по фазам

Фаза 2

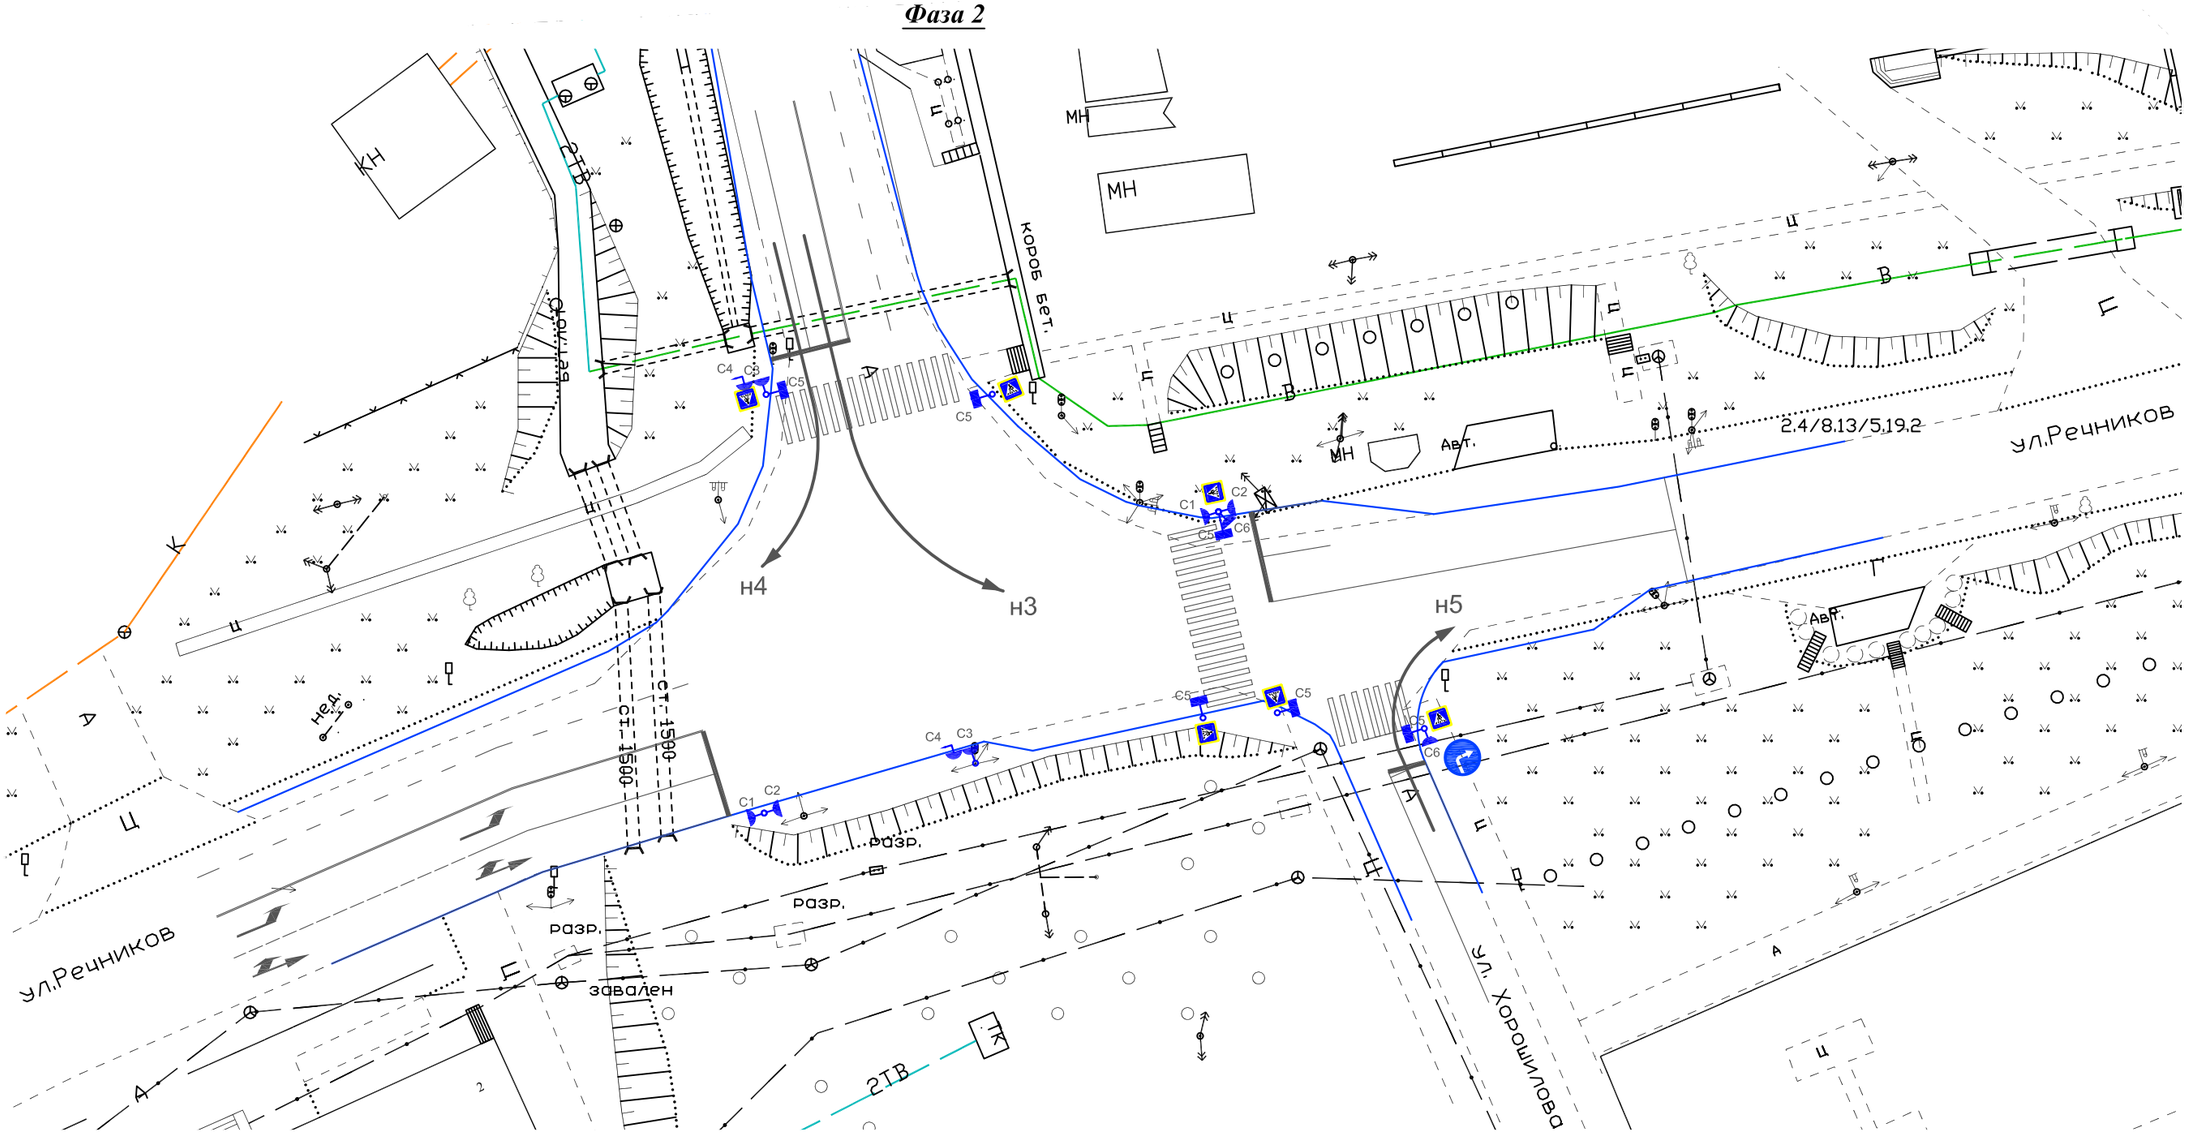


Организация движения по фазам

Фаза 3

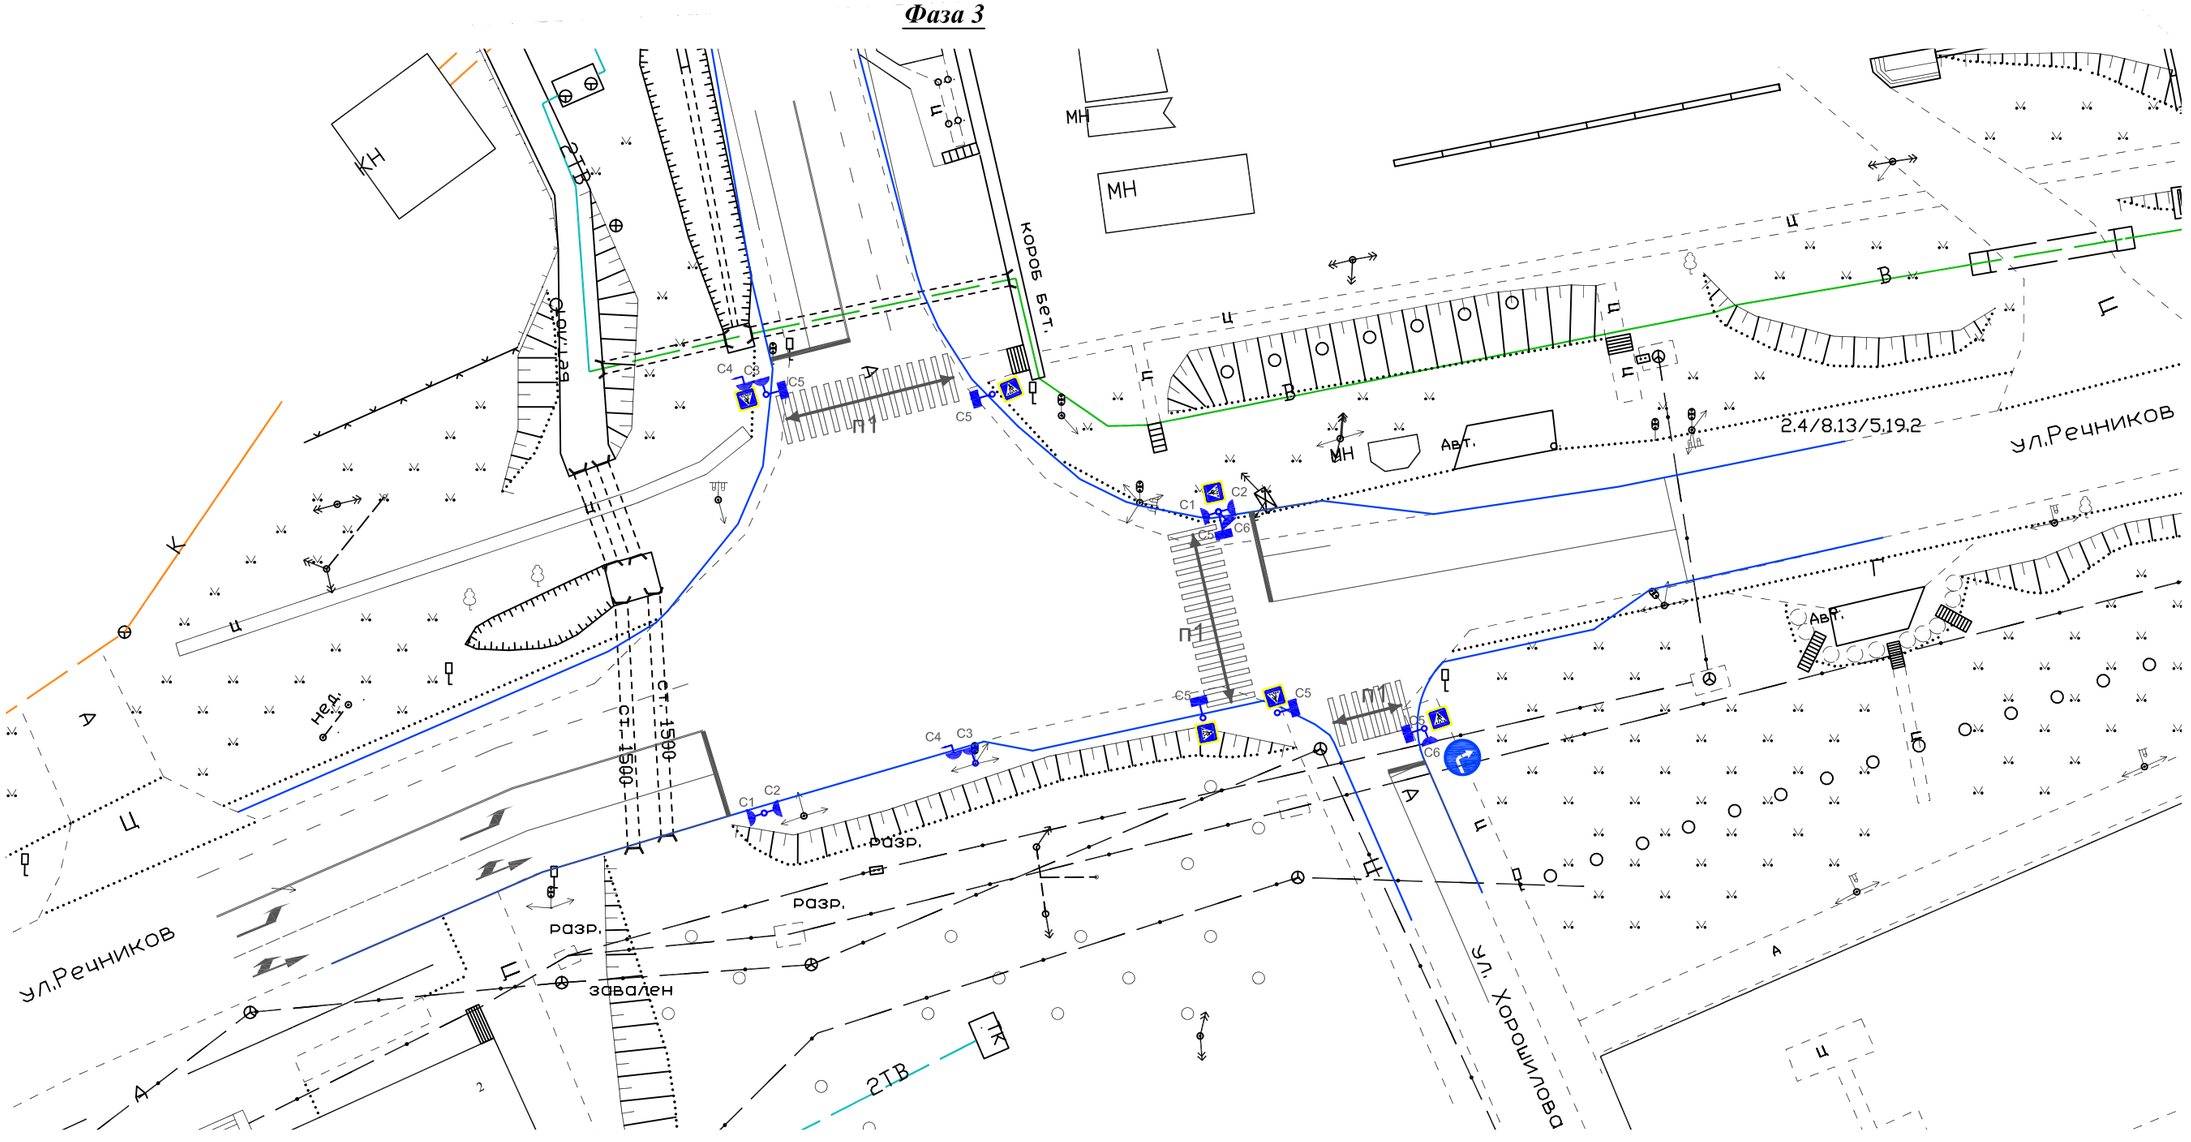


Режим работы светофорной сигнализации

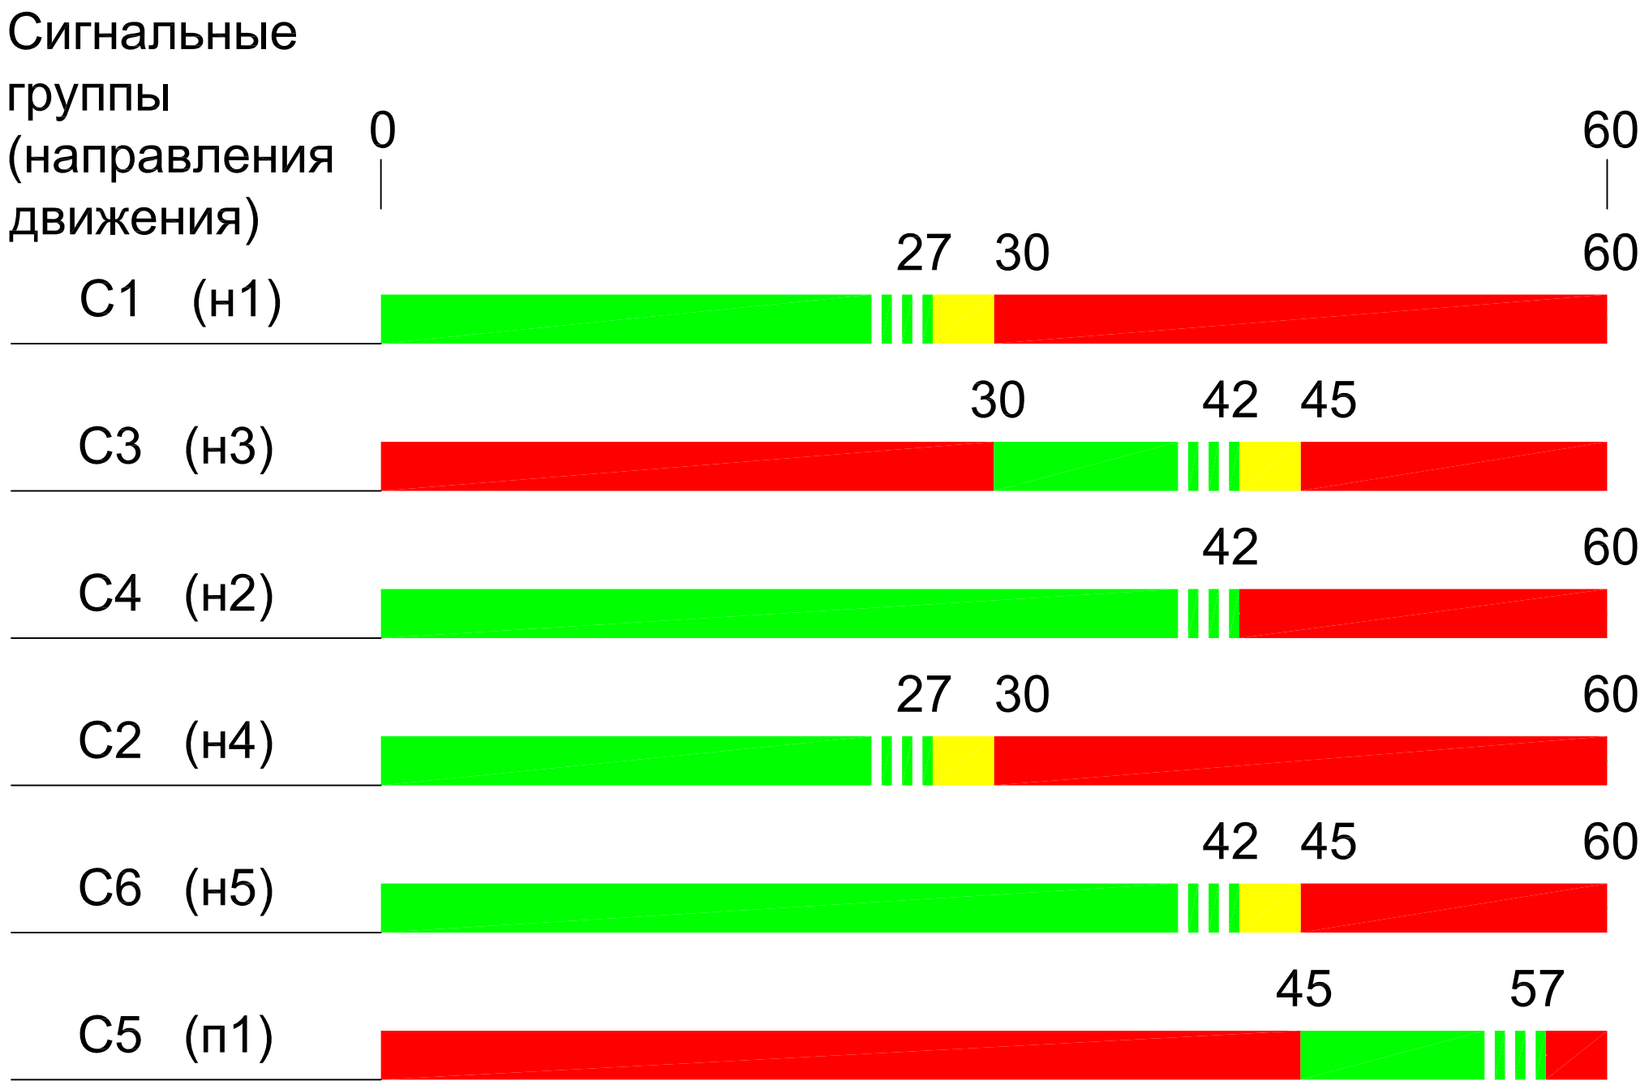

- зеленый мигающий сигнал


Средняя транспортная задержка - 12 (с/прив.ед.)

Схема расстановки оборудования на светофорном объекте по адресу:
г. Усть-Кут, перекресток ул. Речников - пер. Профсоюзный

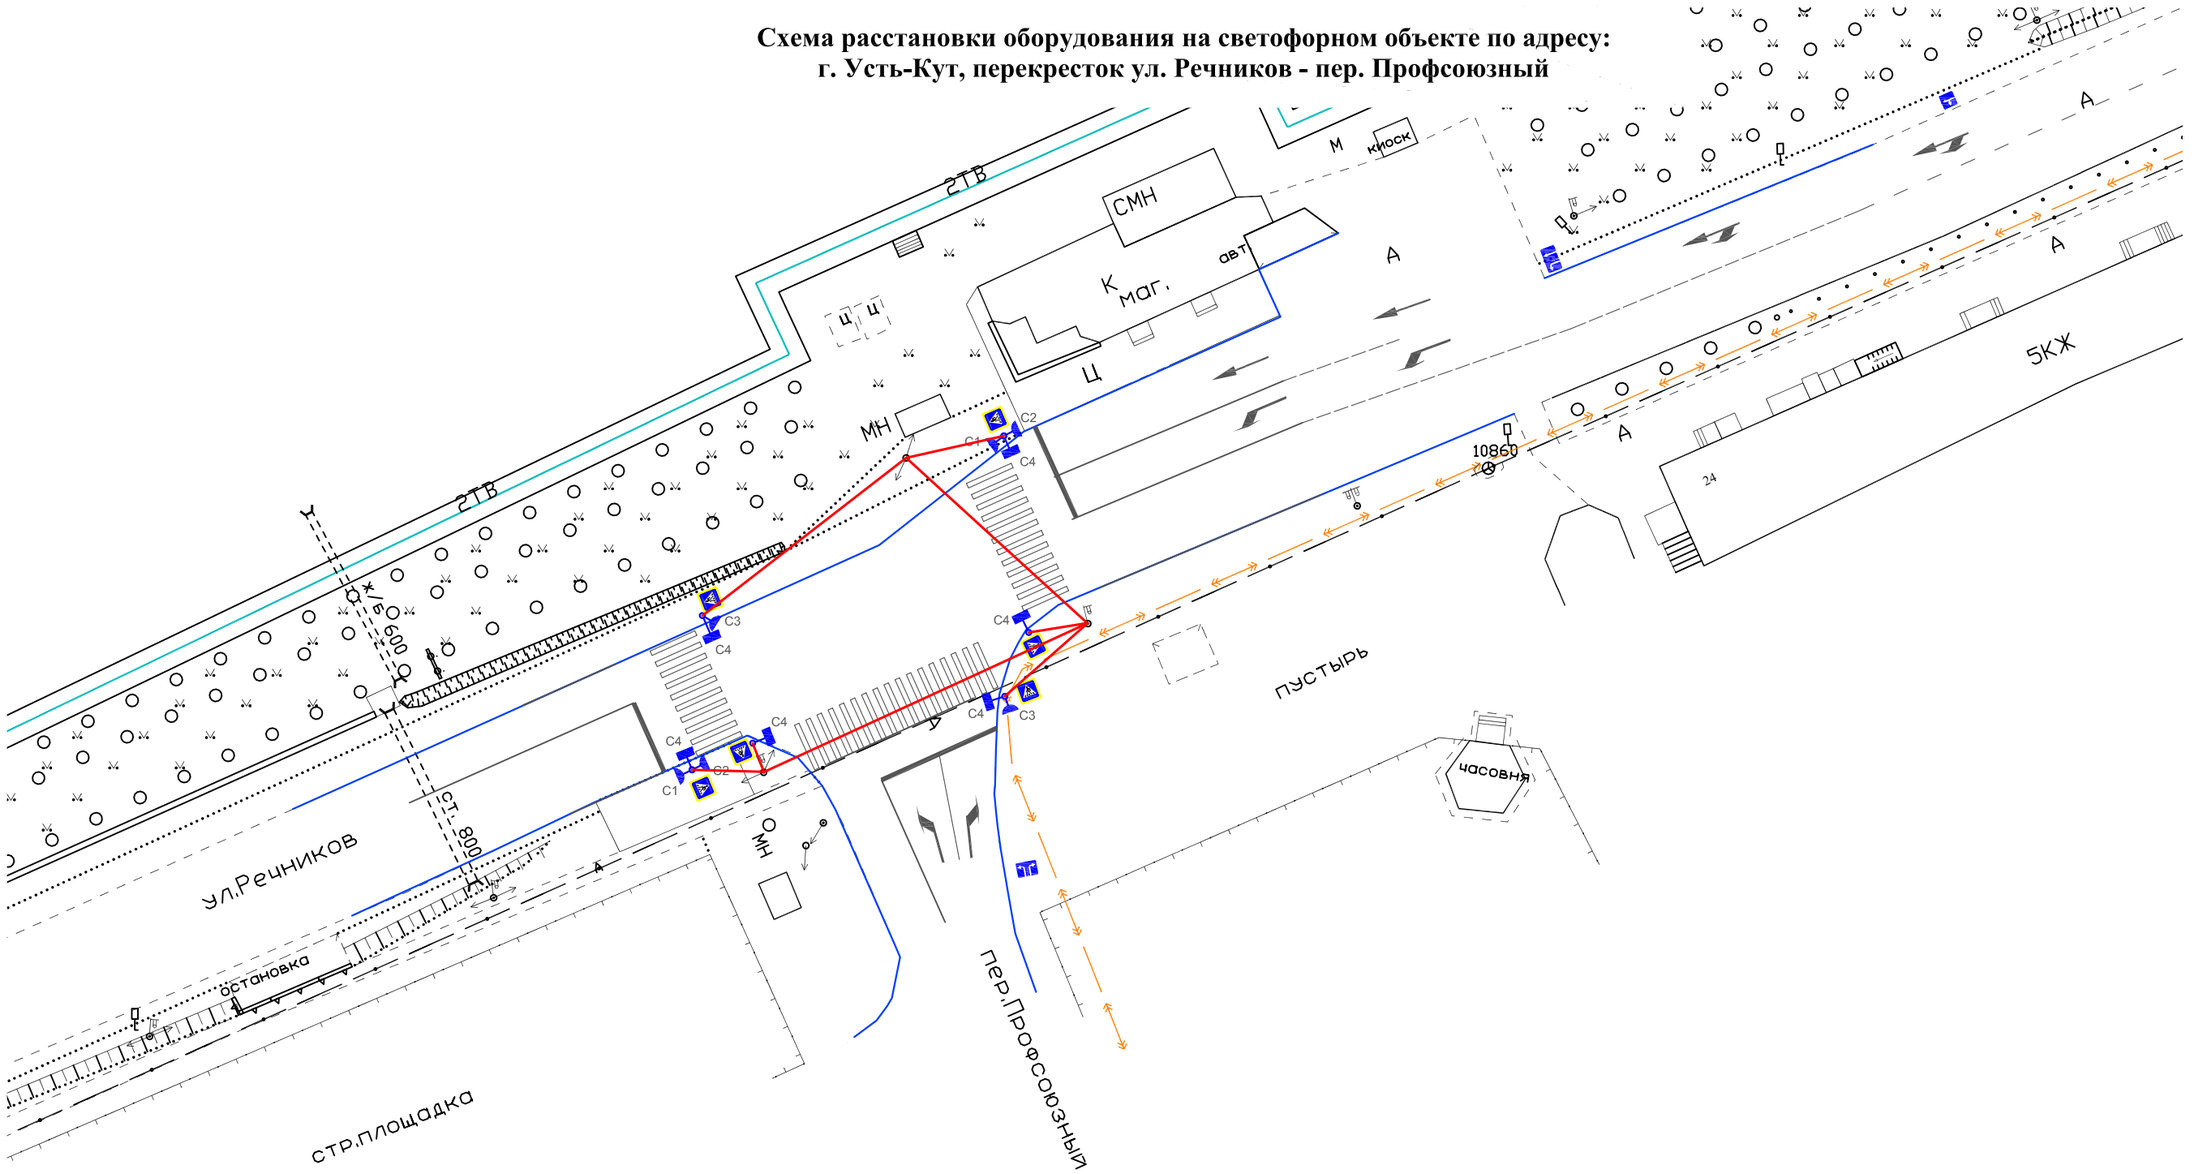


Организация движения по фазам

Фаза 1

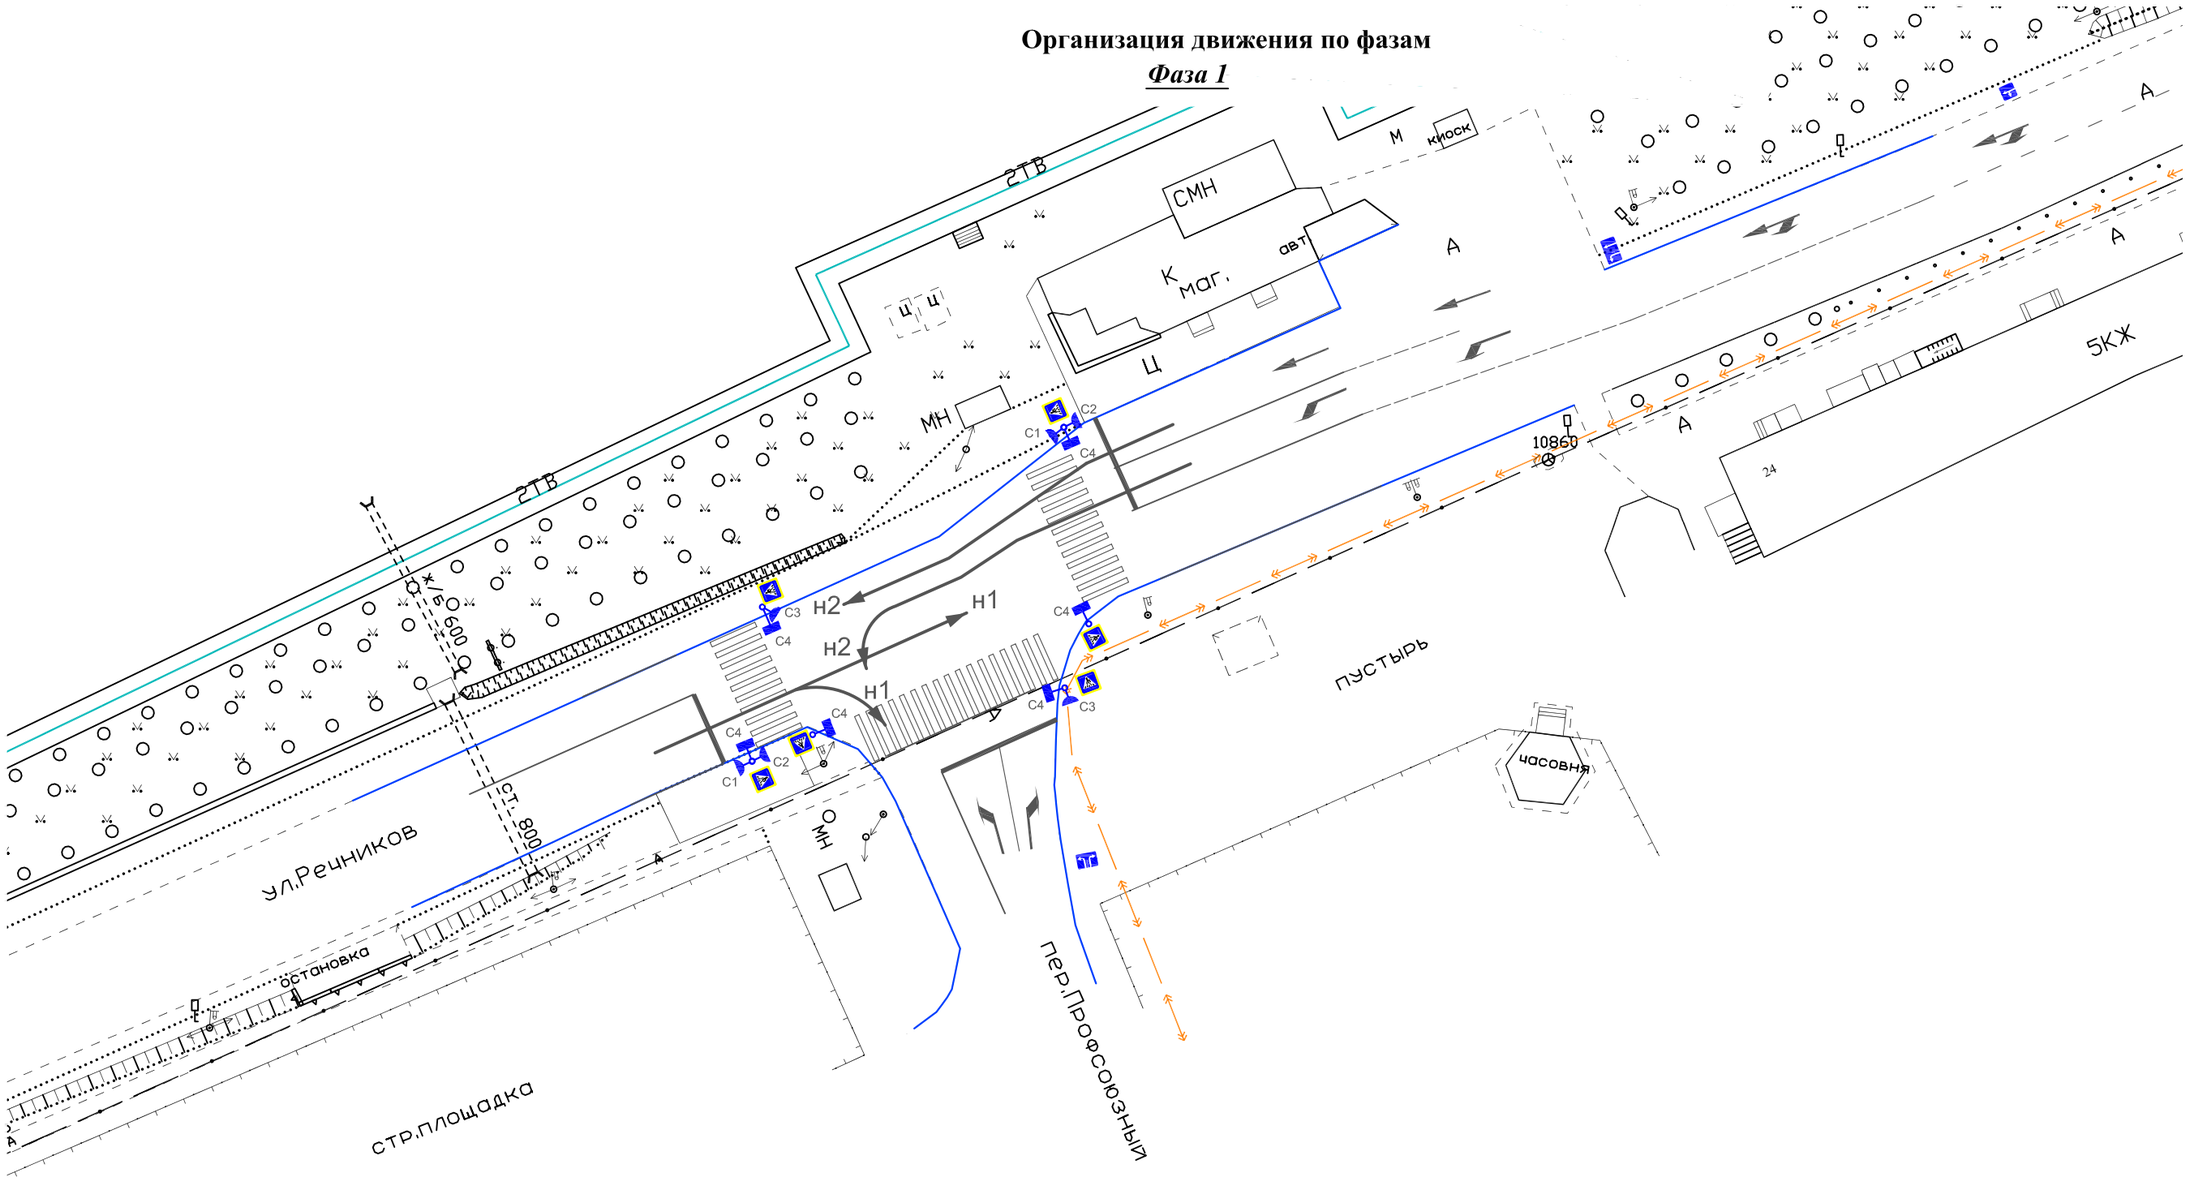


Организация движения по фазам

Фаза 2

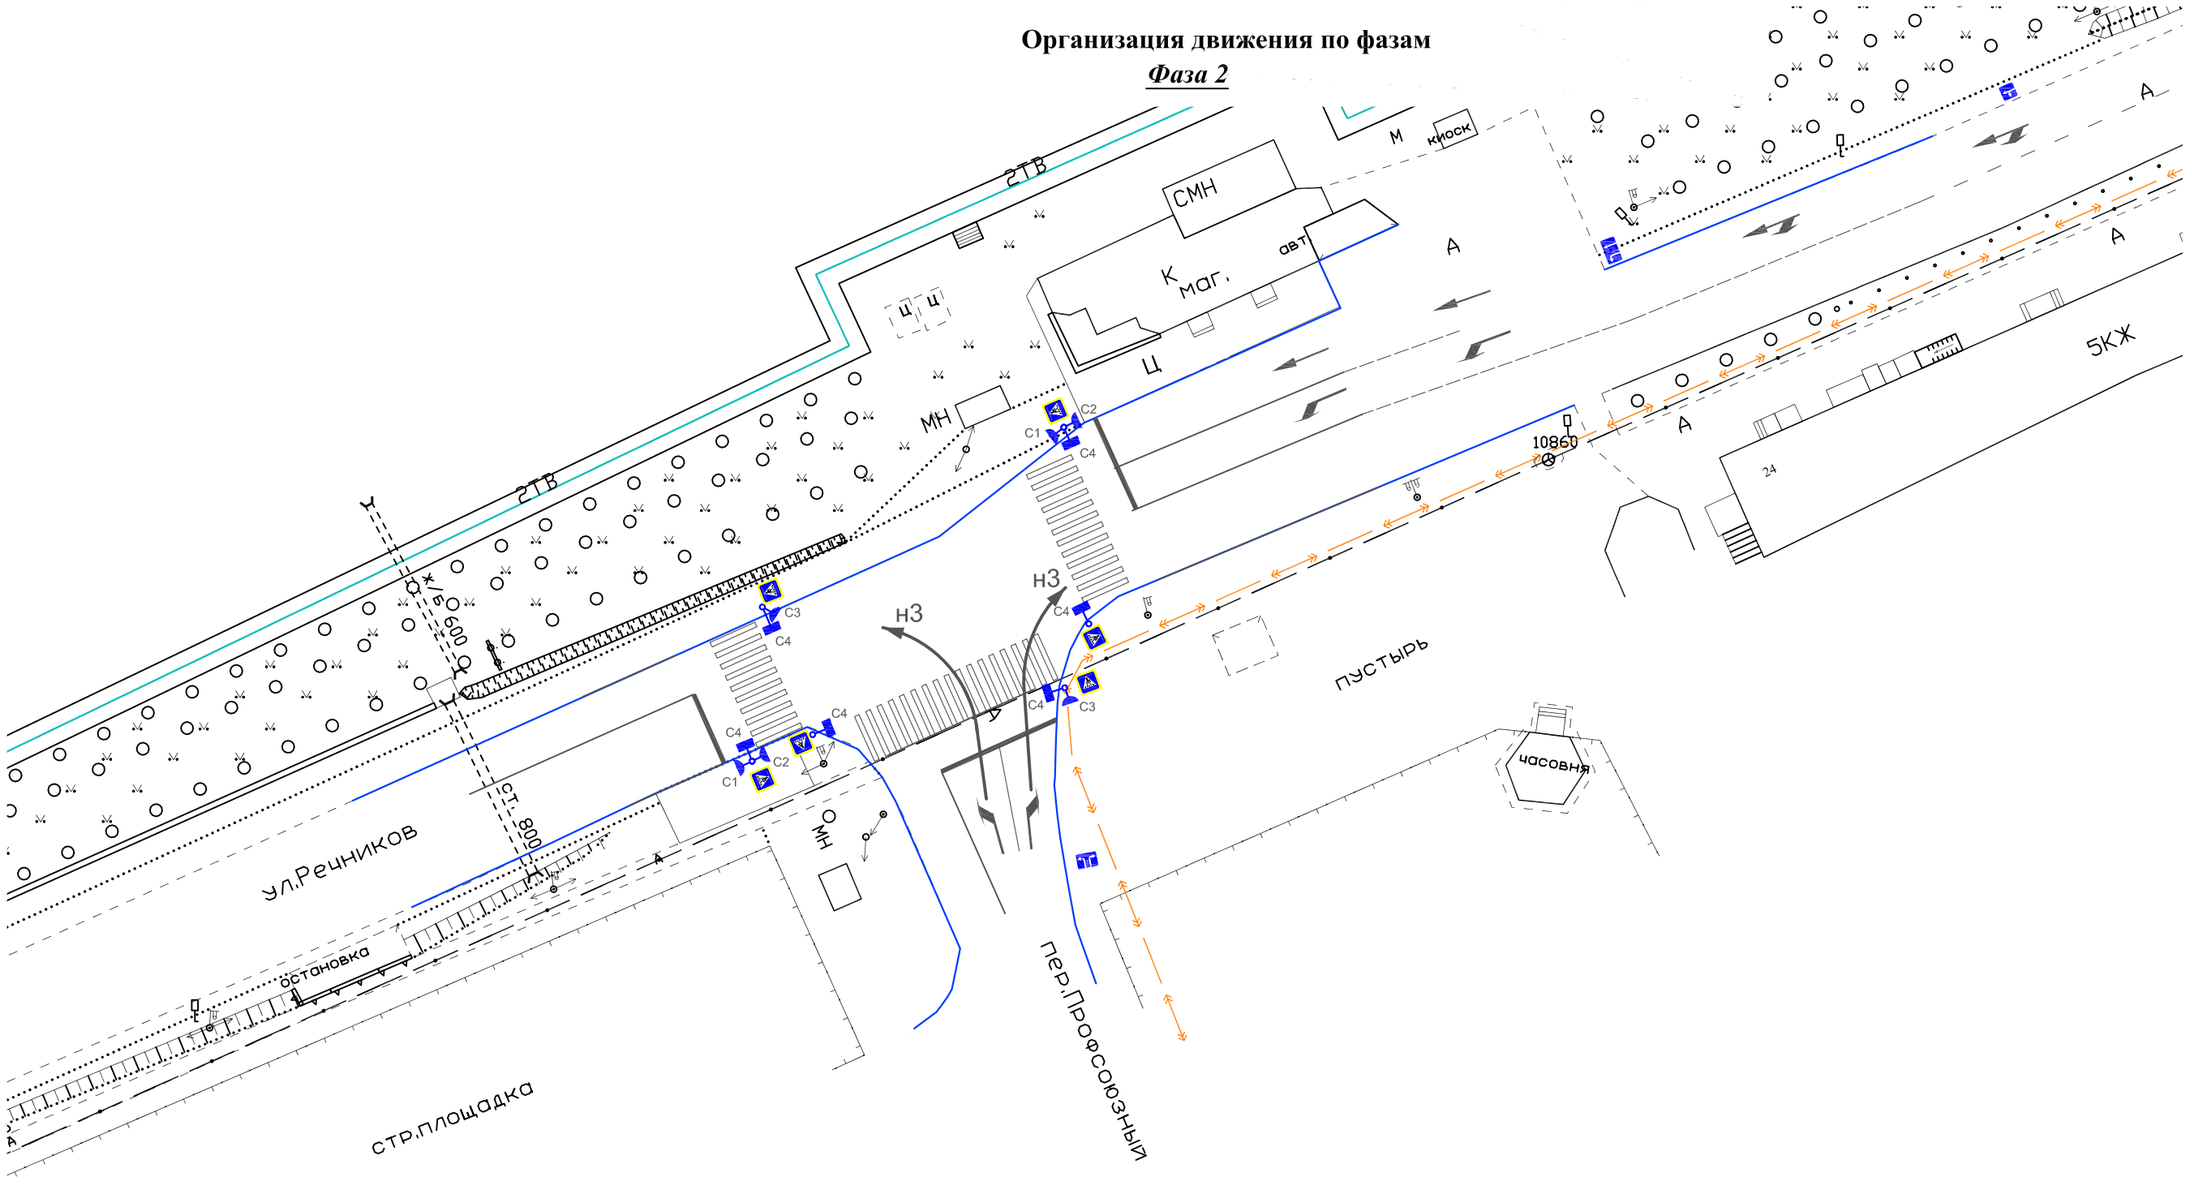


Организация движения по фазам

Фаза 3

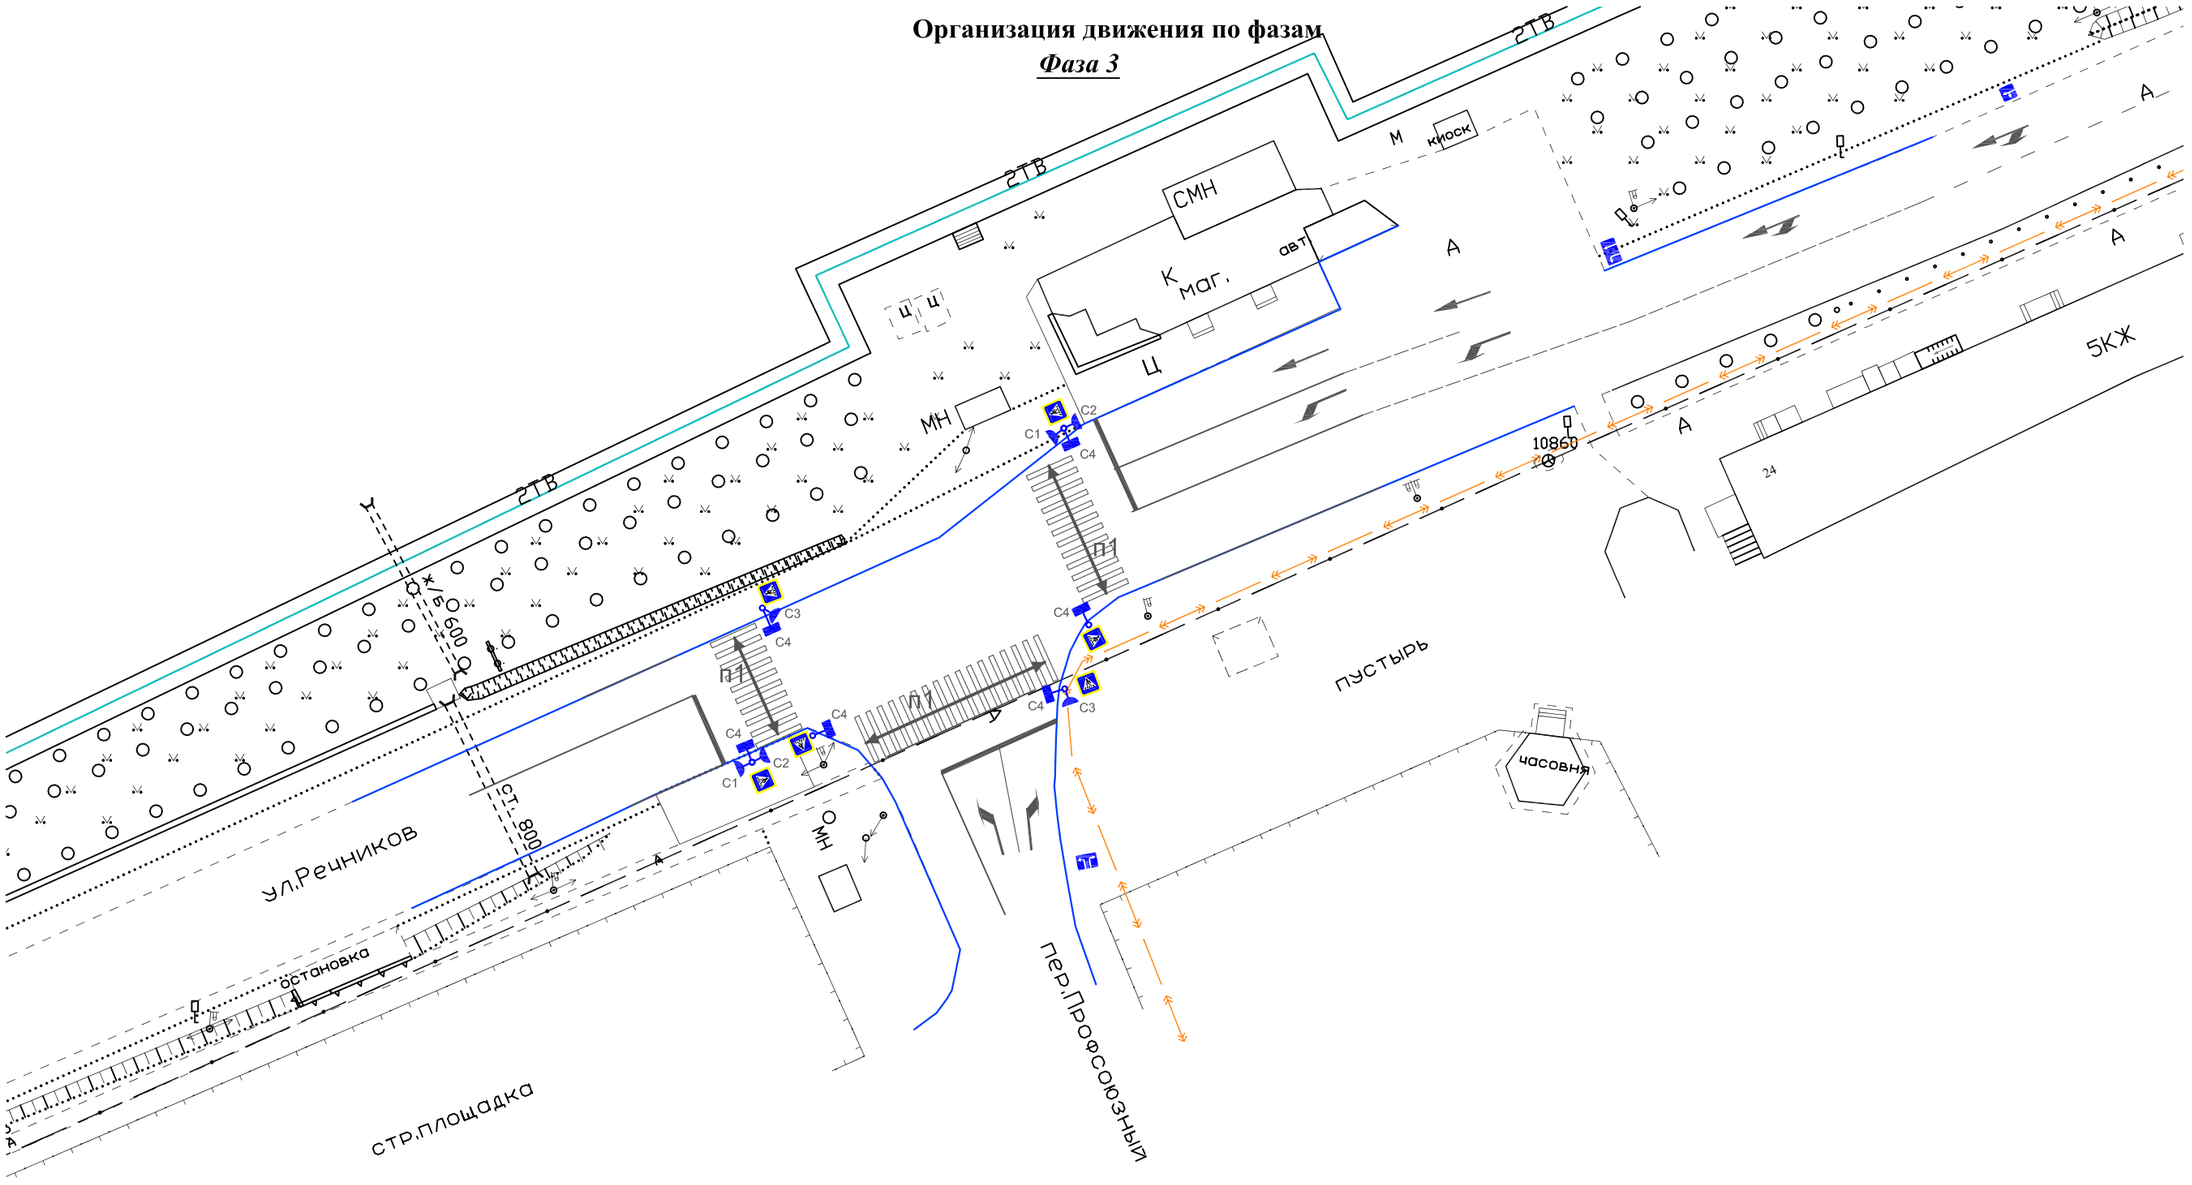


Режим работы светофорной сигнализации

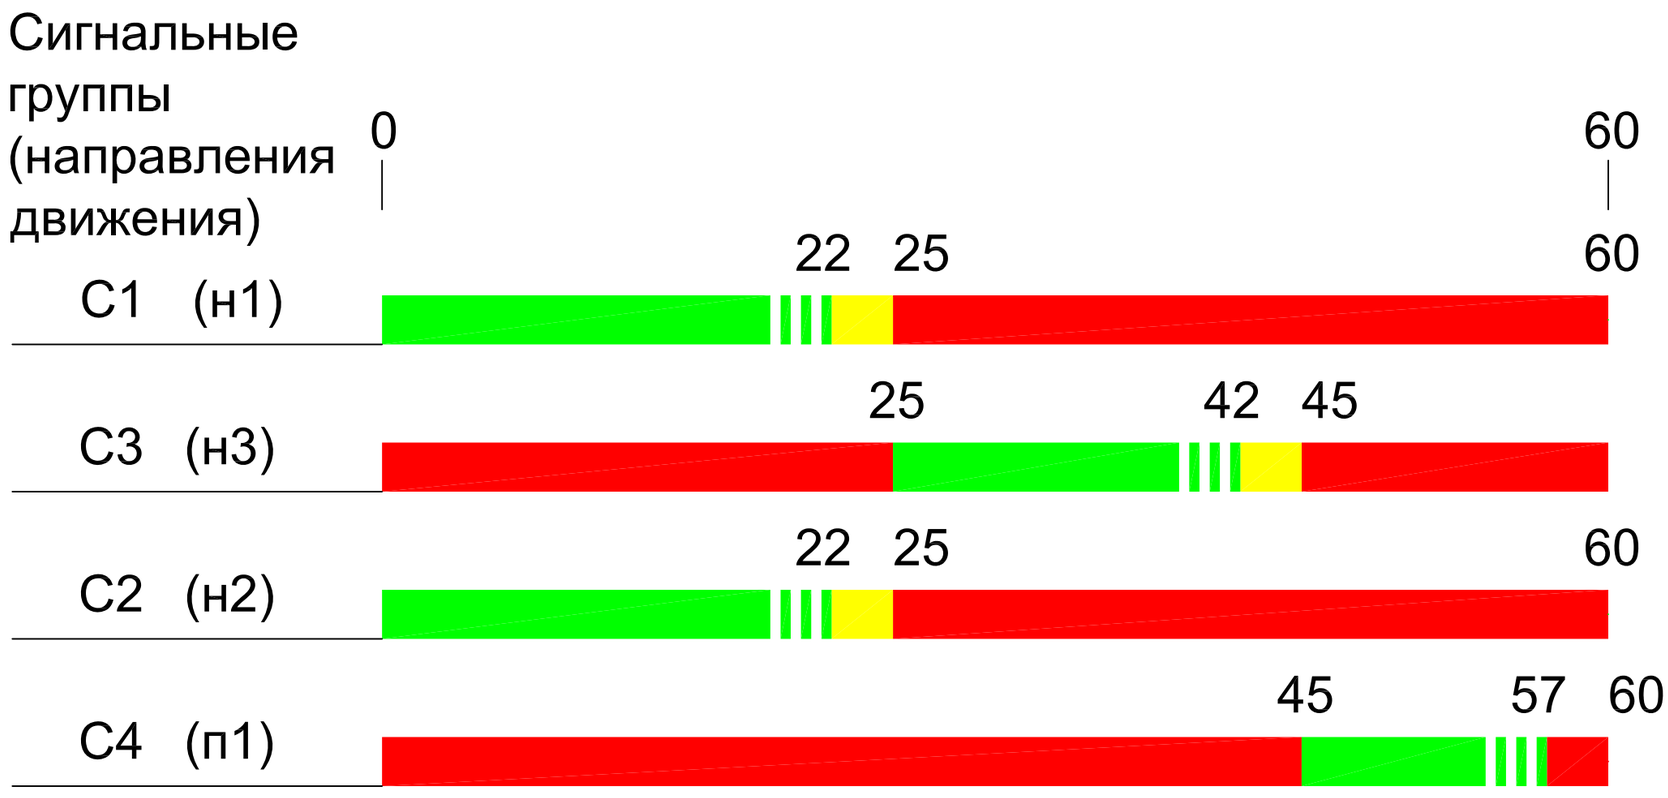

|||| - зеленый мигающий сигнал


Средняя транспортная задержка - 19 (с/прив.ед.)

Схема расстановки оборудования на светофорном объекте по адресу:
г. Усть-Кут, перекресток ул. Речников - ул. Дзержинского

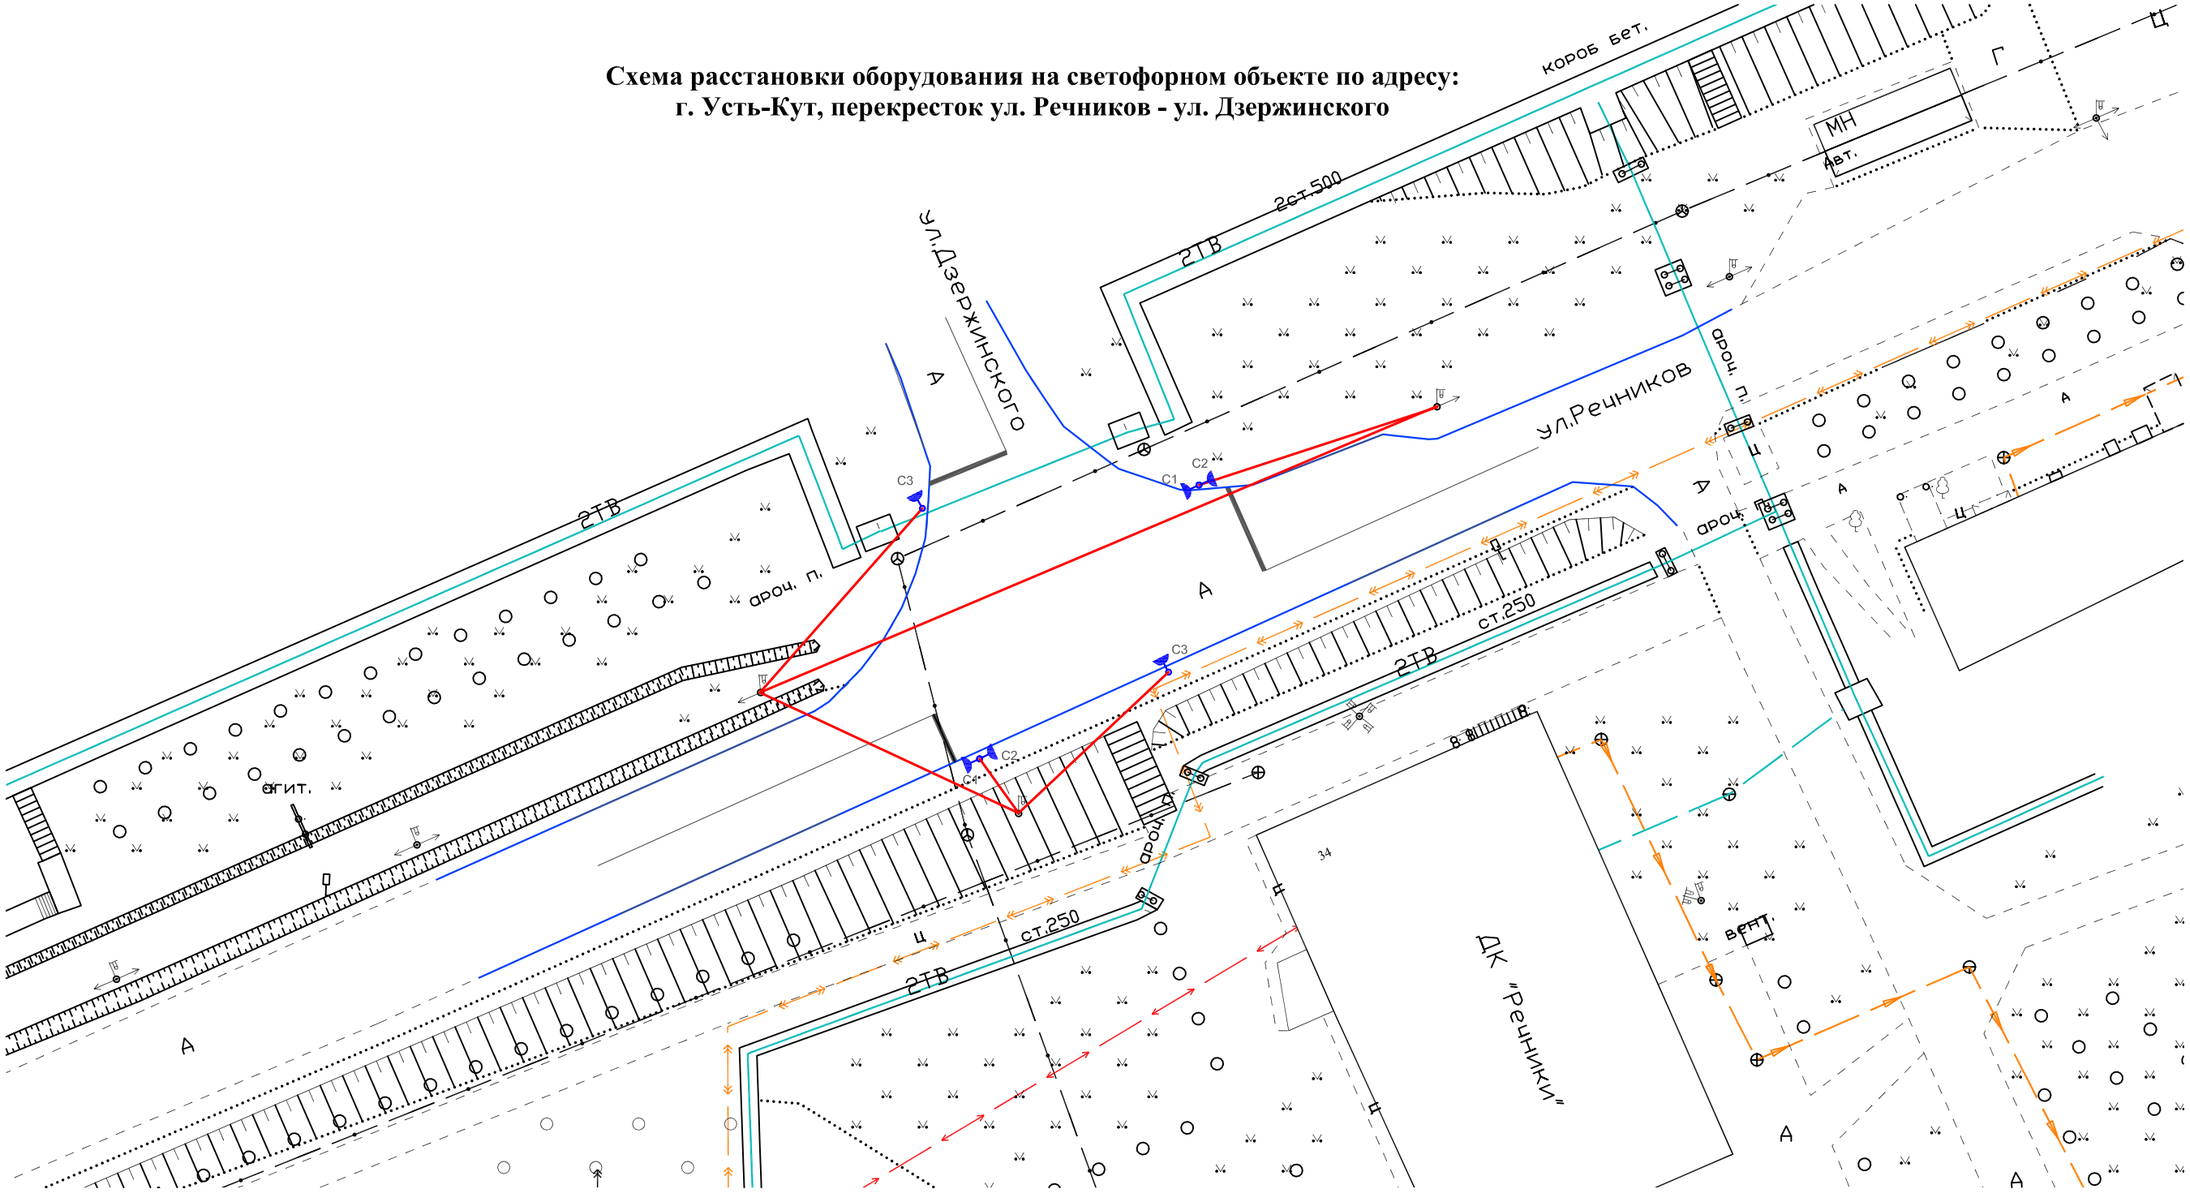


Организация движения по фазам

Фаза 1

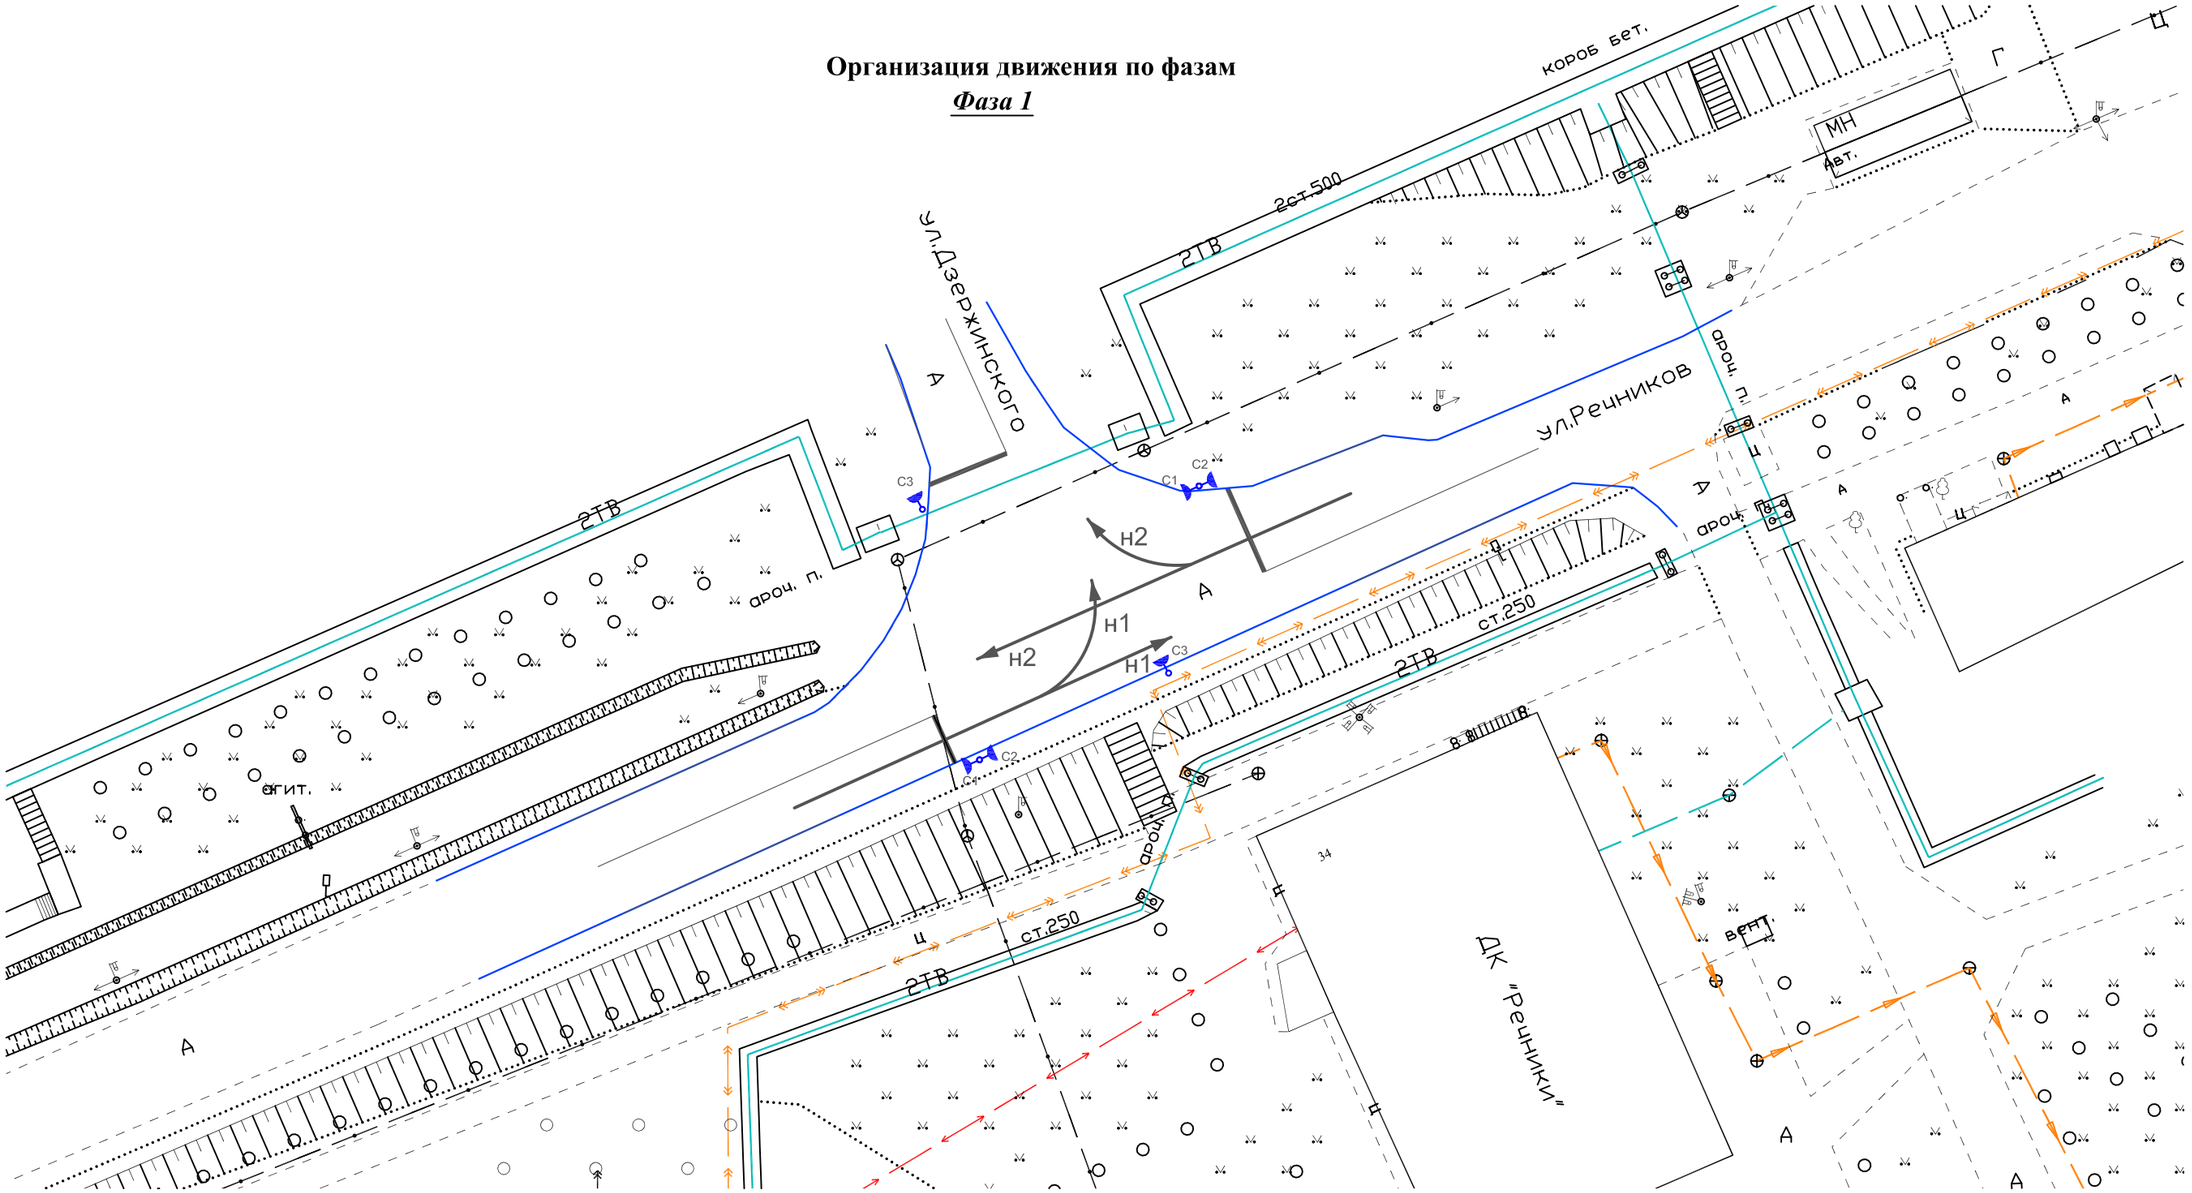


Организация движения по фазам


Фаза 2

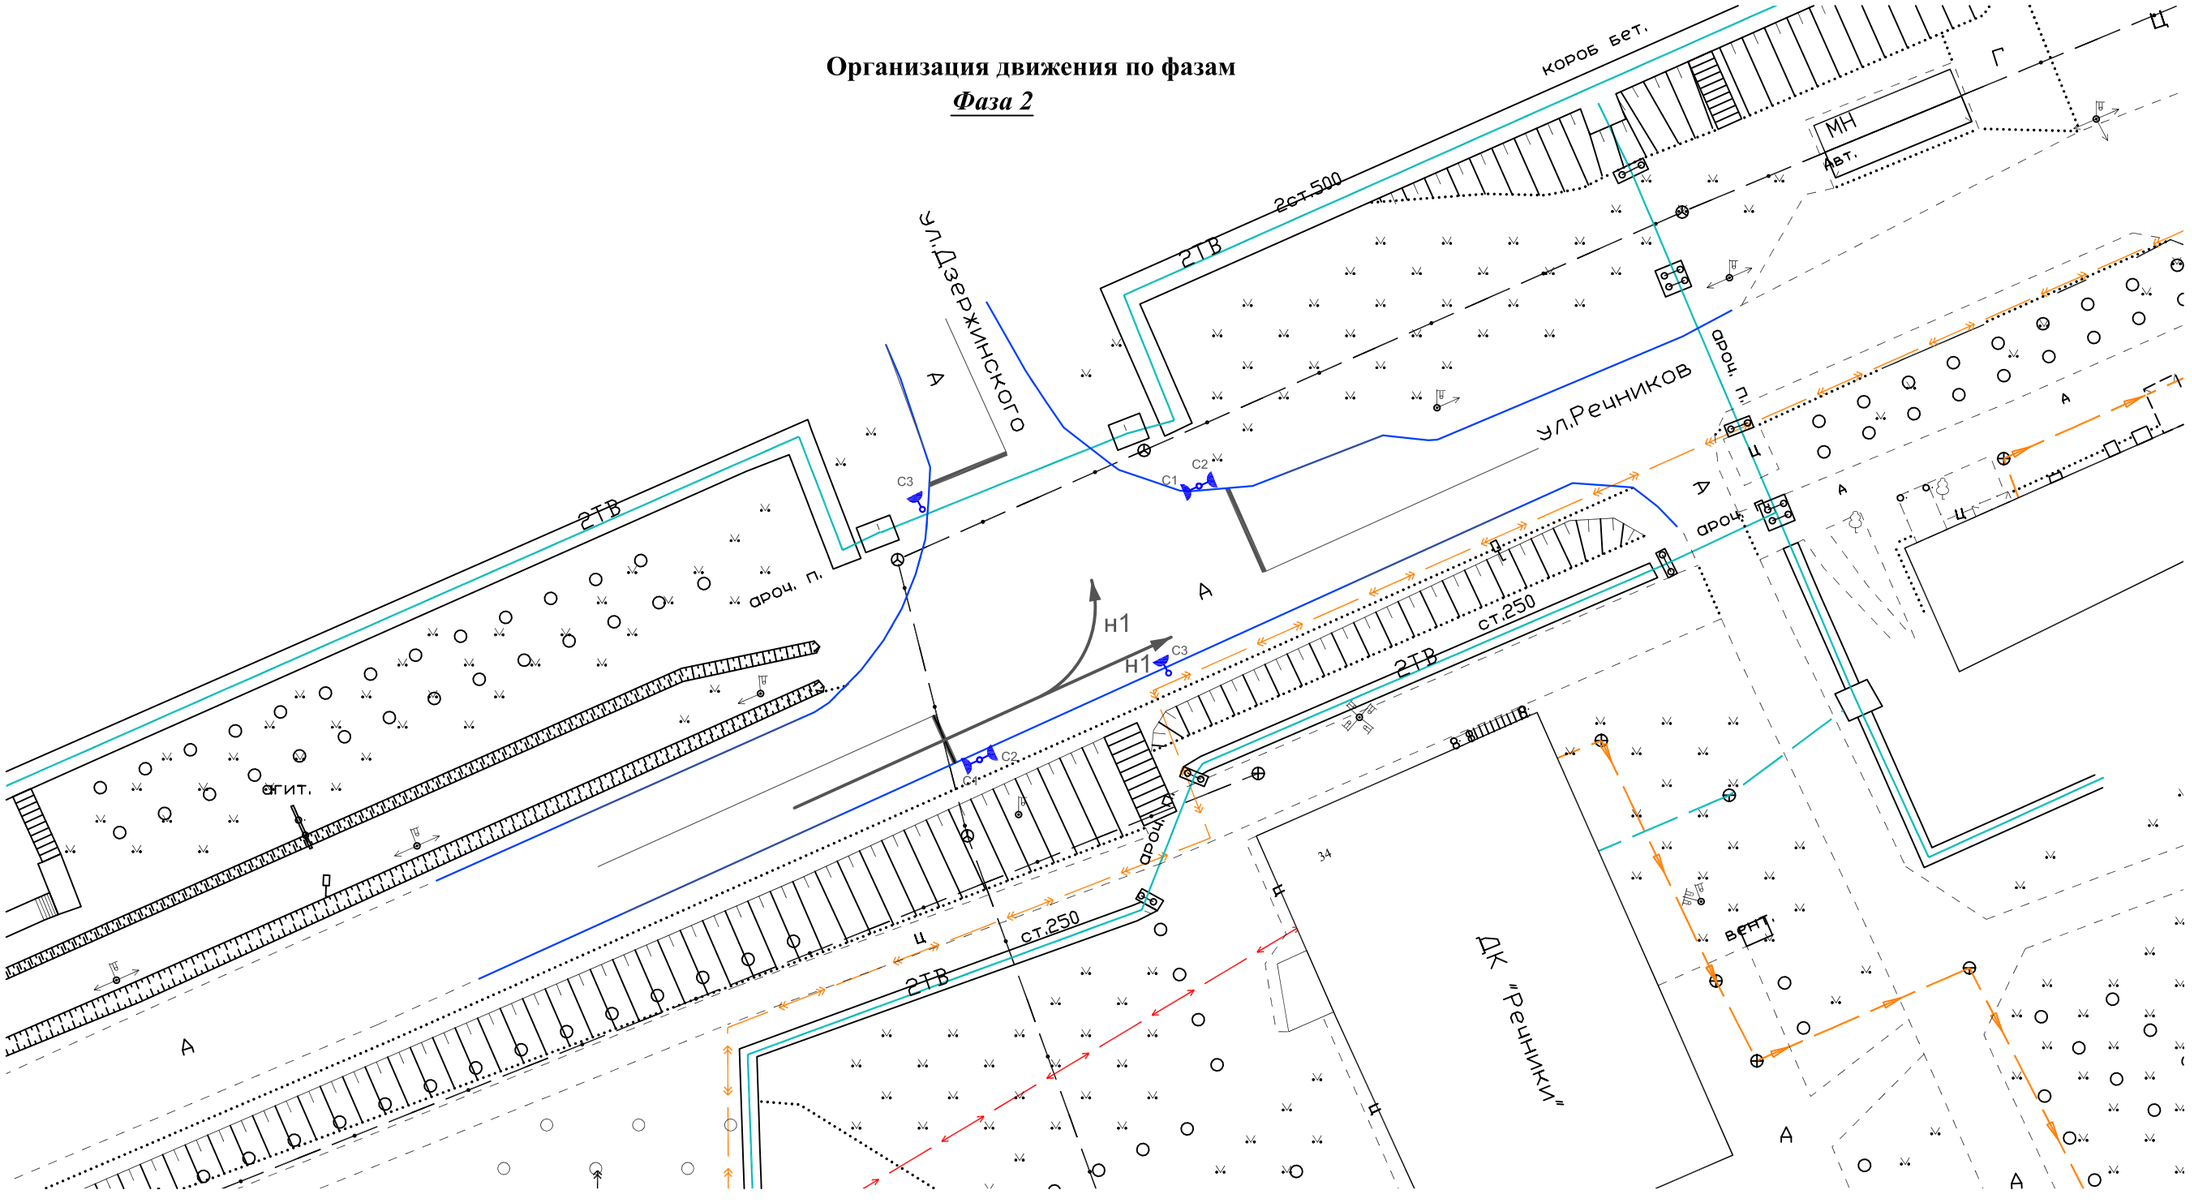

Организация движения по фазам

Фаза 3

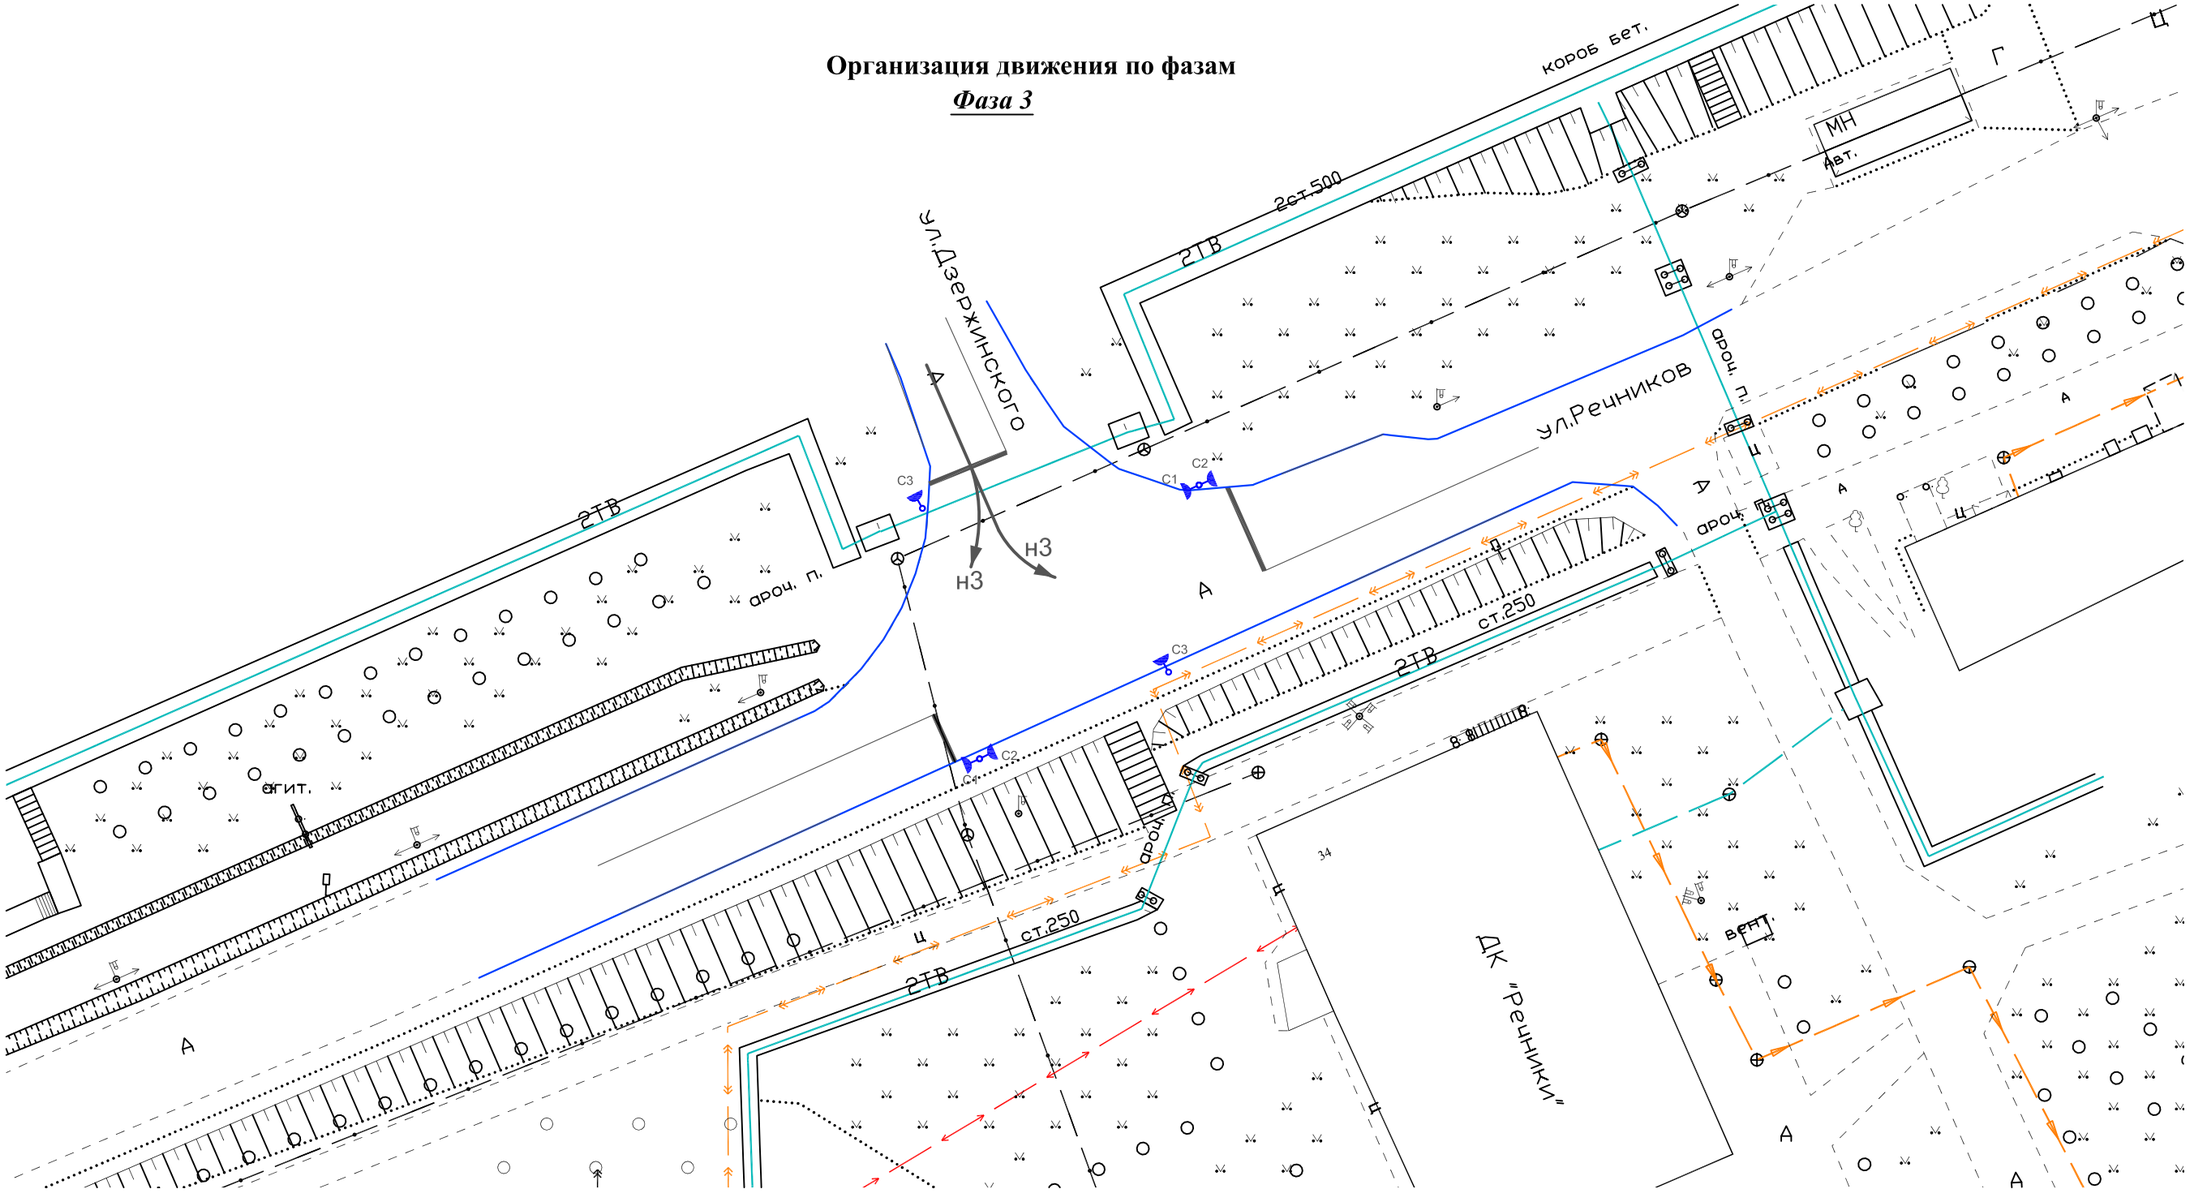

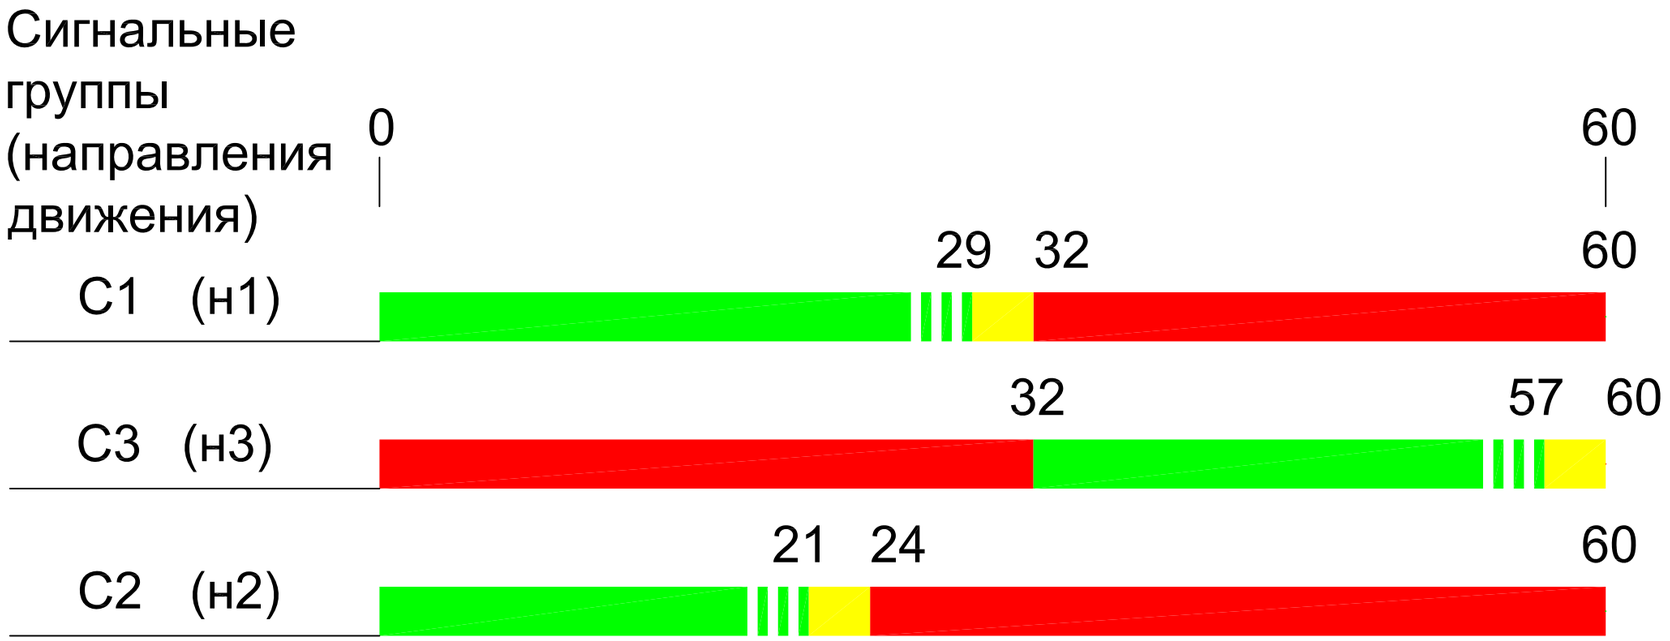

|||| - зеленый мигающий сигнал


Средняя транспортная задержка - 13 (с/прив.ед.)
Длина очереди для направления н3 (авт.)

- средняя - 3
- 95%-ной обеспеченности - 7

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от перекрестка с ул. Солнечная до пер. Сиреневый


1-й участок: км 0+000 - км 1+665
2-й участок: км 0+000 - км 0+508

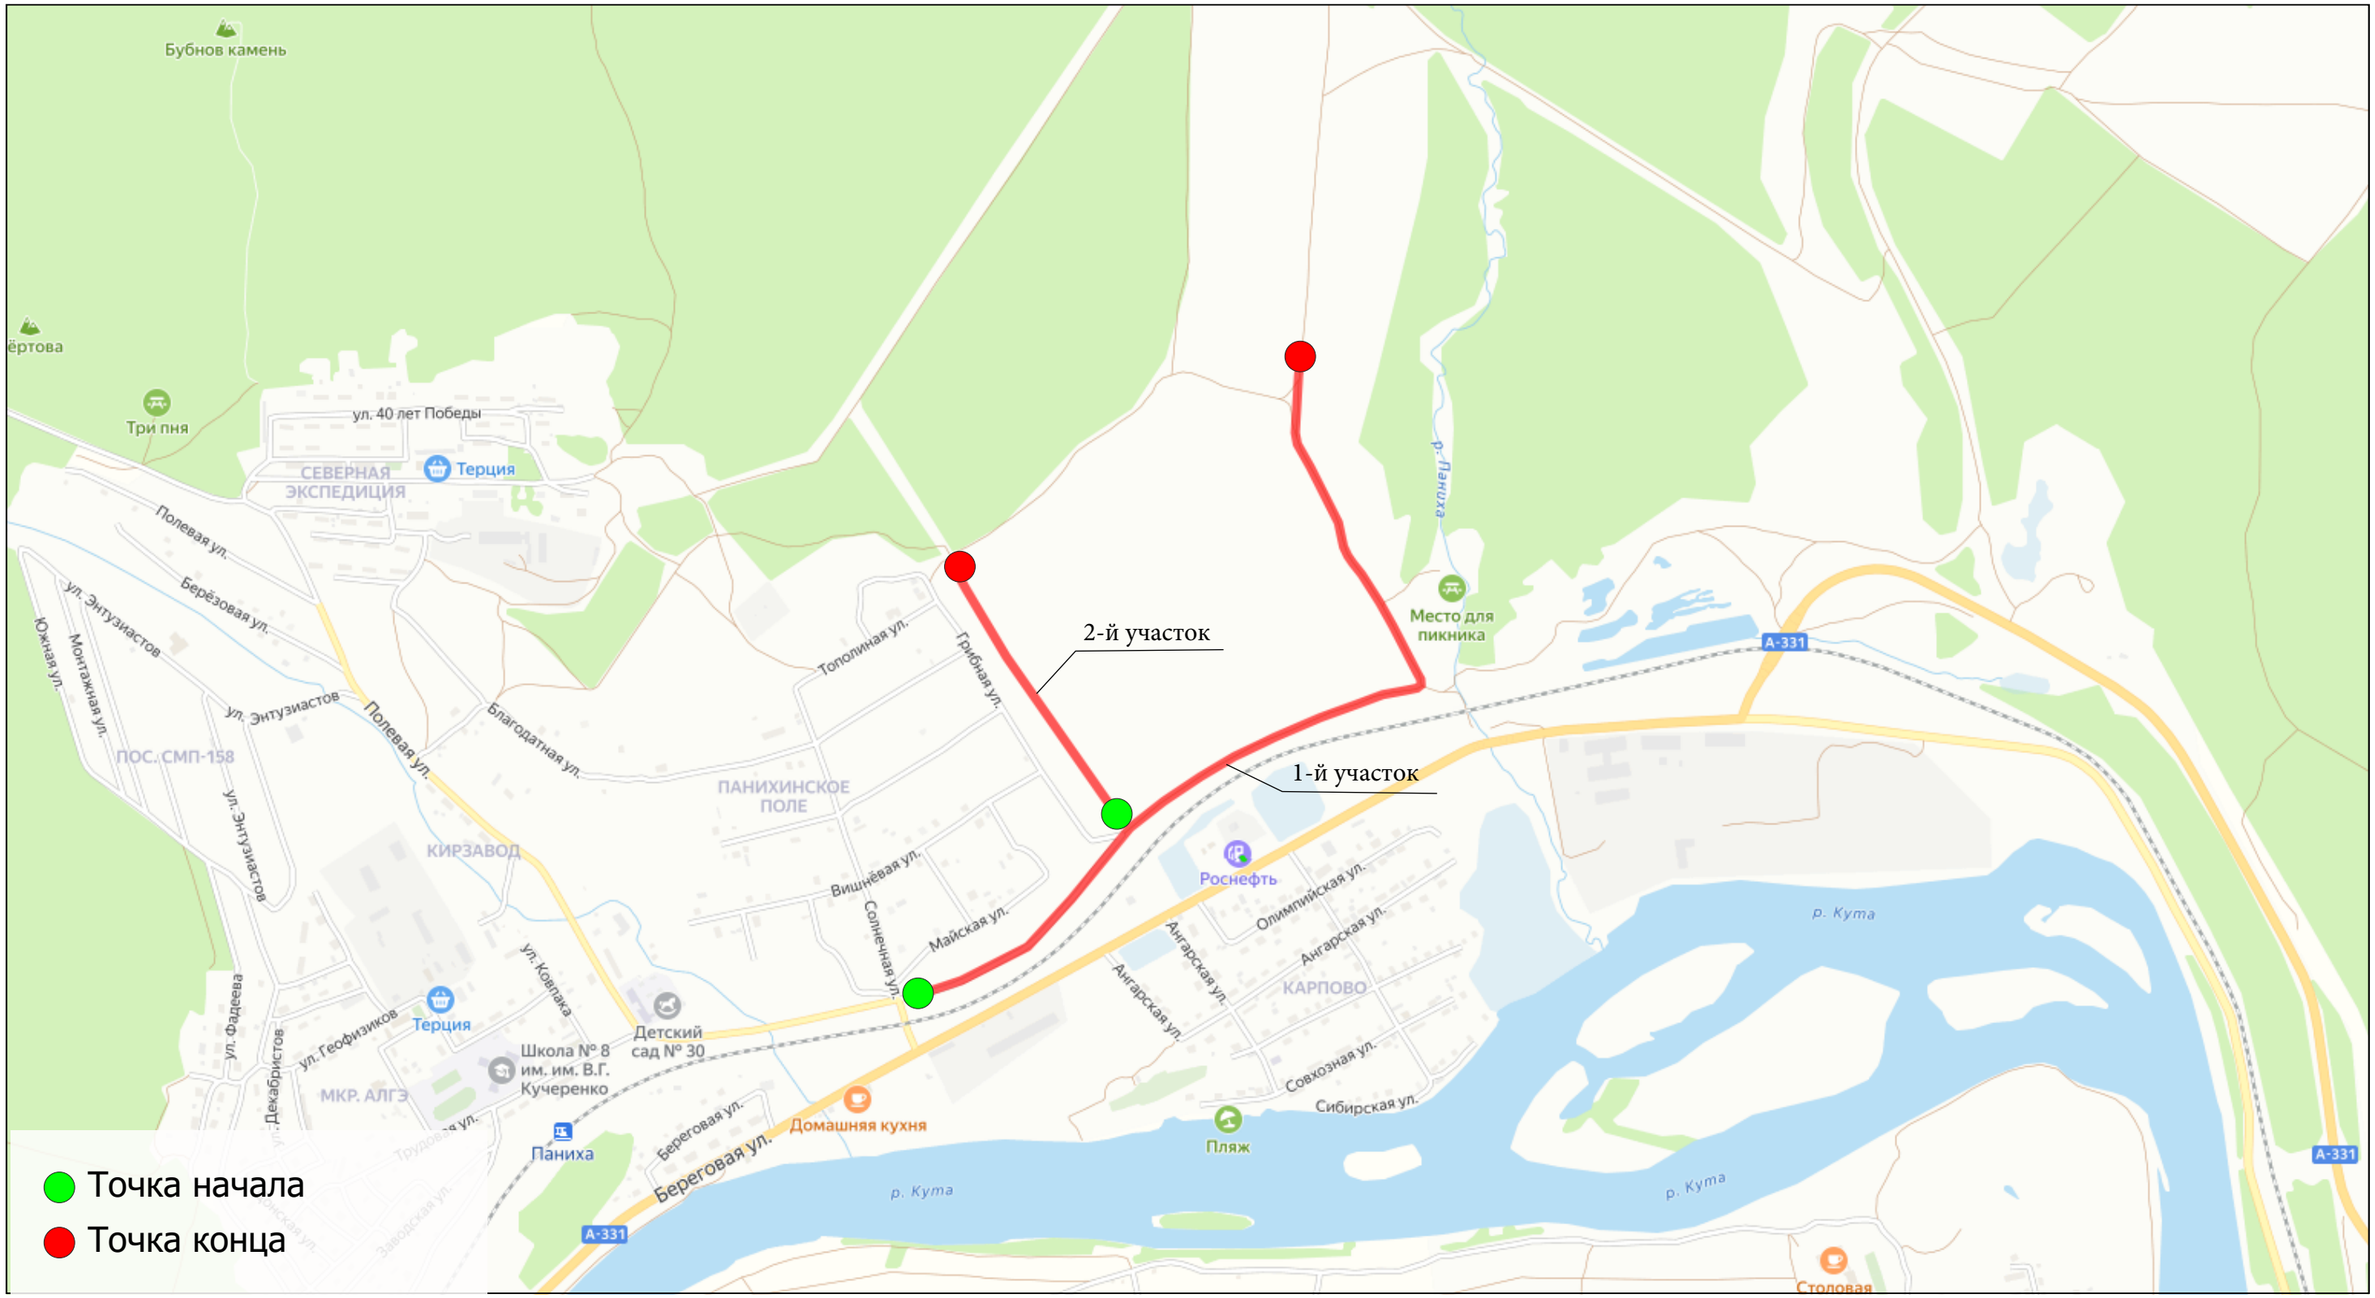

М 1:3000

Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Солнечная до пер. Сиреневый уч. №1


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12 (0–21); 12 (21–195); 4 (195–400); 4 (400–595); 16 (595–829); 2 (829–930); 14 (930–960); 14 (960–879); R=11605м; R=9873м; R=8785м; R=3554м
Кривые в плане	44; R=682м P=29; a=13°; 132; 191; R=699м P=16; a=26°; 278; 498; R=629м P=30; a=12°; 567; 630; R=673м P=34; a=11°; 762; 850; R=637м P=68; a=5°; 899; R=676м P=93; a=4°; 940; R=677м P=25; a=15°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0; 5,00; 879; 4,00

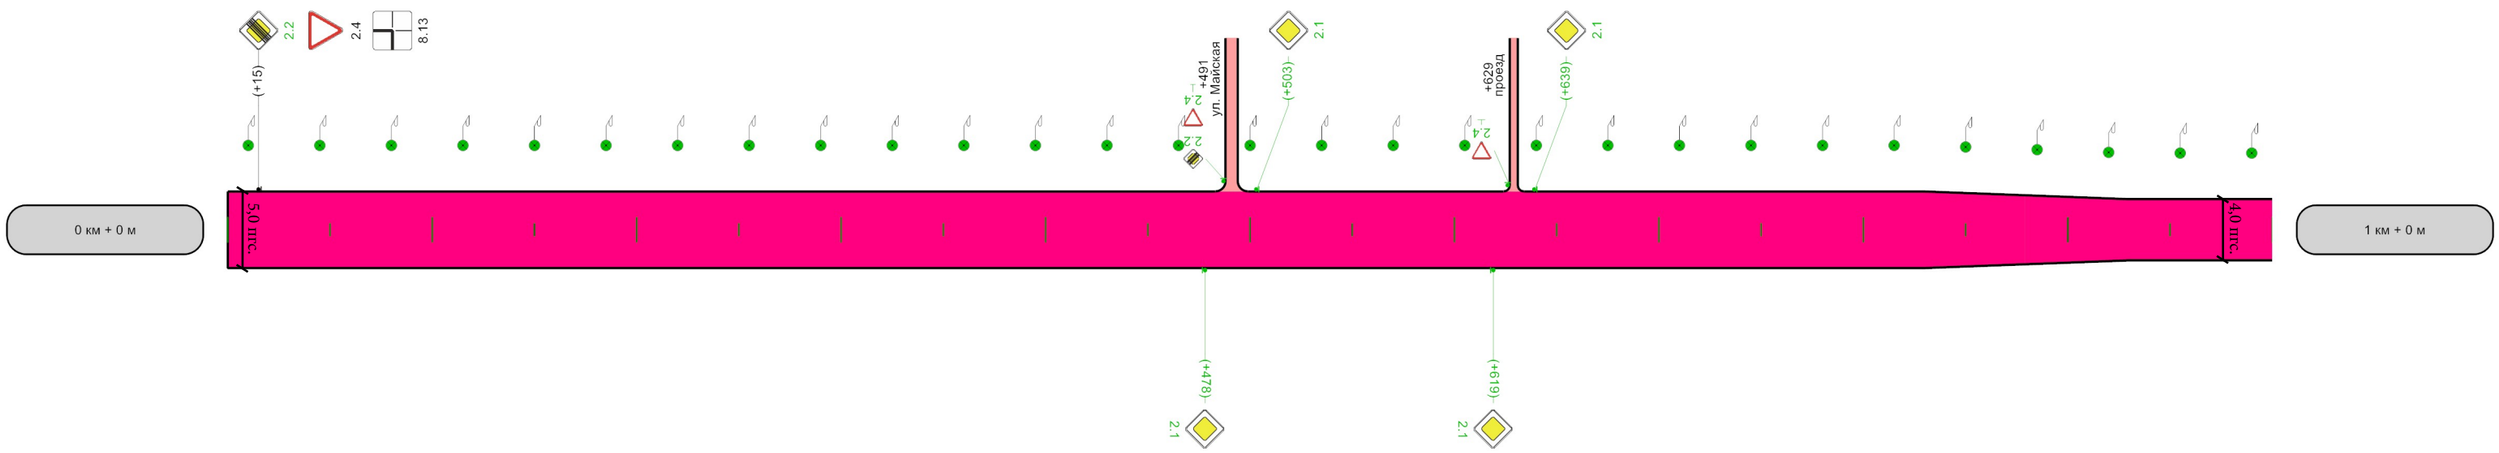

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	14 — R=3554м — 77 — 273 — 515 — R=2835м — 72
Кривые в плане	12 — 22 R=632м P=3; a=113° 85 — 148 R=1110м P=205; a=3° 207 — 226 R=608м P=88; a=4° 267 — R=685м P=18; a=22° 336 — 345 R=608м P=26; a=13° 392 — 475 — R=614м P=10; a=35° 544
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

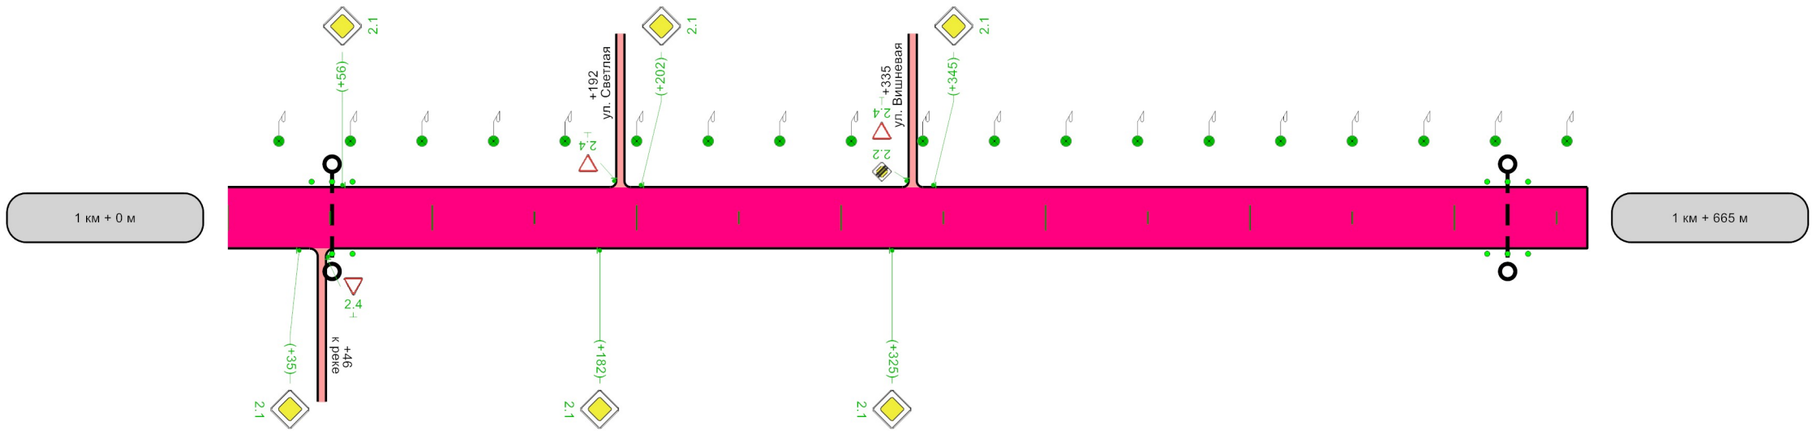

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+478	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+503	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+619	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+639	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			1+035	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			1+056	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			1+182	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			1+202	Требуется установить	1	слева
9	2.1	Главная дорога			1+325	Требуется установить	1	справа
10	2.1	Главная дорога			1+345	Требуется установить	1	слева
11	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**11**	
		Итого:					**12**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
13	8.13	Направление главной дороги			0+015	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**11**	
		Всего:					**13**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+041	1+061	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	1+051	1+061	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	1+616	1+636	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	1+616	1+636	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**70/11**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	1+655	Населенный пункт	48/48	1645	0	Слева
Итого:				**48/48**	**1645**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	59 58 95 19 R=4580м 179
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

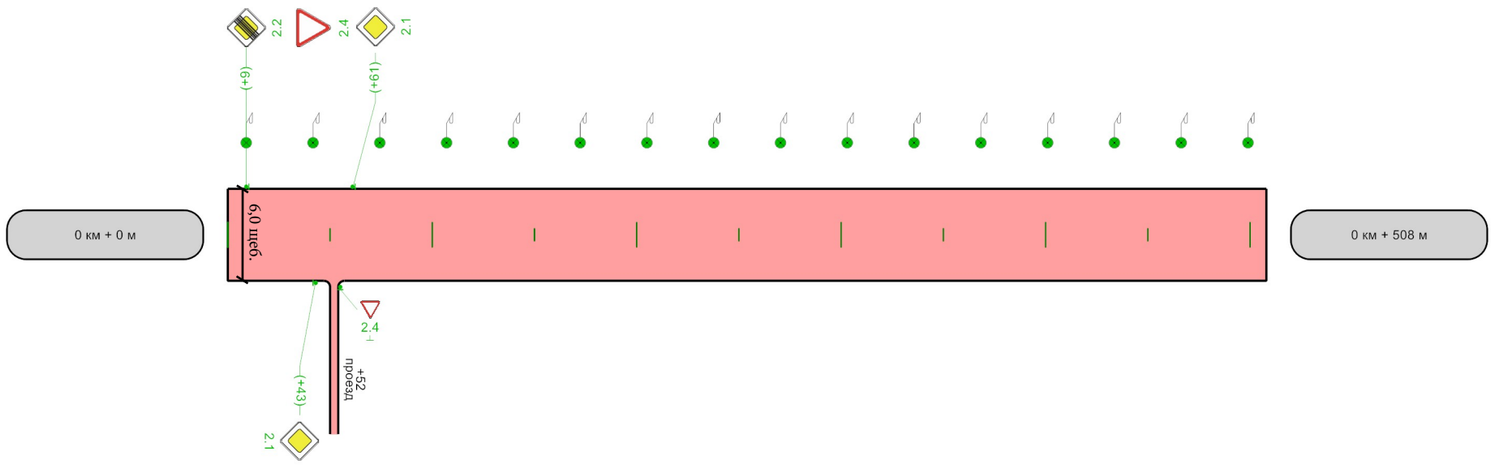

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+043	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+061	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+009	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+499	Населенный пункт	16/16	490	0	Слева
Итого:				**16/16**	**490**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от ул. Майской до водозабора Слопешный


км 0+000 - км 6+208

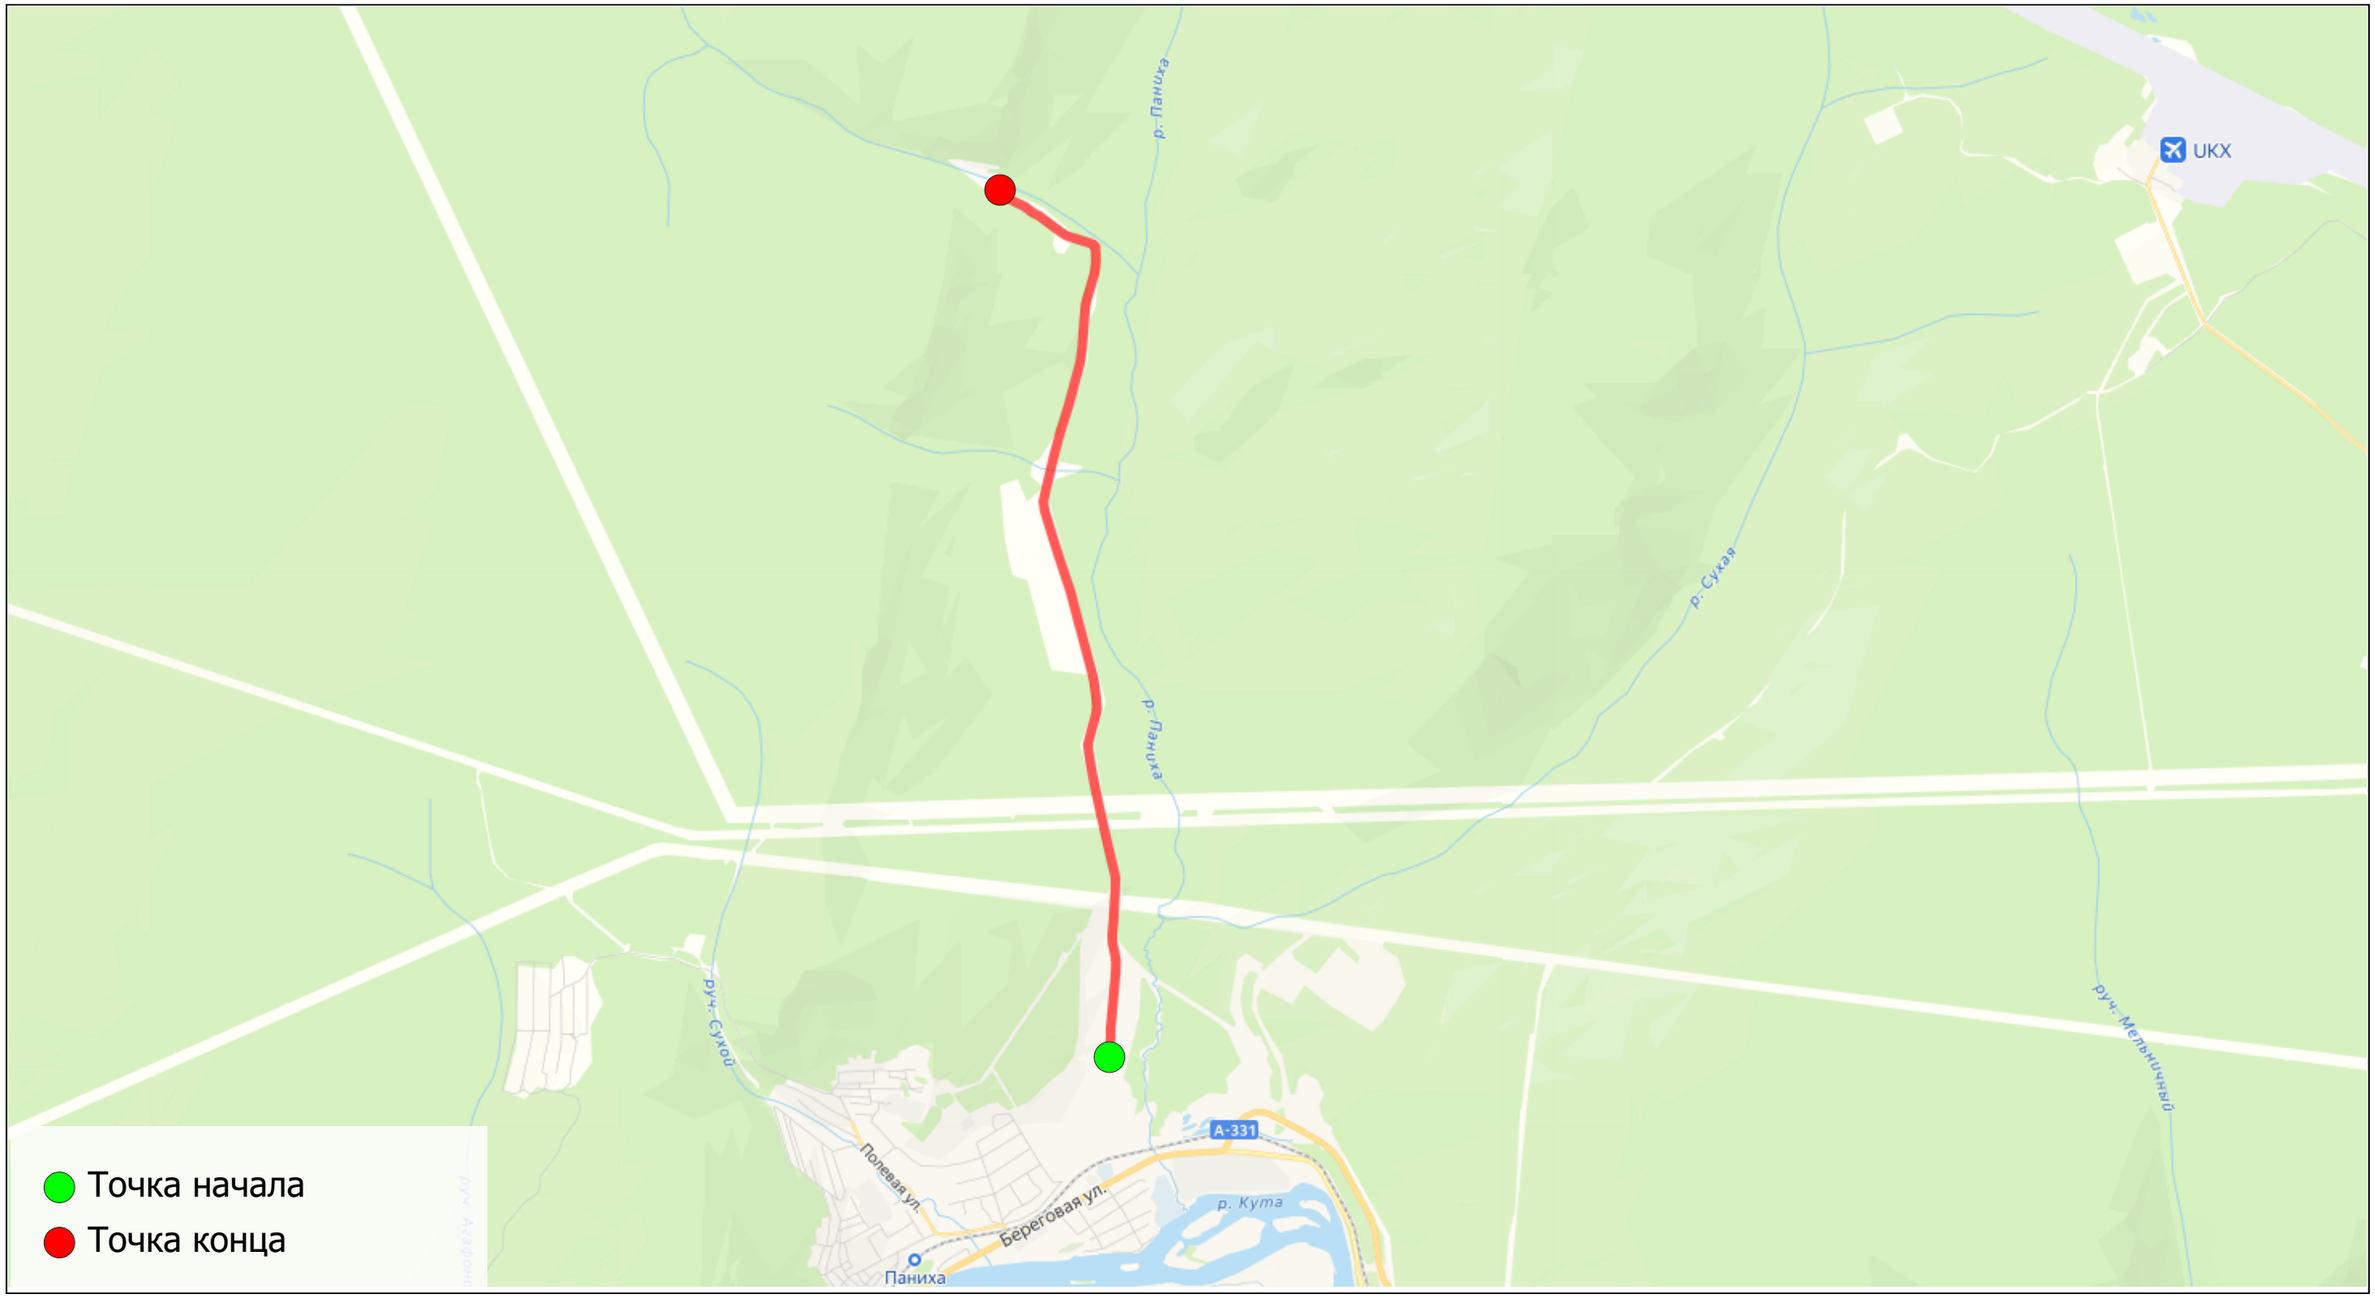

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Тер., Пластмасса, 966 - 1080
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 59 5 R=11833м 225 9 500 1 R=4628м 678 37 713 37 R=7995м
Кривые в плане	549 R=610м P=27; a=13° 685 716 R=602м P=38; a=9° 796
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

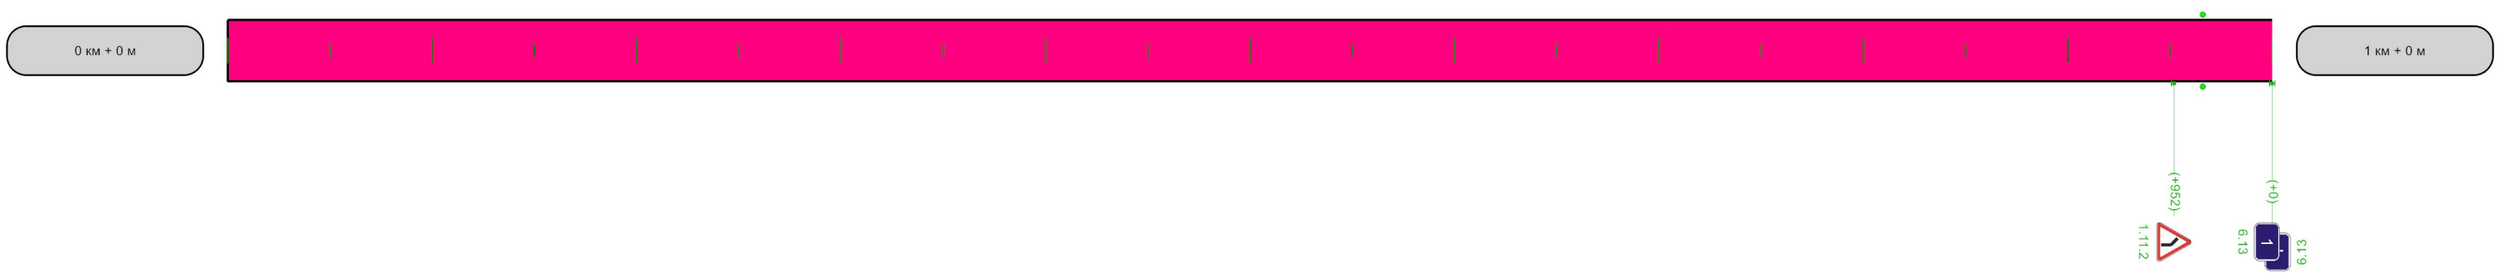


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Тер., Пластмасса, 966 - 1080
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	2тр., Пластмасса, 0 - 66 / 2тр., Пластмасса, 116 - 166 / 3тр., Пластмасса, 206 - 306 / 3тр., Пластмасса, 858 - 958
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	37 0 7 1 102 R=7385м 35 353 35 387 R=7142м 16 526 26 97 R=2755м
Кривые в плане	102 R=535м P=37; a=8° 179
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

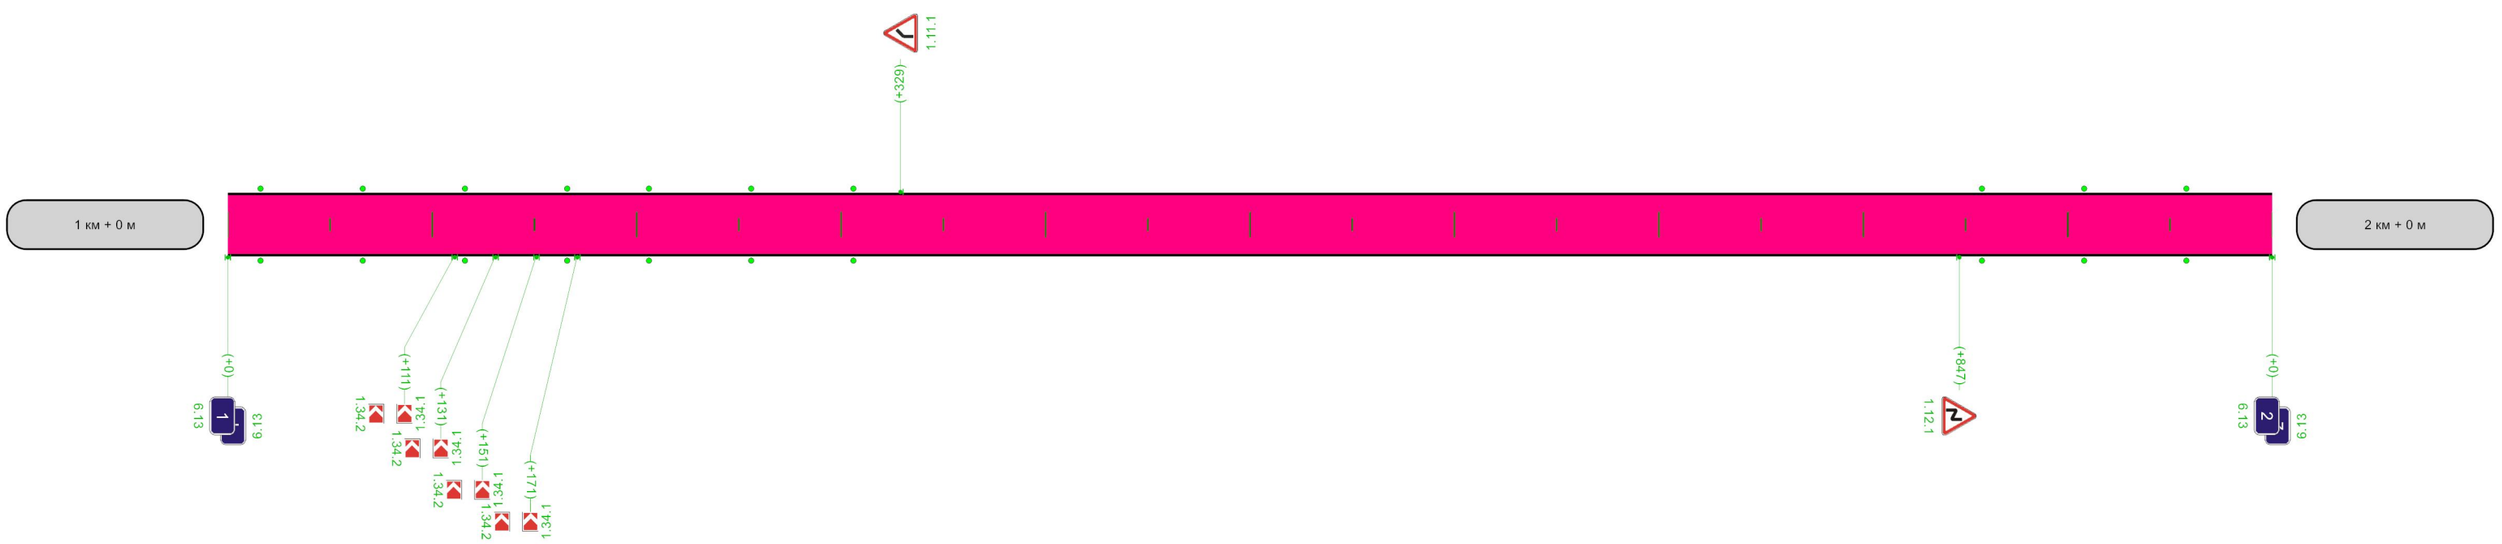


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	2тр., Пластмасса, 0 - 66 / 2тр., Пластмасса, 116 - 166 / 3тр., Пластмасса, 206 - 306 / 3тр., Пластмасса, 858 - 958
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	5тр., Пластмасса, 8 - 108 / 4тр., Пластмасса, 220 - 370 / 3тр., Пластмасса, 420 - 520
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	26 · R=2755м · 158 · 42 · 201 · 42 · R=5772м · 552 · 19 · 706 · 11 · R=8538м · 840 · 27 · 875 · 27 · R=7845м
Кривые в плане	R=293м P=7; a=24° · 119 · 216 · R=355м P=8; a=25° · 373 · 467 · R=637м P=55; a=7° · 541
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

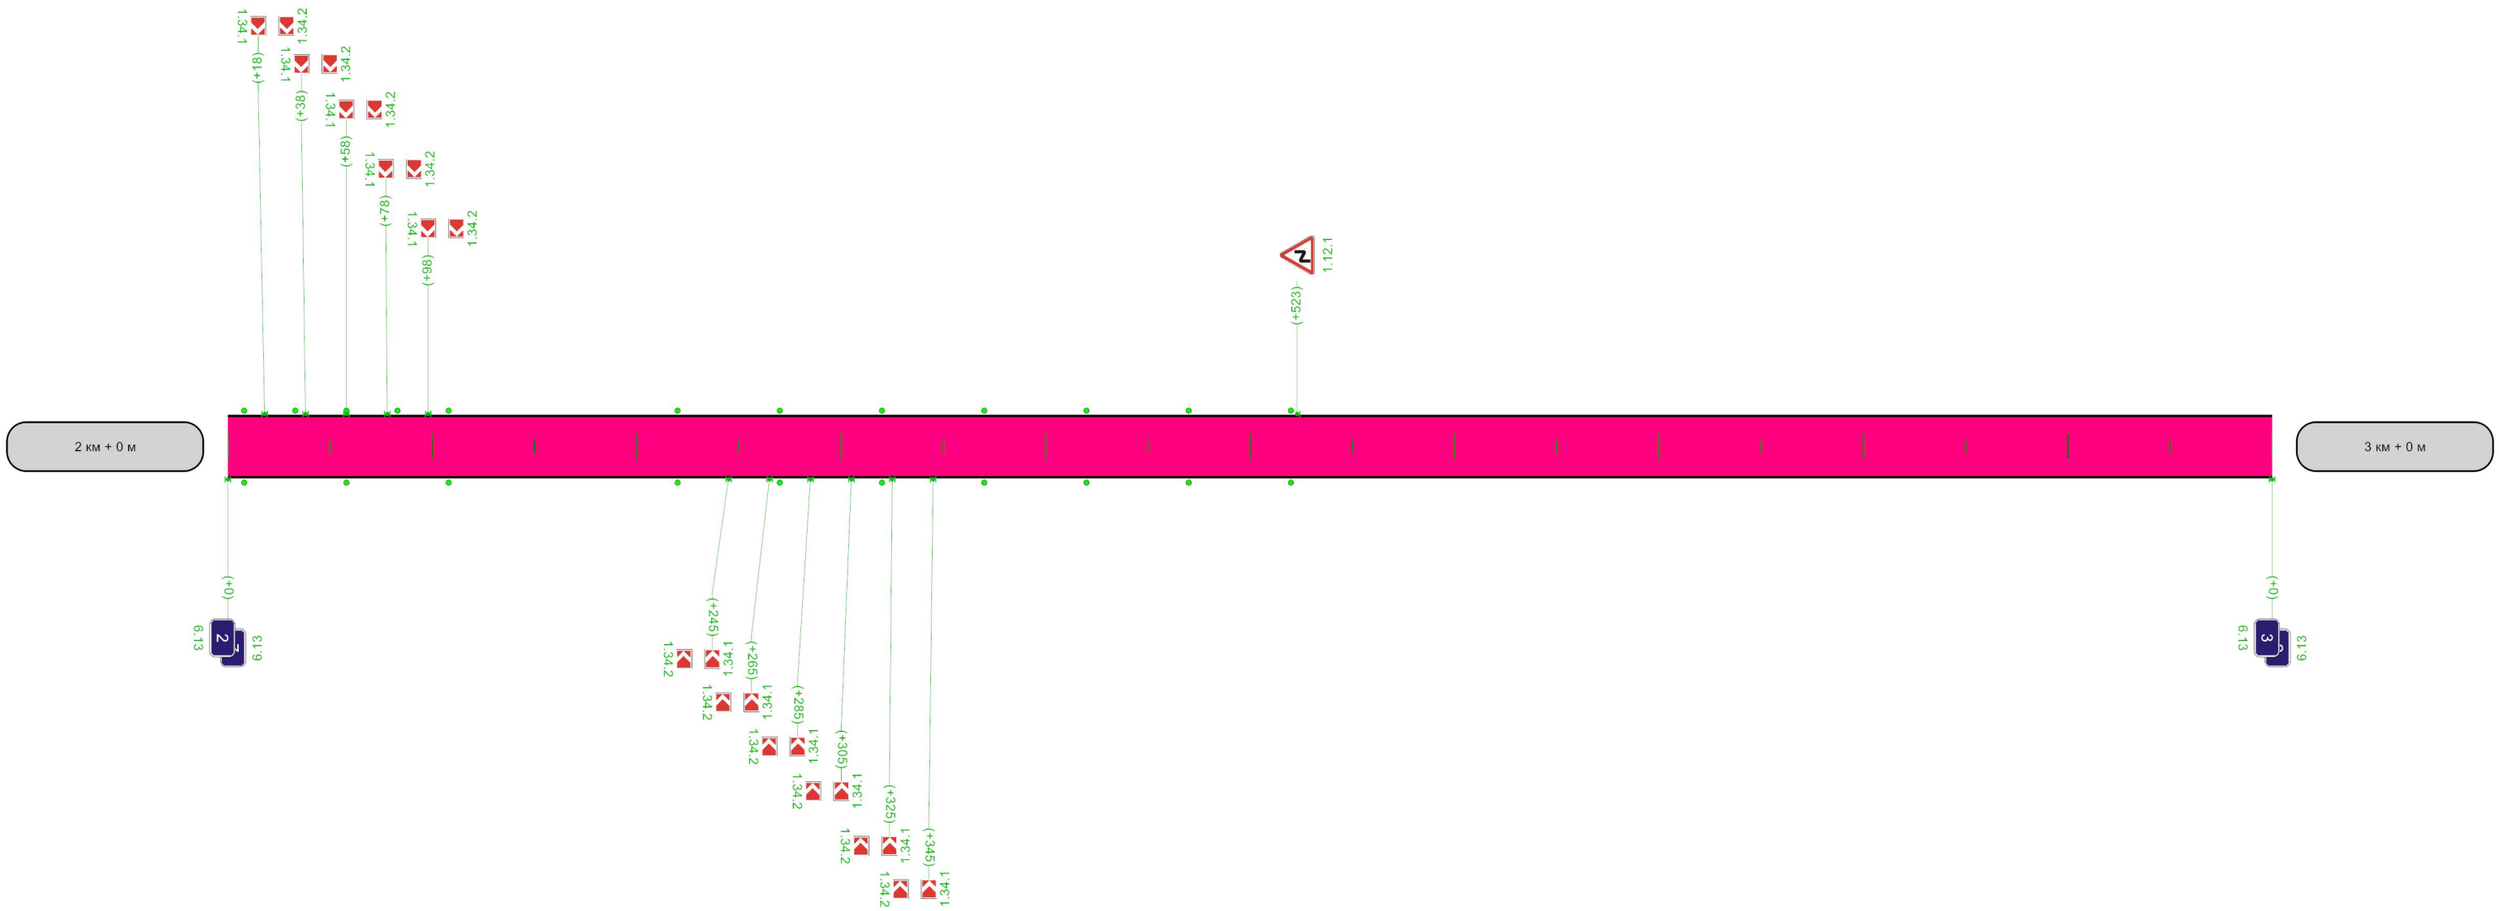


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	3тр., Пластмасса, 8 - 108 / 4тр., Пластмасса, 220 - 370 / 3тр., Пластмасса, 420 - 520
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3тр., Пластмасса, 476 - 576 / 3тр., Пластмасса, 626 - 726 / 3тр., Пластмасса, 800 - 900
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	27 R=7845м 190 13 224 13 R=5380м 328 6 479 2 R=2636м 626 54 659 53 R=2387м 839 22 879 22 R=4256м
Кривые в плане	602 R=381м P=7, a=32° 750
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

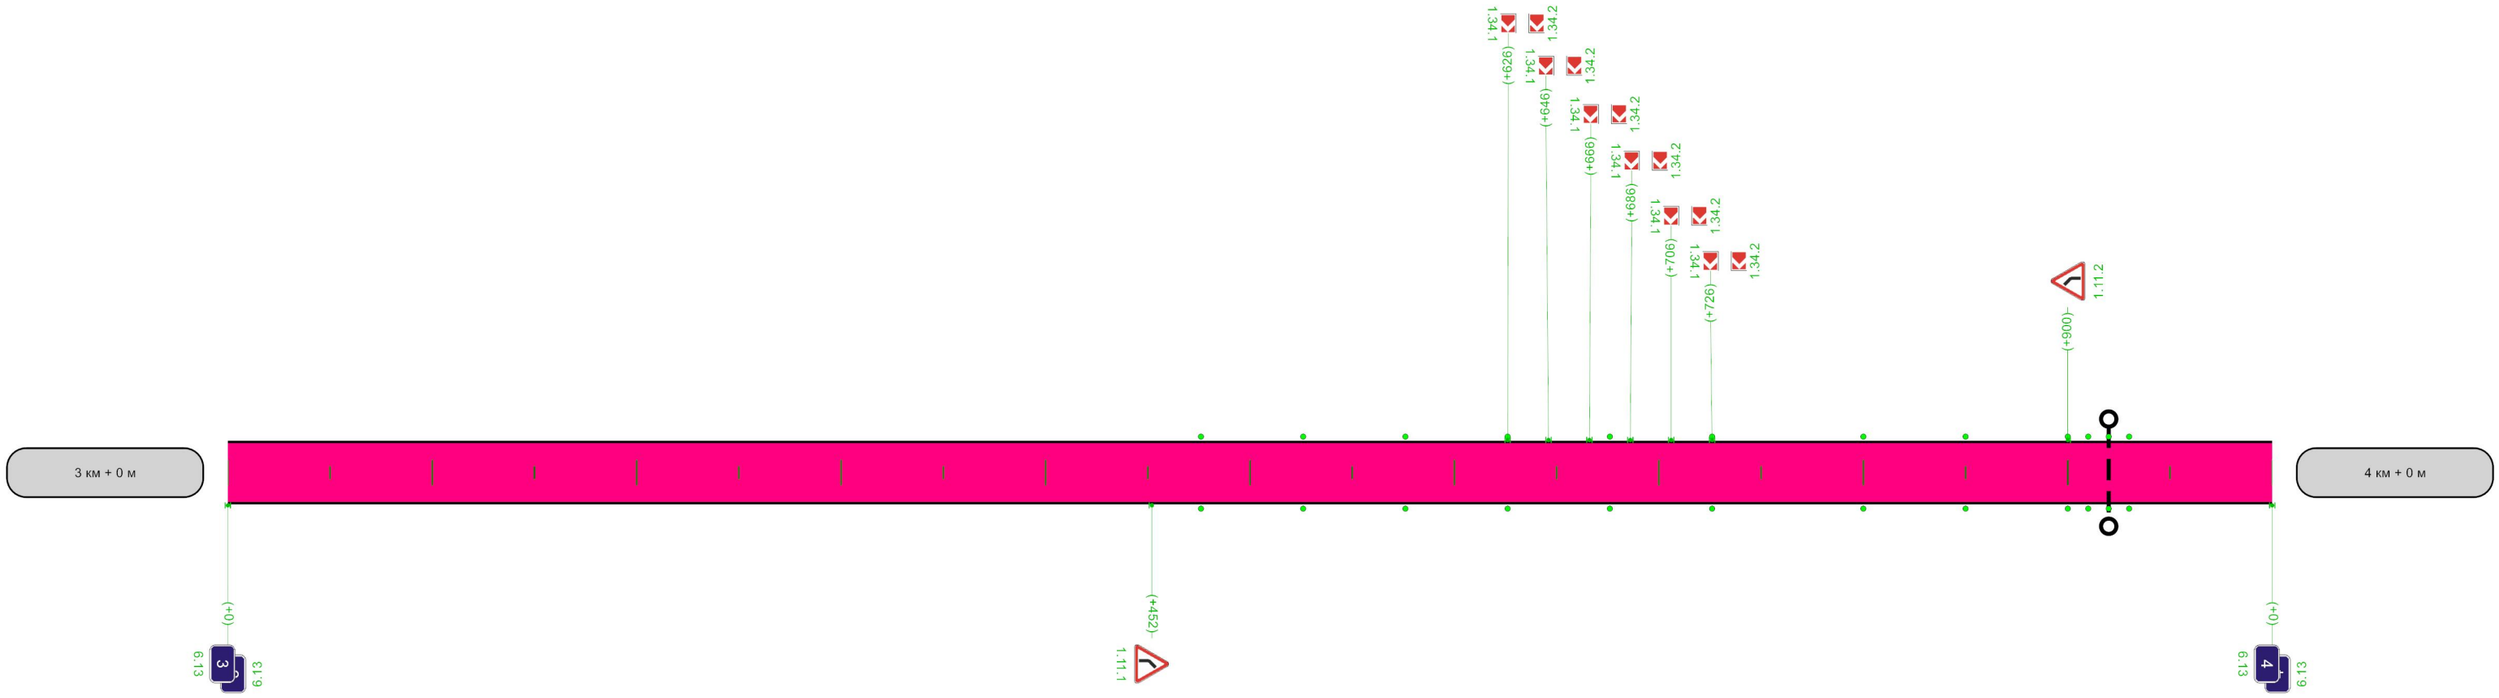


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	3тр., Пластмасса, 476 - 576 / 3тр., Пластмасса, 626 - 726 / 3тр., Пластмасса, 800 - 900
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	22 R=4256м 31 104 31 141 R=9374м 5 382 2 503 R=8062м 35 765 35 799 R=6397м
Кривые в плане	605 R=678м P=46; a=8° 675 R=1055м 967 P=70; a=9°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

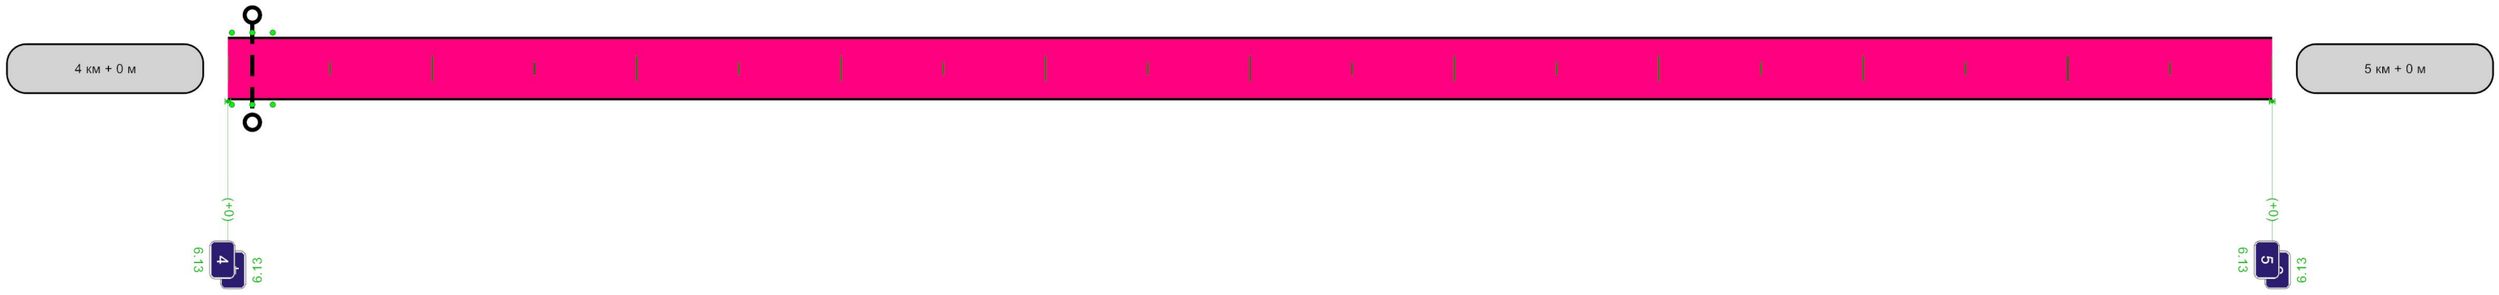


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от ул. Майской до водозабора Слопешный


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	3тр., Пластмасса, 209 - 309 · 5тр., Пластмасса, 390 - 470 · 1тр., Пластмасса, 622 - 672 · 2тр., Пластмасса, 794 - 844 · 4тр., Пластмасса, 871 - 916 · 2тр., Пластмасса, 926 - 976
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	35 · R=6397м · 14 · 109 · 8 · 208 · R=5606м · 43 · 496 · 43 · 535 · R=4465м · 17 · 652 · 18 · 692 · R=8286м · 34 · 824 · 19 · 966 · R=4396м
Кривые в плане	R=1055м P=70; a=9° · 126 · 201 · R=411м P=15; a=16° · 317 · 387 · R=70м P=1; a=69° · 472 · 592 · R=236м P=7; a=20° · 676 · 772 · R=455м P=22; a=12° · 866 · R=188м P=7; a=16° · 920 · R=269м P=12; a=13° · 982
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

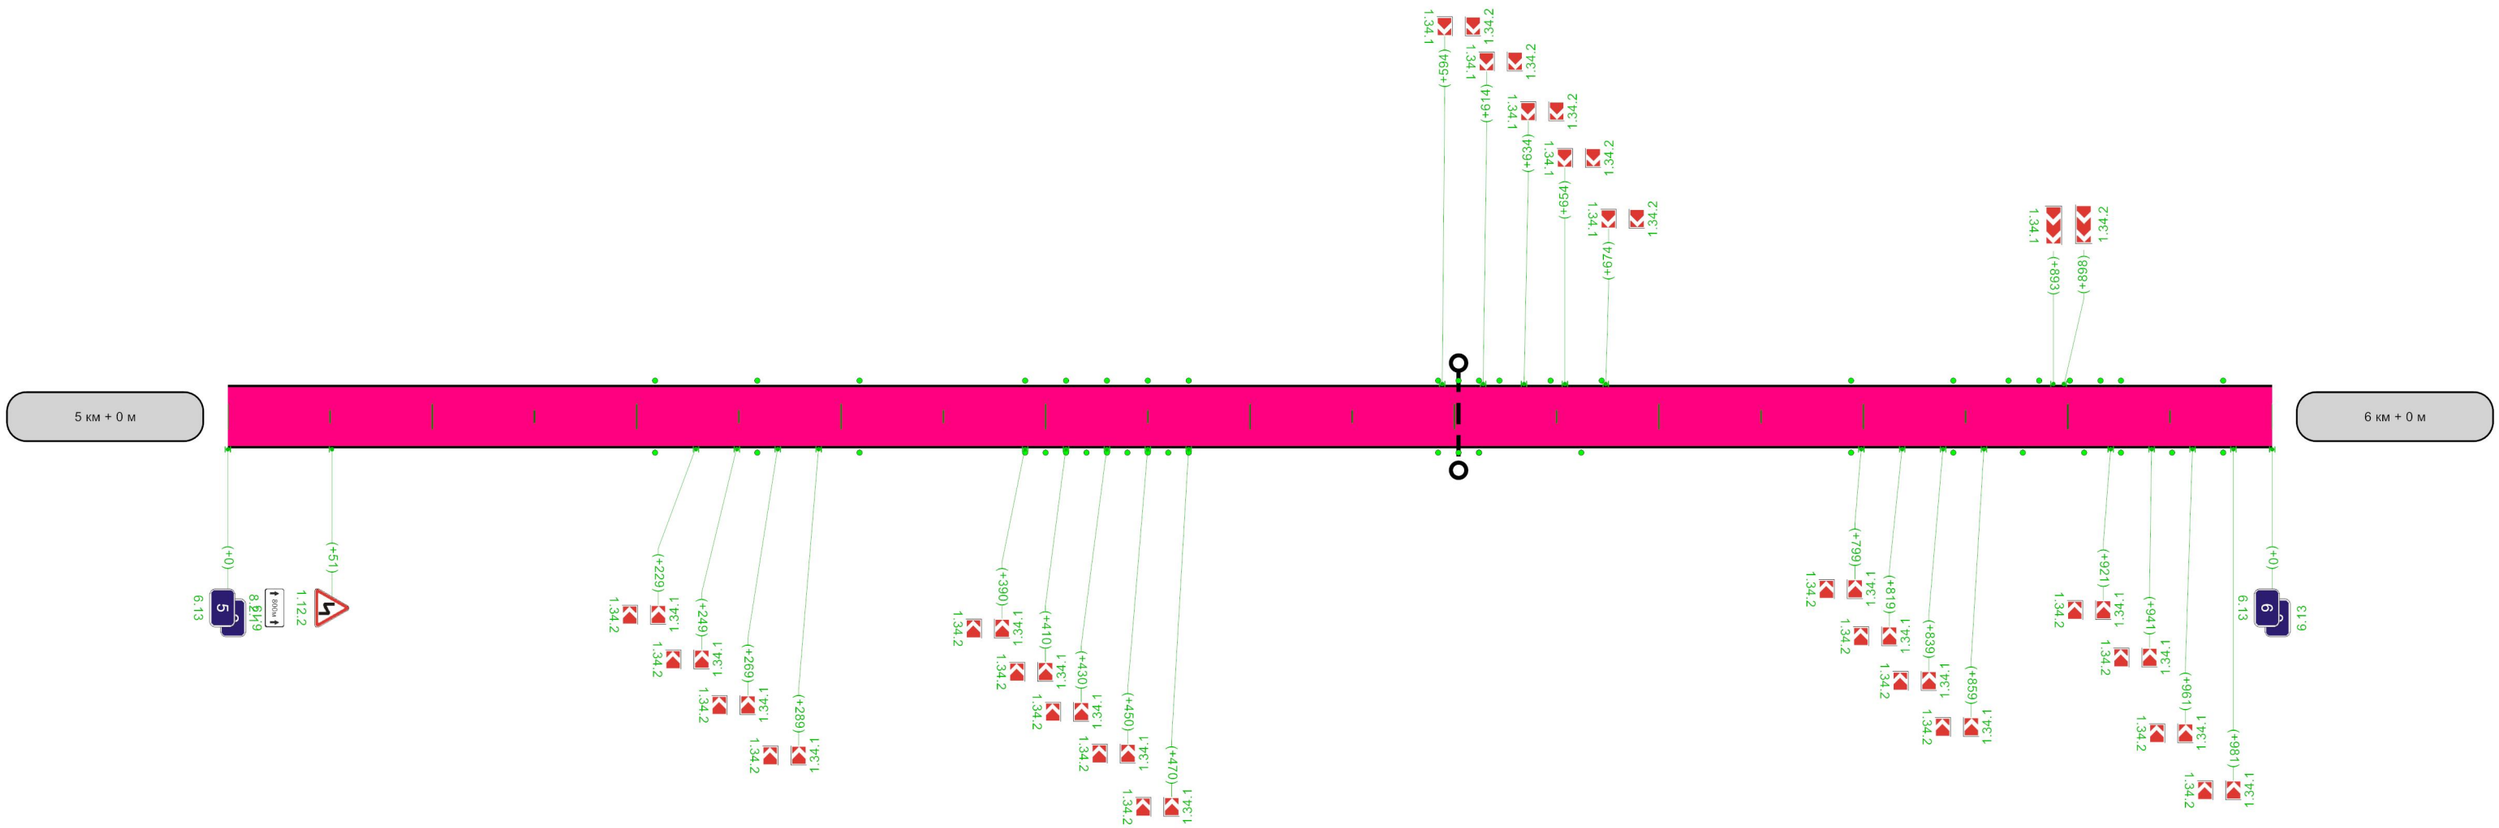

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	3тр., Пластмасса, 209 - 309 · 9тр., Пластмасса, 390 - 470 · 2тр., Пластмасса, 612 - 662 · 2тр., Пластмасса, 794 - 844 · 3тр., Пластмасса, 926 - 976
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	Зтр., Пластмасса, 26 - 126
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19 R=4396м 127 56
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

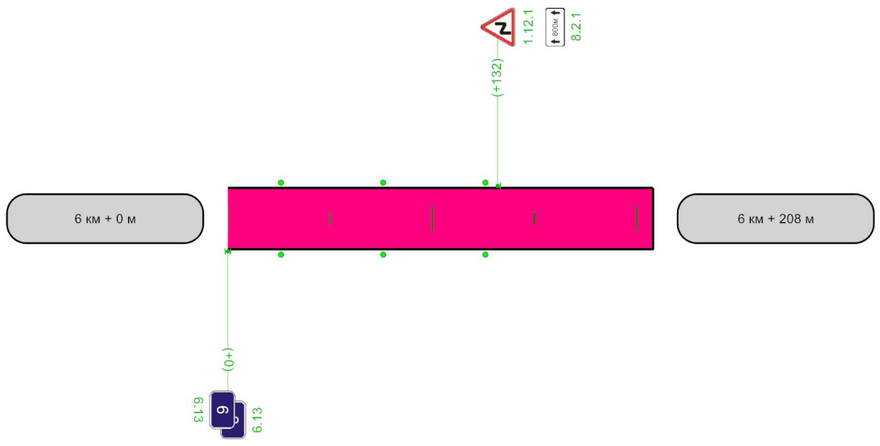

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Зтр., Пластмасса, 26 - 126
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			1+329	Требуется установить	1	слева
2	1.11.1	Опасный поворот			3+452	Требуется установить	1	справа
3	1.11.2	Опасный поворот			0+952	Требуется установить	1	справа
4	1.11.2	Опасный поворот			3+900	Требуется установить	1	слева
5	1.12.1	Опасные повороты			1+847	Требуется установить	1	справа
6	1.12.1	Опасные повороты			2+523	Требуется установить	1	слева
7	1.12.1	Опасные повороты			6+132	Требуется установить	1	слева
8	1.12.2	Опасные повороты			5+051	Требуется установить	1	справа
9	1.34.1	Направление поворота			1+111	Требуется установить	1	справа
10	1.34.1	Направление поворота			1+131	Требуется установить	1	справа
11	1.34.1	Направление поворота			1+151	Требуется установить	1	справа
12	1.34.1	Направление поворота			1+171	Требуется установить	1	справа
13	1.34.1	Направление поворота			2+018	Требуется установить	1	слева
14	1.34.1	Направление поворота			2+038	Требуется установить	1	слева
15	1.34.1	Направление поворота			2+058	Требуется установить	1	слева
16	1.34.1	Направление поворота			2+078	Требуется установить	1	слева
17	1.34.1	Направление поворота			2+098	Требуется установить	1	слева
18	1.34.1	Направление поворота			2+245	Требуется установить	1	справа
19	1.34.1	Направление поворота			2+265	Требуется установить	1	справа
20	1.34.1	Направление поворота			2+285	Требуется установить	1	справа
21	1.34.1	Направление поворота			2+305	Требуется установить	1	справа
22	1.34.1	Направление поворота			2+325	Требуется установить	1	справа
23	1.34.1	Направление поворота			2+345	Требуется установить	1	справа
24	1.34.1	Направление поворота			3+626	Требуется установить	1	слева
25	1.34.1	Направление поворота			3+646	Требуется установить	1	слева
26	1.34.1	Направление поворота			3+666	Требуется установить	1	слева
27	1.34.1	Направление поворота			3+686	Требуется установить	1	слева
28	1.34.1	Направление поворота			3+706	Требуется установить	1	слева
29	1.34.1	Направление поворота			3+726	Требуется установить	1	слева
30	1.34.1	Направление поворота			5+229	Требуется установить	1	справа
31	1.34.1	Направление поворота			5+249	Требуется установить	1	справа
32	1.34.1	Направление поворота			5+269	Требуется установить	1	справа
33	1.34.1	Направление поворота			5+289	Требуется установить	1	справа
34	1.34.1	Направление поворота			5+390	Требуется установить	1	справа
35	1.34.1	Направление поворота			5+410	Требуется установить	1	справа
36	1.34.1	Направление поворота			5+430	Требуется установить	1	справа
37	1.34.1	Направление поворота			5+450	Требуется установить	1	справа
38	1.34.1	Направление поворота			5+470	Требуется установить	1	справа
39	1.34.1	Направление поворота			5+594	Требуется установить	1	слева
40	1.34.1	Направление поворота			5+614	Требуется установить	1	слева
41	1.34.1	Направление поворота			5+634	Требуется установить	1	слева
42	1.34.1	Направление поворота			5+654	Требуется установить	1	слева
43	1.34.1	Направление поворота			5+674	Требуется установить	1	слева
44	1.34.1	Направление поворота			5+799	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	1.34.1	Направление поворота			5+819	Требуется установить	1	справа
46	1.34.1	Направление поворота			5+839	Требуется установить	1	справа
47	1.34.1	Направление поворота			5+859	Требуется установить	1	справа
48	1.34.1	Направление поворота			5+893	Требуется установить	1	слева
49	1.34.1	Направление поворота			5+921	Требуется установить	1	справа
50	1.34.1	Направление поворота			5+941	Требуется установить	1	справа
51	1.34.1	Направление поворота			5+961	Требуется установить	1	справа
52	1.34.1	Направление поворота			5+981	Требуется установить	1	справа
53	1.34.2	Направление поворота			1+111	Требуется установить	1	справа
54	1.34.2	Направление поворота			1+131	Требуется установить	1	справа
55	1.34.2	Направление поворота			1+151	Требуется установить	1	справа
56	1.34.2	Направление поворота			1+171	Требуется установить	1	справа
57	1.34.2	Направление поворота			2+018	Требуется установить	1	слева
58	1.34.2	Направление поворота			2+038	Требуется установить	1	слева
59	1.34.2	Направление поворота			2+058	Требуется установить	1	слева
60	1.34.2	Направление поворота			2+078	Требуется установить	1	слева
61	1.34.2	Направление поворота			2+098	Требуется установить	1	слева
62	1.34.2	Направление поворота			2+245	Требуется установить	1	справа
63	1.34.2	Направление поворота			2+265	Требуется установить	1	справа
64	1.34.2	Направление поворота			2+285	Требуется установить	1	справа
65	1.34.2	Направление поворота			2+305	Требуется установить	1	справа
66	1.34.2	Направление поворота			2+325	Требуется установить	1	справа
67	1.34.2	Направление поворота			2+345	Требуется установить	1	справа
68	1.34.2	Направление поворота			3+626	Требуется установить	1	слева
69	1.34.2	Направление поворота			3+646	Требуется установить	1	слева
70	1.34.2	Направление поворота			3+666	Требуется установить	1	слева
71	1.34.2	Направление поворота			3+686	Требуется установить	1	слева
72	1.34.2	Направление поворота			3+706	Требуется установить	1	слева
73	1.34.2	Направление поворота			3+726	Требуется установить	1	слева
74	1.34.2	Направление поворота			5+229	Требуется установить	1	справа
75	1.34.2	Направление поворота			5+249	Требуется установить	1	справа
76	1.34.2	Направление поворота			5+269	Требуется установить	1	справа
77	1.34.2	Направление поворота			5+289	Требуется установить	1	справа
78	1.34.2	Направление поворота			5+390	Требуется установить	1	справа
79	1.34.2	Направление поворота			5+410	Требуется установить	1	справа
80	1.34.2	Направление поворота			5+430	Требуется установить	1	справа
81	1.34.2	Направление поворота			5+450	Требуется установить	1	справа
82	1.34.2	Направление поворота			5+470	Требуется установить	1	справа
83	1.34.2	Направление поворота			5+594	Требуется установить	1	слева
84	1.34.2	Направление поворота			5+614	Требуется установить	1	слева
85	1.34.2	Направление поворота			5+634	Требуется установить	1	слева
86	1.34.2	Направление поворота			5+654	Требуется установить	1	слева
87	1.34.2	Направление поворота			5+674	Требуется установить	1	слева
88	1.34.2	Направление поворота			5+799	Требуется установить	1	справа
89	1.34.2	Направление поворота			5+819	Требуется установить	1	справа
90	1.34.2	Направление поворота			5+839	Требуется установить	1	справа
91	1.34.2	Направление поворота			5+859	Требуется установить	1	справа
92	1.34.2	Направление поворота			5+898	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	1.34.2	Направление поворота			5+921	Требуется установить	1	справа
94	1.34.2	Направление поворота			5+941	Требуется установить	1	справа
95	1.34.2	Направление поворота			5+961	Требуется установить	1	справа
96	1.34.2	Направление поворота			5+981	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**96**	
		Итого:					**96**	
		Информационные знаки						
97	6.13	Километровый знак			1+000	Требуется установить	1	справа
98	6.13	Километровый знак			1+000	Требуется установить	1	справа
99	6.13	Километровый знак			2+000	Требуется установить	2	справа
100	6.13	Километровый знак			3+000	Требуется установить	2	справа
101	6.13	Километровый знак			4+000	Требуется установить	2	справа
102	6.13	Километровый знак			5+000	Требуется установить	2	справа
103	6.13	Километровый знак			6+000	Требуется установить	2	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**12**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
104	8.2.1	Зона действия			5+051	Требуется установить	1	справа
105	8.2.1	Зона действия			6+132	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**110**	
		Всего:					**110**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+966	1+066	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
2	0+966	1+066	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
3	1+116	1+166	50/2		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
4	1+116	1+166	50/2		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
5	1+206	1+306	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
6	1+206	1+306	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
7	1+858	1+958	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
8	1+858	1+958	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
9	2+008	2+108	100/5		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
10	2+008	2+108	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
11	2+220	2+370	150/4		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
12	2+220	2+370	150/4		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
13	2+420	2+520	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
14	2+420	2+520	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
15	3+476	3+576	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
16	3+476	3+576	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
17	3+626	3+726	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
18	3+626	3+726	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
19	3+800	3+900	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
20	3+800	3+900	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
21	3+910	3+930	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
22	3+910	3+930	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
23	4+002	4+022	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
24	4+002	4+022	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
25	5+209	5+309	100/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
26	5+209	5+309	100/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
27	5+390	5+470	80/5		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
28	5+390	5+470	80/9		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
29	5+592	5+612	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
30	5+592	5+612	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
31	5+612	5+662	50/2		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
32	5+622	5+672	50/3		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
33	5+794	5+844	50/2		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
34	5+794	5+844	50/2		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
35	5+871	5+916	45/4		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
36	5+878	5+908	30/2		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
37	5+926	5+976	50/2		Слева	Пластмасса	Кривая в плане
38	5+926	5+976	50/3		Справа	Пластмасса	Кривая в плане
39	6+026	6+126	100/3		Слева	Пластмасса	Подход к кривой
40	6+026	6+126	100/3		Справа	Пластмасса	Подход к кривой
Итого:			**3055/126**				


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от д.2 по ул. Кравченко до пересечения с ул. Зимней, вблизи д. 10
км 0+000 - км 0+252



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	54 2 R=5066м 239 8
Кривые в плане	R=621м 26 P=5; a=69° 220 R=692м P=20; a=20°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,20

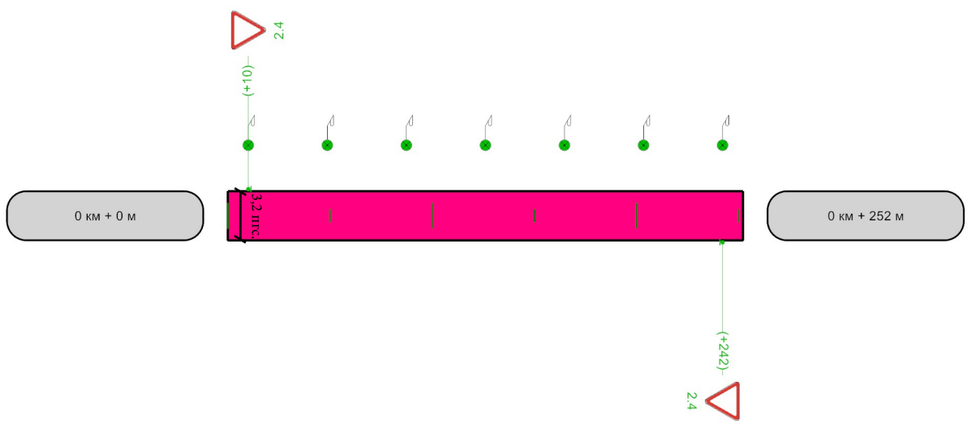

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+242	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+242	Населенный пункт	7/7	232	0	Слева
Итого:				**7/7**	**232**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от дома №128 по ул. Кировадо до пересечения с автодорогой по ул. Реброва-Денисова
км 0+000 - км 0+138

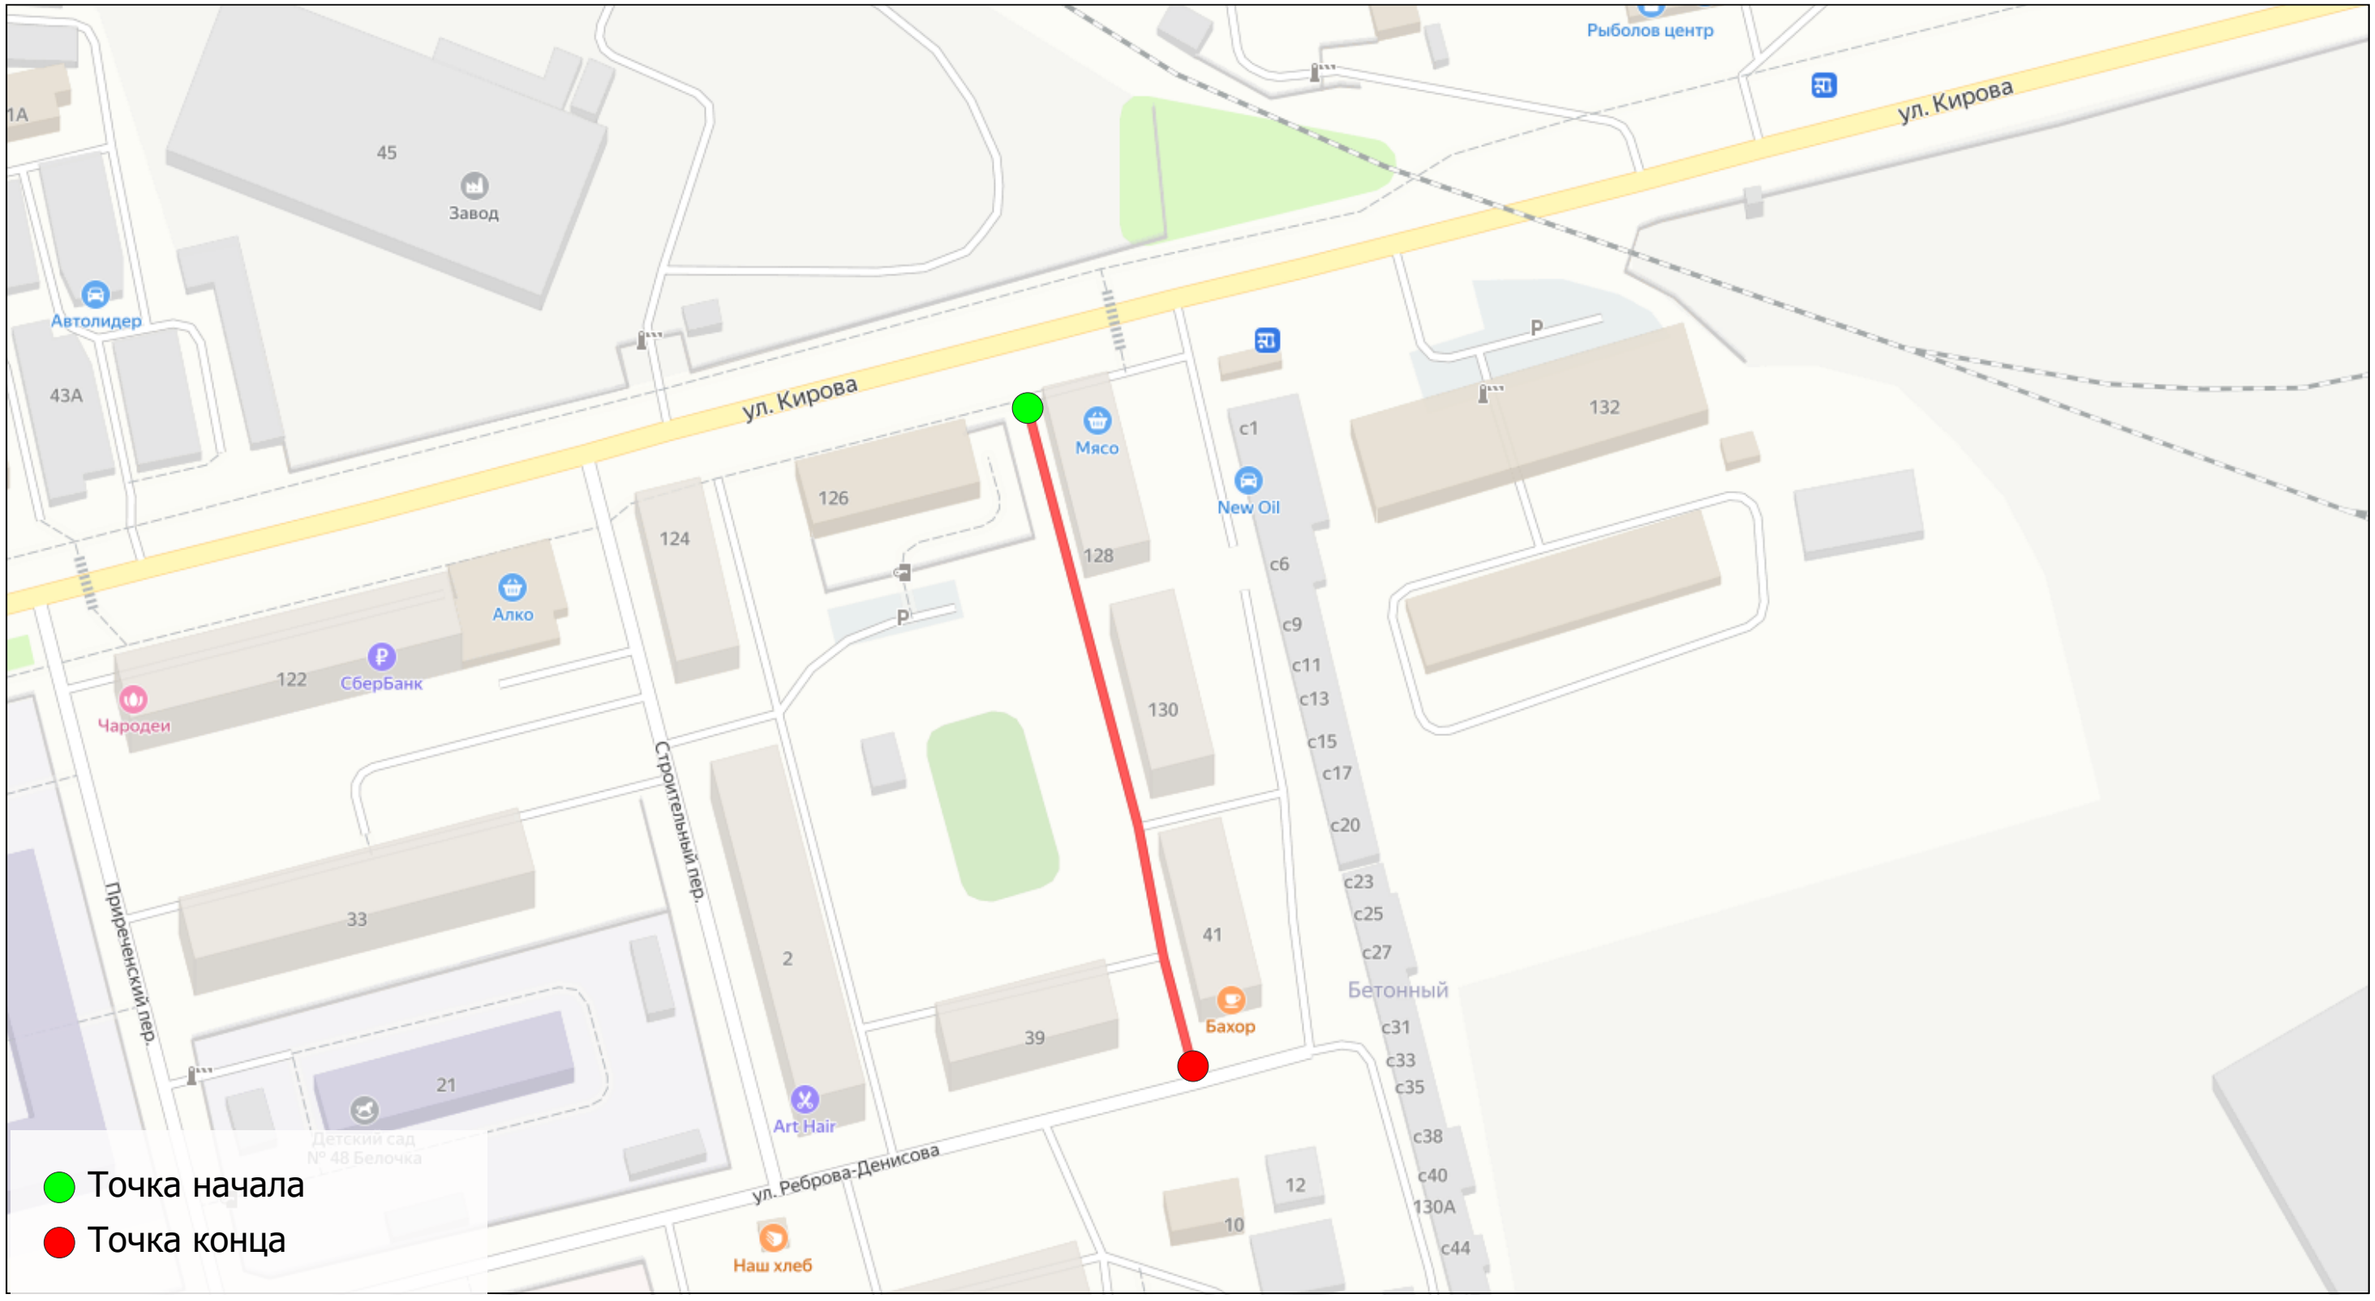

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	16 16 7 R=10479м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

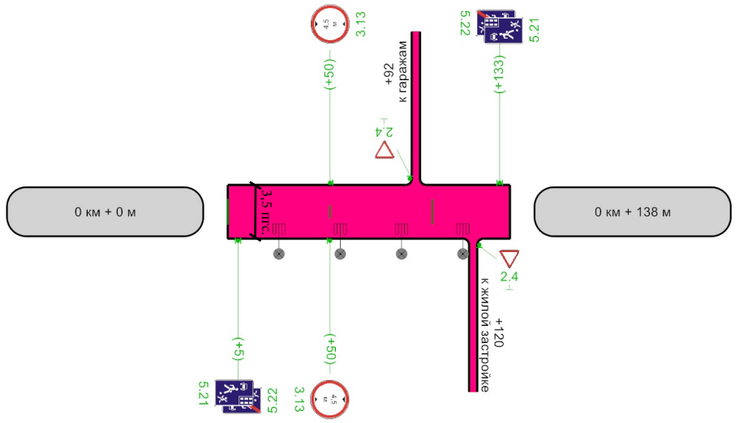

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
1	3.13	Ограничение высоты			0+050	Требуется установить	1	слева
2	3.13	Ограничение высоты			0+050	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
3	5.21	Жилая зона			0+005	Требуется установить	1	справа
4	5.21	Жилая зона			0+133	Требуется установить	1	слева
5	5.22	Конец жилой зоны			0+005	Требуется установить	1	справа
6	5.22	Конец жилой зоны			0+133	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+115	Населенный пункт	4/8	0	90	Справа
Итого:				**4/8**	**0**	**90**	


Автомобильная дорога общего пользования внутрихозяйственного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Старое»
км 0+000 - км 0+489

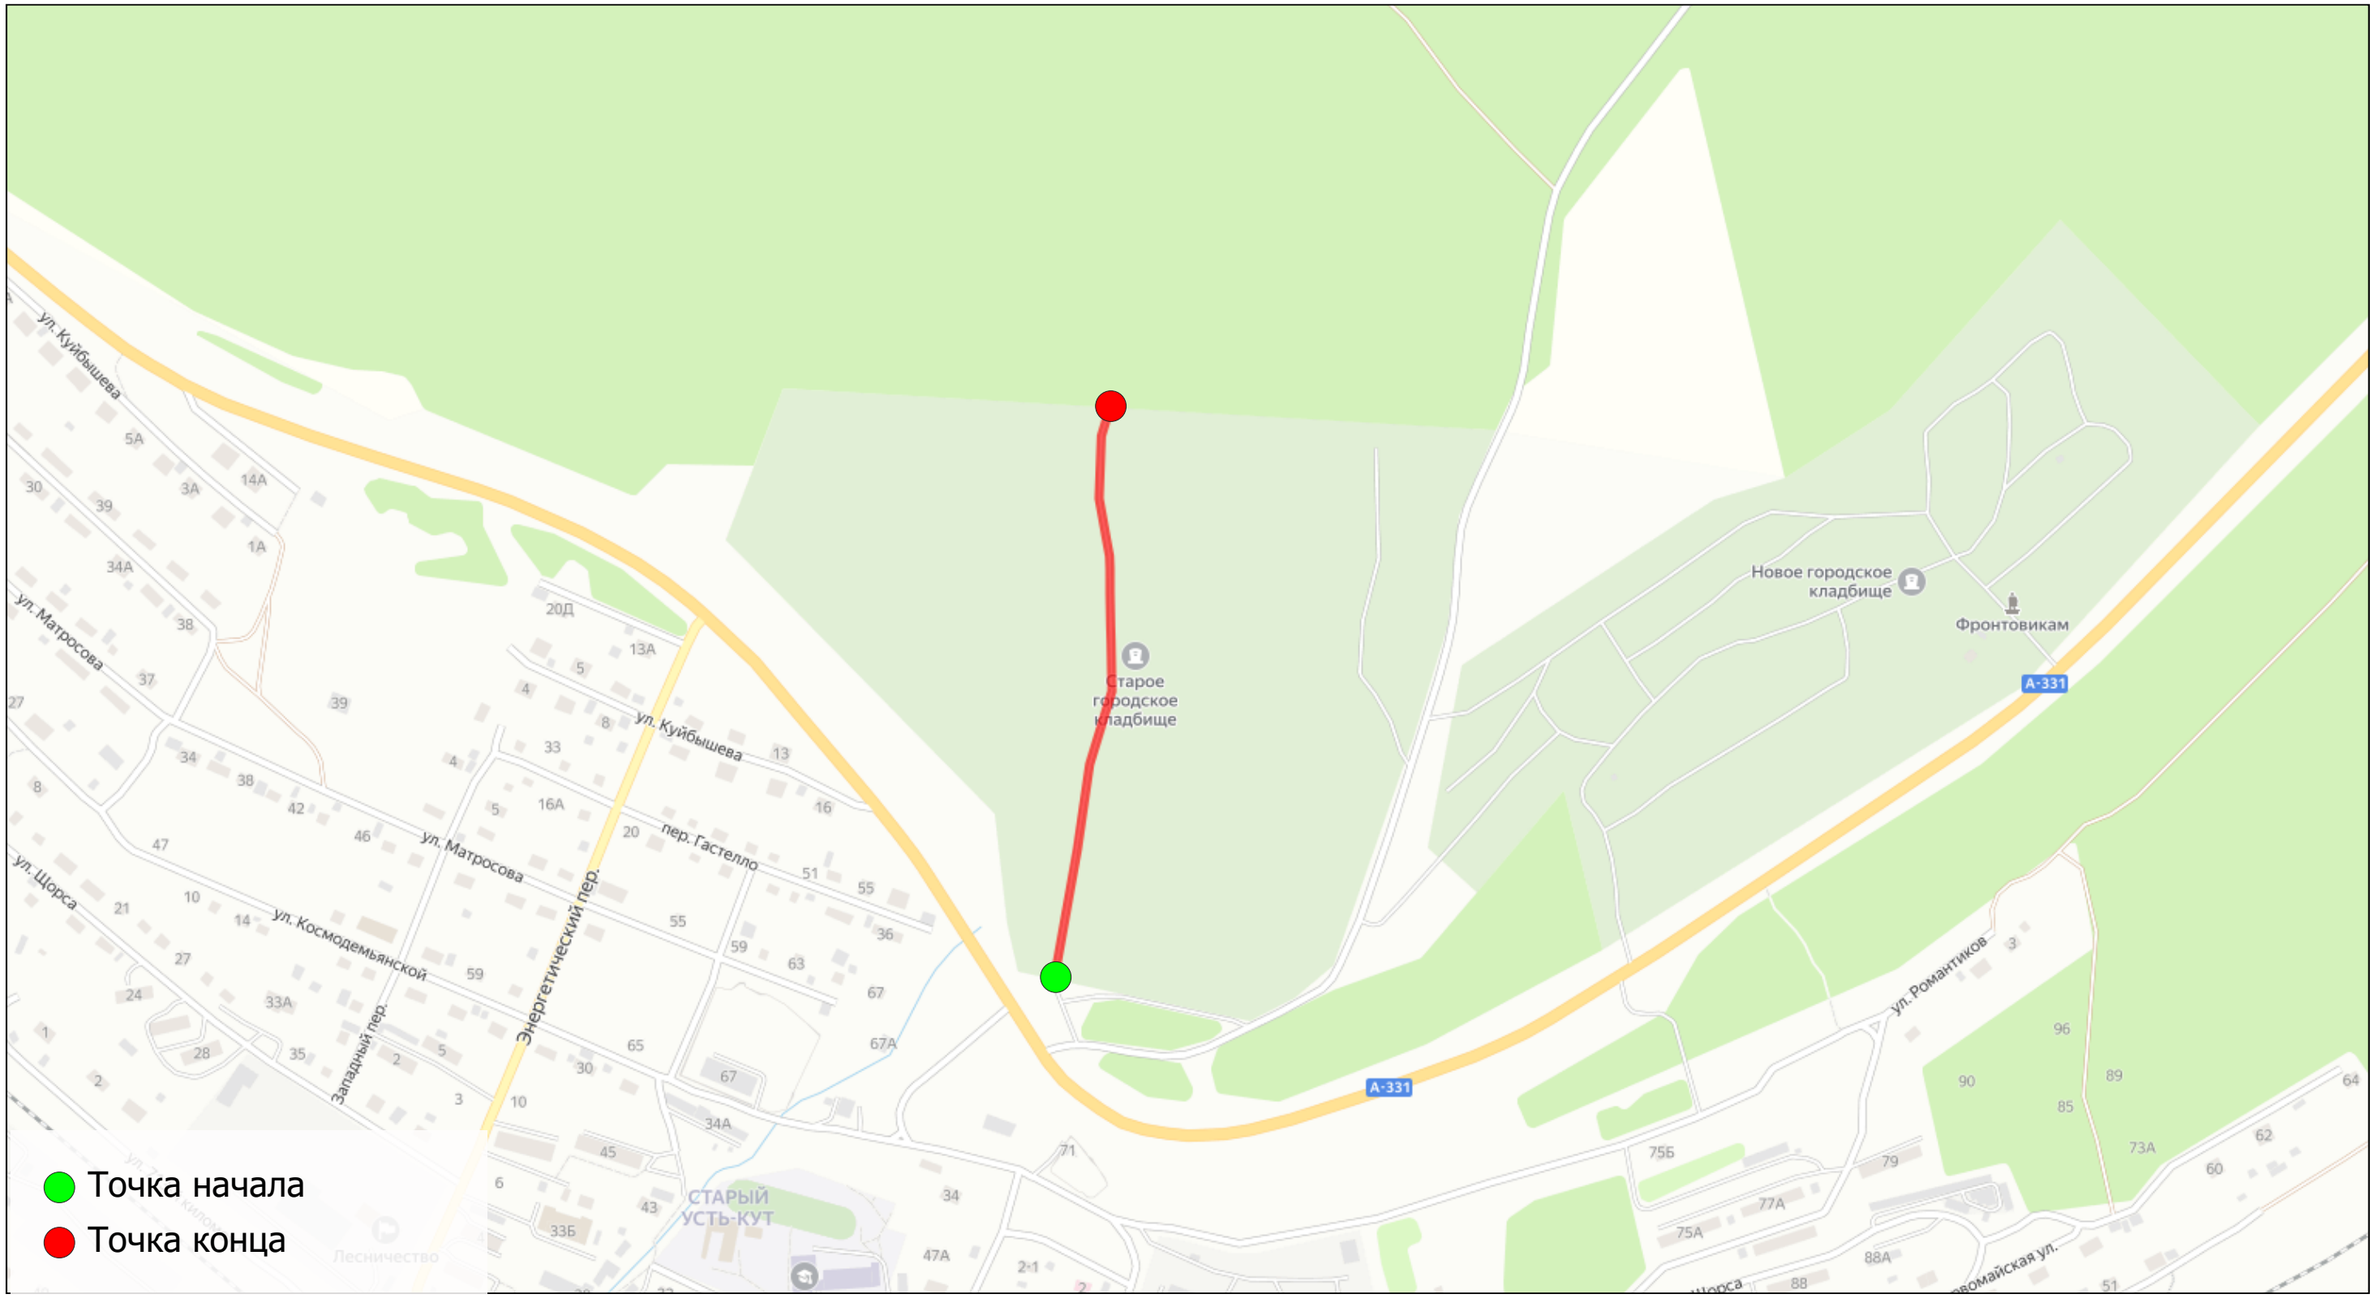

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	46 / 37 / 43 / R=1449м / 176 / 140 / 291 / 118 / R=2126м
Кривые в плане	225 / R=695м P=24; а=17° / 282 / 345 / R=664м P=50; а=8° / R=681м / 380 / 400 / 410 / R=650м P=23; а=16° / 480
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 / 3,20 / 200 / 3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+479	Населенный пункт	14/14	469	0	Слева
Итого:				**14/14**	**469**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Старое»

1-й участок: км 0+000 - км 0+762
2-й участок: км 0+000 - км 0+286

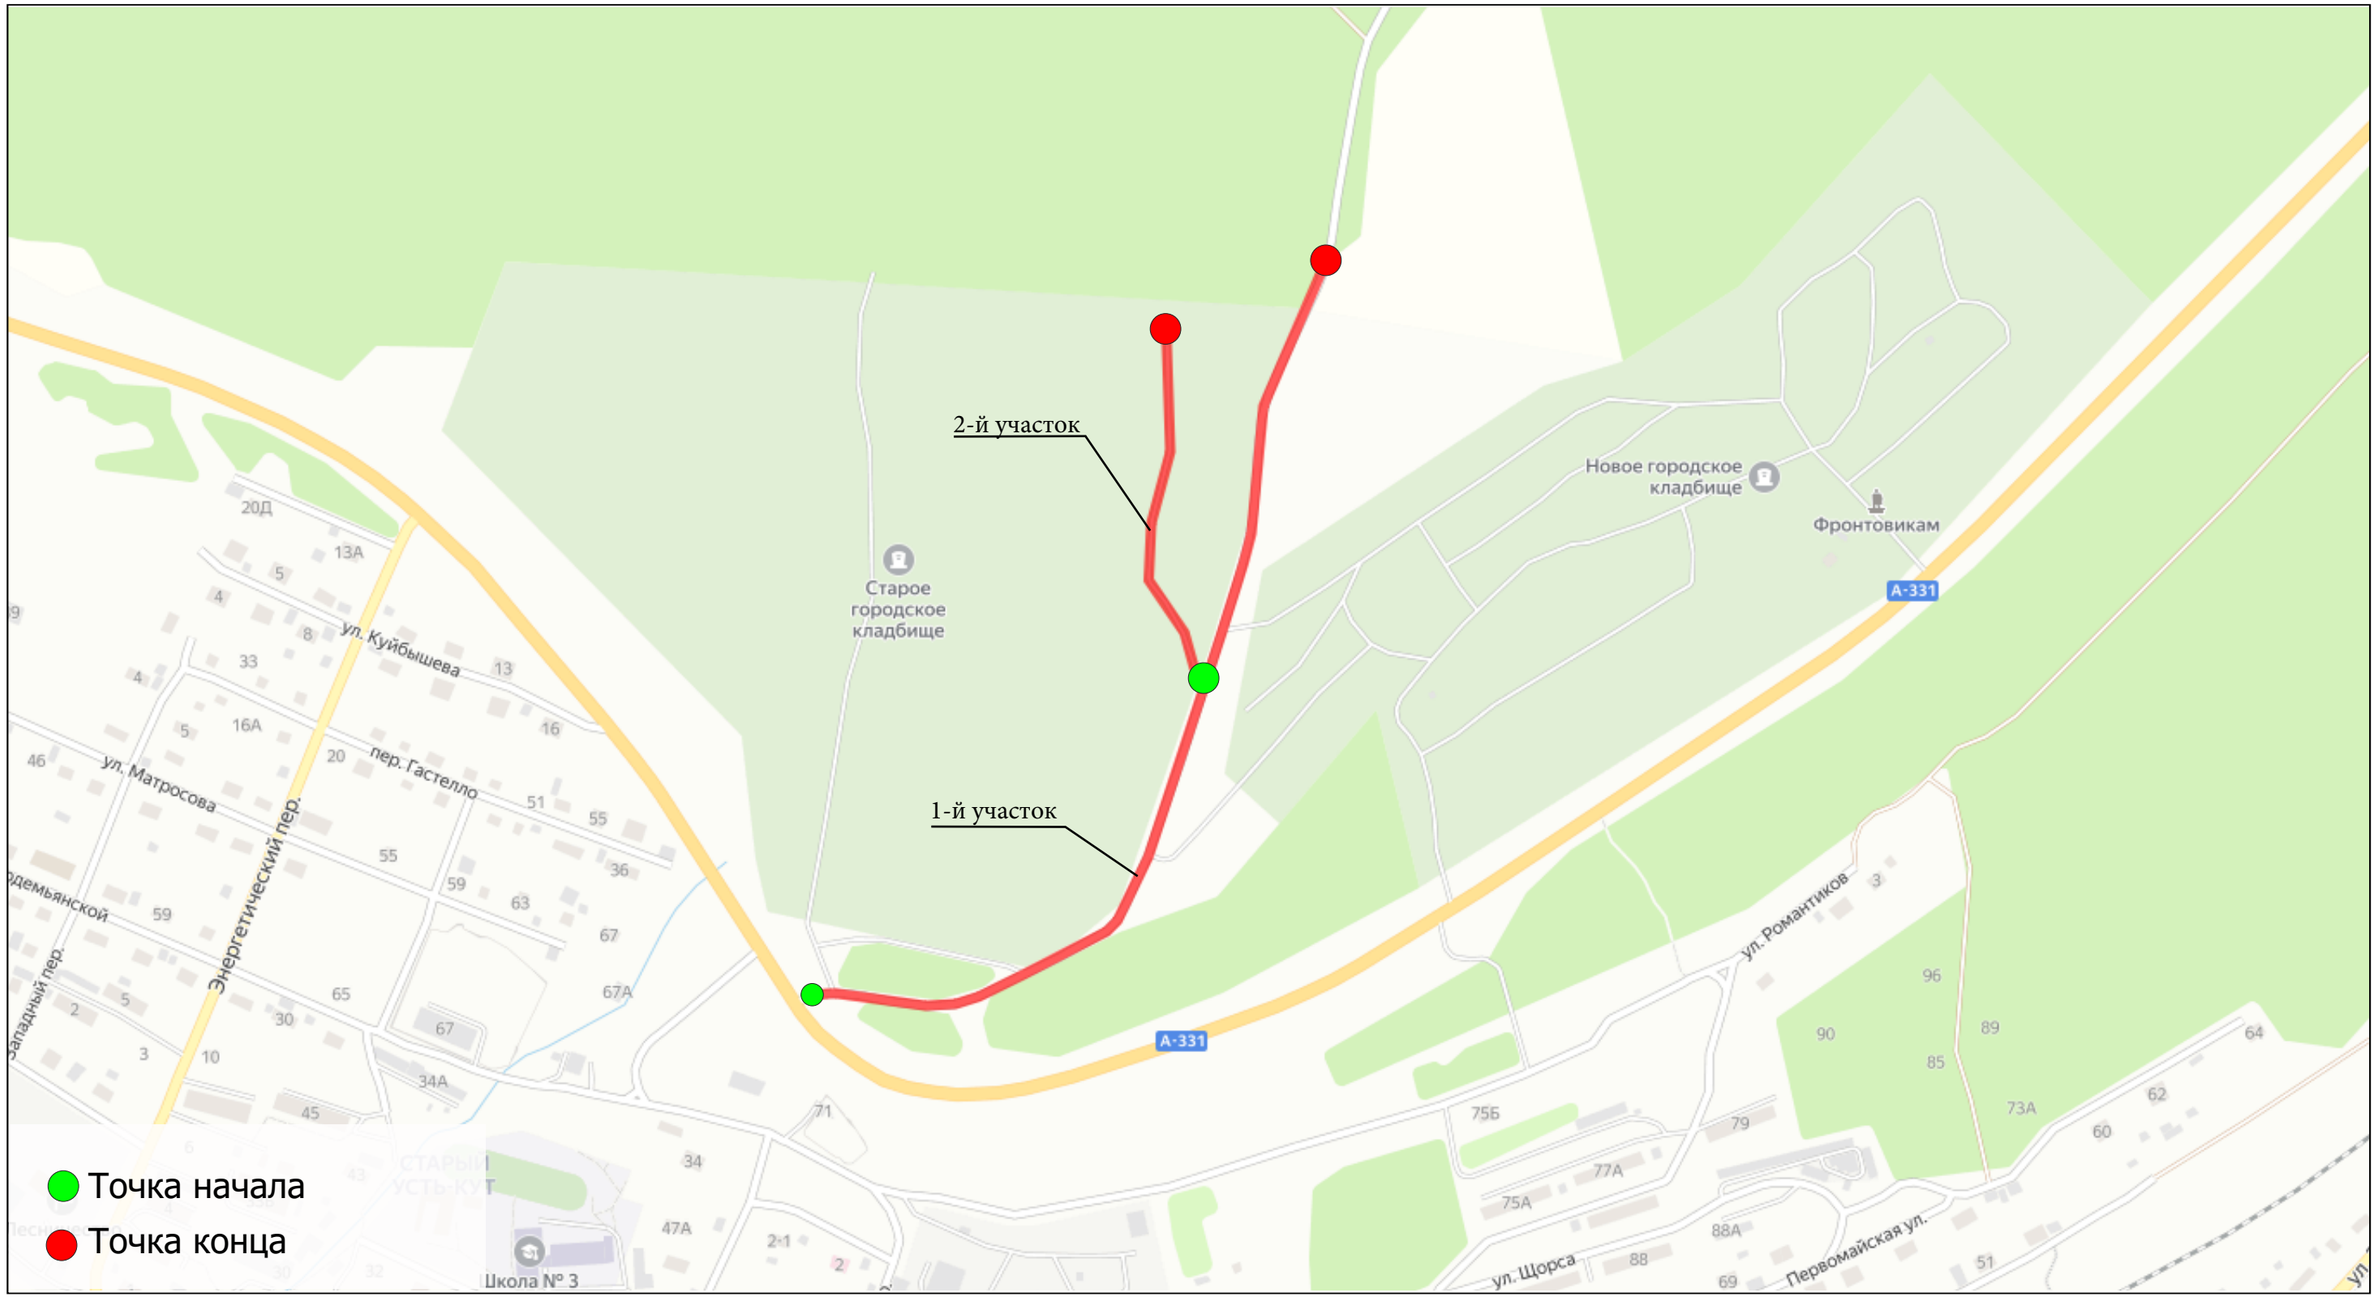

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	75 · 89 · 129 · R=4657м · 62 · 252 · 62 · 296 · R=5204м · 127 · 636
Кривые в плане	R=606м P=8; a=41° 10 · 41 · 80 · R=603м P=7; a=52° · 156 · 236 · R=624м P=9; a=39° · 300 · 537 · R=609м P=22; a=16° · 590 · 647 · R=791м P=29; a=16°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 · 4,50

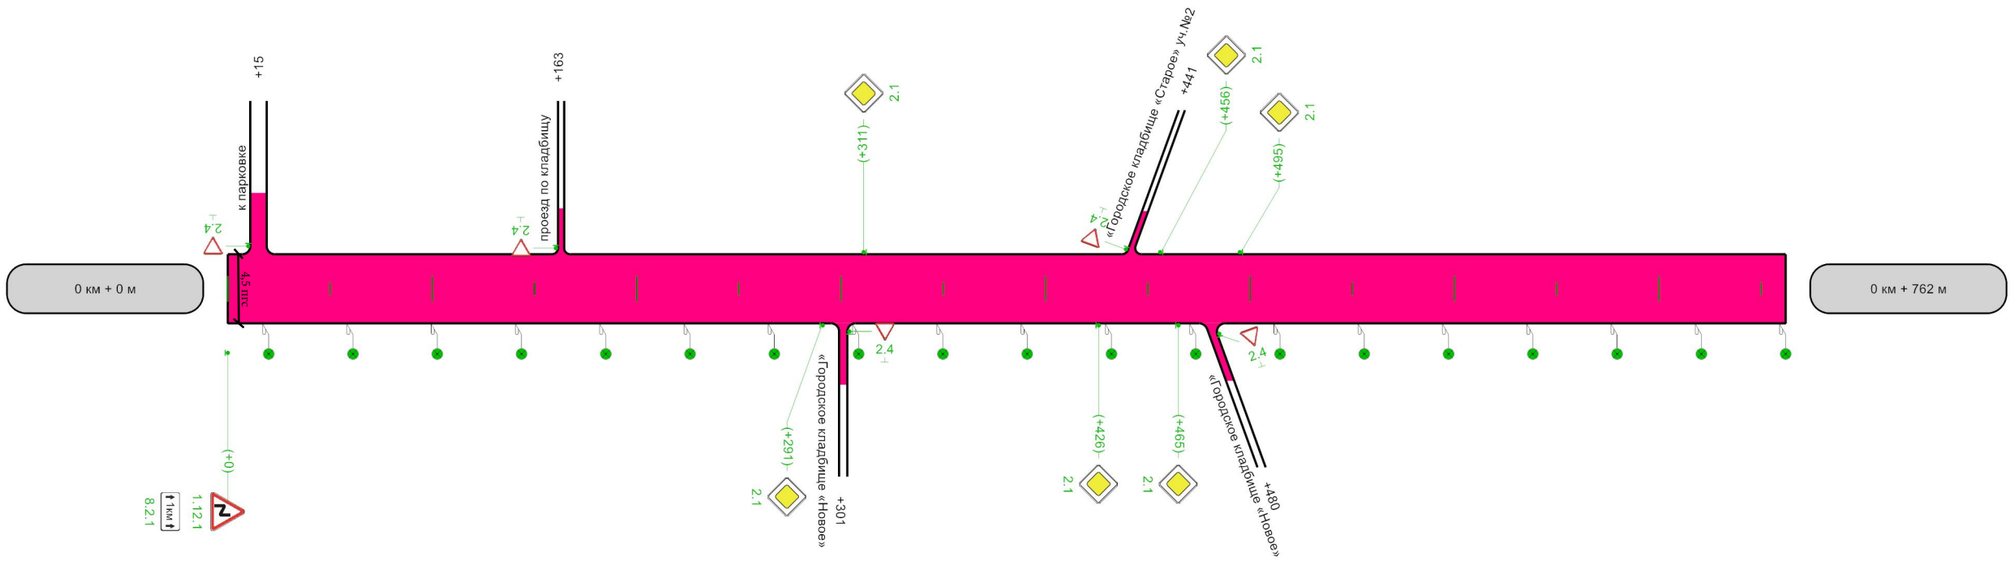

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты			0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+291	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+311	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+426	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+456	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+465	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+495	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.2.1	Зона действия			0+000	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+020	0+762	Населенный пункт	19/19	742	0	Справа
Итого:				**19/19**	**742**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 85 2 R=3776м 191 136
Кривые в плане	25 R=601м Р=17; а=20° 71 R=604м Р=8; а=42° 111 176 R=607м Р=15; а=23° 234
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,50

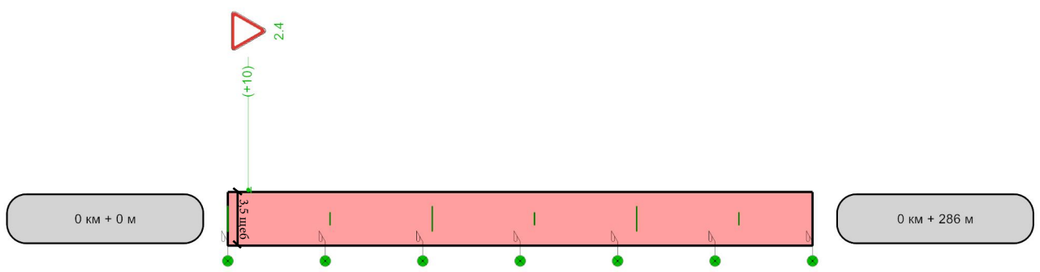

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+286	Населенный пункт	7/7	286	0	Справа
Итого:				**7/7**	**286**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования внутрихозяйственного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Внутриквартальная дорога «Якуримское кладбище»
км 0+000 - км 0+357

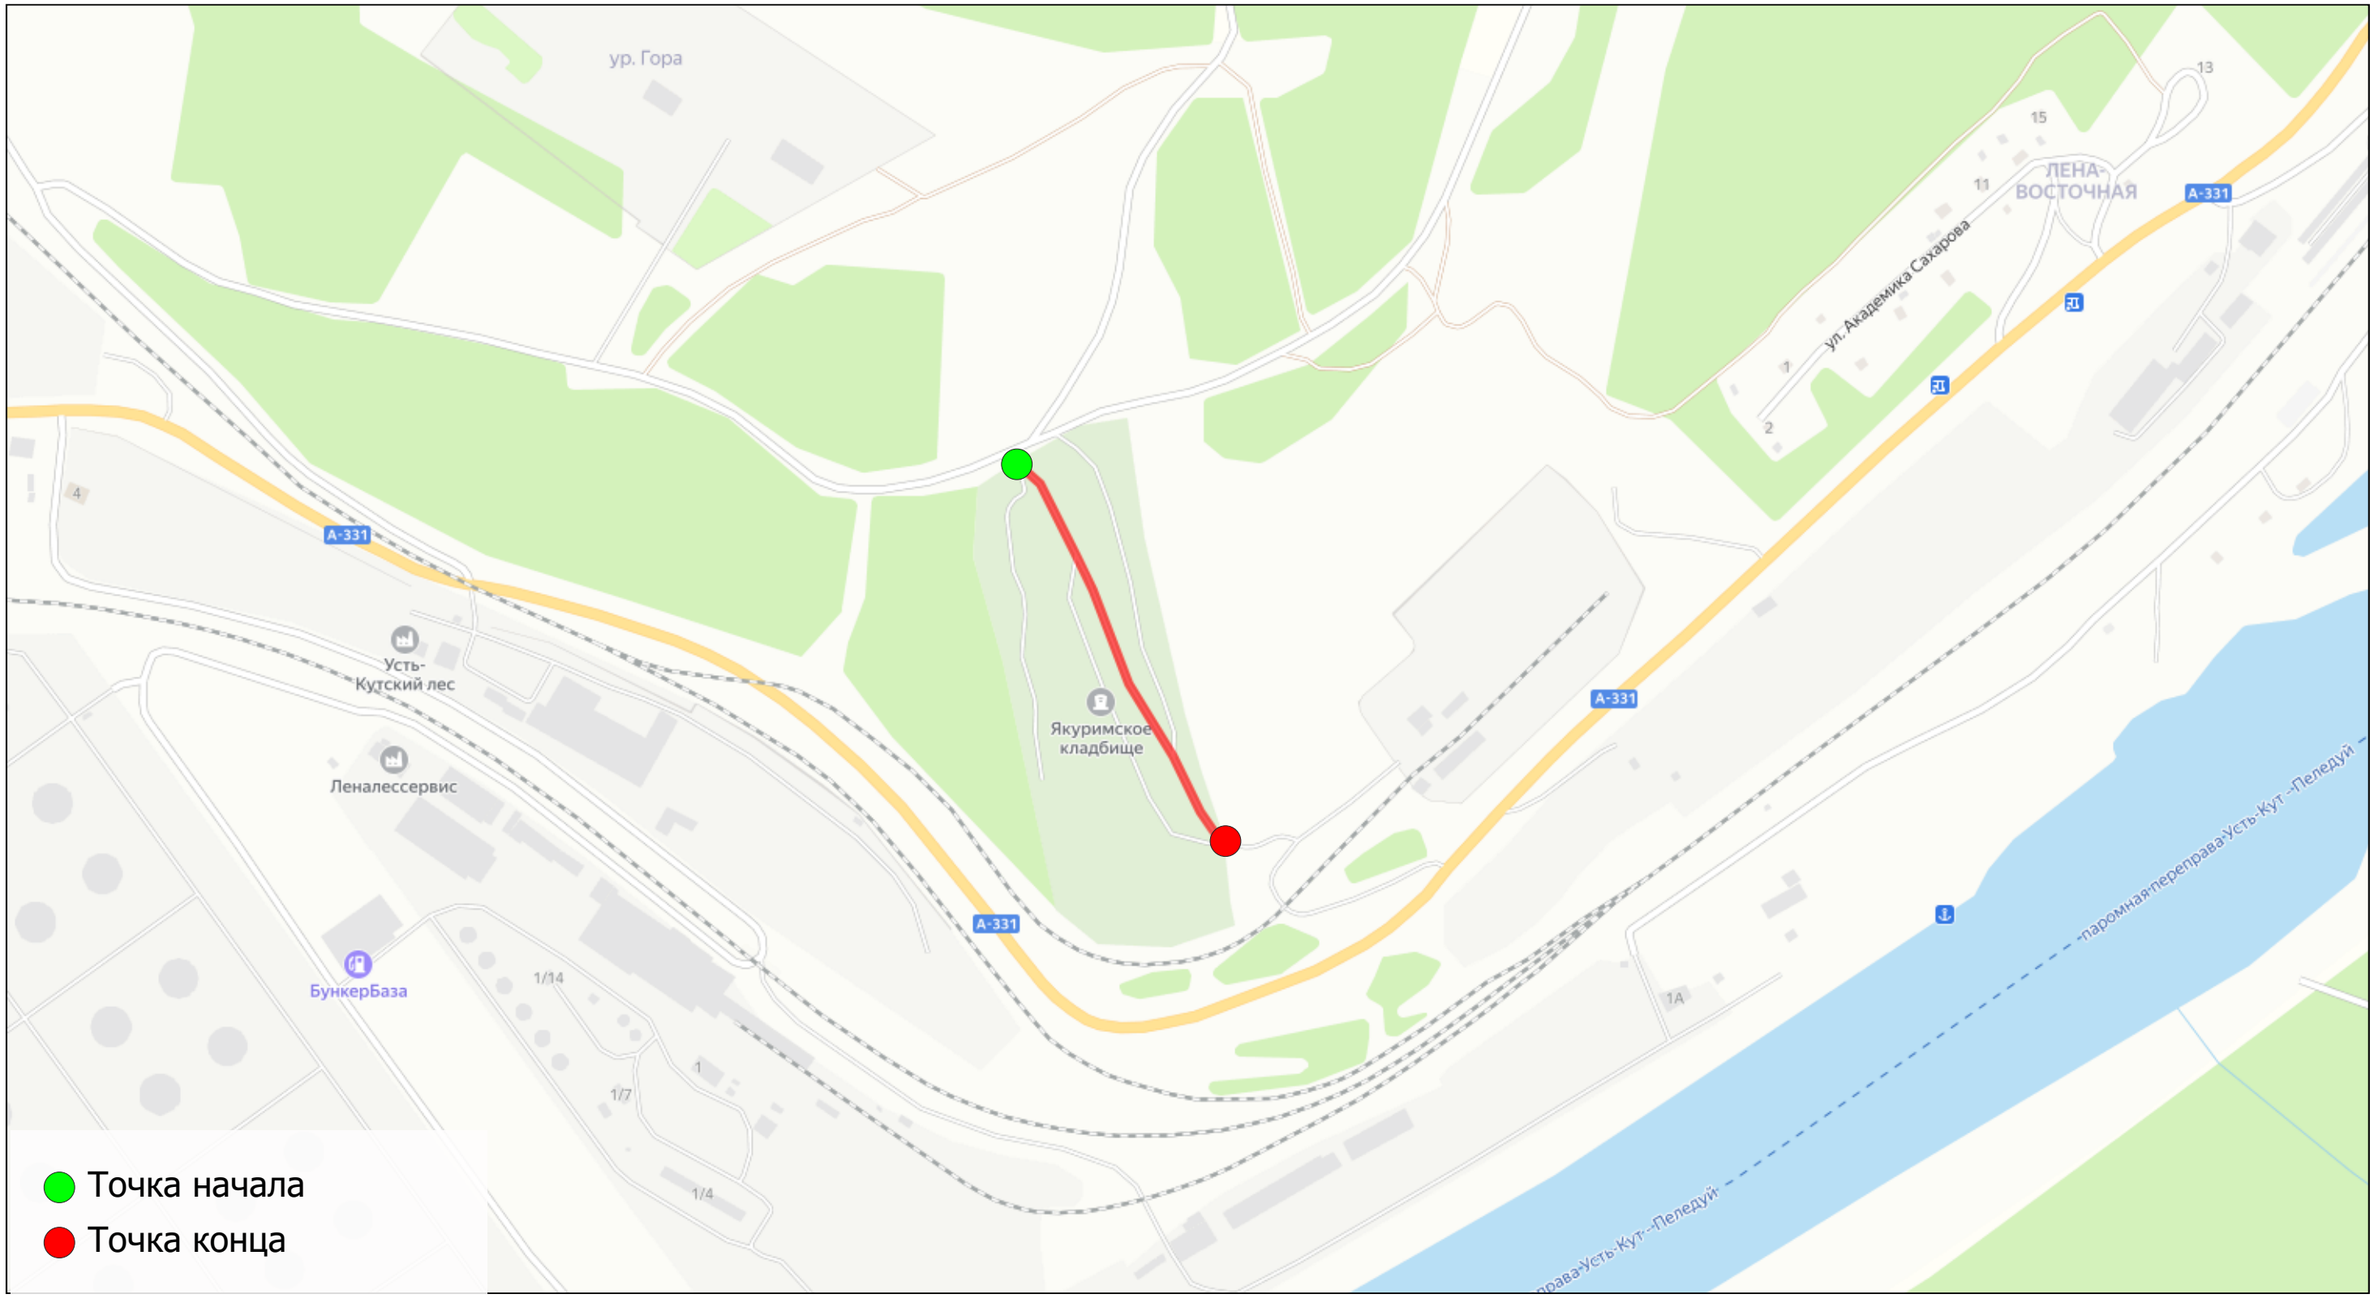

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	46 · 37 · 43 · R=1449м · 176 · 140 · 291 · 118 · R=2126м
Кривые в плане	R=695м P=24; a=17° · 55
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

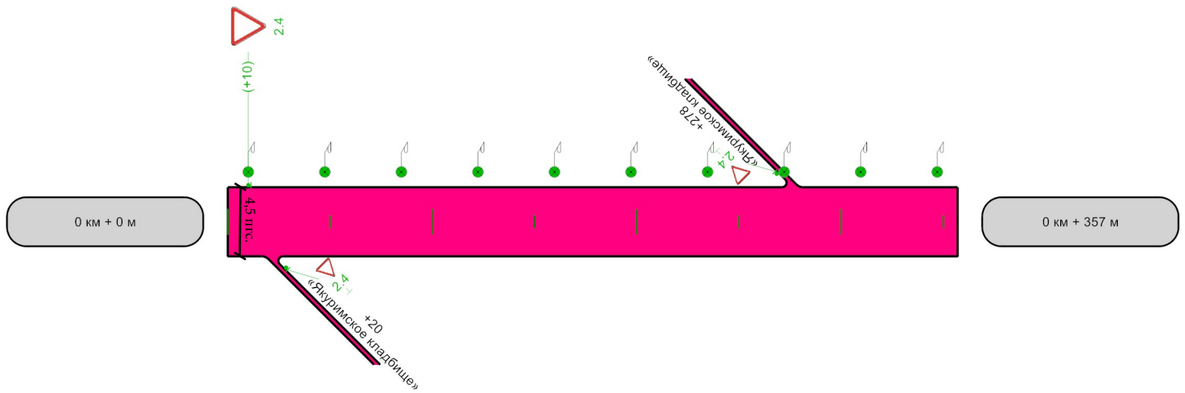

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+347	Населенный пункт	10/10	337	0	Слева
Итого:				**10/10**	**337**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования внутрихозяйственного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Внутриквартальная дорога входящая в состав сооружения «Городское кладбище «Новое»
км 0+000 - км 0+338

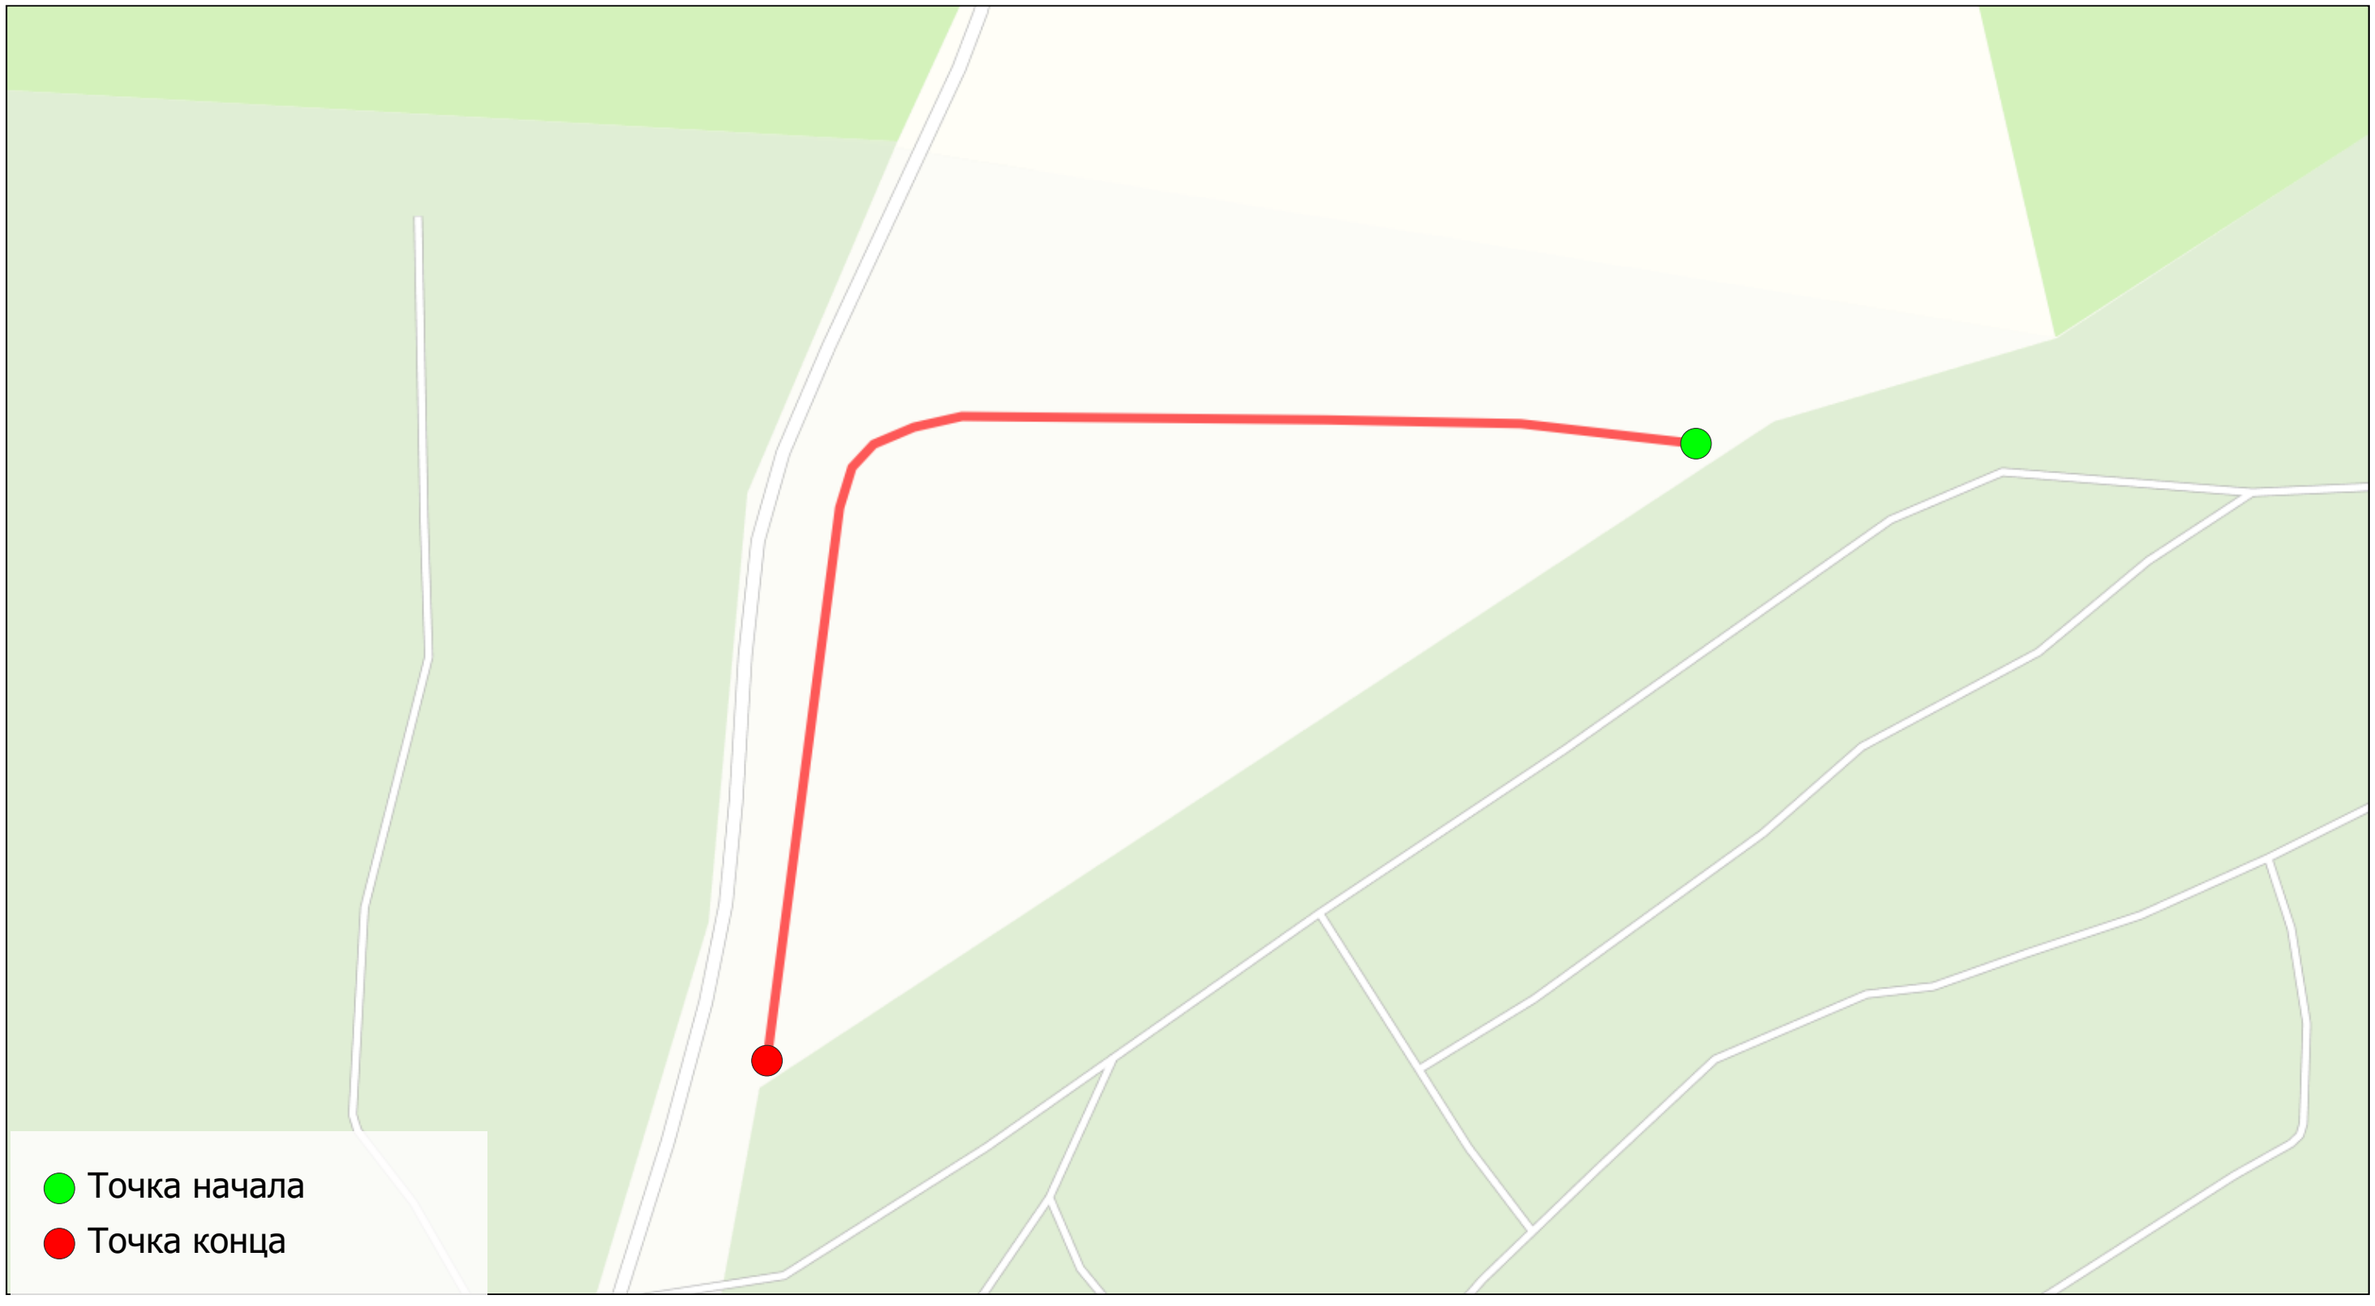

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	79 19 80 R=1368м
Кривые в плане	R=601м P=55; a=6° 60 191 R=624м P=5; a=69° 224
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

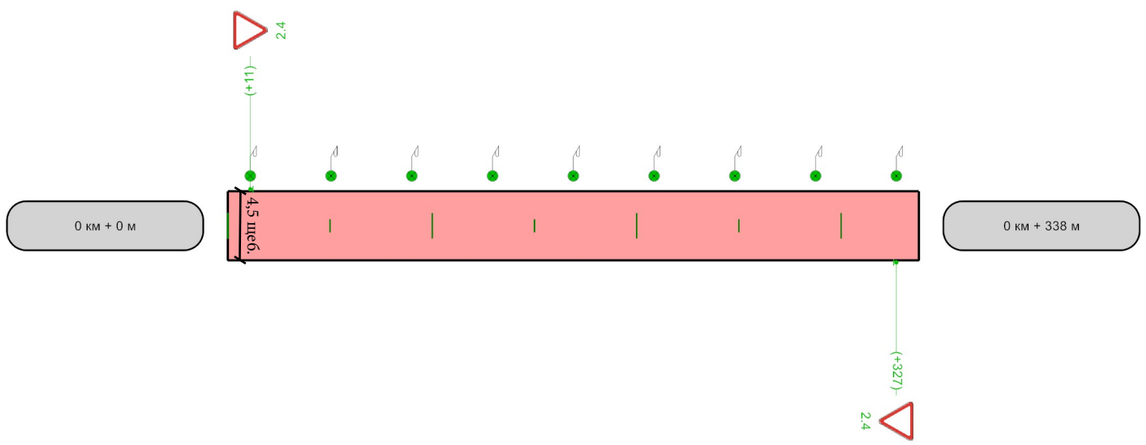

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+300	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**2**	
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:						

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+300	Населенный пункт	9/9	290	0	Слева
Итого:				**9/9**	**290**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от здания 54а по ул. Пушкина до примыкания к автодороге с кадастровым № 38:18:040202:1527
км 0+000 - км 0+136



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 22 49 12 R=3850м 113
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 5,20

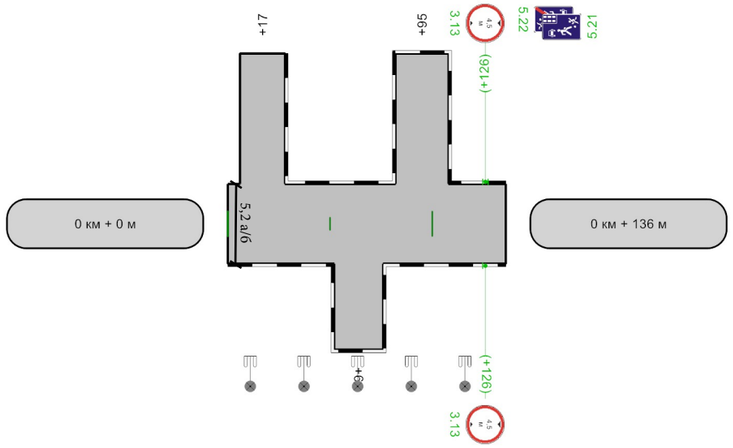

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
1	3.13	Ограничение высоты			0+126	Требуется установить	1	слева
2	3.13	Ограничение высоты			0+126	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки особых предписаний						
3	5.21	Жилая зона			0+126	Требуется установить	1	слева
4	5.22	Конец жилой зоны			0+126	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+011	0+116	Населенный пункт	5/10	0	105	Справа
Итого:				**5/10**	**0**	**105**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от пересечения с автодорогой по ул. Пушкина до примыкания автодороги с кадастровым № 38:18:000000:1255 км 0+000 - км 0+961

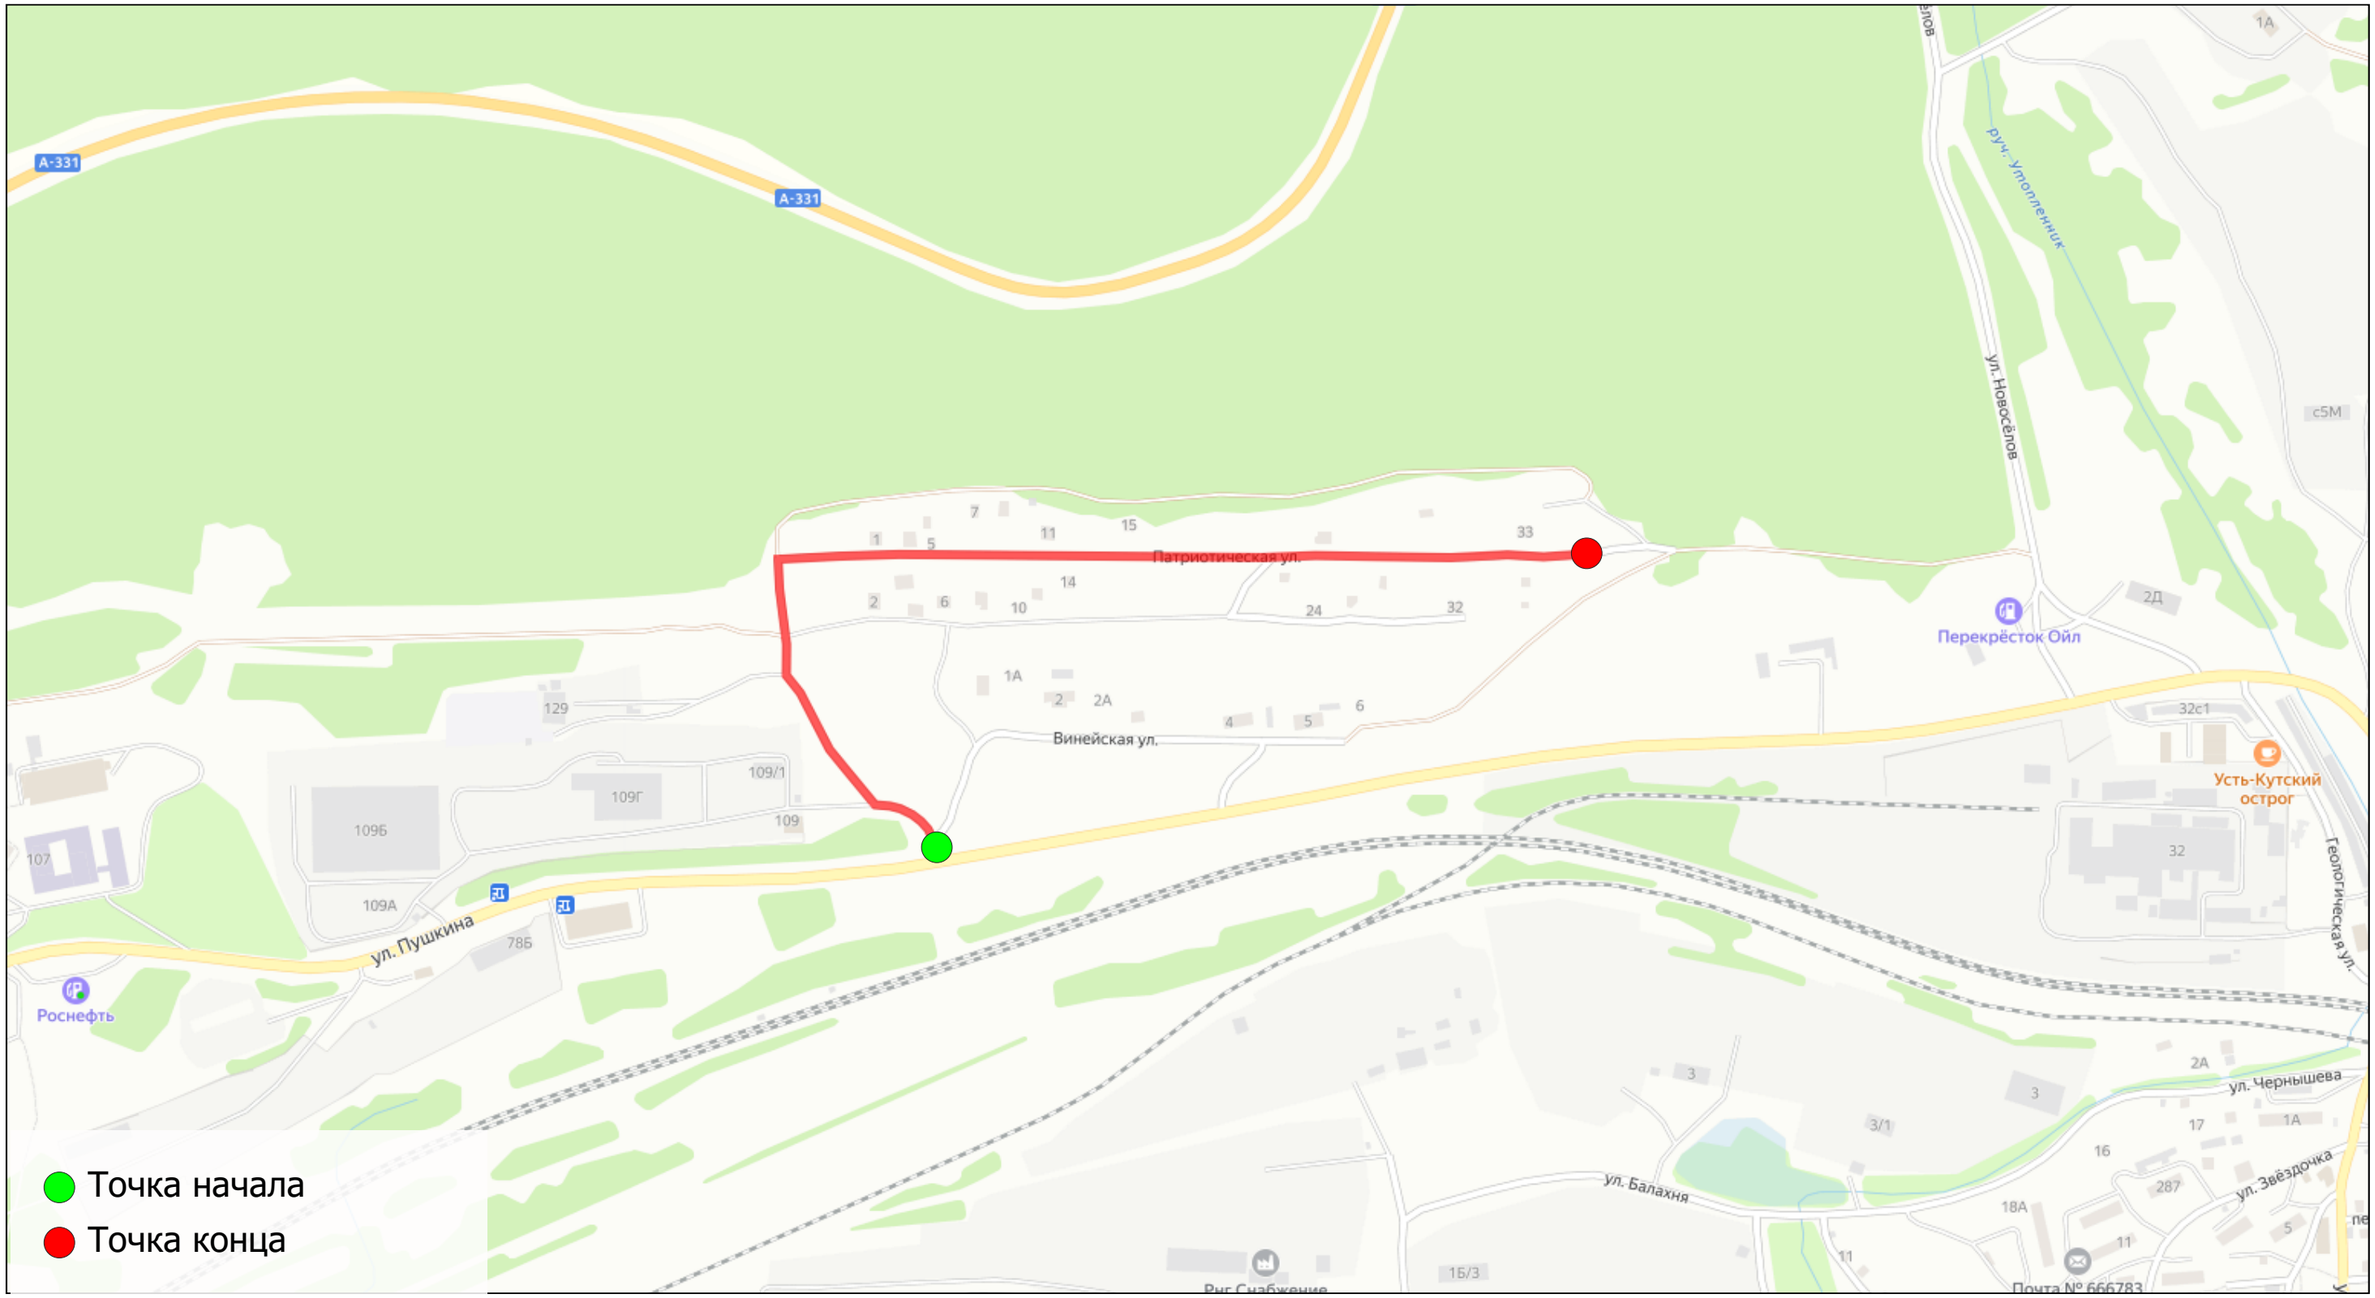

М 1:3000


1-ая от осевой
1.2
0 - 71
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси
Элементы дороги в продольном профиле
112
117
242
R=1749м
19
468
43
571
R=4569м
19
674
Кривые в плане
19
R=46м
P=0; a=93°
71
90
104
R=627м
P=18; a=20°
147
R=670м
P=39; a=10°
191
R=655м
P=10; a=39°
227
246
R=616м
289
312
Тротуары слева
Характеристики проезжей части
0
0,25-6,00-0,25
83
4,50


0 км + 0 м
0 км + 961 м
4,5 пос.
6,5 а/б
1.1 1.7
1.1
1.7
1.2
1.2 1.7 1.13
+76
к предприятию
+211
к предприятию
+234
к жилой застройке
+14
ул. Винейская
(+5)
(+27)
(+43)
(+47)
(+69)
(+88)
(+99+)
(+201)
(+244)
2.1
2.2
2.4
3.20
8.13
1.11.2
15м
8.1.1
1.34.2
1.34.1


Горизонтальная разметка справа
осевая
1.1
0 - 99
1.7
99 - 23
1.1
23 - 69
1.7
69 - 83
1-ая от осевой
1.2
0 - 71
1.2
22 - 83
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа
Тротуары справа

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	55,000	142,000	40,000	12,000	**22,000**
ИТОГО	**55,000**	**142,000**	**40,000**	**12,000**	**22,000**
ЛИН.КМ	**0,055**	**0,142**	**0,040**	**0,012**	
ПРИВЕД.КМ	**0,055**	**0,142**	**0,020**	**0,003**	
ПЛОЩАДЬ	**5,500**	**14,200**	**2,000**	**0,300**	**22,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.2	Опасный поворот			0+005	Требуется установить	1	справа
2	1.34.1	Направление поворота			0+047	Требуется установить	1	справа
3	1.34.2	Направление поворота			0+043	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Знаки приоритета						
4	2.1	Главная дорога			0+005	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+027	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+066	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+088	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+201	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+244	Требуется установить	1	слева
10	2.2	Конец главной дороги			0+005	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
12	3.20	Обгон запрещен			0+027	Требуется установить	1	слева
13	3.20	Обгон запрещен			0+027	Требуется установить	1	справа
14	3.20	Обгон запрещен			0+066	Требуется установить	1	слева
15	3.20	Обгон запрещен			0+066	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
16	8.1.1	Расстояние до объекта			0+005	Требуется установить	1	справа
17	8.13	Направление главной дороги			0+088	Требуется установить	1	слева
18	8.13	Направление главной дороги			0+066	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**18**	
		Всего:					**18**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+083	0+093	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+083	0+093	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+952	Населенный пункт	28/28	943	0	Слева
Итого:				**28/28**	**943**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Тополиная от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная

1-й участок: км 0+000 - км 0+525
2-й участок: км 0+000 - км 0+330

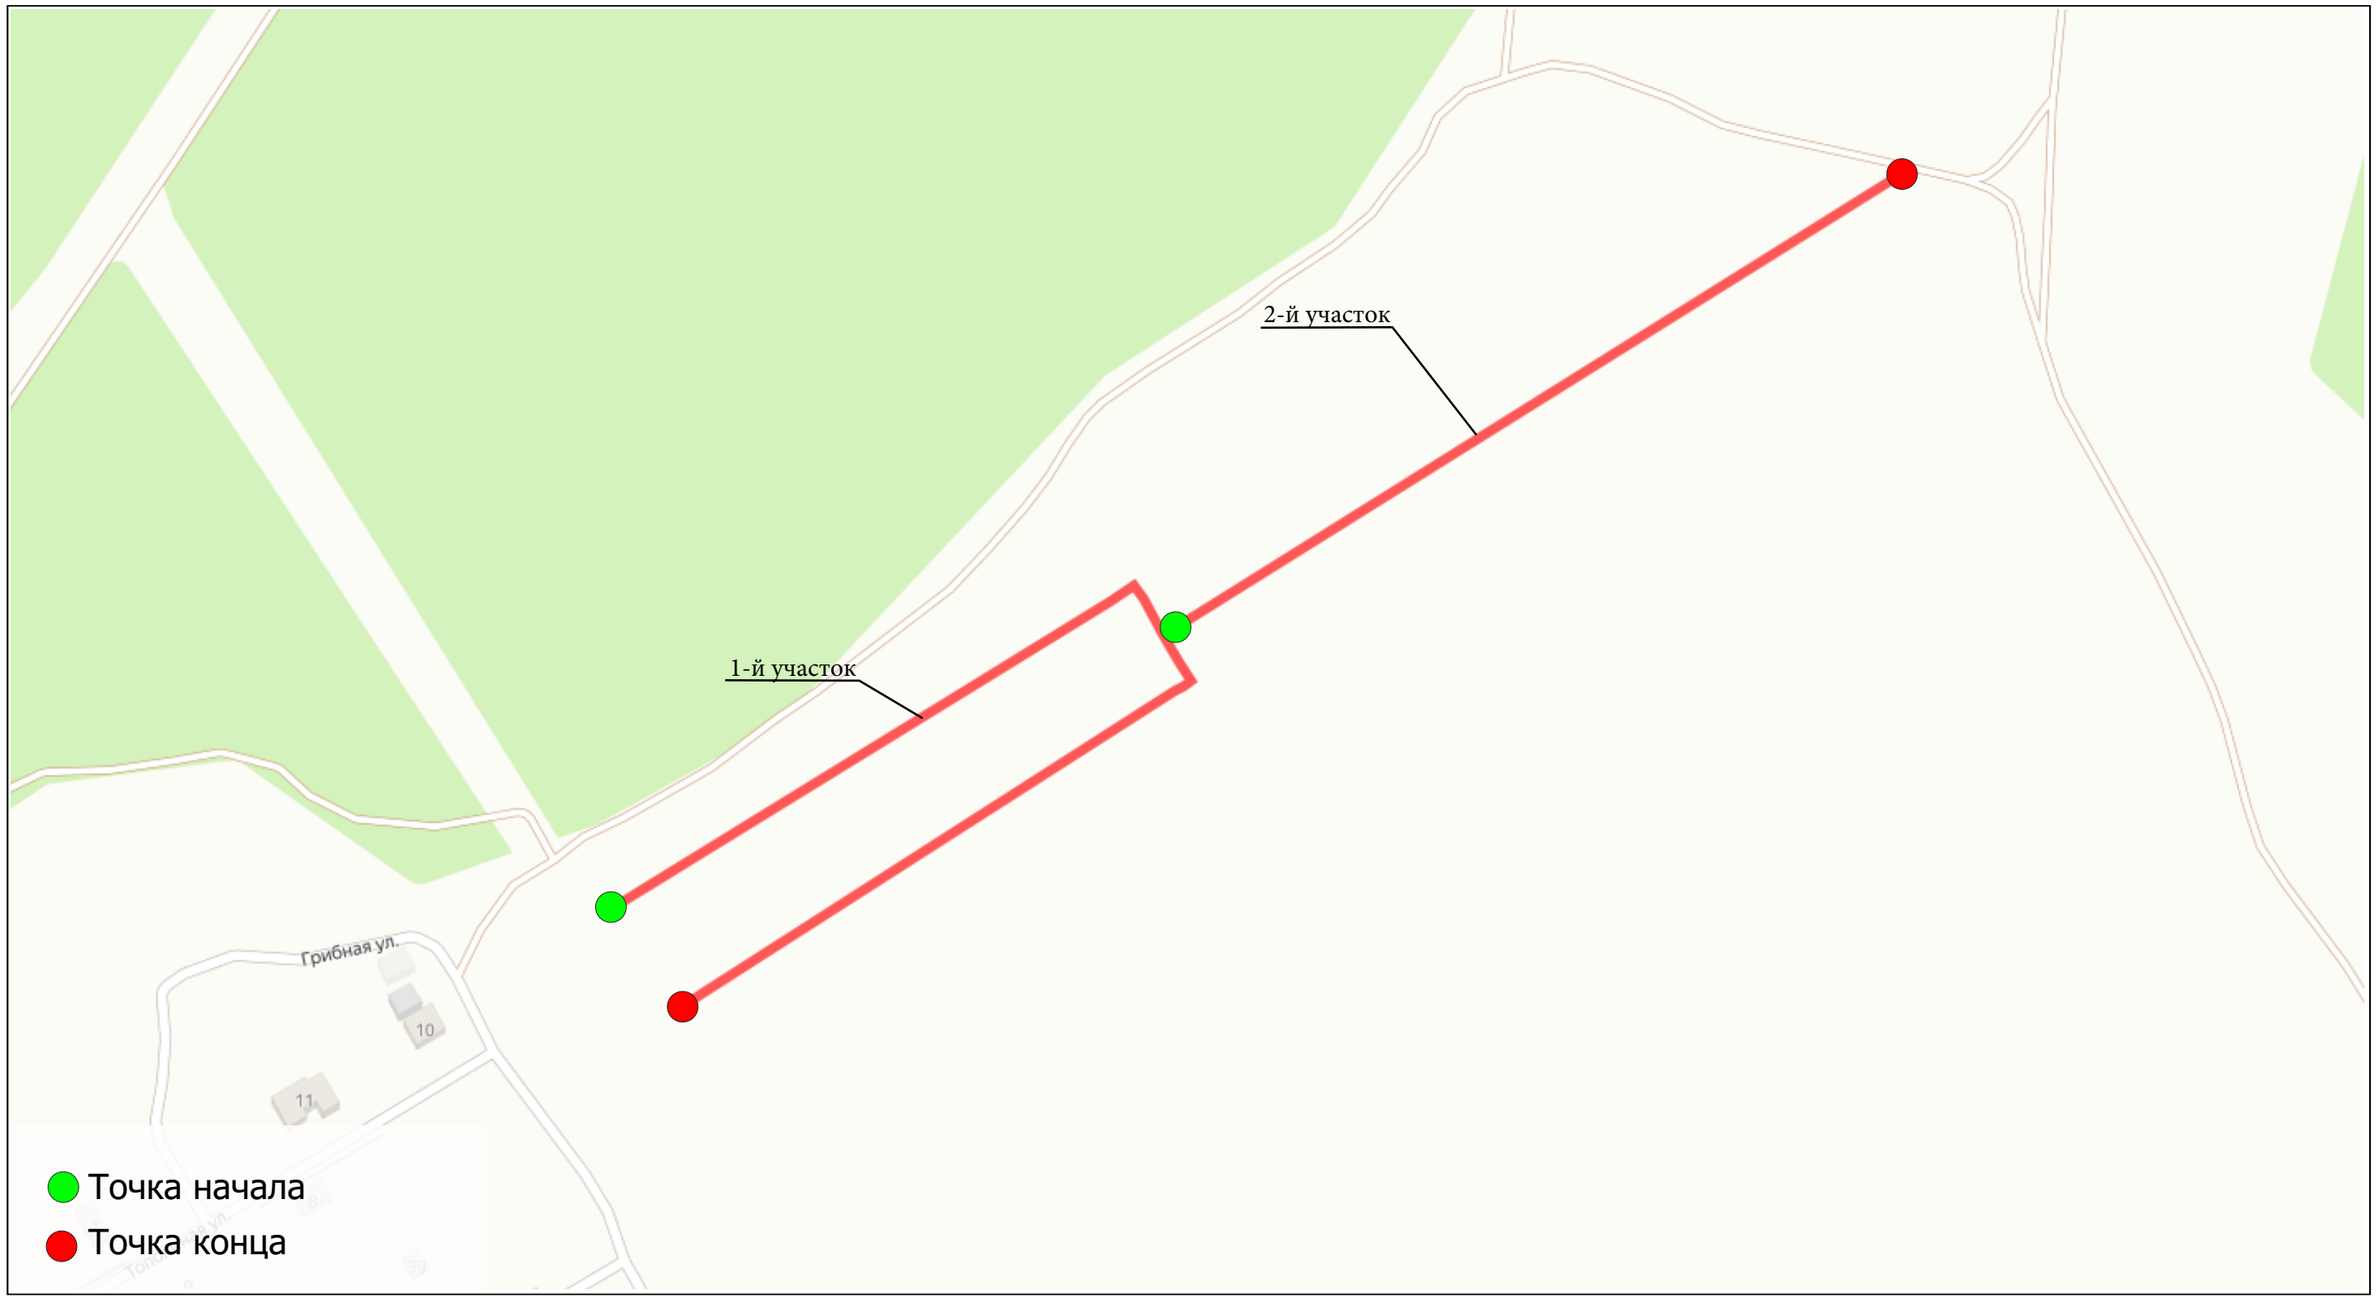

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	230 R=605м 250 275 R=615м 295
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

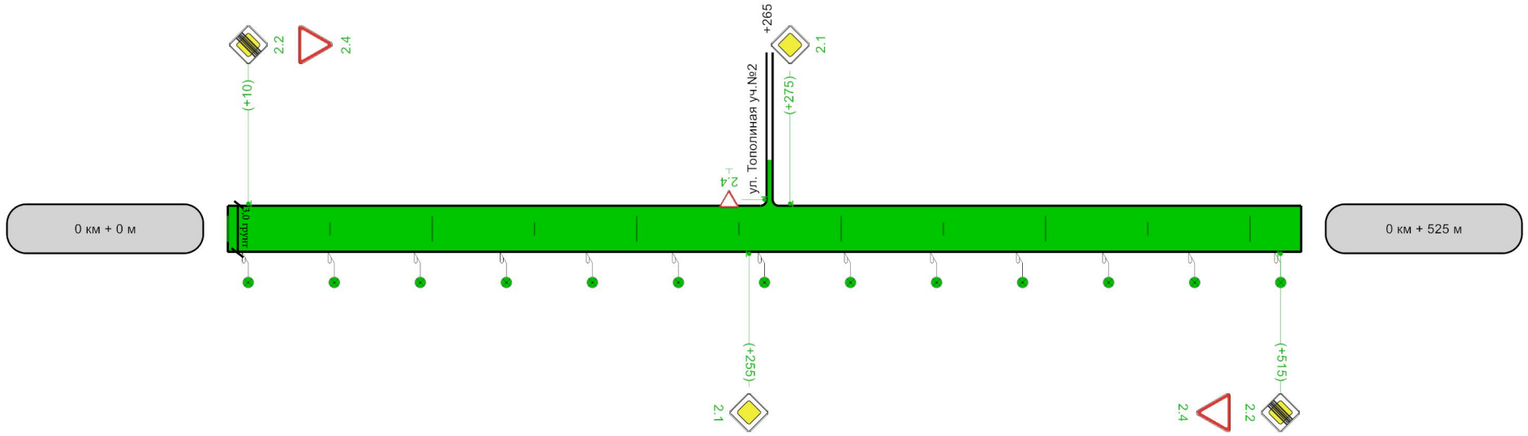

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+255	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+275	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги			0+515	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+515	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+515	Населенный пункт	13/13	505	0	Справа
Итого:				**13/13**	**505**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	b 3,00

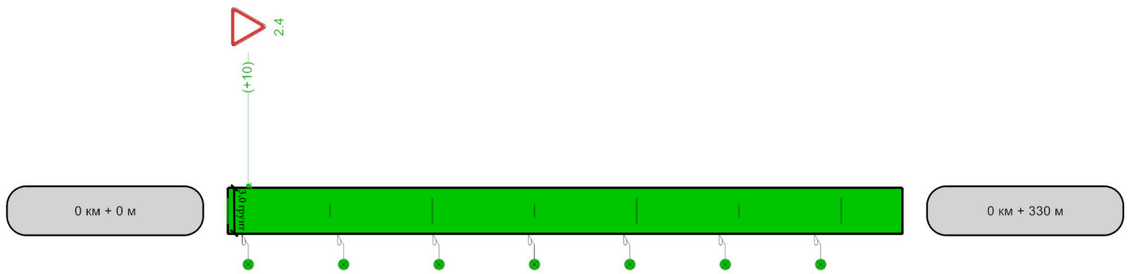

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+290	Населенный пункт	7/7	280	0	Справа
Итого:				**7/7**	**280**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Благодатная, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная

1-й участок: км 0+000 - км 0+569
2-й участок: км 0+000 - км 0+089



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	17
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00

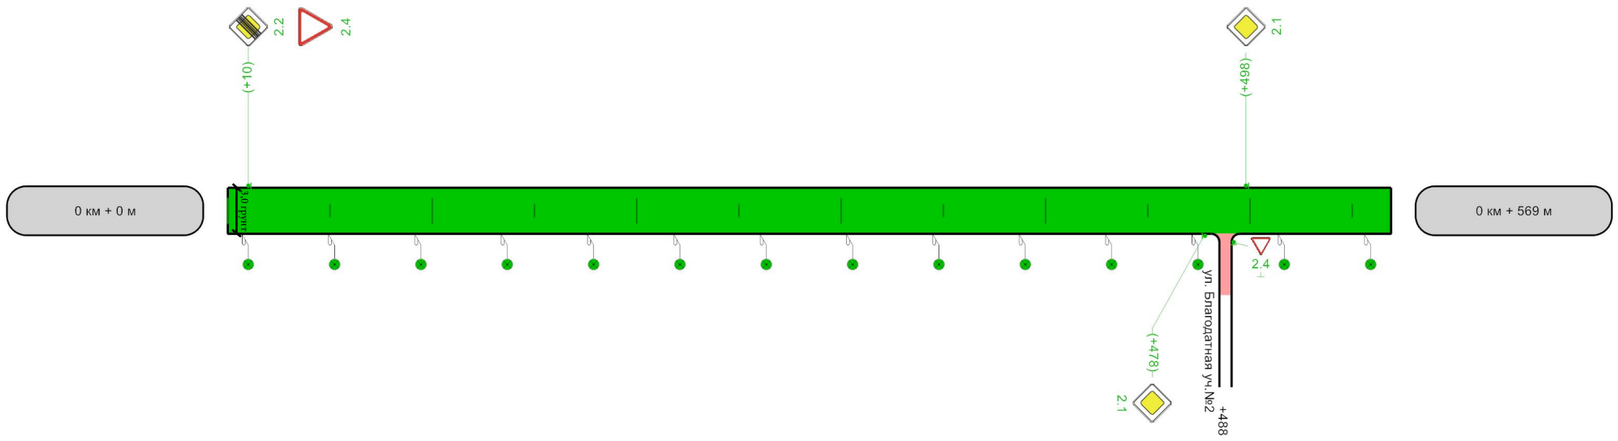

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+478	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+498	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+559	Населенный пункт	14/14	549	0	Справа
Итого:				**14/14**	**549**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	73
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

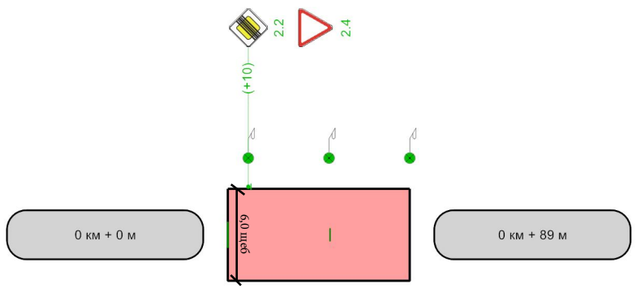

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+089	Населенный пункт	3/3	79	0	Слева
Итого:				**3/3**	**79**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автодороги А-331 Вилюй до примыкания с земельным участком с кадастровым № 38:18:040105:15 по ул. Высоцкого, 22
км 0+000 - км 0+148

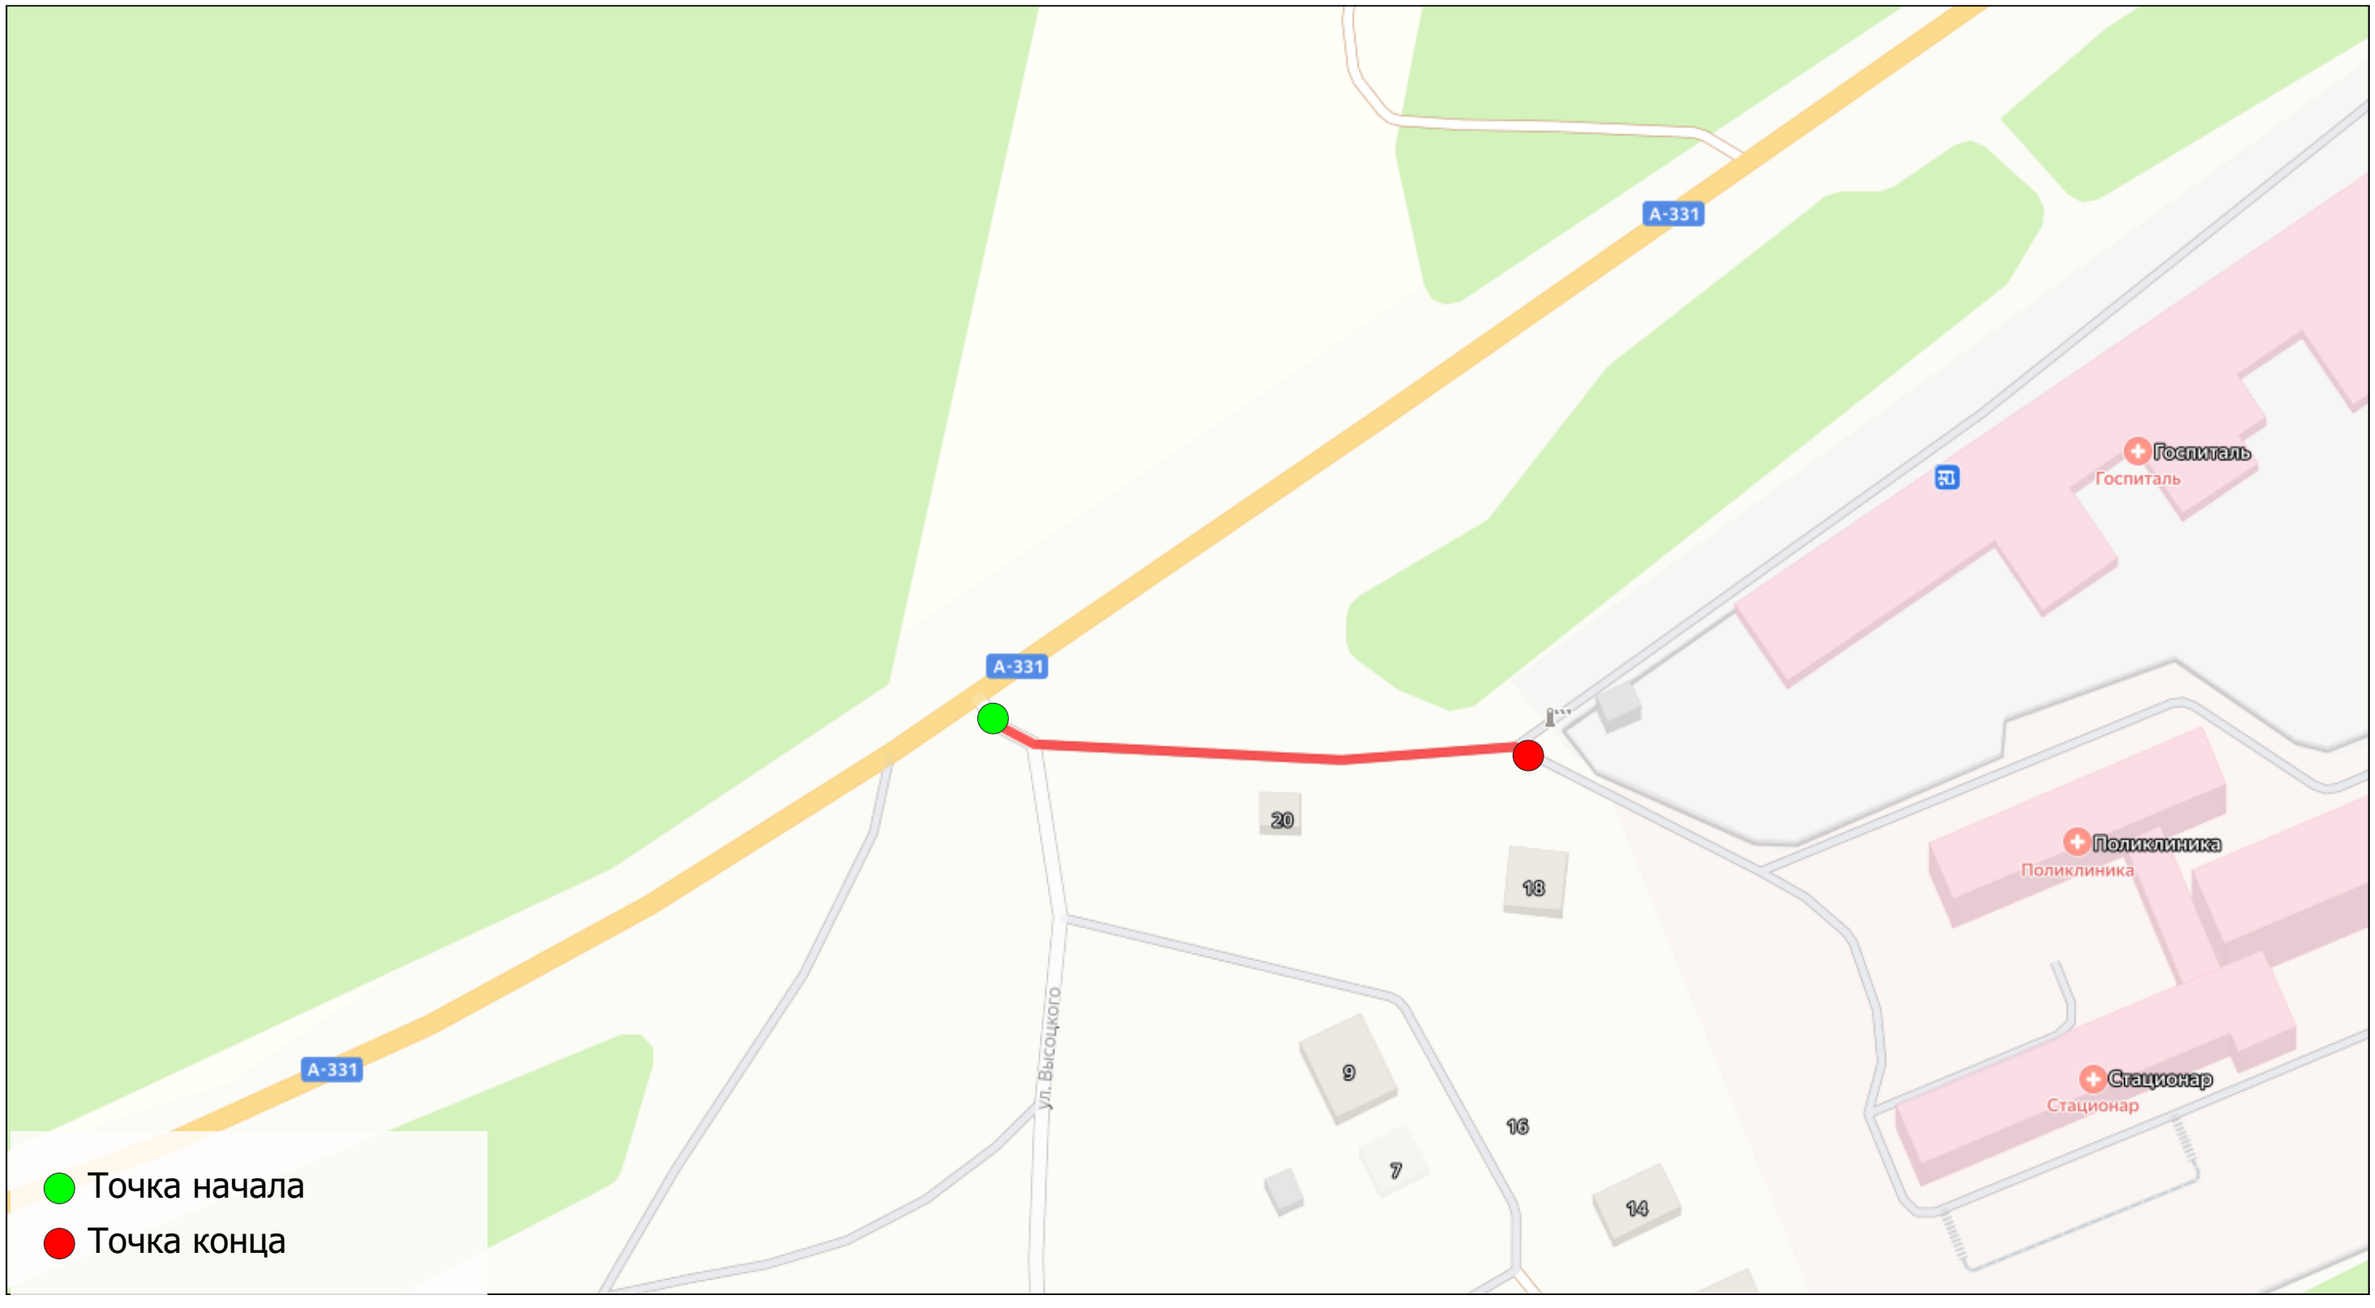

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 136
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 16 2 R=3978м
Кривые в плане	R=186м 112 P=12; a=9°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 0,60-6,00-0,60

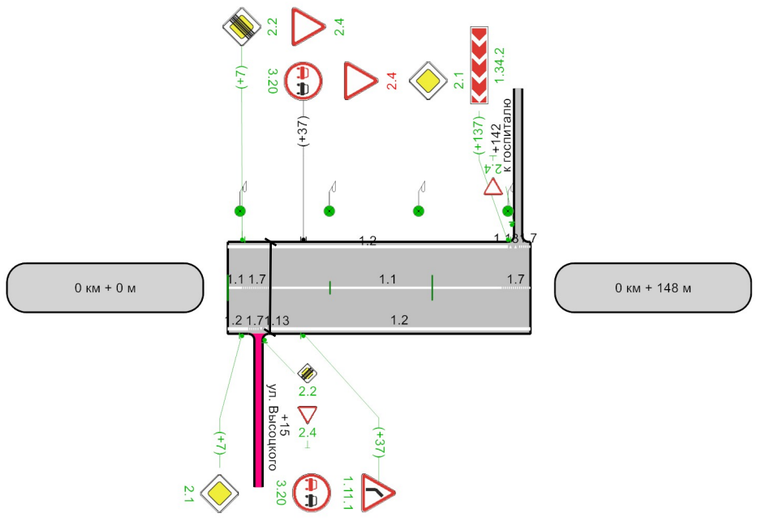

Горизонтальная разметка	осевая	1.1 0 - 7	1.7 7 - 22	1.1 22 - 134	1.7 134 - 148
	1-ая от осевой	1.2 0 - 21	1.1 21 - 22	1.2 21 - 148	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа					

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6
0 - 1	119,000	275,000	40,000	10,000	**41,650**
ИТОГО	**119,000**	**275,000**	**40,000**	**10,000**	**41,650**
ЛИН.КМ	**0,119**	**0,275**	**0,040**	**0,010**	
ПРИВЕД.КМ	**0,119**	**0,275**	**0,020**	**0,002**	
ПЛОЩАДЬ	**11,900**	**27,500**	**2,000**	**0,250**	**41,650**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот			0+037	Требуется установить	1	справа
2	1.34.2	Направление поворота			0+137	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+007	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+037	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+007	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+007	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+037	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**1**	
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
8	3.20	Обгон запрещен			0+037	Требуется установить	1	слева
9	3.20	Обгон запрещен			0+037	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**1**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+006	0+137	Населенный пункт	4/4	131	0	Слева
Итого:				**4/4**	**131**	**0**	

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
