394050, г. Воронеж, ул. Федора Тютчева д.93/5, офис 318; E-mail: zm36@yandex.ru; 8 (950) 759-81-85;
ИНН/КПП 3661083604/366101001; ОКТМО 20701000001; ОКАТО 20401000000; ОГРН 1173668056451

Заказчик
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
Генеральный подрядчик
ООО «Зеленый Мегаполис»

Утверждаю
И.о. директора МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
_____ О.Л. Зубарев
«____»_____ 2025 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Том 9, томов 10

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г.

Разработано

Директор _____ С.В. Глуховской

«____»_____ 2025 г.

2025 г.

Содержание:

№ п/п	Наименование	стр.
1.	Утверждаемая часть ПОДД	3
2.	Лист согласования и ответы согласующих органов	4
3.	Условные обозначения элементов обустройства дороги	5
4.	Автодорога от жилого дома по ул. Шевченко, 1б до жилого дома по ул. Шевченко, 26	6
5.	Автодорога от автодороги ул. Пушкина до земельного участка по ул. Винейская, 7	11
6.	Автодорога от автодороги ул. Якуримская до нежилого здания по ул. Заречная, стр. 20	14
7.	Автодорога от жилого дома по ул. Радищева, д. 2 до жилого дома по ул. Радищева, д. 71	22
8.	Автодорога от строения № 2д по ул. Щорса (здание котельной) до автодороги пер. Энергетический	32
9.	Автодорога от жилого дома по ул. Речников, д. 3 до выезда на автодорогу ул. Речников	37
10.	Автодорога от жилого дома по ул. Зимняя, д. 2 до нежилого здания по ул. Кравченко, д. 14/1	45
11.	Автодорога от земельного участка по ул. Приленская, 1 Б до земельного участка по ул. Благополучная, 1б	48
12.	Автодорога от земельного участка по ул. Благодатная, 9 до земельного участка по ул. Благодатная, 43	51
13.	Автодорога от жилого дома по ул. Комсомольская, д. 1 до жилого дома по ул. Иркутская, д.17	56
14.	Автодорога от жилого дома по ул. Корабелов, 10 до автодороги ул. Черноморская	59
15.	Автодорога от жилого дома по ул. Киевская, д. 2 до жилого дома по ул. Киевская, д. 6	62
16.	Автодорога от жилого дома ул. Лесная 27 до жилого дома по ул. Лесная 28	65
17.	Автодорога от здания по ул. Луговая, строение. 21 до производственной базы по ул. Луговая, участок №25а	71
18.	Автодорога по ул. Мельничный ручей от дороги общего пользования по ул. Новая до железнодорожных путей	76
19.	Автодорога от многоквартирного дома по ул. Буровиков, д.1, по ул. Мира до жилого дома по ул. Мира, д. 7	79
20.	Автодорога от дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до автодороги ул. Портовая	83
21.	Автодорога от жилого дома по ул. Пушкина 1 до жилого дома по ул. Пушкина 59	88
22.	Автодорога по ул. Вишневая, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная	94
23.	Автодорога от многоквартирного дома по ул. Речников, 16 до земельного участка по ул. Гайдара, 9	99
24.	Автодорога по ул. Центральная, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная	103
25.	Автодорога от жилого дома по ул. Фадеева, д.1 до жилого дома по ул. Фадеева, д.12	108
26.	Автодорога от пересечения дороги вблизи дома № 2 по улице Спортивной до пересечения дороги вблизи дома №14 по улице Спортивная	111
27.	Автодорога от въезда с ул. Пушкина до жилого дома по ул. Пушкина, 103	114
28.	Автодорога от въезда с автодороги ул. Халтурина до жилого дома по ул. Халтурина, д.52б	117
29.	Автодорога по пер. Светлый от д. № 20 по ул. Гайдара, между домами № до примыкания к автодороге ул. Речников	121
30.	Автодорога от жилого дома № 115 по ул. Пушкина до примыкания к автомобильной дороге по ул. Пушкина	124
31.	Автодорога от жилого дома № 1 по ул. Российская до примыкания к автомобильной дороге по ул. Пушкина	127
32.	Автодорога от автомобильной дороги федерального значения до восточной границы ГСК "Солнечный"	130
33.	Автодорога от автомобильной дороги федерального значения до ул. 2-я Парковая	133
34.	Автодорога от автодороги ул. Пушкина до въезда к административному зданию по ул. Володарского, 69	136
35.	Автодорога от ж/д переезда в районе ЯГУ до автодороги ул. Геологическая	139
36.	Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Новое»	143
37.	Обосновывающая часть ПОДД	150

Задание на разработку ПОДД

Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения

Полное содержание Технического задания представлено в приложении №1 к Муниципальному контракту №056/ЭА от 17.06.2025г., предметом которого является выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения автомобильных дорог Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Значения основных параметрах дорожного движения и основных показателей безопасности дорожного движения.

Основные параметры дорожного движения определяются посредством обработки результатов обследования дорожного движения, полученных в ходе проведения полевых работ.

Значения параметров дорожного движения рассматриваемых дорог находятся на уровне, при котором пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов

Перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание

В целях устранения отклонений от нормативных требований, выявленных в ходе проведенного анализа дорожно-транспортной ситуации на улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), были выработаны следующие проектные решения:

-На опасных участках дорог, с учетом минимального расстояния видимости, обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и пешеходов, были применены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки по ограничению скоростного режима и запрещению обгона.

- Перекрестки автомобильных дорог были обустроены знаками приоритета 2.4 и 2.1.

-На территории улично-дорожной Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) были запроектированы тротуары в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019.

- По результатам натурного обследования определено парковочное пространство, которое было обустроено соответствующими информационными знаками 6.4, совместно с табличками «Способ постановки тс на стоянку», 1/10 часть парковочного пространств выделена под места для инвалидов.

- Искусственные дорожные неровности были применены и обустроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Информация о согласовании ПОДД

Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) разработан в соответствии с Муниципальным контрактом№056/ЭА от 17.06.2025г. на «Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения», заключенным между ООО «Зеленый Мегаполис» и Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Основанием для проектирования является федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Целями разработки проекта организации дорожного движения являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.




Разработанный проект организации дорожного движения соответствует всем действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, стандартами, техническими нормами в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ОТВЕТЫ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ

Муниципальный контракт № 056/ЭА от 17.06.2025г. на "Выполнение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)"

№ п/п	Наименование согласующих органов и организаций	ФИО, должность	Отметка о согласовании	Примечание
1				
2				
3				
4				

Условные обозначения элементов обустройства дороги


Обозначения	Наименование
	светофор транспортный на прямой опоре
	светофор транспортный на растяжке
	светофор транспортный на консольной опоре
	светофор пешеходный на прямой опоре
	дорожное ограждение металлическое существующее
	дорожное ограждение металлическое проектируемое
	пешеходное ограждение существующее
	пешеходное ограждение проектируемое
	мост, путепровод
	водопропускная труба
	проектируемый столб освещения
	существующий столб освещения
	железнодорожный переезд

Обозначения	Наименование
	проектируемый дорожный знак
	существующий дорожный знак
	демонтируемый дорожный знак
	железнодорожный светофор
	существующий тротуар (пешеходная дорожка)
	проектируемый тротуар (пешеходная дорожка)
	искусственная дорожная неровность
	проектируемые сигнальные столбики
	существующие сигнальные столбики
	бортовой камень (бордюр)

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Шевченко, 1б до жилого дома по ул. Шевченко, 26

1-й участок: км 0+000 - км 0+610
2-й участок: км 0+000 - км 0+110

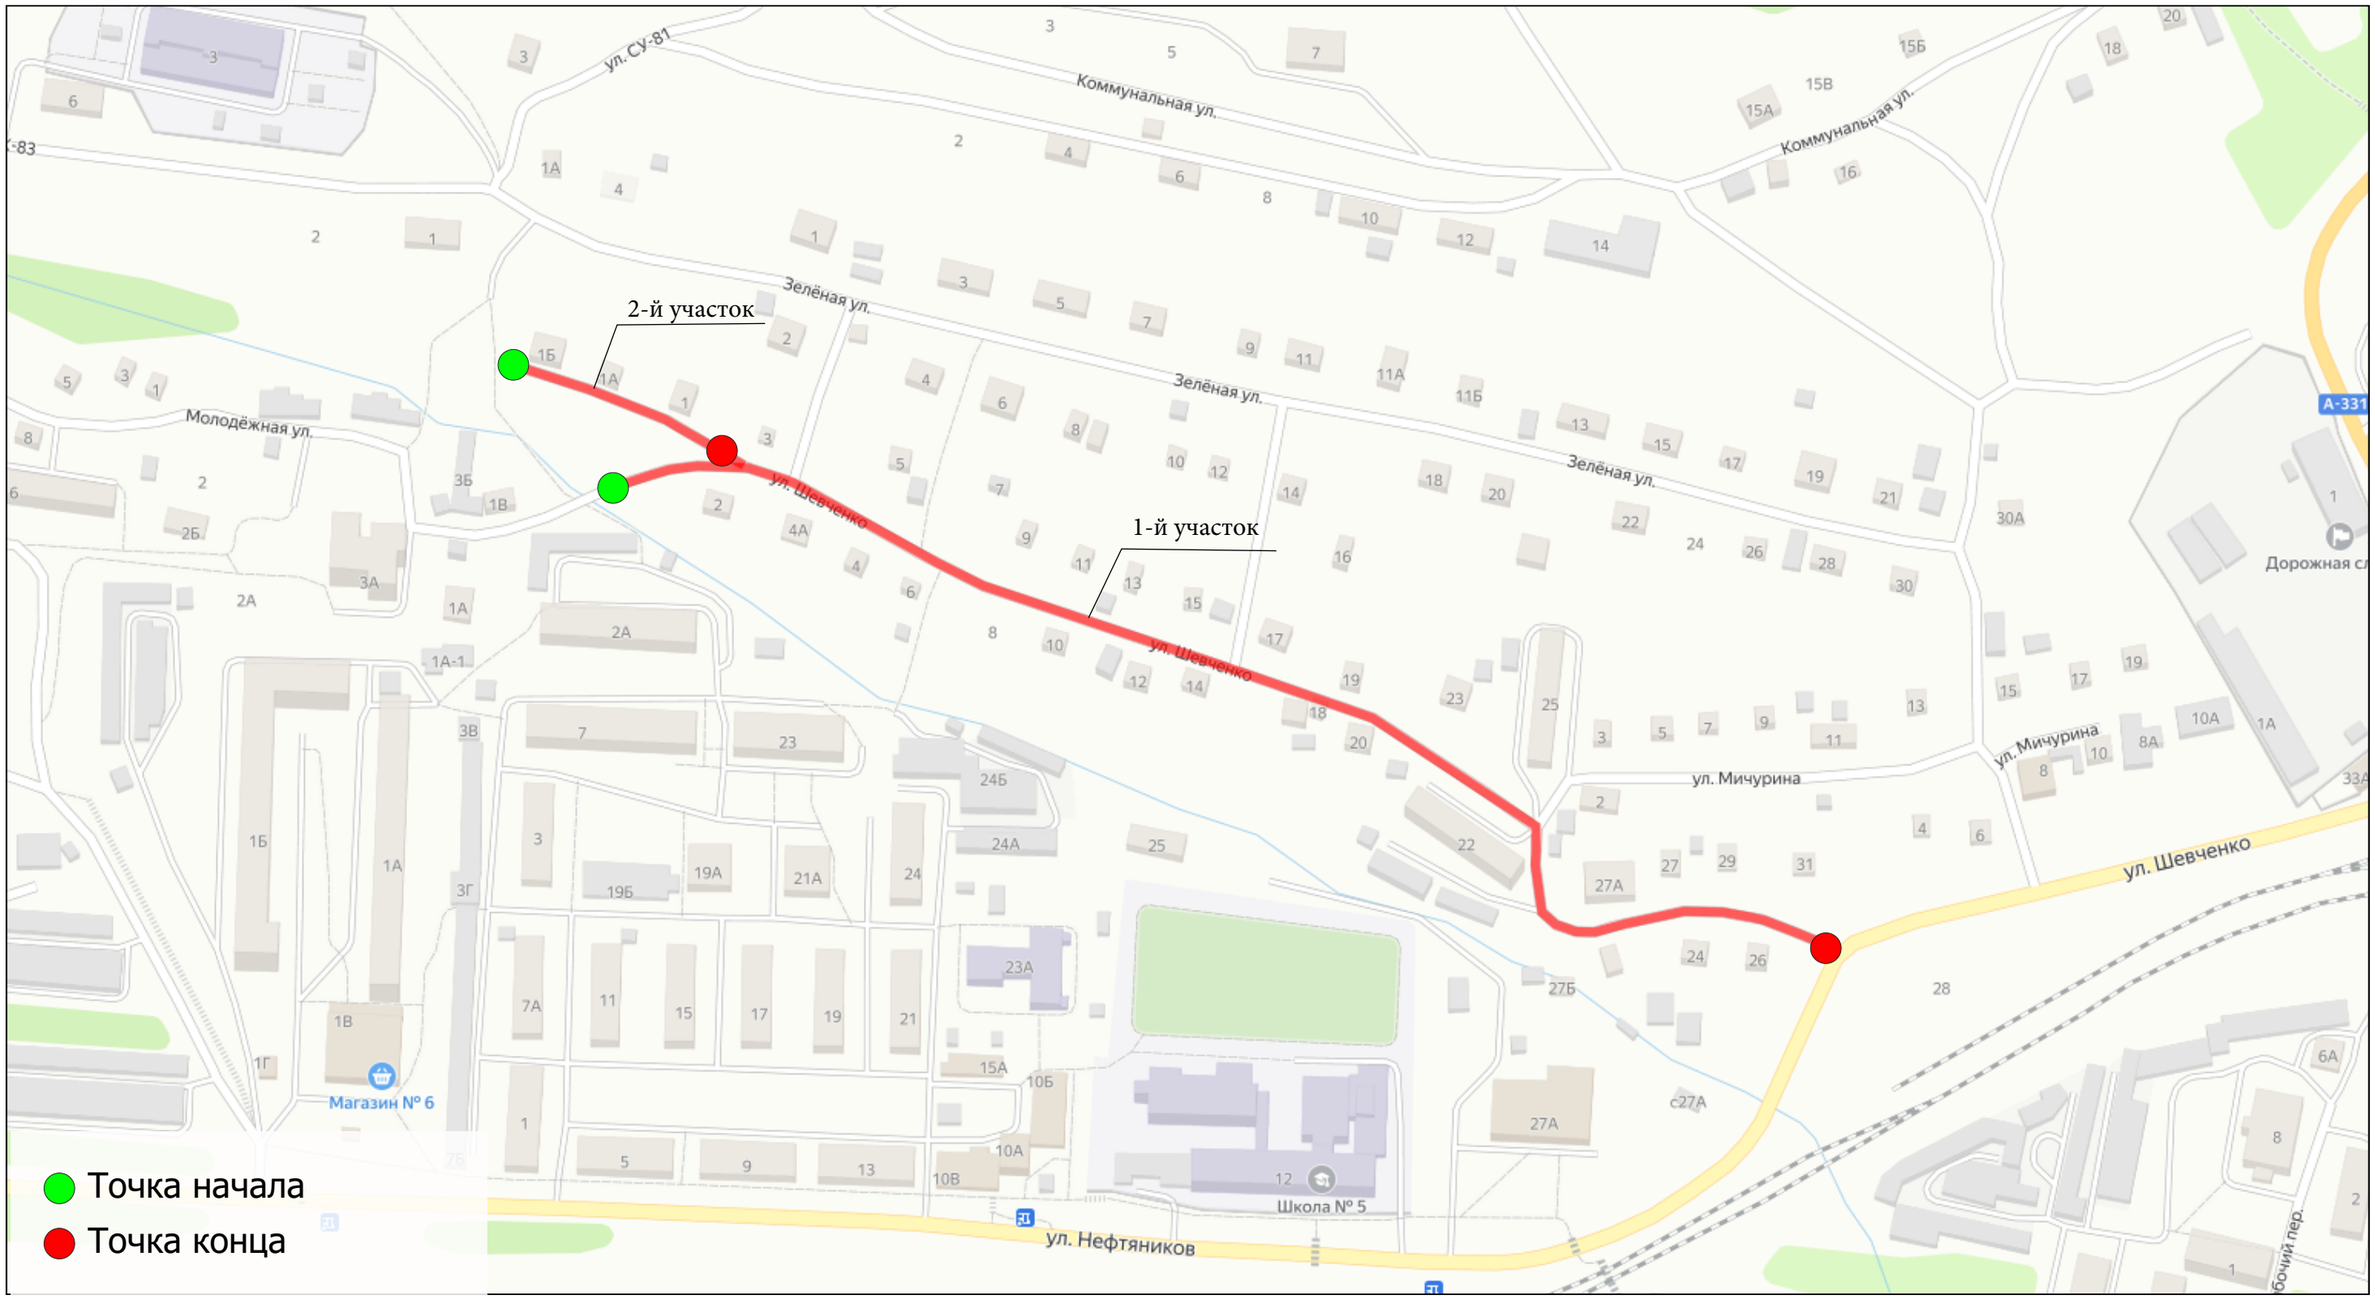

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0; 4; 30; R=1556м; 130; 51; 226; 40; R=6810м; 468; 75; 490; 75; R=4298м; 568
Кривые в плане	13; R=683м P=9; a=43°; 76; 156; R=672м P=47; a=8°; 223; 335; R=610м P=17; a=20°; 374; 418; R=648м P=11; a=34°; 442; 461; R=627м P=4; a=87°; 502; 522; R=602м P=13; a=26°; 568
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0; 3,20; 110; 5,00; 300; 3,50

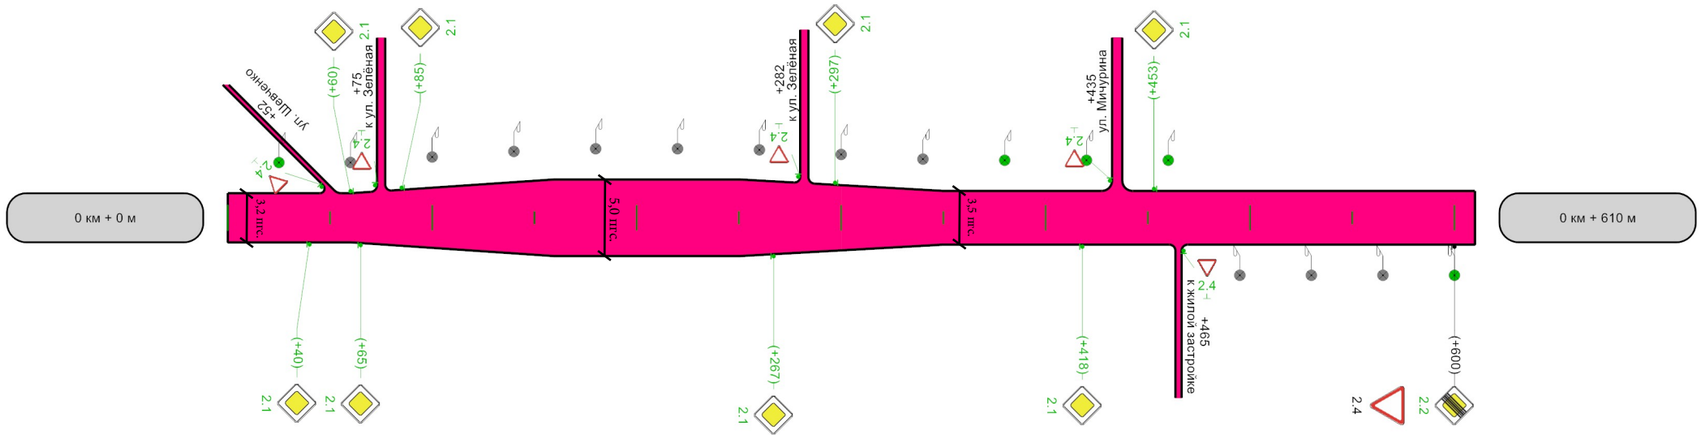

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+060	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+065	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+085	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога			0+267	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога			0+297	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога			0+418	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога			0+453	Требуется установить	1	слева
9	2.2	Конец главной дороги			0+600	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+600	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**9**	
		Итого:					**10**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**9**	
		Всего:					**10**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+025	0+025	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+060	0+300	Населенный пункт	7/7	0	240	Слева
3	0+340	0+340	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+380	0+460	Населенный пункт	3/3	80	0	Слева
5	0+495	0+565	Населенный пункт	3/3	0	70	Справа
6	0+600	0+600	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**16/16**	**80**	**310**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	62
Кривые в плане	15 R=696м P=23; a=17° 103
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

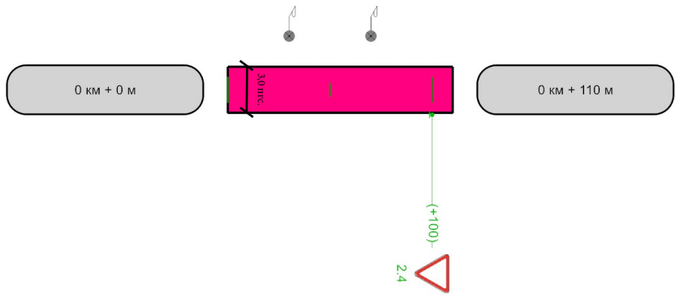

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+100	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+030	0+070	Населенный пункт	2/2	0	40	Слева
Итого:				**2/2**	**0**	**40**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автодороги ул. Пушкина до земельного участка по ул. Винейская, 7
км 0+000 - км 0+474

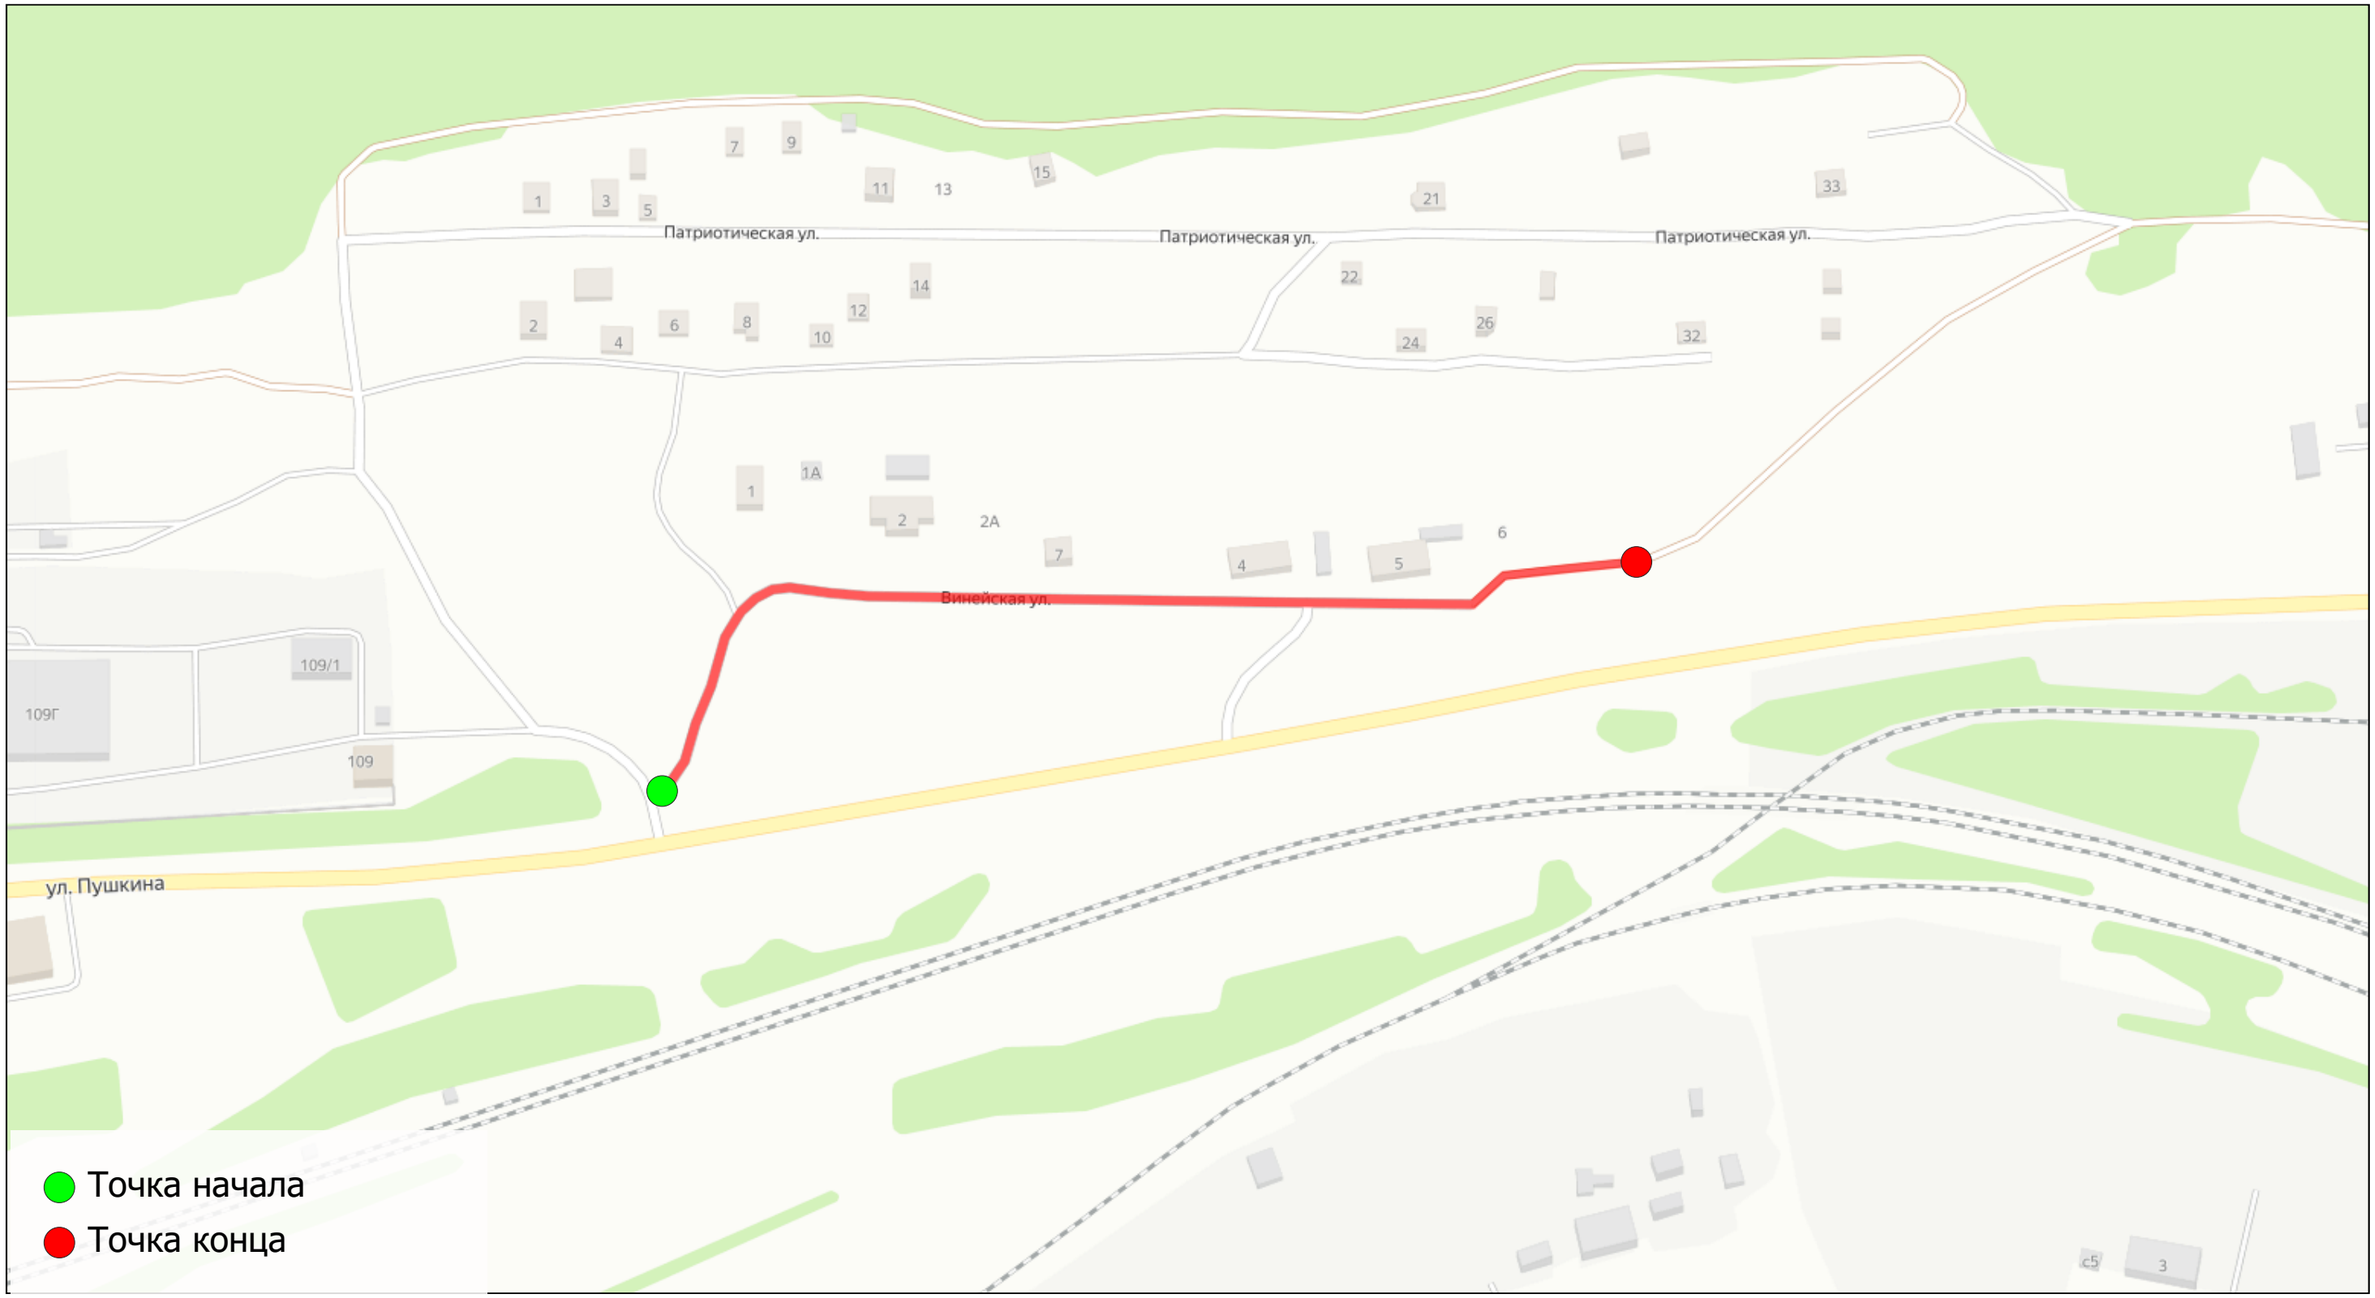

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	86 · 5 · R=2050м · 38 · 258 · 38 · 279 · R=7111м · 21 · 399
Кривые в плане	R=612м P=2; a=183° · 40 · 61 · R=644м P=5; a=73° · 118 · 341 · R=668м P=31; a=12° · 399
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

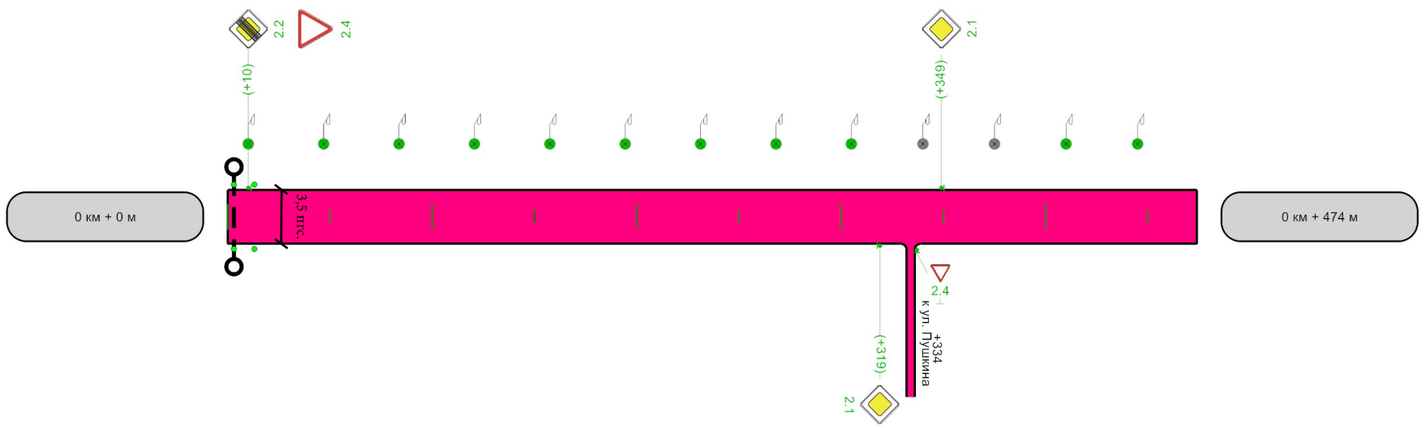

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+319	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+349	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+003	0+013	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+003	0+013	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+305	Населенный пункт	9/9	295	0	Слева
2	0+340	0+375	Населенный пункт	2/2	0	35	Слева
3	0+410	0+445	Населенный пункт	2/2	35	0	Слева
Итого:				**13/13**	**330**	**35**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от автодороги ул. Якуримская до нежилого здания по ул. Заречная, стр. 20

1-й участок: км 0+000 - км 0+740
2-й участок: км 0+000 - км 0+372
3-й участок: км 0+000 - км 0+281

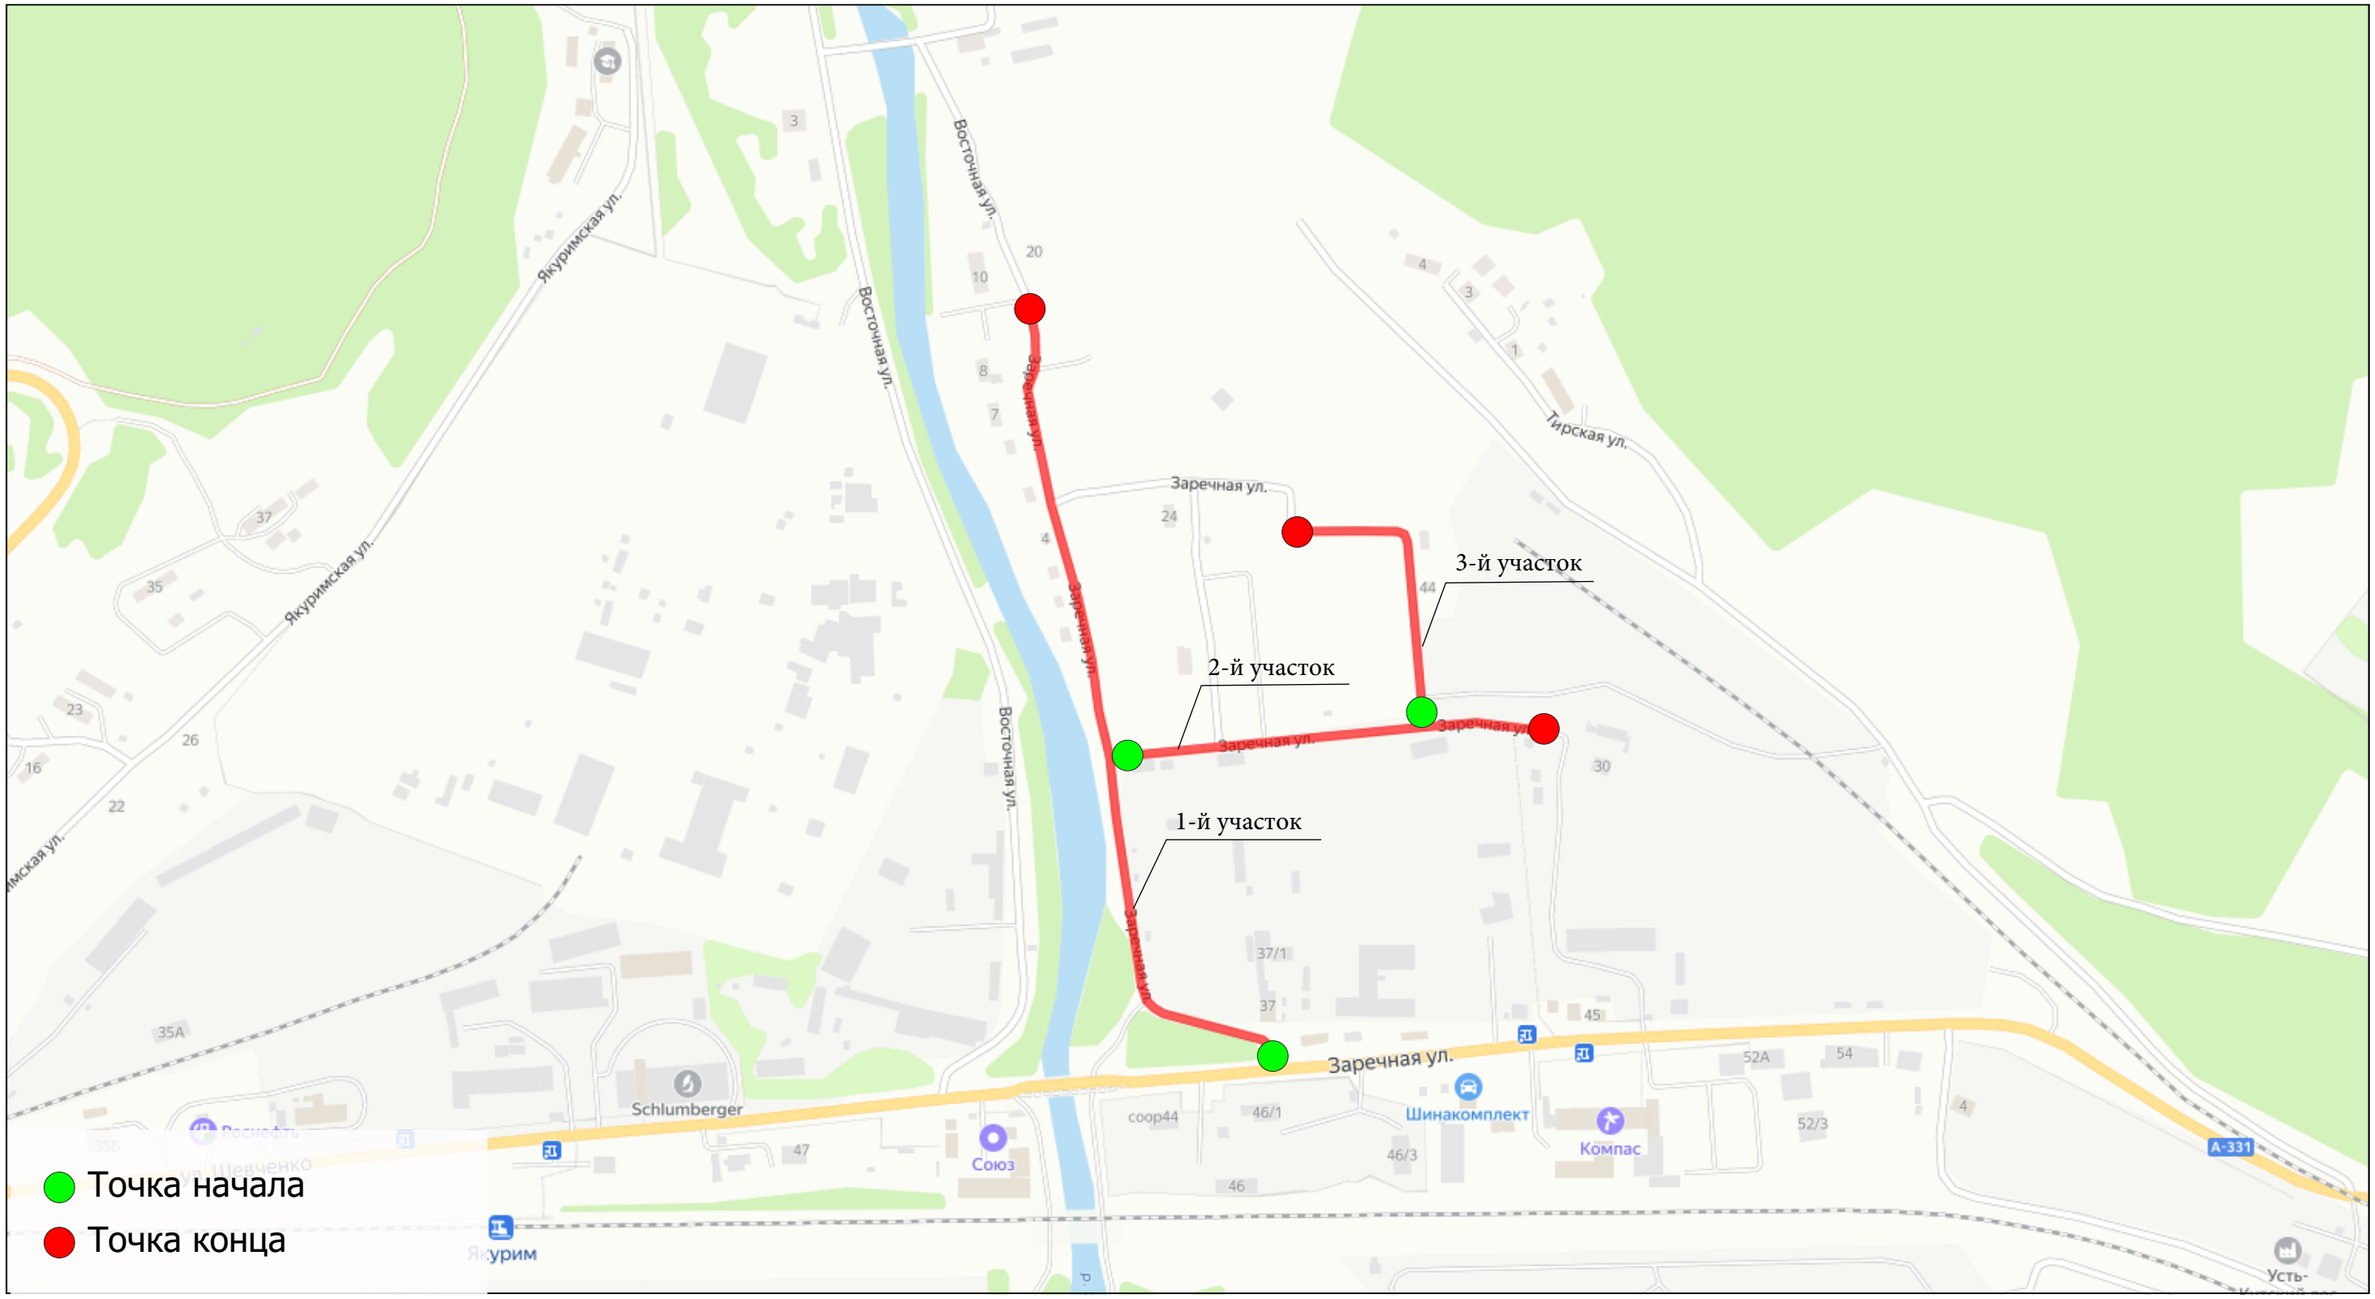

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 21 2 R=6943м 224 11
Кривые в плане	R=632м P=3; a=116° 67 83 R=676м P=6; a=67° 172 621 R=620м P=15; a=23° 670 R=693м P=9; a=42°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00-0,25 20 6,50

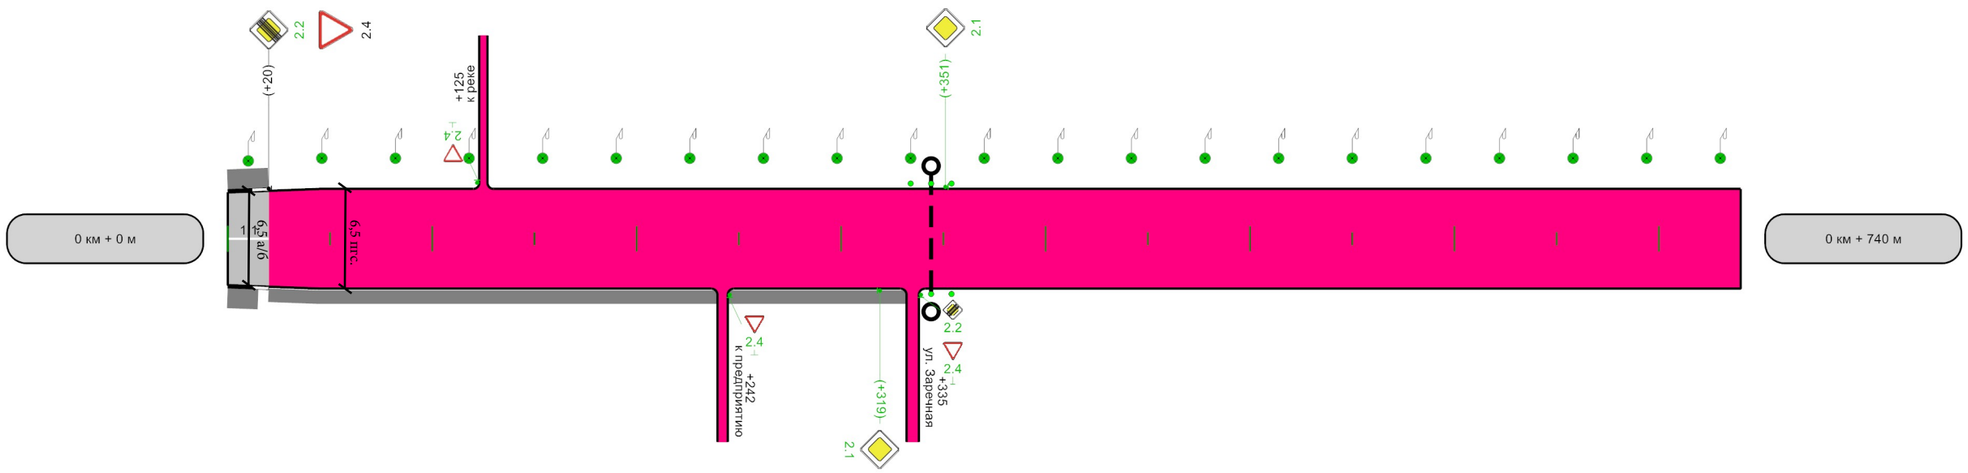

осевая	1.1 0 - 20		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа		ширина 1м, бет, 20 - 240	ширина 1м, бет, 244 - 332

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	
Ширина, м	0.10	
1	2	3
0 - 1	20,000	2,000
ИТОГО	20,000	2,000
ЛИН.КМ	0,020	
ПРИВЕД.КМ	0,020	
ПЛОЩАДЬ	2,000	2,000

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+319	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+351	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+020	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+020	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+334	0+354	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+344	0+354	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**30/5**					

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+730	Населенный пункт	21/21	720	0	Слева
Итого:				**21/21**	**720**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+015	Жилая застройка	Справа		15
2	0+000	0+020	Жилая застройка	Слева		20
3	0+020	0+240	Жилая застройка	Справа		220
4	0+244	0+332	Жилая застройка	Справа		88
Итого:					**0**	**343**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	5
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

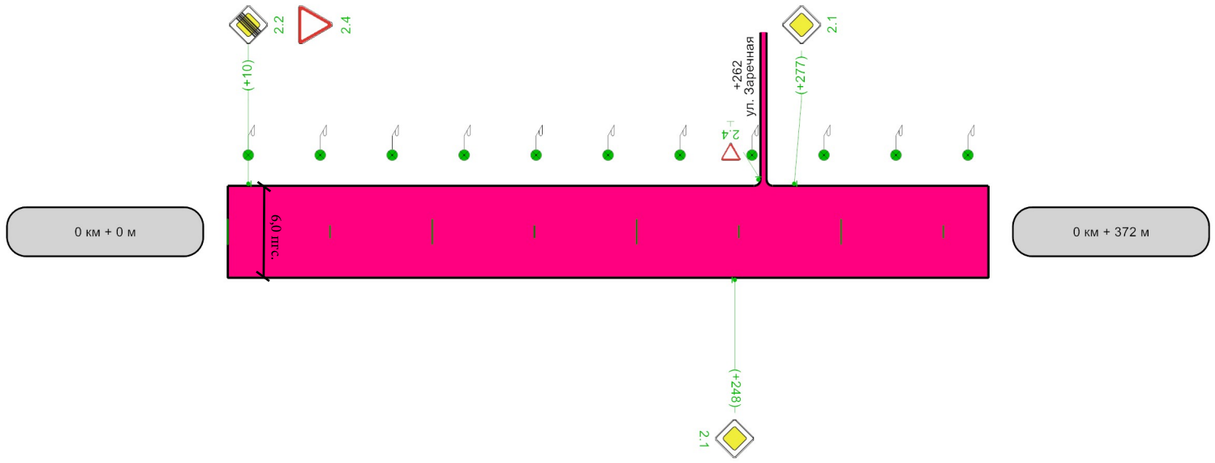

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+248	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+277	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+362	Населенный пункт	11/11	352	0	Слева
Итого:				**11/11**	**352**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 1 19 2 R=7881м 143
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 3,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+271	Населенный пункт	8/8	261	0	Слева
Итого:				**8/8**	**261**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Радищева, д. 2 до жилого дома по ул. Радищева, д. 71


1-й участок: км 0+000 - км 1+093
2-й участок: км 0+000 - км 0+471

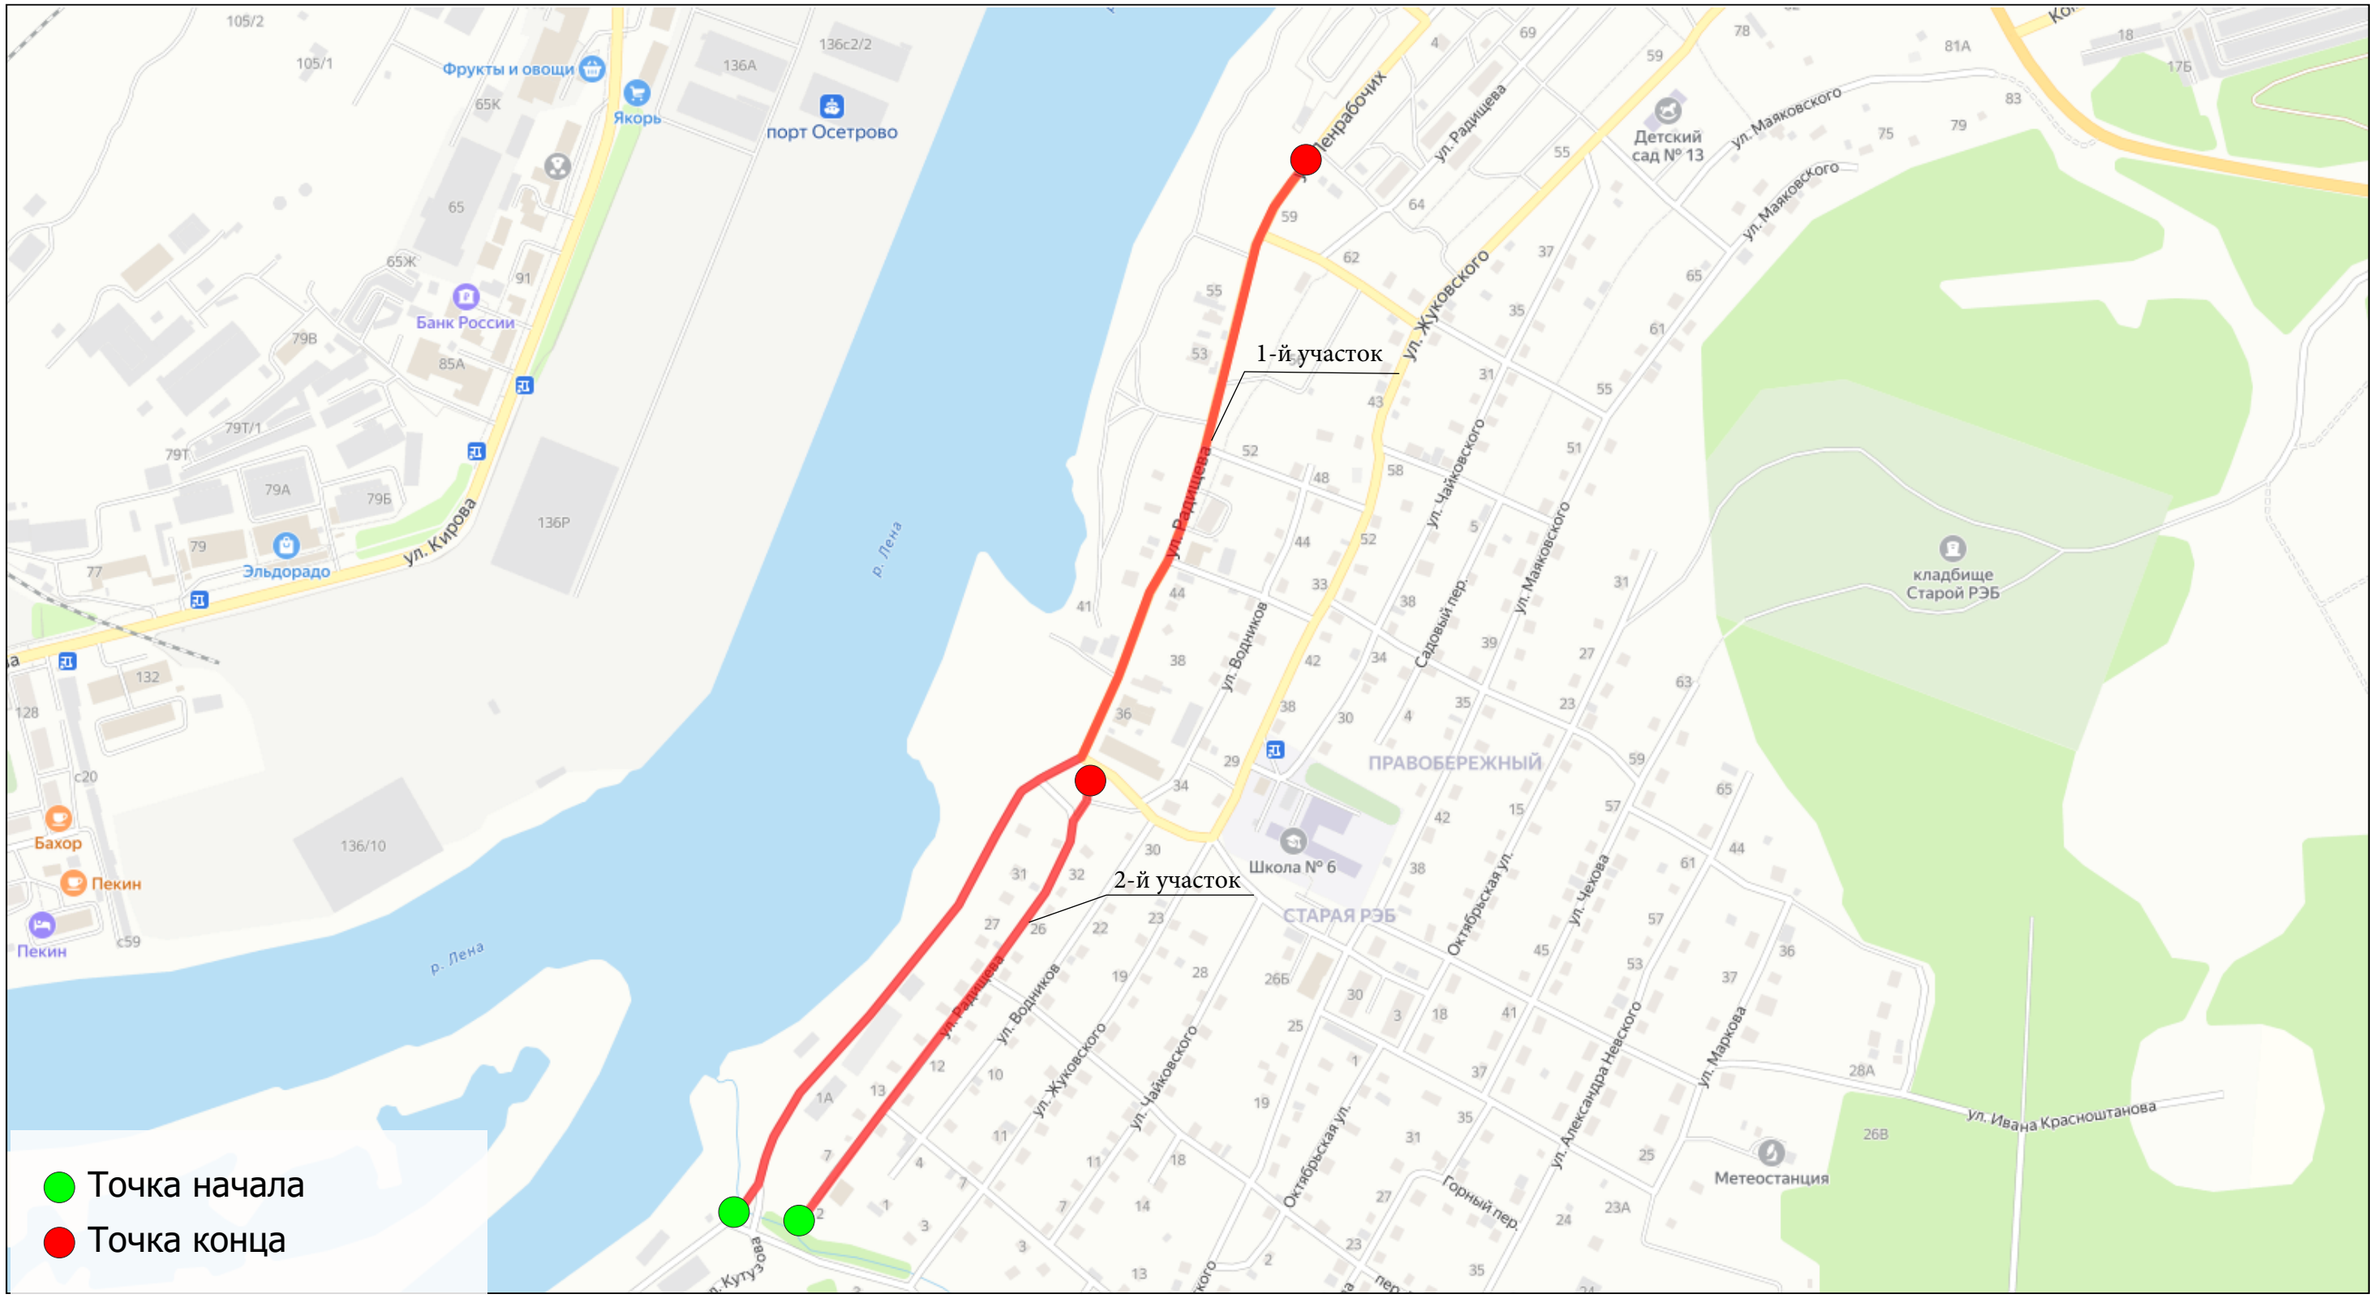

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Радищева, д. 2 до жилого дома по ул. Радищева, д. 71 уч. №1


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 2 13 R=9049м 148 3 10 356 R=4236м 519 28 541 28 R=7659м 850 12 872 12 R=5938м
Кривые в плане	R=694м P=16; a=24° 40 65 R=664м P=19; a=21° 160 181 R=602м P=74; a=5° 222 270 R=612м P=31; a=11° 372 440 R=691м P=12; a=33° 492 514 R=653м P=11; a=33° 545 712 R=610м P=62; a=6° 762 972 R=640м P=13; a=28°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00 4,50 22 7,00 4,50 492 7,00

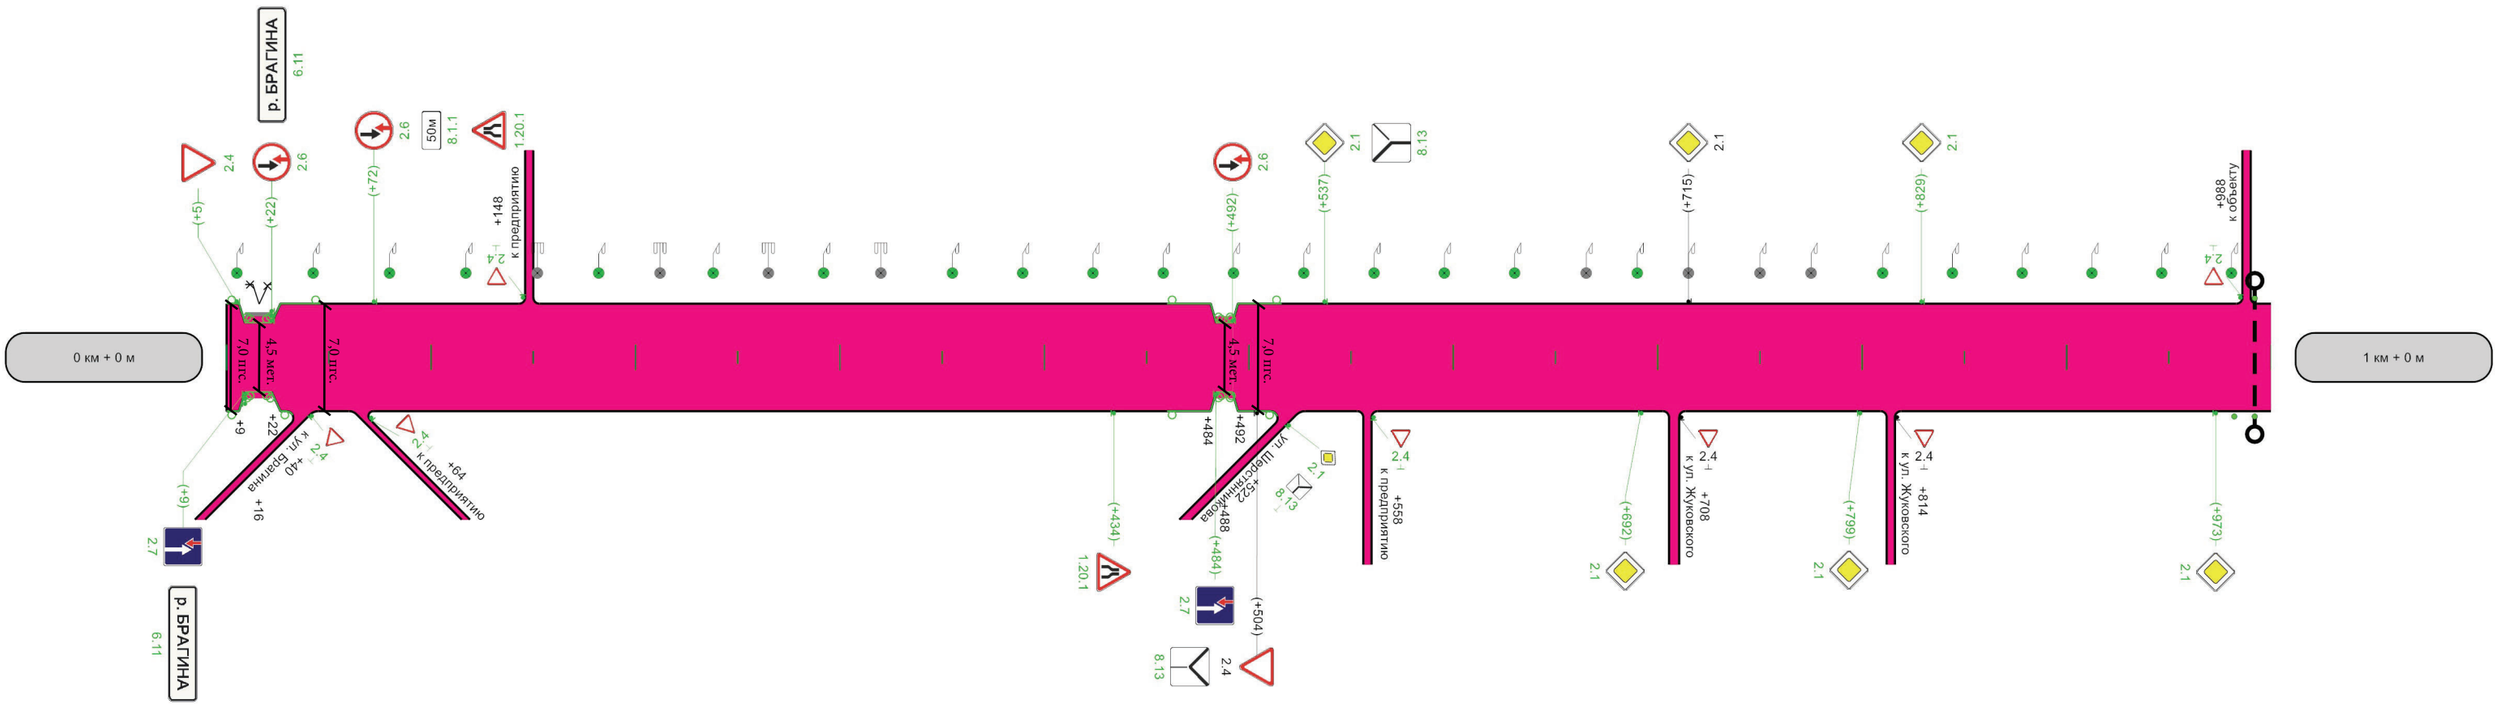


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	12 R=5938м
Кривые в плане	R=640м P=13; a=28°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,00

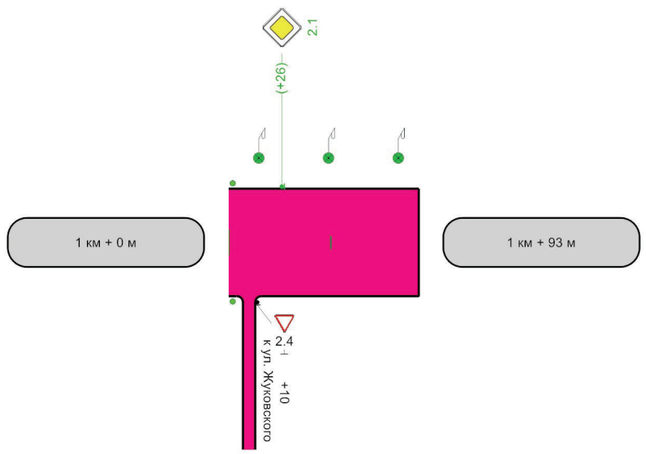

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

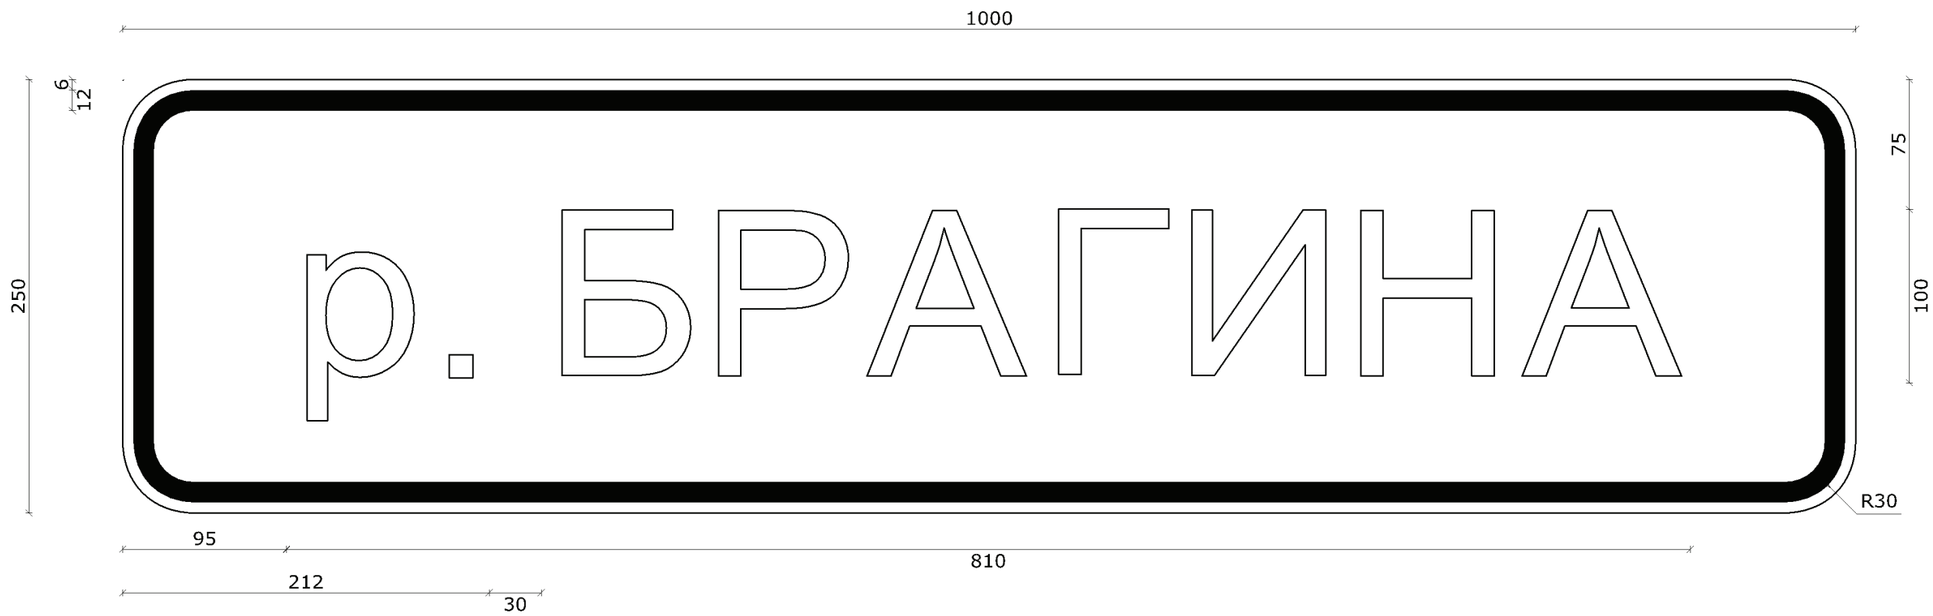

Номер знака: 6.11. "Наименование объекта"
Площадь: 0,25 кв. м
Количество: 1 шт.
Местоположение: км 0+009, Справа; км 0+022, Слева
Дорога: Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Радищева, д. 2 до жилого дома по ул. Радищева, д. 71 уч. №1
Фон знака: белый
Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)



Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004
Размеры надписей даны по границам слов (символов)

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.20.1	Сужение дороги			0+072	Требуется установить	1	слева
2	1.20.1	Сужение дороги			0+434	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога			0+537	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+692	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+715	Установлено	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+799	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+829	Требуется установить	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+973	Требуется установить	1	справа
9	2.1	Главная дорога			1+026	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+504	Установлено	1	справа
12	2.6	Преимущество встречного движения			0+022	Требуется установить	1	слева
13	2.6	Преимущество встречного движения			0+072	Требуется установить	1	слева
14	2.6	Преимущество встречного движения			0+492	Требуется установить	1	слева
15	2.7	Преимущество перед встречным движением			0+009	Требуется установить	1	справа
16	2.7	Преимущество перед встречным движением			0+484	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**14**	
		Информационные знаки						
17	6.11	Наименование объекта		0,25	0+009	Требуется установить	1	справа
18	6.11	Наименование объекта		0,25	0+022	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
19	8.1.1	Расстояние до объекта			0+072	Требуется установить	1	слева
20	8.13	Направление главной дороги			0+537	Требуется установить	1	слева
21	8.13	Направление главной дороги			0+504	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					2	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					19	
		Всего:					21	

Ведомость размещения дорожного ограждения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+000	0+009	9			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
2	0+000	0+009	9			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
3	0+009	0+022	13			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
4	0+009	0+022	13			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
5	0+022	0+033	11			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
6	0+022	0+046	24			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
7	0+460	0+484	24			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста
8	0+460	0+484	24			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в начале моста

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	0+484	0+492	8			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
10	0+484	0+492	8			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Мост или путепровод
11	0+492	0+515	23			Справа	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
12	0+492	0+516	24			Слева	Одностороннее металлическое на металлических стойках	У - 1	0,80	Подход в конце моста
Итого:			**190**							

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+982	1+002	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+992	1+002	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**30/5**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+117	Населенный пункт	4/4	112	0	Слева
2	0+152	0+152	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
3	0+182	0+182	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+212	0+212	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
5	0+238	0+238	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
6	0+265	0+265	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
7	0+292	0+292	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
8	0+320	0+320	Населенный пункт	1/2	0	0	Слева
9	0+355	0+630	Населенный пункт	9/9	275	0	Слева
10	0+665	0+665	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
11	0+690	0+690	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
12	0+715	0+715	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
13	0+750	0+775	Населенный пункт	2/2	0	25	Слева

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	0+810	1+083	Населенный пункт	9/9	273	0	Слева
Итого:				**34/38**	**660**	**25**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+009	0+022		13			Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Мост или путепровод
Итого:				**13**							

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+009	0+022		Слева		13
Итого:					**0**	**13**

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8 — 17 (193) — R=3378м — 83 (414 426)
Кривые в плане	311 — R=689м P=21; α=19° — 406
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50 | 3,00

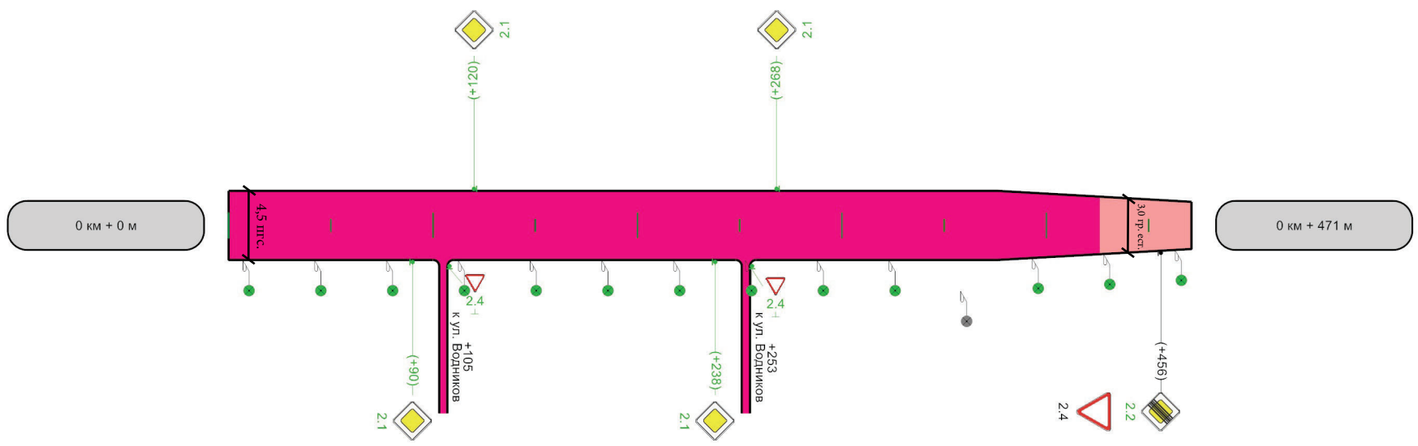

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+120	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+238	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+268	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+456	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+456	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+326	Населенный пункт	10/10	316	0	Справа
2	0+361	0+361	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+396	0+466	Населенный пункт	3/3	70	0	Справа
Итого:				**14/14**	**386**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от строения № 2д по ул. Щорса (здание котельной) до автодороги пер. Энергетический км 0+000 - км 1+095

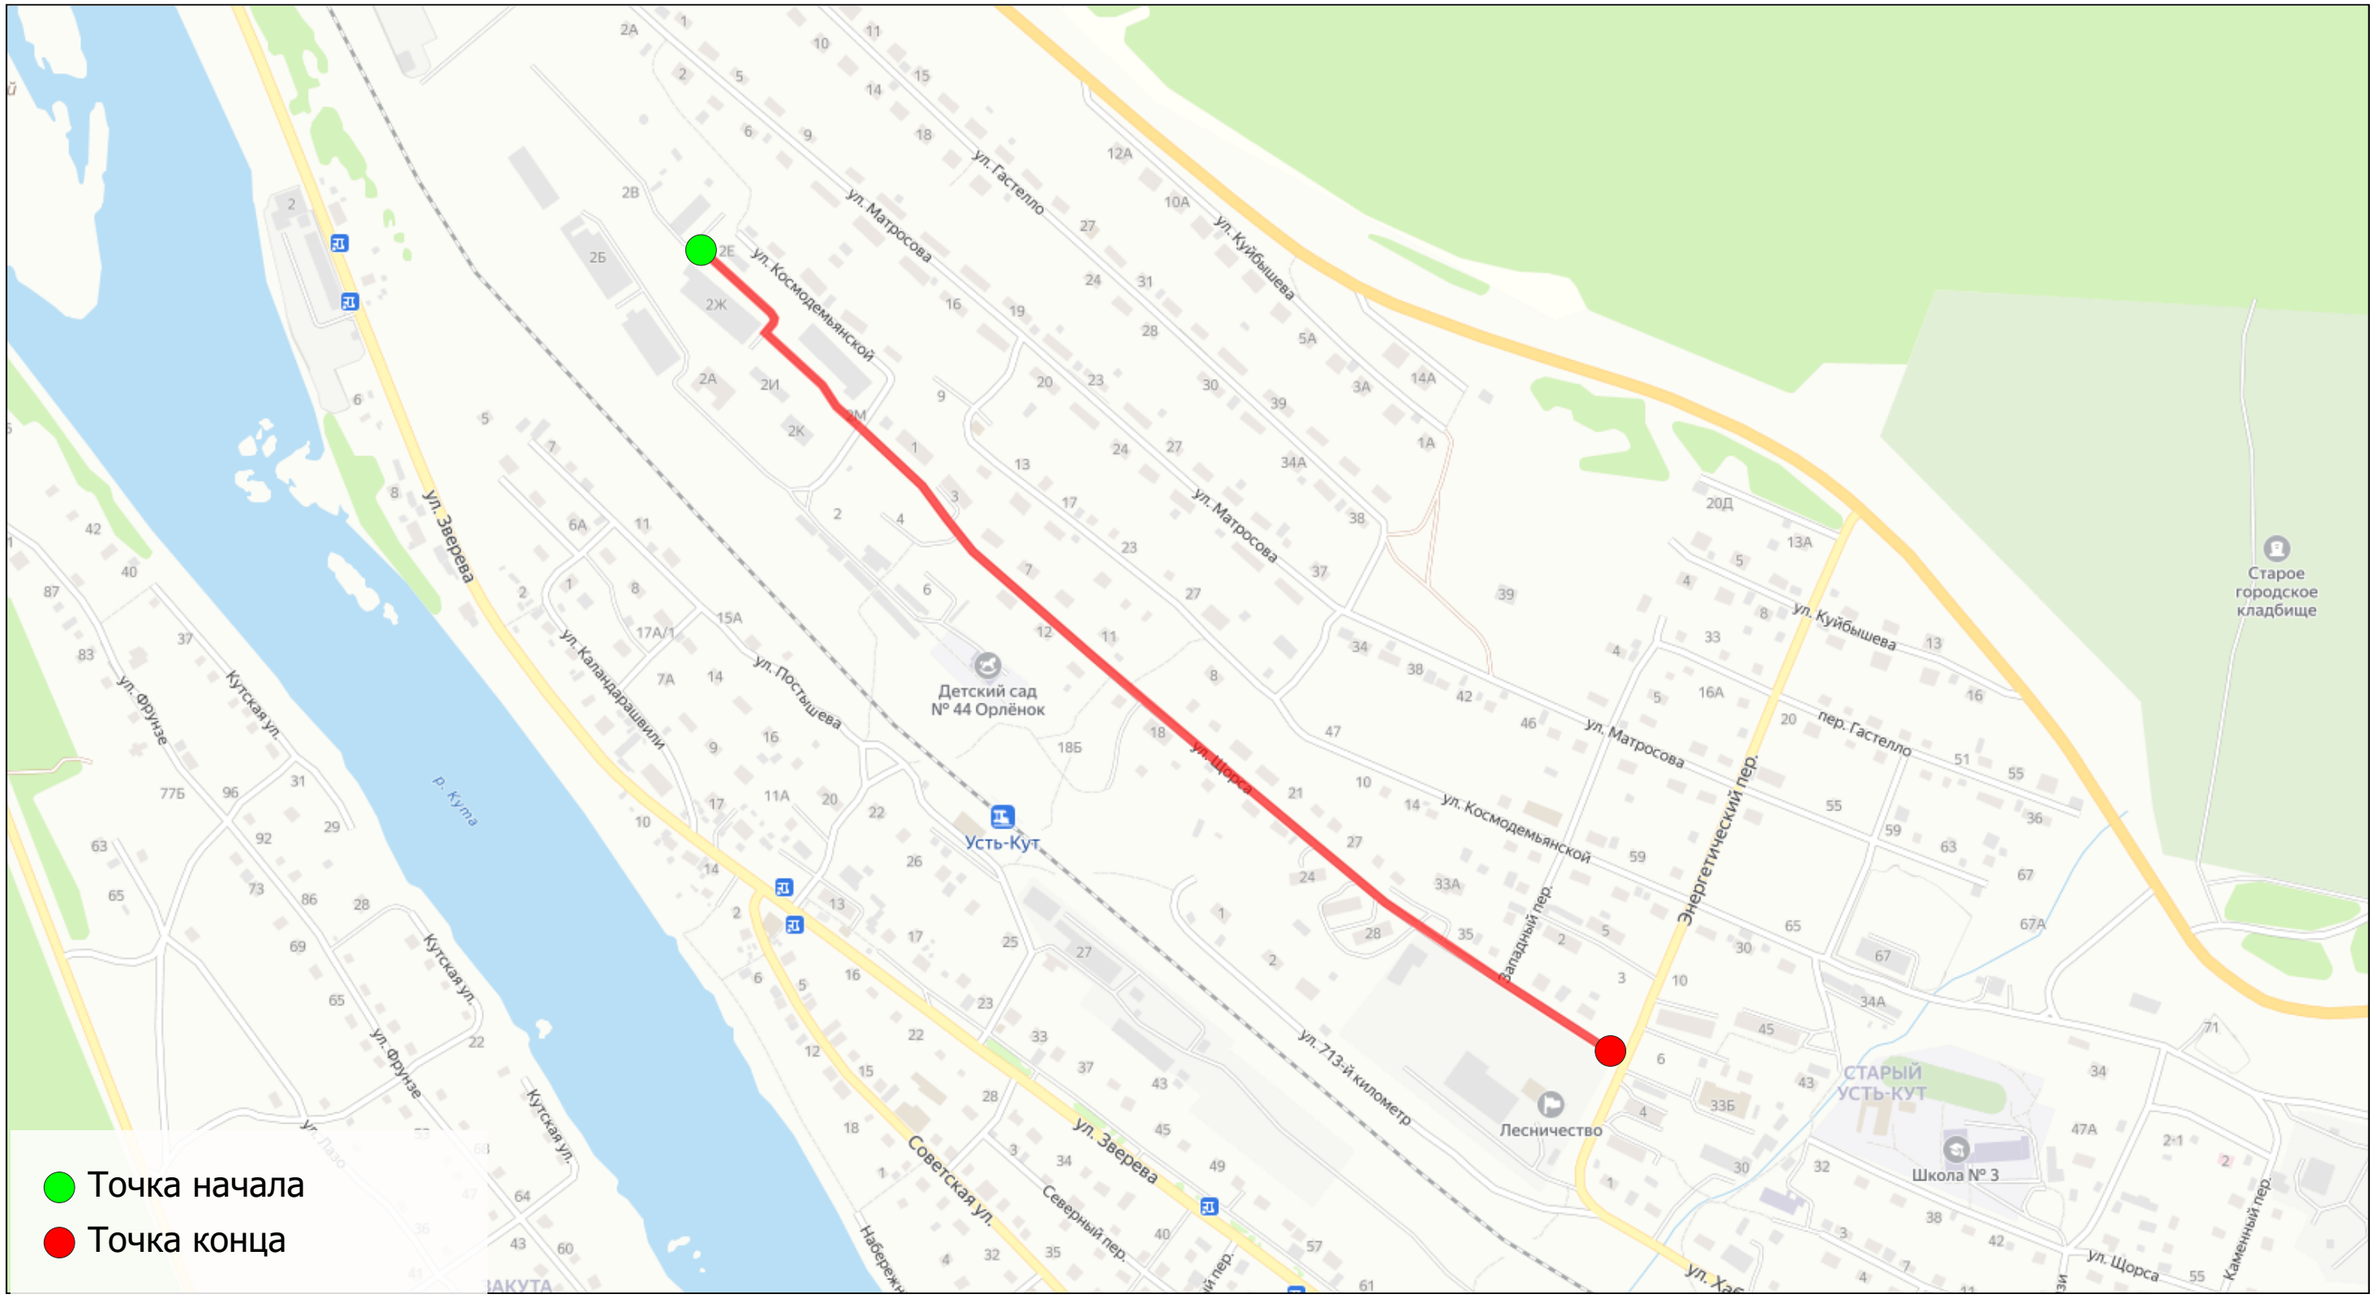

М 1:3000

Автомобильная дорога от строения № 2д по ул. Щорса (здание котельной) до автодороги пер. Энергетический


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	7 38 R=9531м 10 202 10 223 R=3613м 21 336 12 562 R=8114м 4 695 10 843 R=8266м
Кривые в плане	R=654м P=48; a=8° 35 R=616м P=17; a=21° 68 110 135 R=628м P=30; a=12 161 188 R=654м P=55; a=7 218 265 R=691м P=37; a=11° 319 340 R=614м P=23; a=15° 396 810 R=919м P=81; a=6° 914
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,50

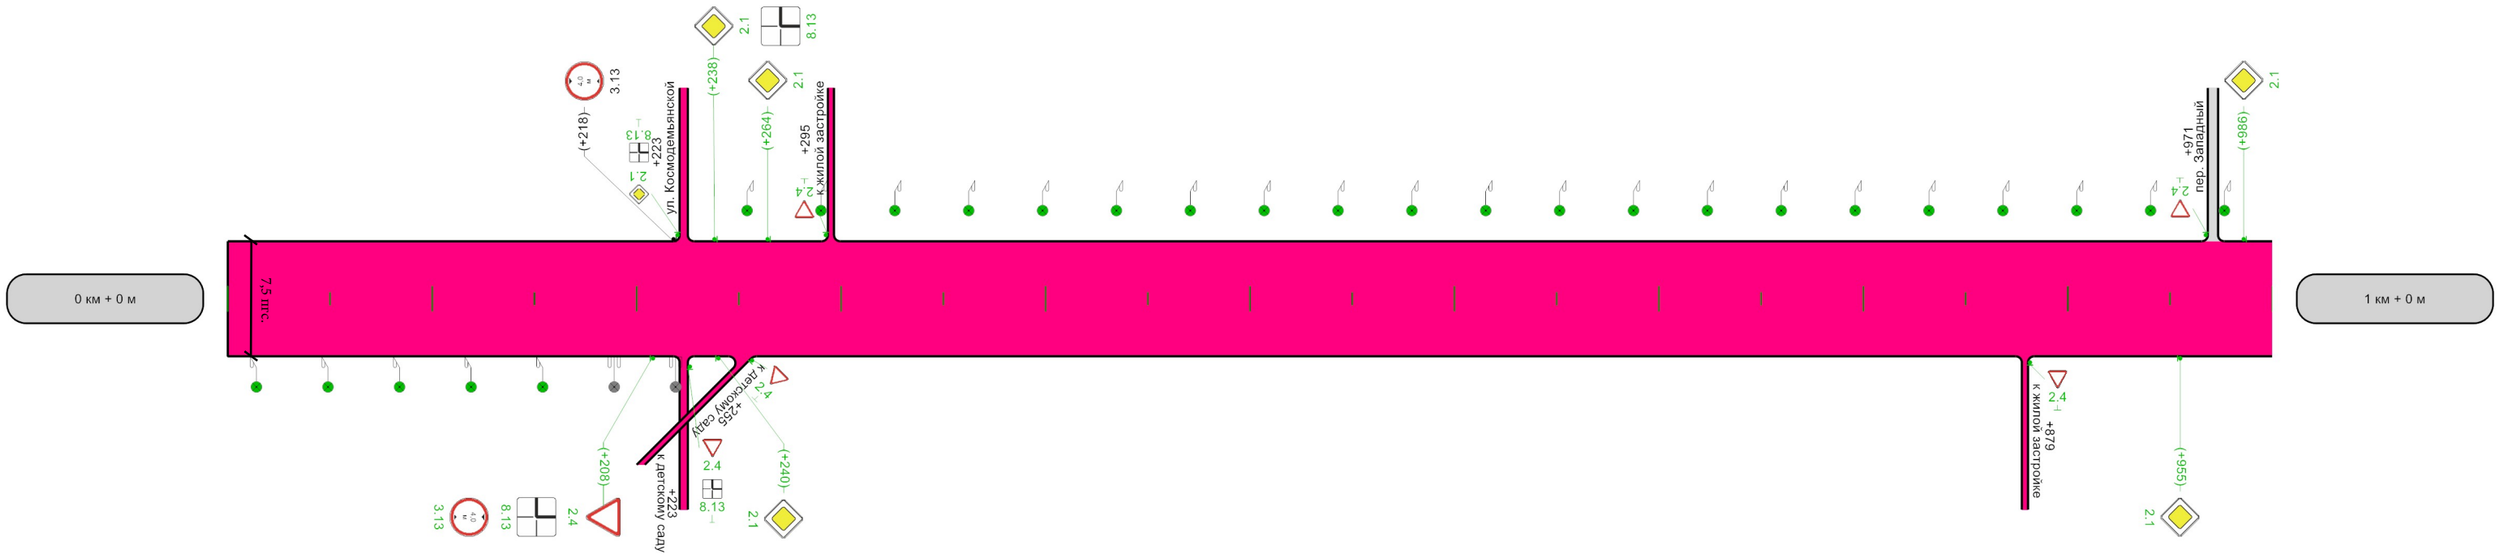

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 R=8266м
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	7,50

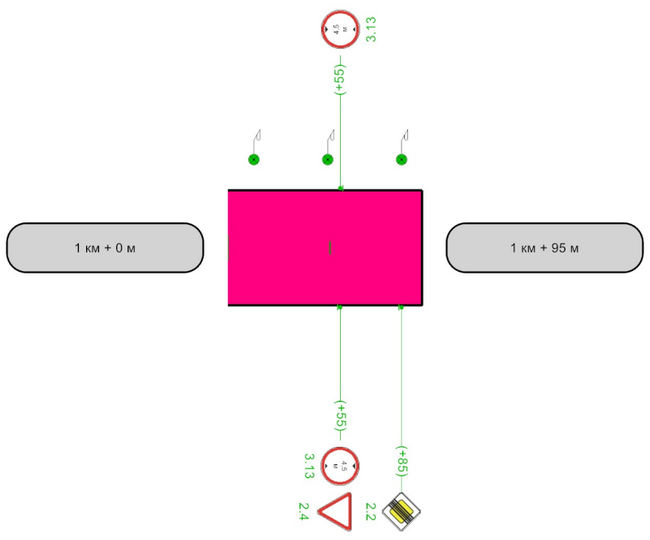

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+238	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+240	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+264	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+955	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+986	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			1+085	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+208	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			1+085	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
9	3.13	Ограничение высоты			0+208	Требуется установить	1	справа
10	3.13	Ограничение высоты			0+218	Установлено	1	слева
11	3.13	Ограничение высоты			1+055	Требуется установить	1	слева
12	3.13	Ограничение высоты			1+055	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
13	8.13	Направление главной дороги			0+208	Требуется установить	1	справа
14	8.13	Направление главной дороги			0+238	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+014	0+154	Населенный пункт	5/5	140	0	Справа
2	0+189	0+219	Населенный пункт	2/4	0	30	Справа
3	0+254	1+085	Населенный пункт	24/24	831	0	Слева
Итого:				**31/33**	**971**	**30**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Речников, д. 3 до выезда на автодорогу ул. Речников км 0+000 - км 1+617

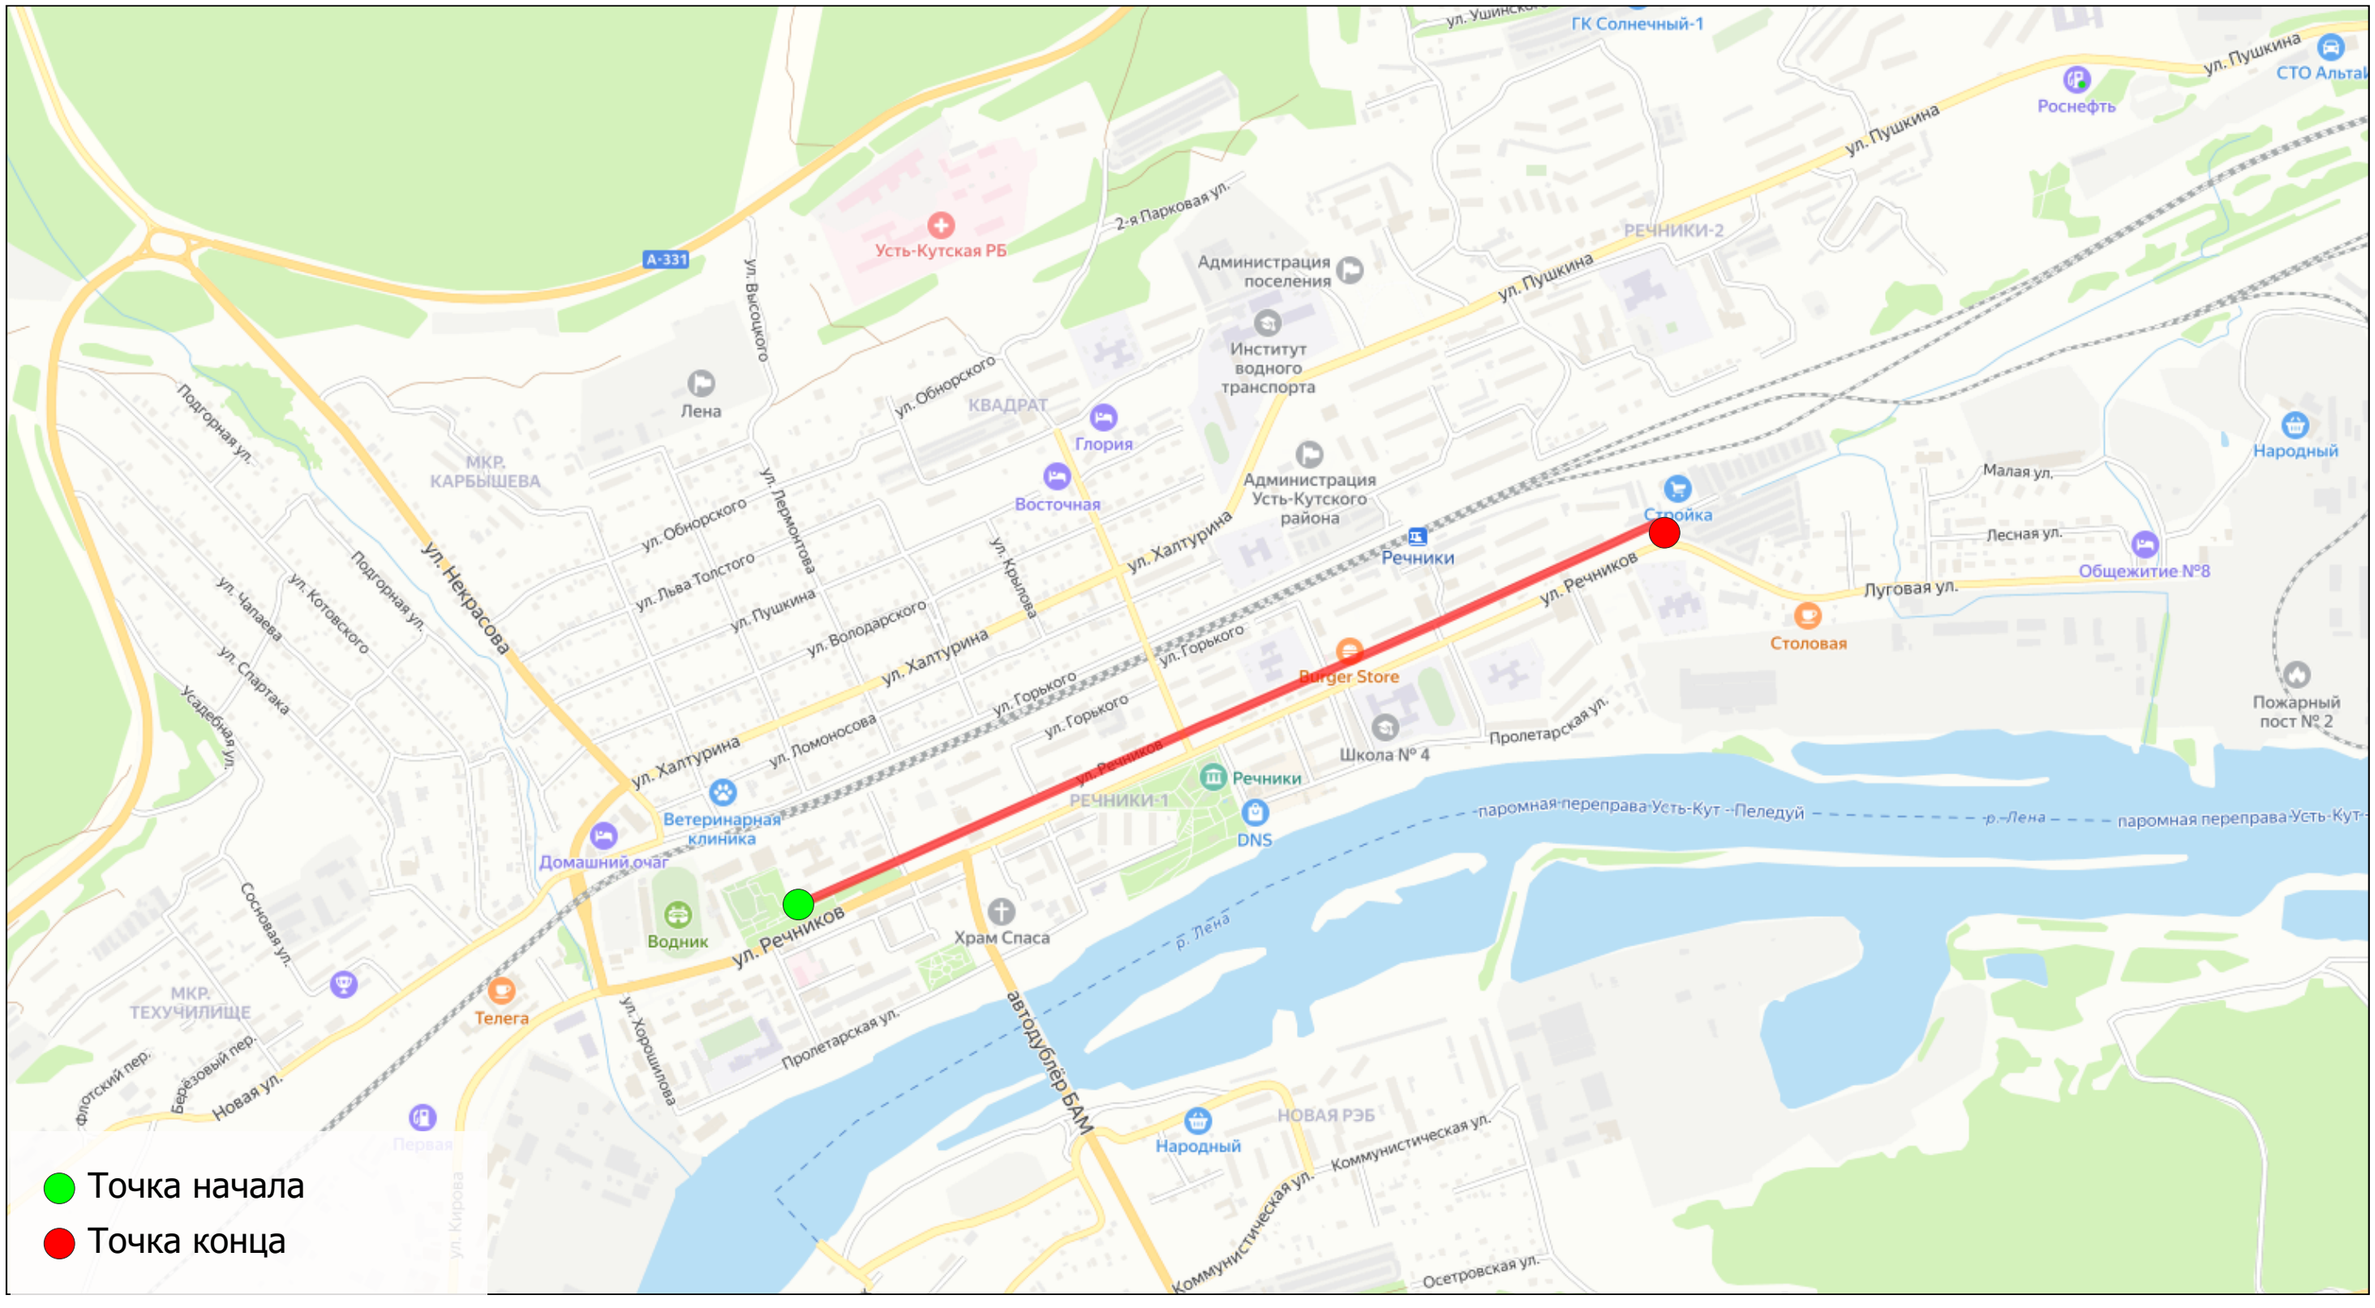


М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Речников, д. 3 до выезда на автодорогу ул. Речников

| | | |

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	8
Кривые в плане	572 586 606
Тротуары слева	ширина 3,2м, а/б, 0 - 62 / ширина 3,2м, а/б, 65 - 153 / ширина 3,2м, а/б, 193 - 301 / ширина 3,2м, а/б, 305 - 400 / ширина 3,2м, а/б, 404 - 500
Характеристики проезжей части	4,00 / 6,00 / 6,00 / 7,00

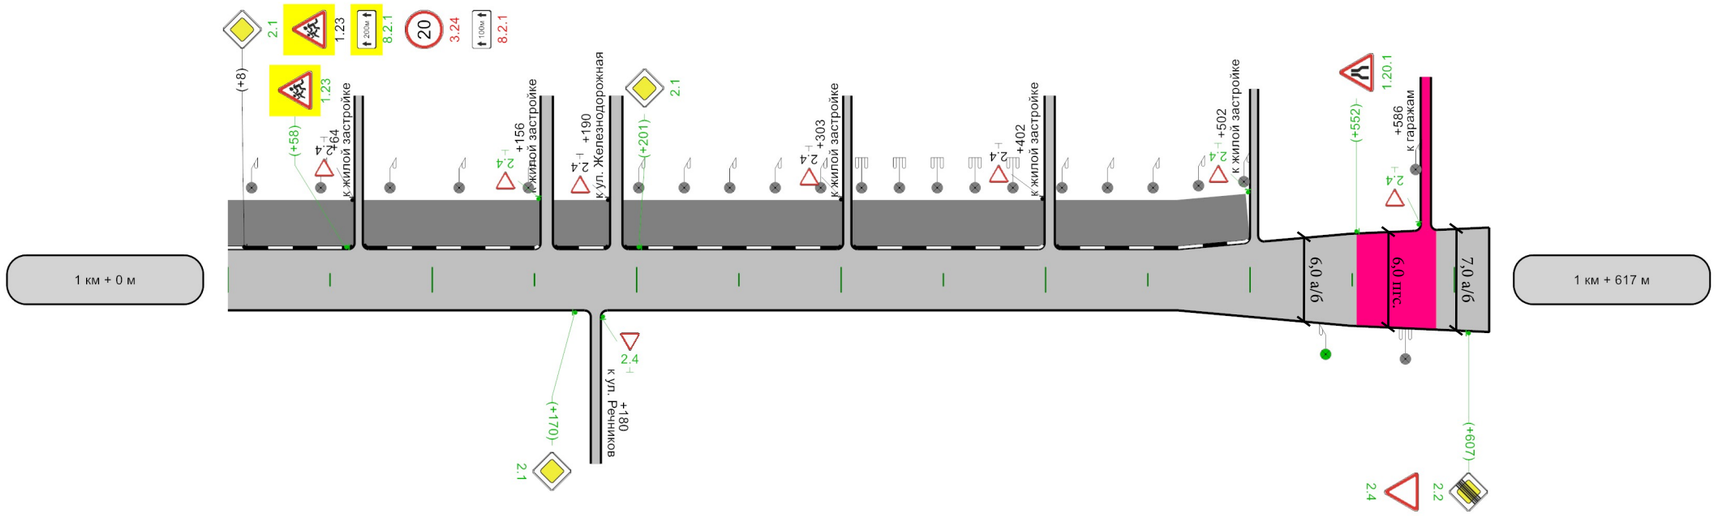

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	1.14.1(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	16.000	0.160	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	4.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	60,000	1212,000	485,000	149,000	180,000	44,000	4,000	8,000	**167,128**
1 - 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
ИТОГО	**60,000**	**1212,000**	**485,000**	**149,000**	**180,000**	**44,000**	**4,000**	**8,000**	**167,128**
ЛИН.КМ	**0,060**	**1,212**	**0,485**	**0,149**	**0,180**	**0,044**	**0,004**	**0,008**	
ПРИВЕД.КМ	**0,060**	**1,212**	**0,121**	**0,112**	**0,090**	**0,011**	**0,064**	**0,001**	
ПЛОЩАДЬ	**6,000**	**121,200**	**12,125**	**11,175**	**9,000**	**1,100**	**6,400**	**0,128**	**167,128**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+822	Требуется установить	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+965	Требуется установить	1	слева
3	1.20.1	Сужение дороги			0+667	Требуется установить	1	справа
4	1.20.1	Сужение дороги			1+552	Требуется установить	1	слева
5	1.22	Пешеходный переход			0+822	Требуется установить	1	справа
6	1.22	Пешеходный переход			0+965	Требуется установить	1	слева
7	1.23	Дети			0+773	Требуется установить	1	справа
8	1.23	Дети			0+822	Установлено	1	справа
9	1.23	Дети			1+008	Установлено	1	слева
10	1.23	Дети			1+058	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**10**	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога			0+176	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+209	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+965	Требуется установить	1	справа
14	2.1	Главная дорога			1+008	Требуется установить	1	слева
15	2.1	Главная дорога			1+170	Требуется установить	1	справа

16	2.1	Главная дорога			1+201	Требуется установить	1	слева
17	2.2	Конец главной дороги			0+700	Требуется установить	1	справа
18	2.2	Конец главной дороги			0+732	Требуется установить	1	слева
19	2.2	Конец главной дороги			1+607	Требуется установить	1	справа
20	2.4	Уступите дорогу			0+700	Установлено	1	справа
21	2.4	Уступите дорогу			0+732	Установлено	1	слева
22	2.4	Уступите дорогу			1+607	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**10**	
		Итого:					**12**	
		Запрещающие знаки						
23	3.13	Ограничение высоты			0+045	Требуется установить	1	слева
24	3.13	Ограничение высоты			0+045	Требуется установить	1	справа
25	3.13	Ограничение высоты			0+249	Требуется установить	1	слева
26	3.13	Ограничение высоты			0+249	Требуется установить	1	справа
27	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+732	Требуется установить	1	справа
28	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+822	Демонтировать	1	справа
29	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+965	Требуется установить	1	слева
30	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+008	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки особых предписаний						
31	5.19.1	Пешеходный переход			0+884	Требуется установить	1	справа
32	5.19.1	Пешеходный переход			0+894	Требуется установить	1	слева
33	5.19.2	Пешеходный переход			0+884	Требуется установить	1	справа
34	5.19.2	Пешеходный переход			0+894	Требуется установить	1	слева
35	5.20	Искусственная неровность			0+884	Требуется установить	1	справа
36	5.20	Искусственная неровность			0+894	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
37	8.2.1	Зона действия			0+822	Демонтировать	1	справа
38	8.2.1	Зона действия			0+822	Требуется установить	1	справа
39	8.2.1	Зона действия			1+008	Демонтировать	1	слева
40	8.2.1	Зона действия			1+008	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					**2**	
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					**4**	
		Всего требуется установить:					**32**	
		Всего:					**36**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+158	Населенный пункт	6/6	0	148	Справа
2	0+188	0+222	Населенный пункт	2/2	34	0	Слева
3	0+257	0+297	Населенный пункт	2/2	0	40	Слева
4	0+346	0+687	Населенный пункт	10/10	0	341	Слева
5	0+741	1+147	Населенный пункт	13/13	0	406	Слева
6	1+201	1+290	Населенный пункт	5/5	0	89	Слева
7	1+310	1+384	Населенный пункт	5/10	0	74	Слева
8	1+408	1+497	Населенный пункт	5/5	0	89	Слева
9	1+537	1+537	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
10	1+576	1+576	Населенный пункт	1/2	0	0	Справа
11	1+581	1+581	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**51/57**	**34**	**1187**	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Материал	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Демонтировать, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+834	0+884	50				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
2	0+850	0+884	34				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
3	0+894	0+899	5				Справа	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
4	0+894	0+944	50				Слева	Металлические секционные	Оцинкованный металл	1,10	Пешеходный переход
Итого:			**139**								

Ведомость размещения светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+884	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+894	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			**2**	**0**		

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+069	Жилая застройка	Справа		69
2	0+000	0+095	Жилая застройка	Слева		95
3	0+099	0+142	Жилая застройка	Слева		43
4	0+146	0+190	Жилая застройка	Слева		44
5	0+197	0+304	Жилая застройка	Слева		107
6	0+345	0+449	Жилая застройка	Слева		104
7	0+454	0+596	Жилая застройка	Слева		142
8	0+665	0+714	Жилая застройка	Слева		49
9	0+720	0+773	Жилая застройка	Слева		53
10	0+777	0+846	Жилая застройка	Слева		69
11	0+850	0+978	Жилая застройка	Слева		128
12	0+983	1+062	Жилая застройка	Слева		79
13	1+065	1+153	Жилая застройка	Слева		88
14	1+159	1+187	Жилая застройка	Слева		28
15	1+193	1+301	Жилая застройка	Слева		108
16	1+305	1+400	Жилая застройка	Слева		95
17	1+404	1+500	Жилая застройка	Слева		96
Итого:					**0**	**1397**

Ведомость размещения пешеходных переходов


№ п/п	Адрес, км + м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
1	0+890	нерегулируемый наземный	в одном уровне	нет
		количество		
Итого:	наземных	1		
	надземных в разных уровнях	0		
	подземных в разных уровнях	0		

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Размеры искусственной неровности			Строительный объем, м³	Соответствует/требуется реконструкция/требуется строительство/требуется демонтаж
		Длина, м	Ширина, м	Высота гребня, м		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+884	11,00	4,00	0,07	3,08	Требуется строительство


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Зимняя, д. 2 до нежилого здания по ул. Кравченко, д. 14/1
км 0+000 - км 0+500

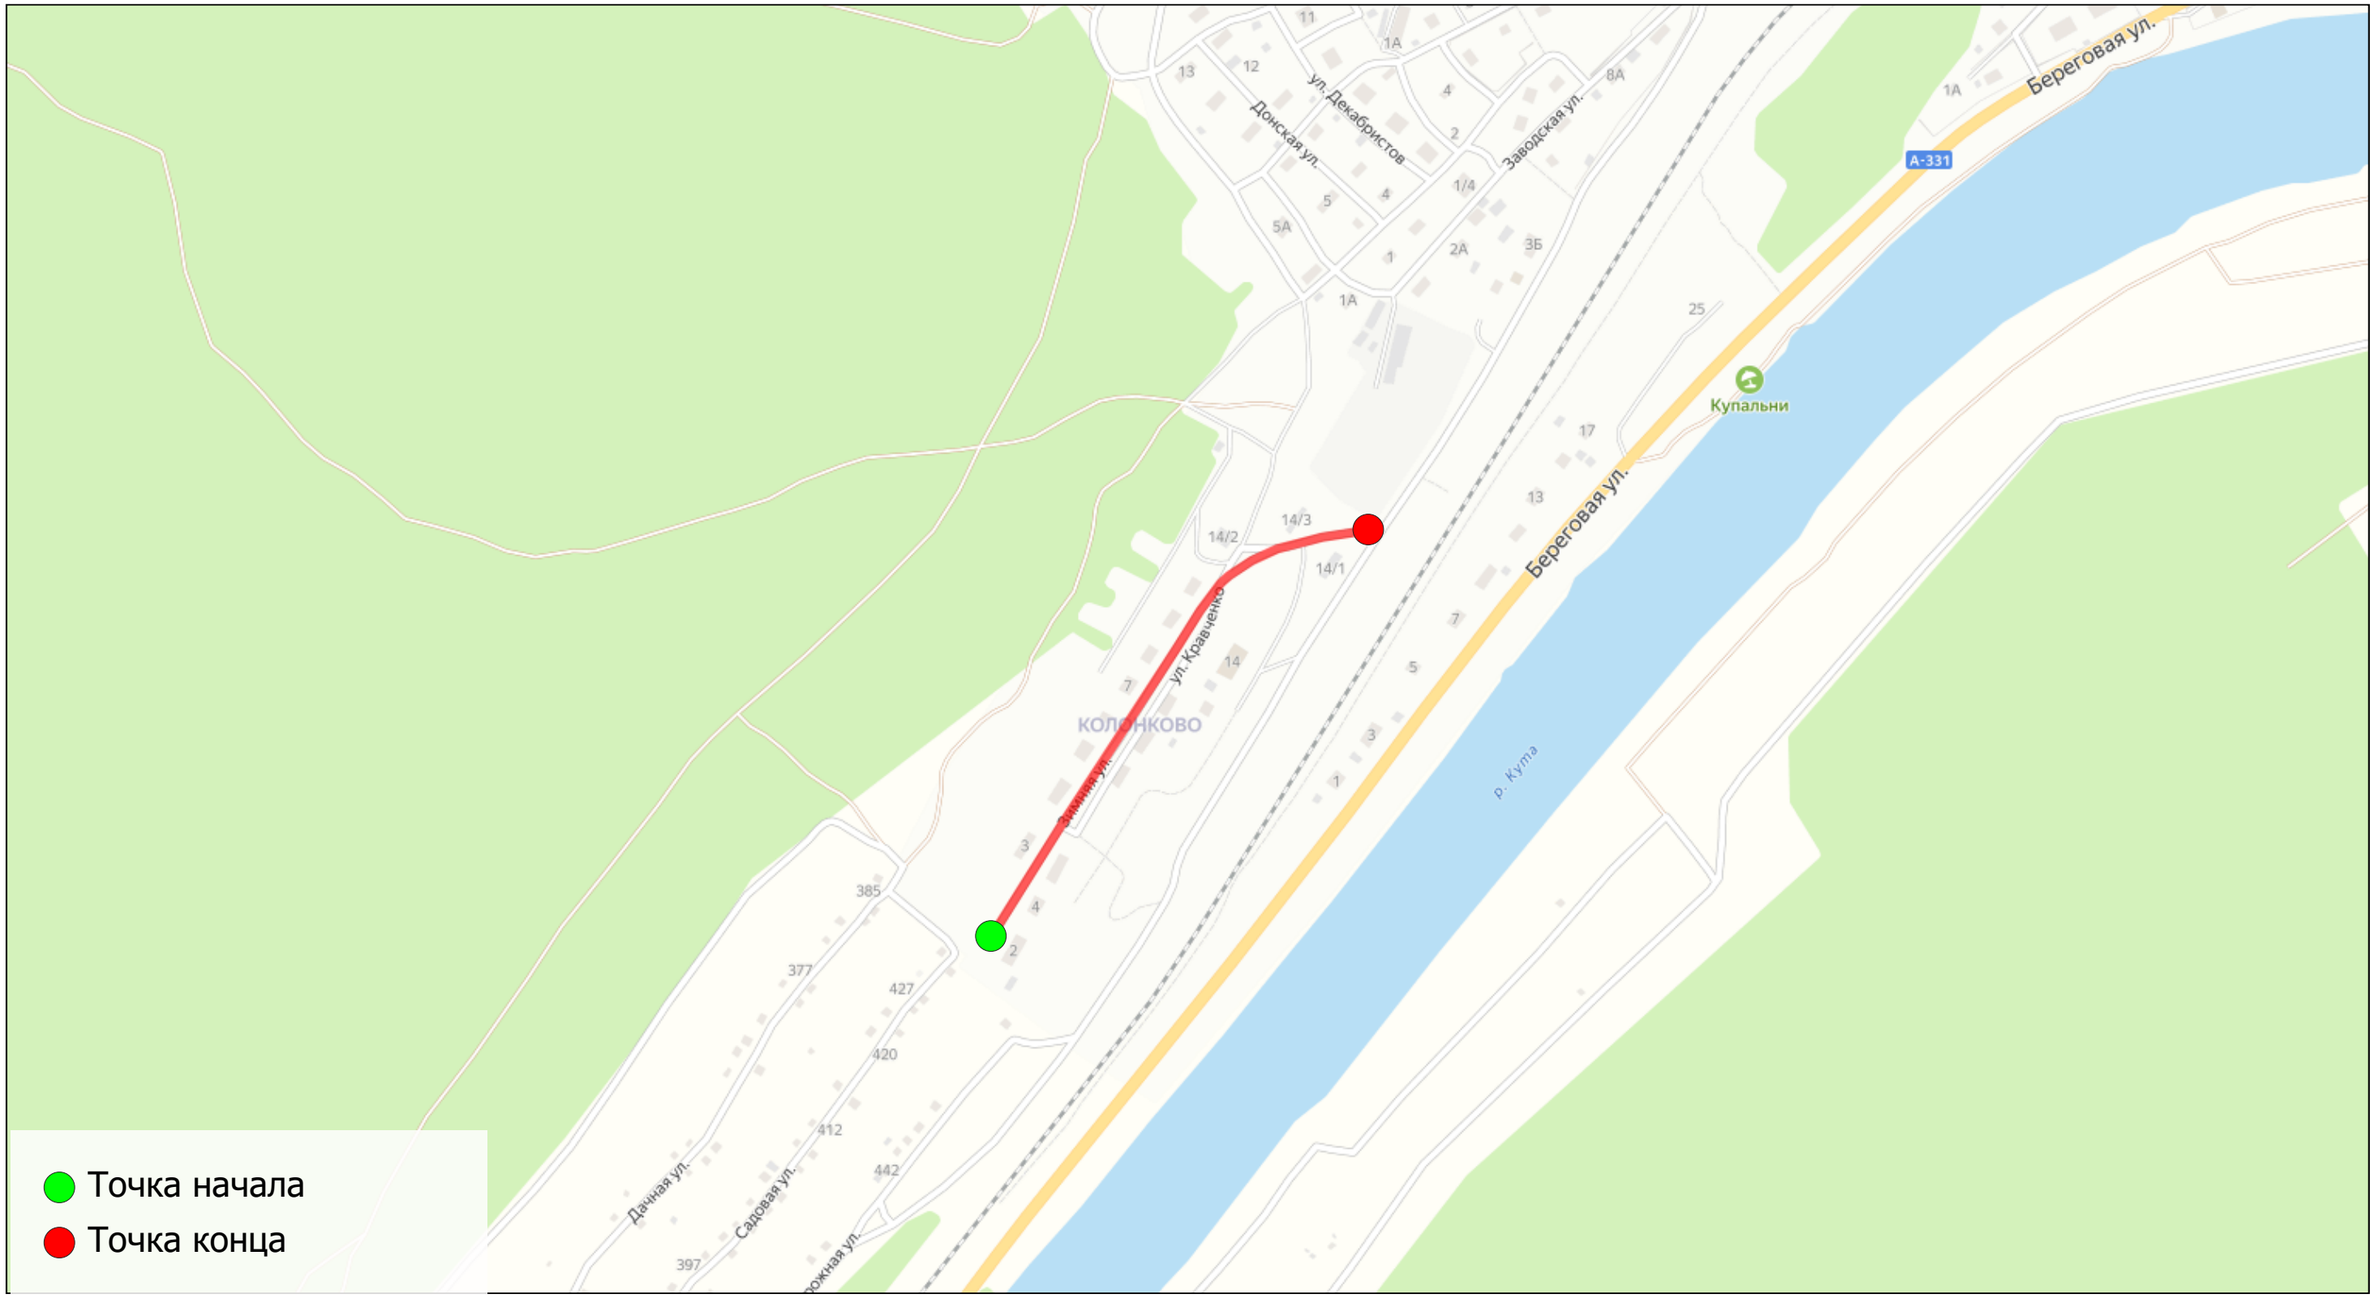

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	46 — R=2523м — 137 (456)
Кривые в плане	325 — R=699м P=8; a=48° — 408
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 350 — 4,50

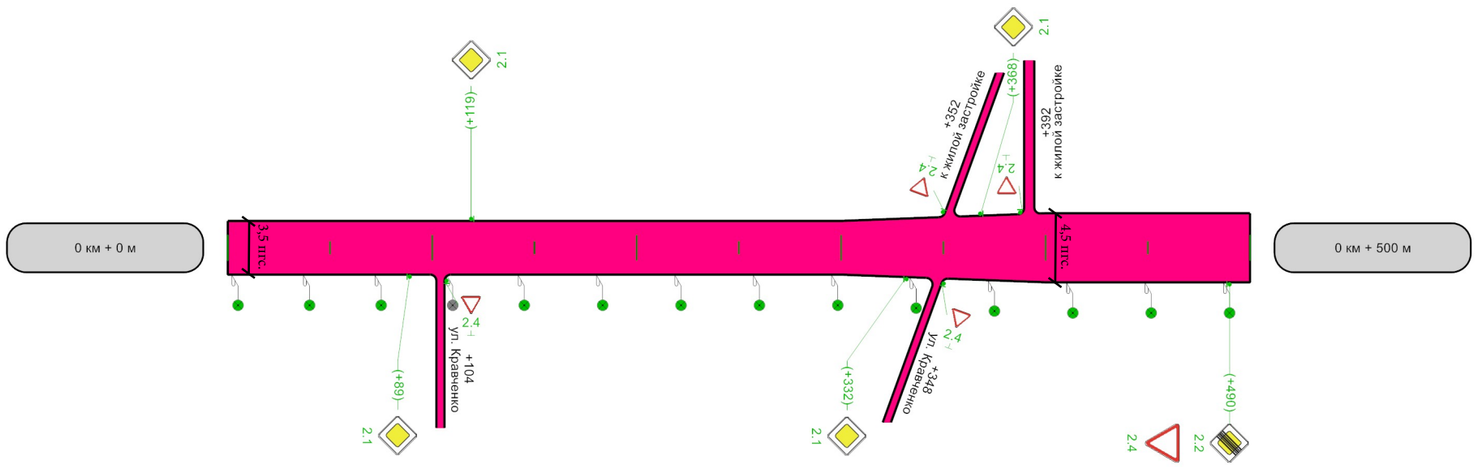

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+089	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+119	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+332	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+368	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+490	Требуется установить	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+490	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+075	Населенный пункт	3/3	70	0	Справа
2	0+110	0+110	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+145	0+490	Населенный пункт	10/10	345	0	Справа
Итого:				**14/14**	**415**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Приленская, 1 Б до земельного участка по ул. Благополучная, 1б км 0+000 - км 0+188



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	84 / 57 / 84 / R=2423м / 184 / 31
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 6,00 — 100 — 4,00

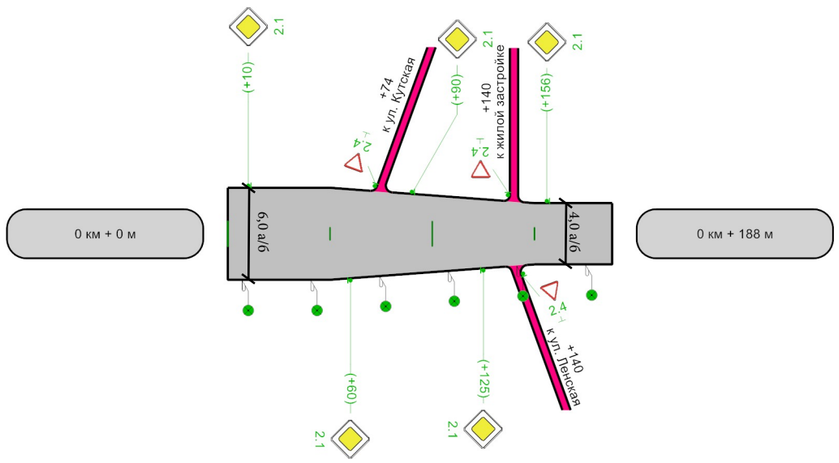

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			0+060	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+090	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+125	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+156	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**5**	
		Всего:					**5**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+178	Населенный пункт	6/6	168	0	Справа
Итого:				**6/6**	**168**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от земельного участка по ул. Благодатная, 9 до земельного участка по ул. Благодатная, 43


км 0+000 - км 1+123

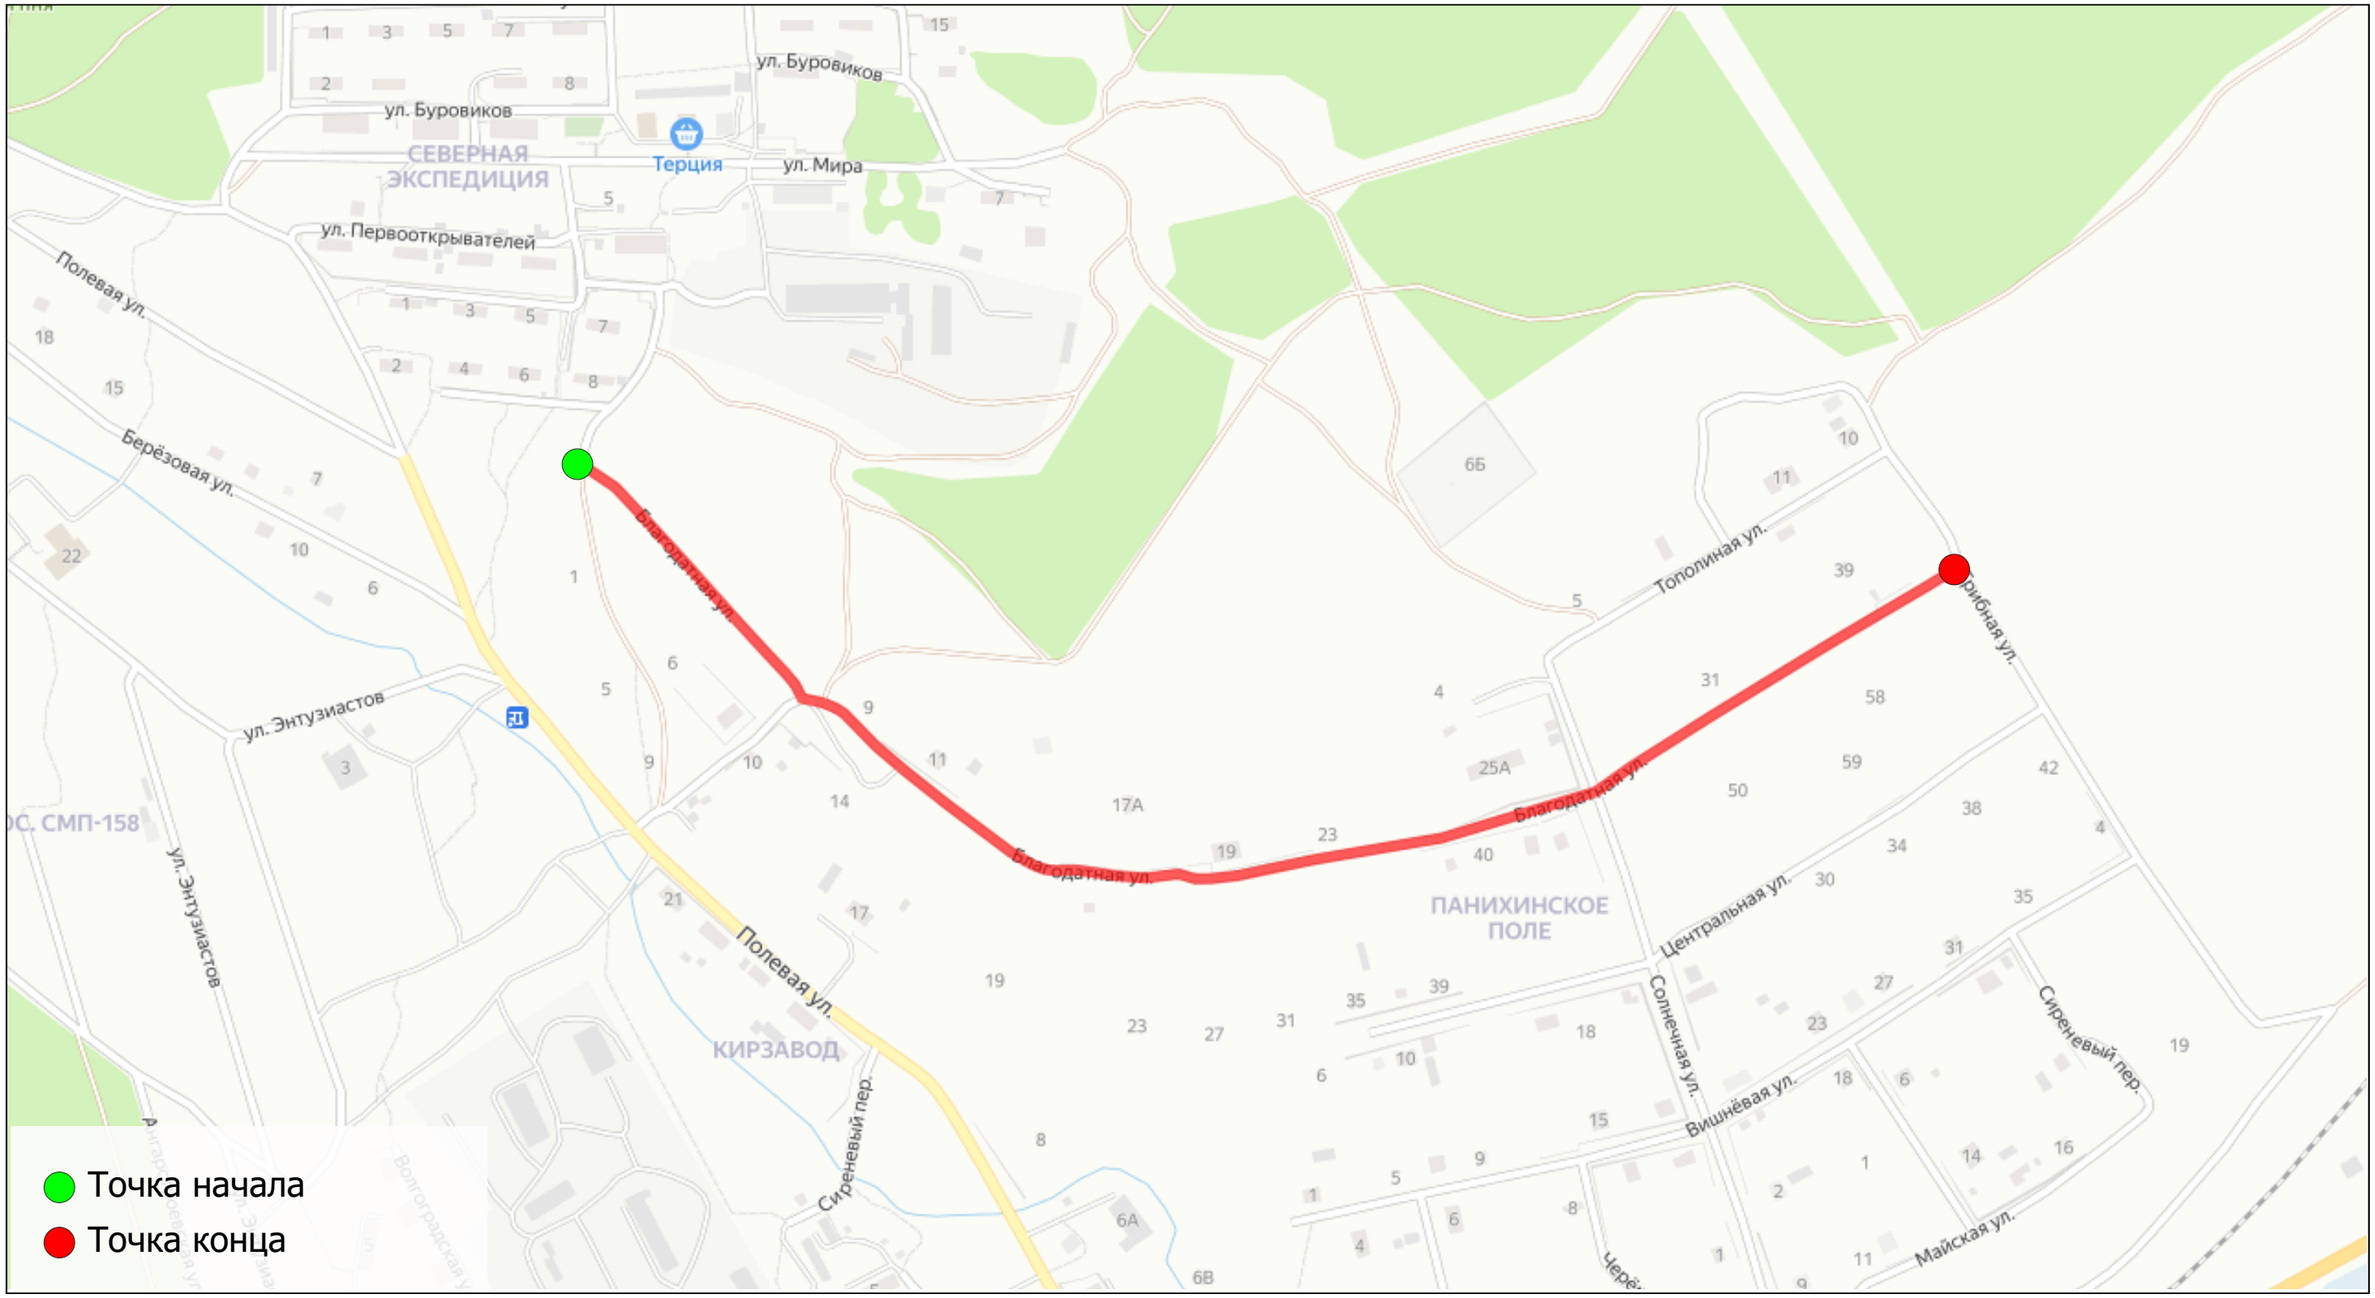

М 1:3000

Автомобильная дорога от земельного участка по ул. Благодатная, 9 до земельного участка по ул. Благодатная, 43


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	104 — 94 — 36 — R=5971м — 63 — 218 — 72 — 346 — R=4738м — 11 — 738 — 11 — 863 — R=8256м
Кривые в плане	358 — R=653м, P=7; a=51° — 583
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

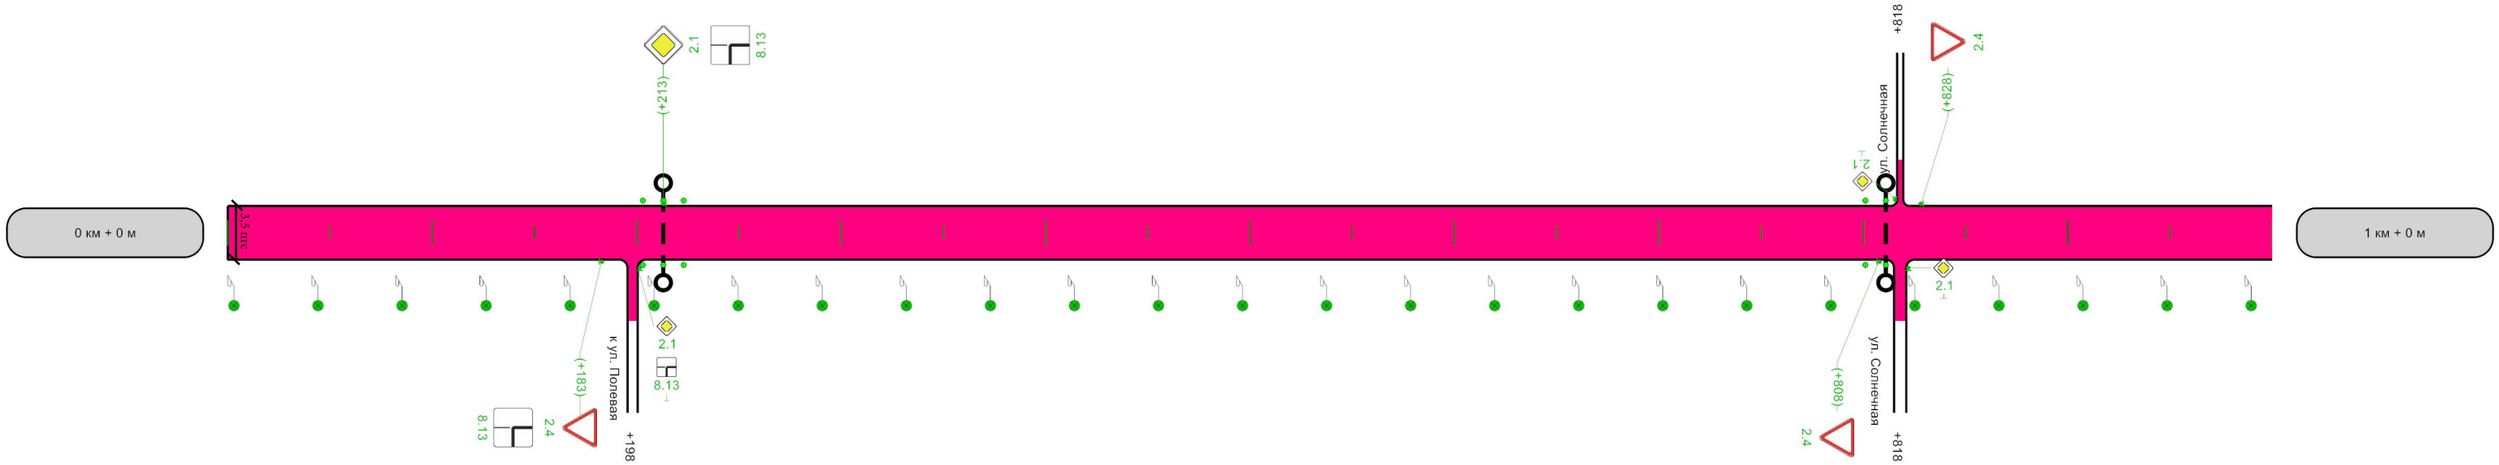

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 / 1
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+213	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+183	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+808	Требуется установить	1	справа
4	2.4	Уступите дорогу			0+828	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			1+110	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
6	8.13	Направление главной дороги			0+213	Требуется установить	1	слева
7	8.13	Направление главной дороги			0+183	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**7**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+203	0+223	20/3		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+203	0+223	20/3		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+801	0+811	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+801	0+811	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**60/10**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+003	1+113	Населенный пункт	28/28	1110	0	Справа
Итого:				**28/28**	**1110**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Комсомольская, д. 1 до жилого дома по ул. Иркутская, д.17
км 0+000 - км 0+357

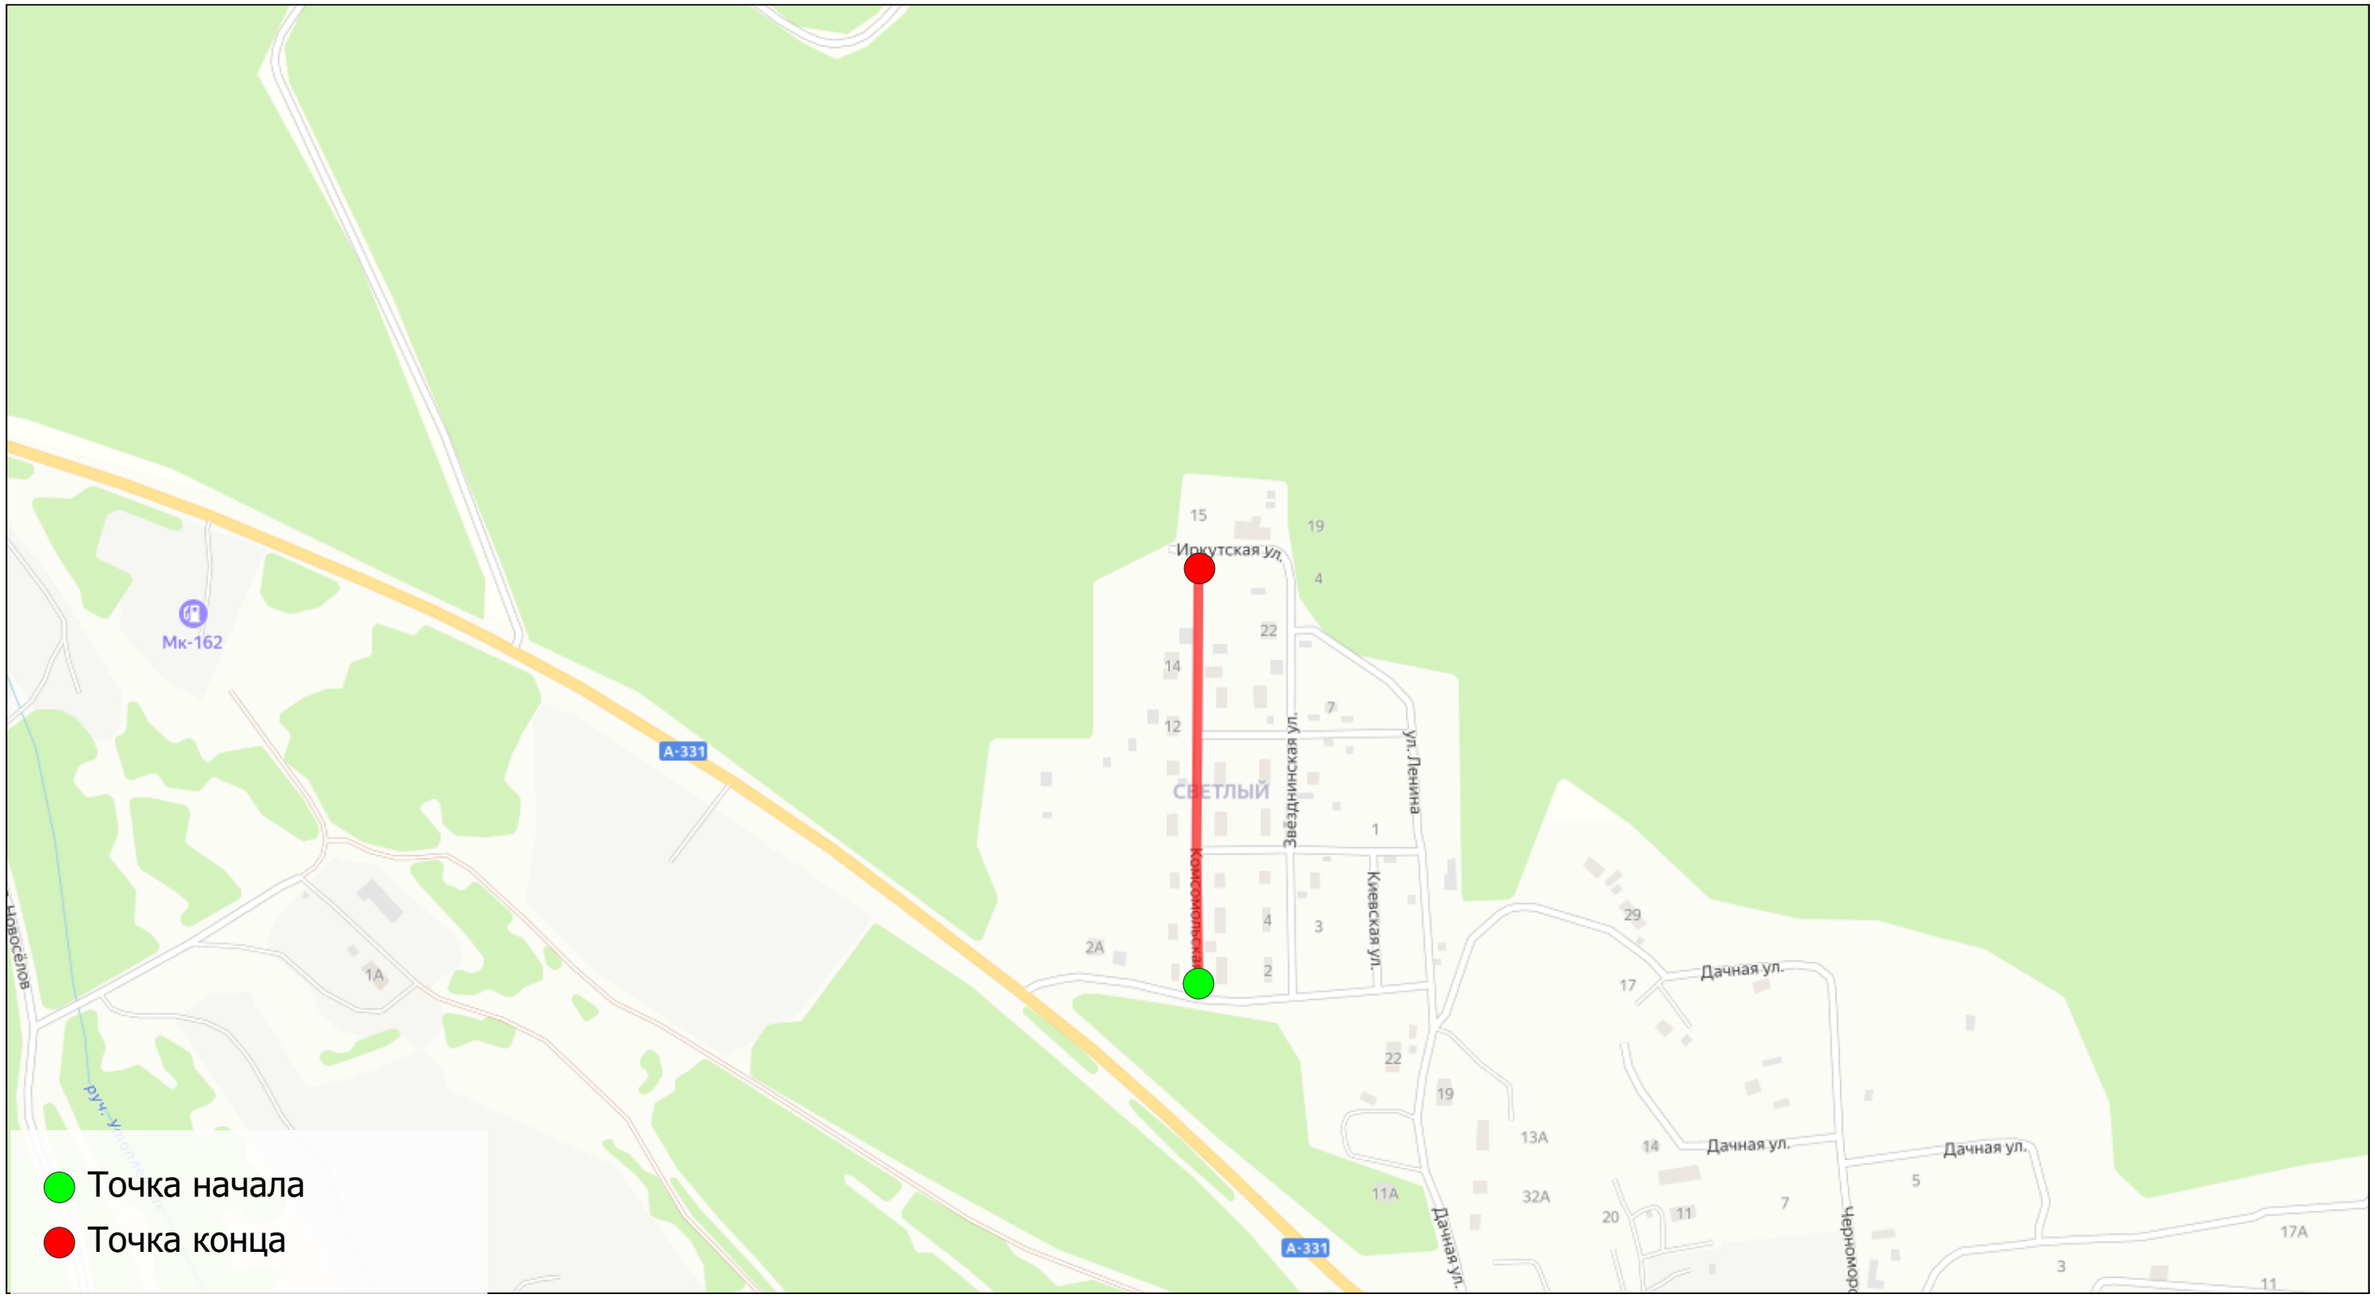

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Элементы дороги в продольном профиле	107 R=5937м 102 89			
Кривые в плане	R=632м P=43; a=8° 32			
Тротуары слева				
Характеристики проезжей части	0	5,10	117	4,50	3,00

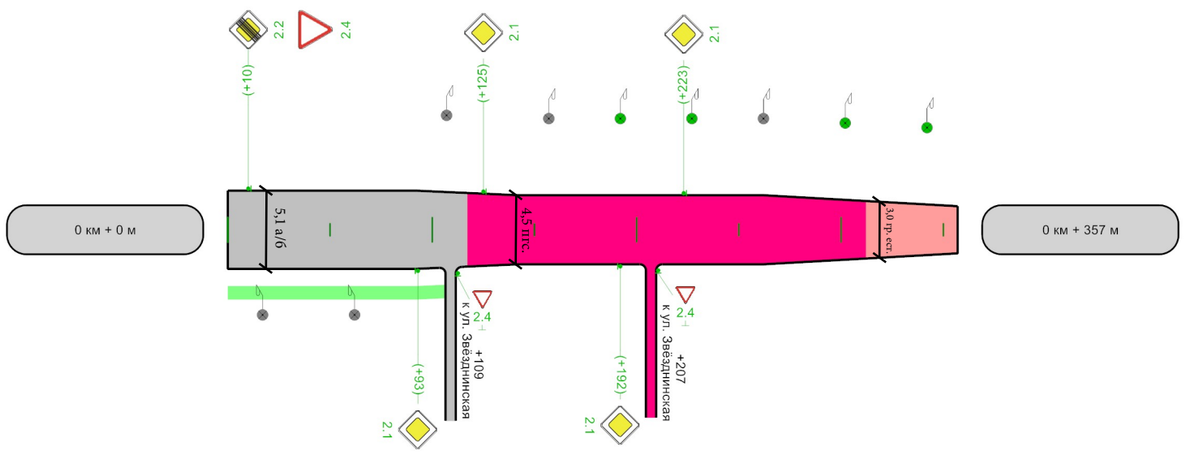

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 106	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+093	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+125	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+192	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+223	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+017	0+017	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
2	0+062	0+062	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
3	0+107	0+107	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+157	0+157	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+192	0+227	Населенный пункт	2/2	35	0	Слева
6	0+262	0+262	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+302	0+342	Населенный пункт	2/2	40	0	Слева
Итого:				**9/9**	**75**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+106	Жилая застройка	Справа	106	
Итого:					**106**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Корабелов, 10 до автодороги ул. Черноморская
км 0+000 - км 0+199

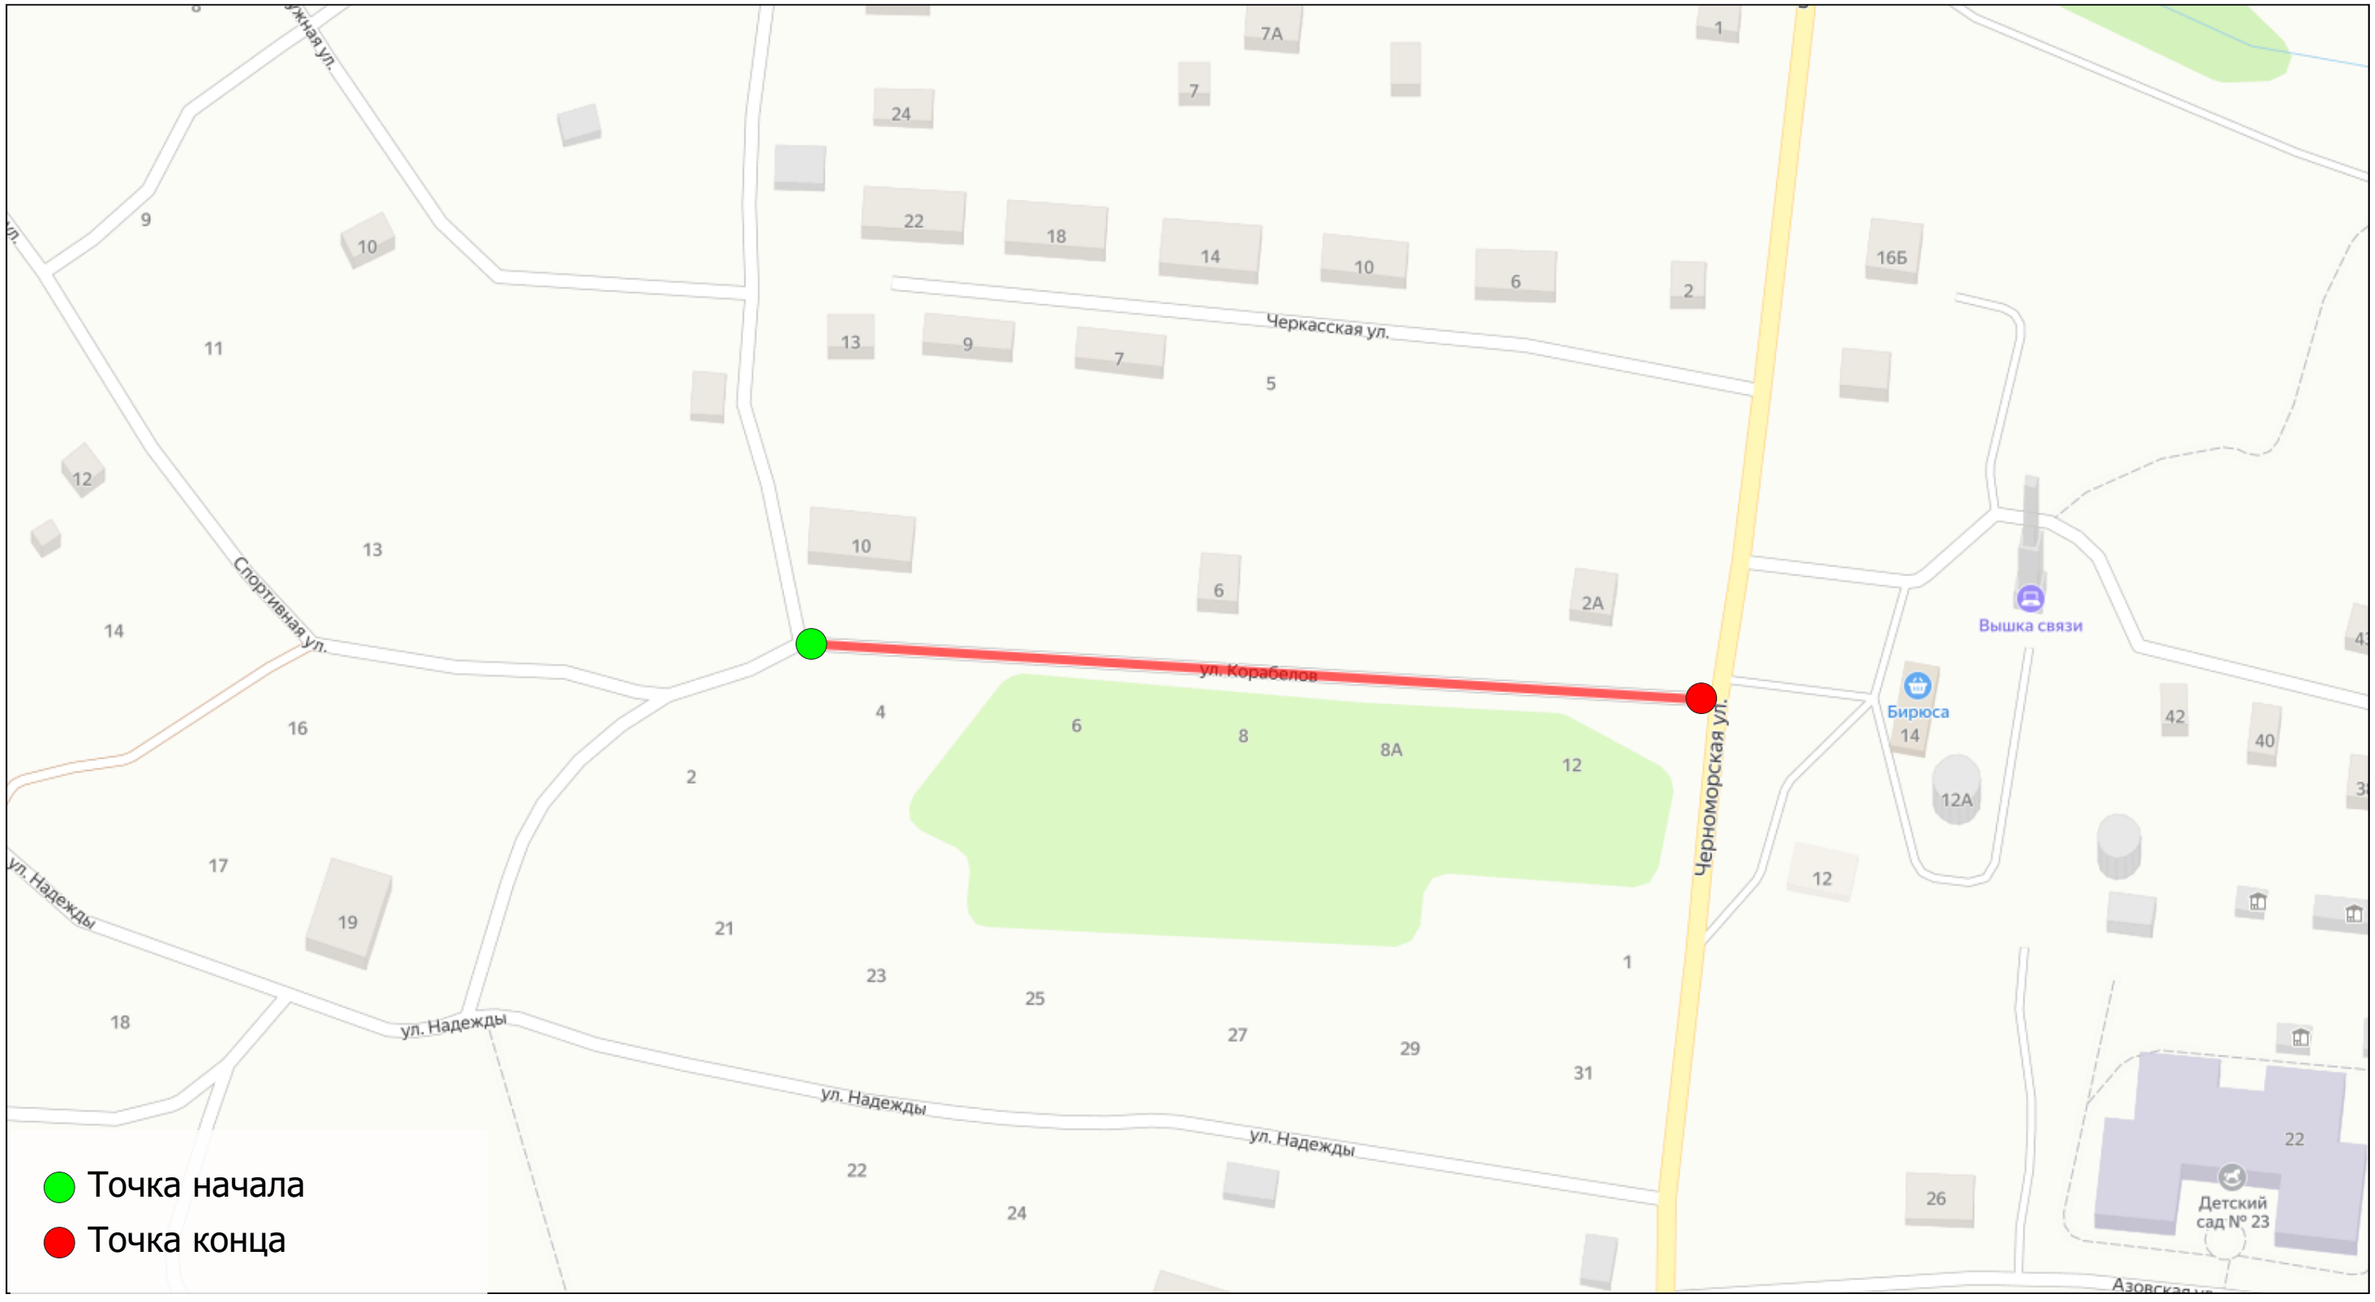

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 77 2 R=4497м
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 199
Характеристики проезжей части	4,00

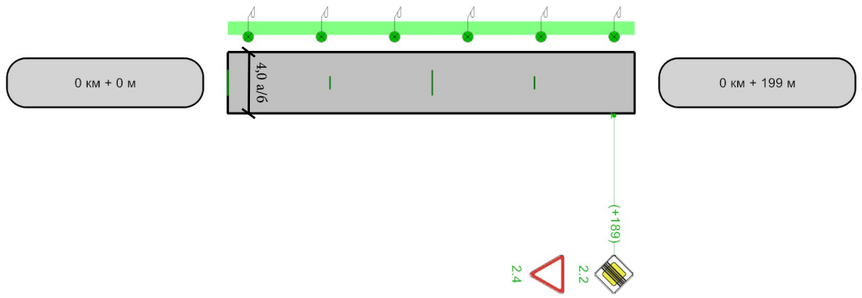

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.2	Конец главной дороги			0+189	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+189	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+189	Населенный пункт	6/6	179	0	Слева
Итого:				**6/6**	**179**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+199	Жилая застройка	Слева	199	
Итого:					**199**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Киевская, д. 2 до жилого дома по ул. Киевская, д. 6
км 0+000 - км 0+109

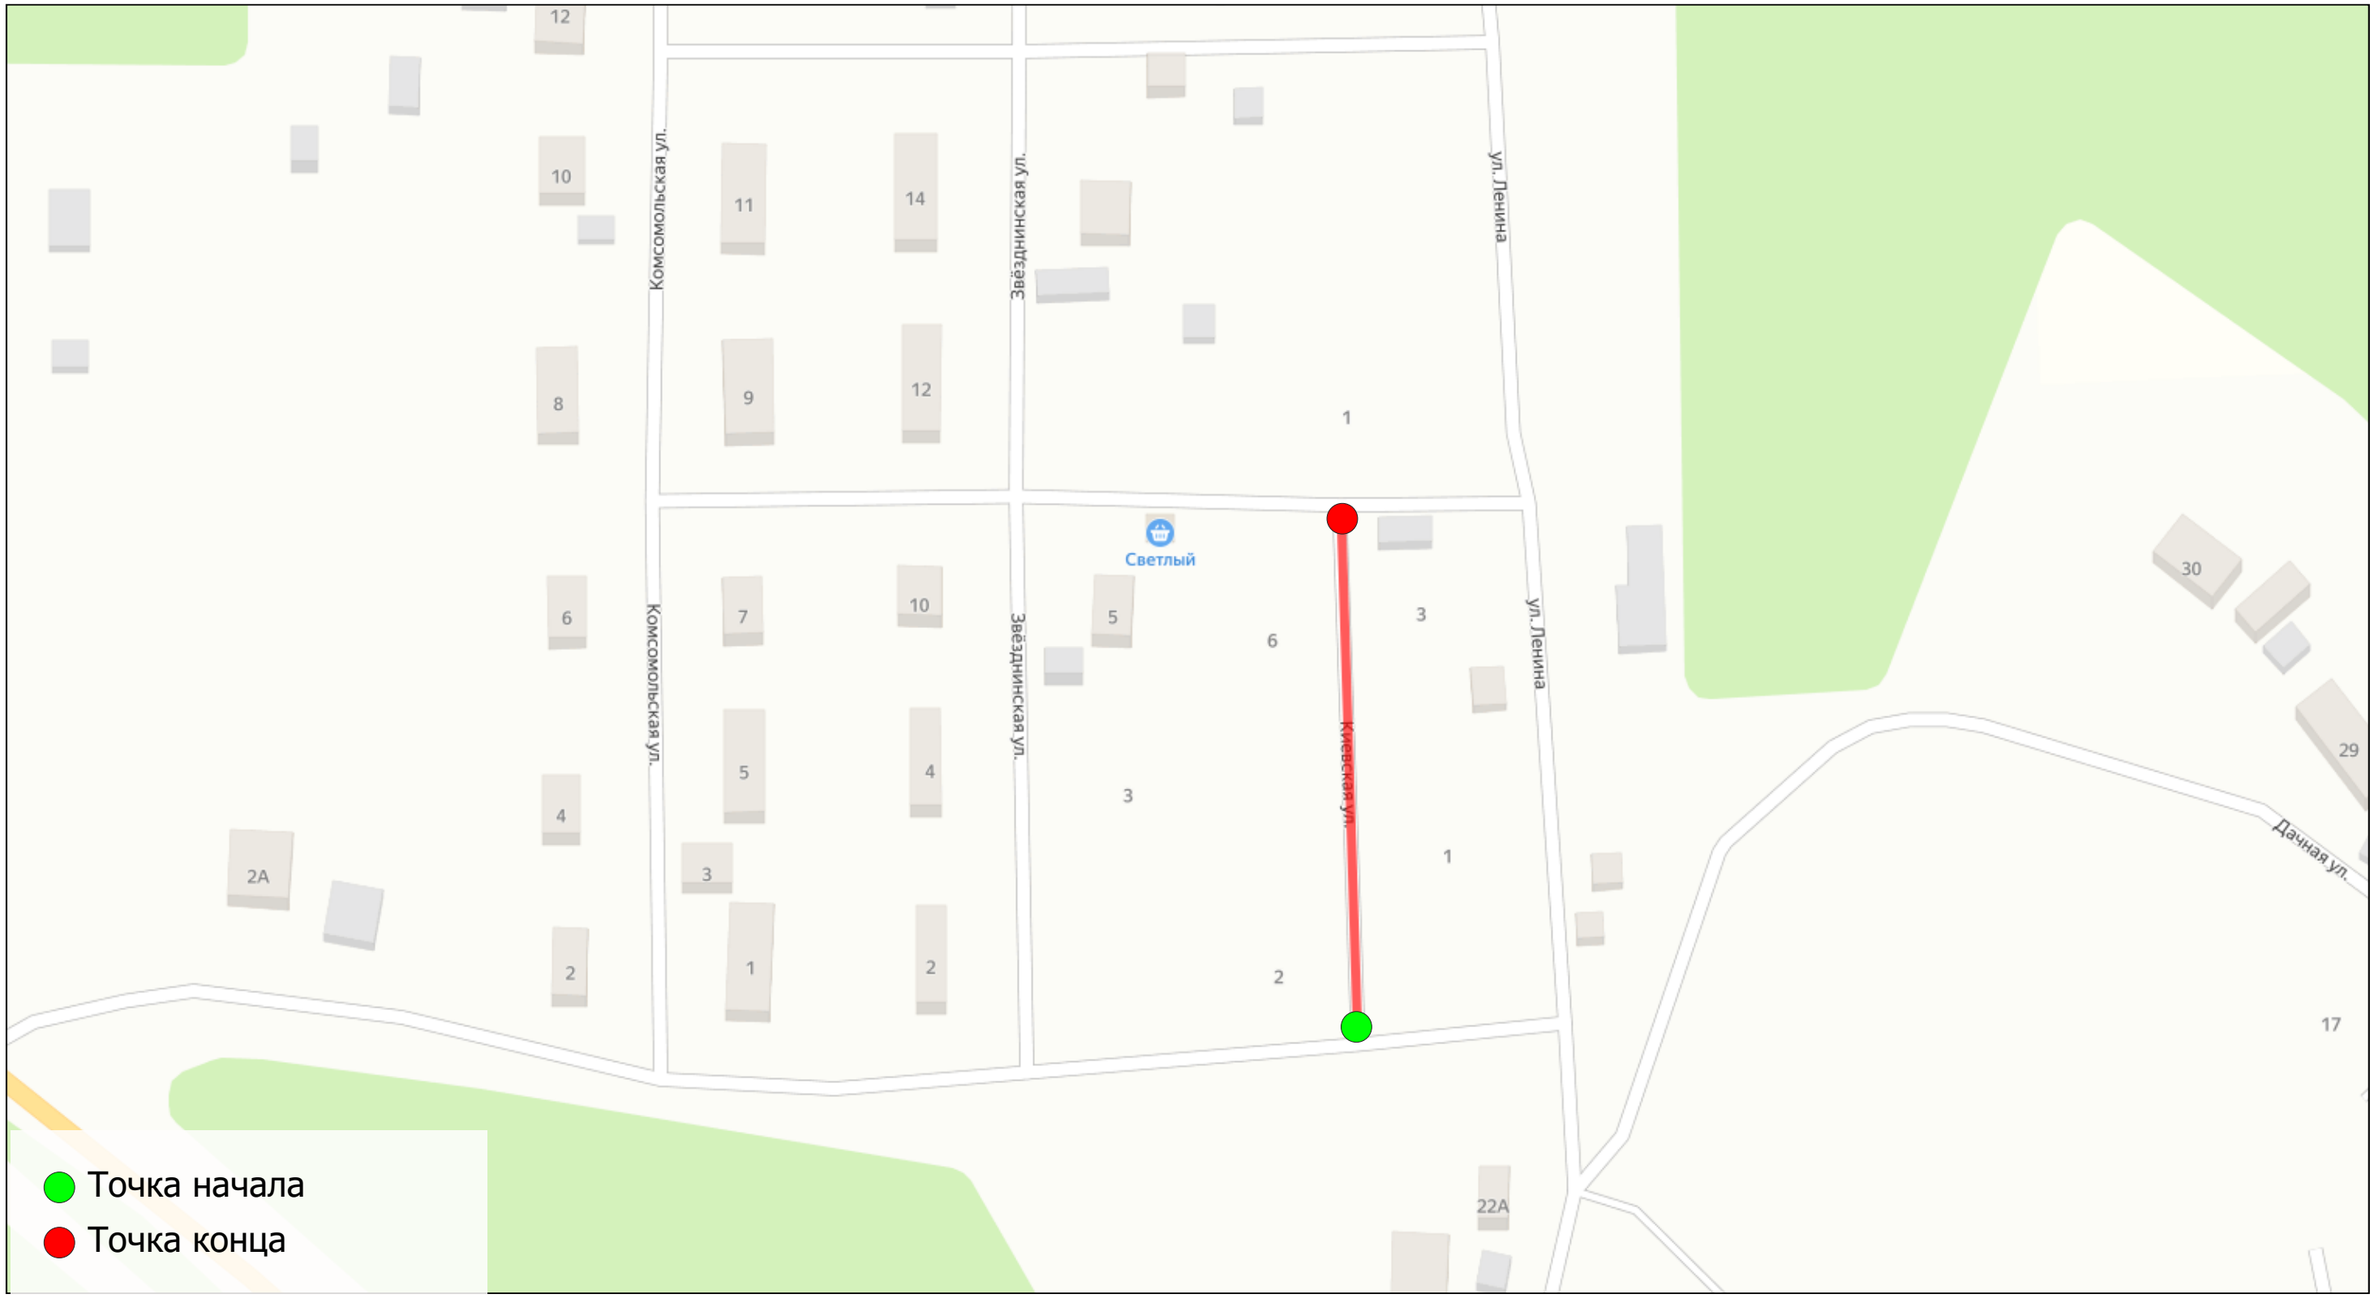

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	80
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 109
Характеристики проезжей части	4,00

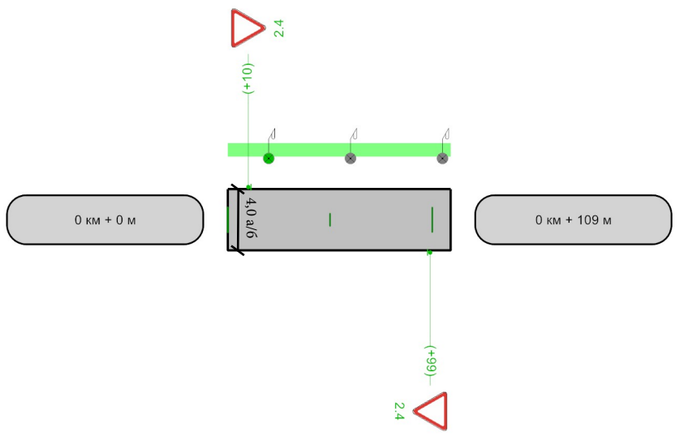

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+099	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+020	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
2	0+060	0+105	Населенный пункт	2/2	0	45	Слева
Итого:				**3/3**	**0**	**45**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+109	Жилая застройка	Слева	109	
Итого:					**109**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома ул. Лесная 27 до жилого дома по ул. Лесная 28

1-й участок: км 0+000 - км 0+324
2-й участок: км 0+000 - км 0+195

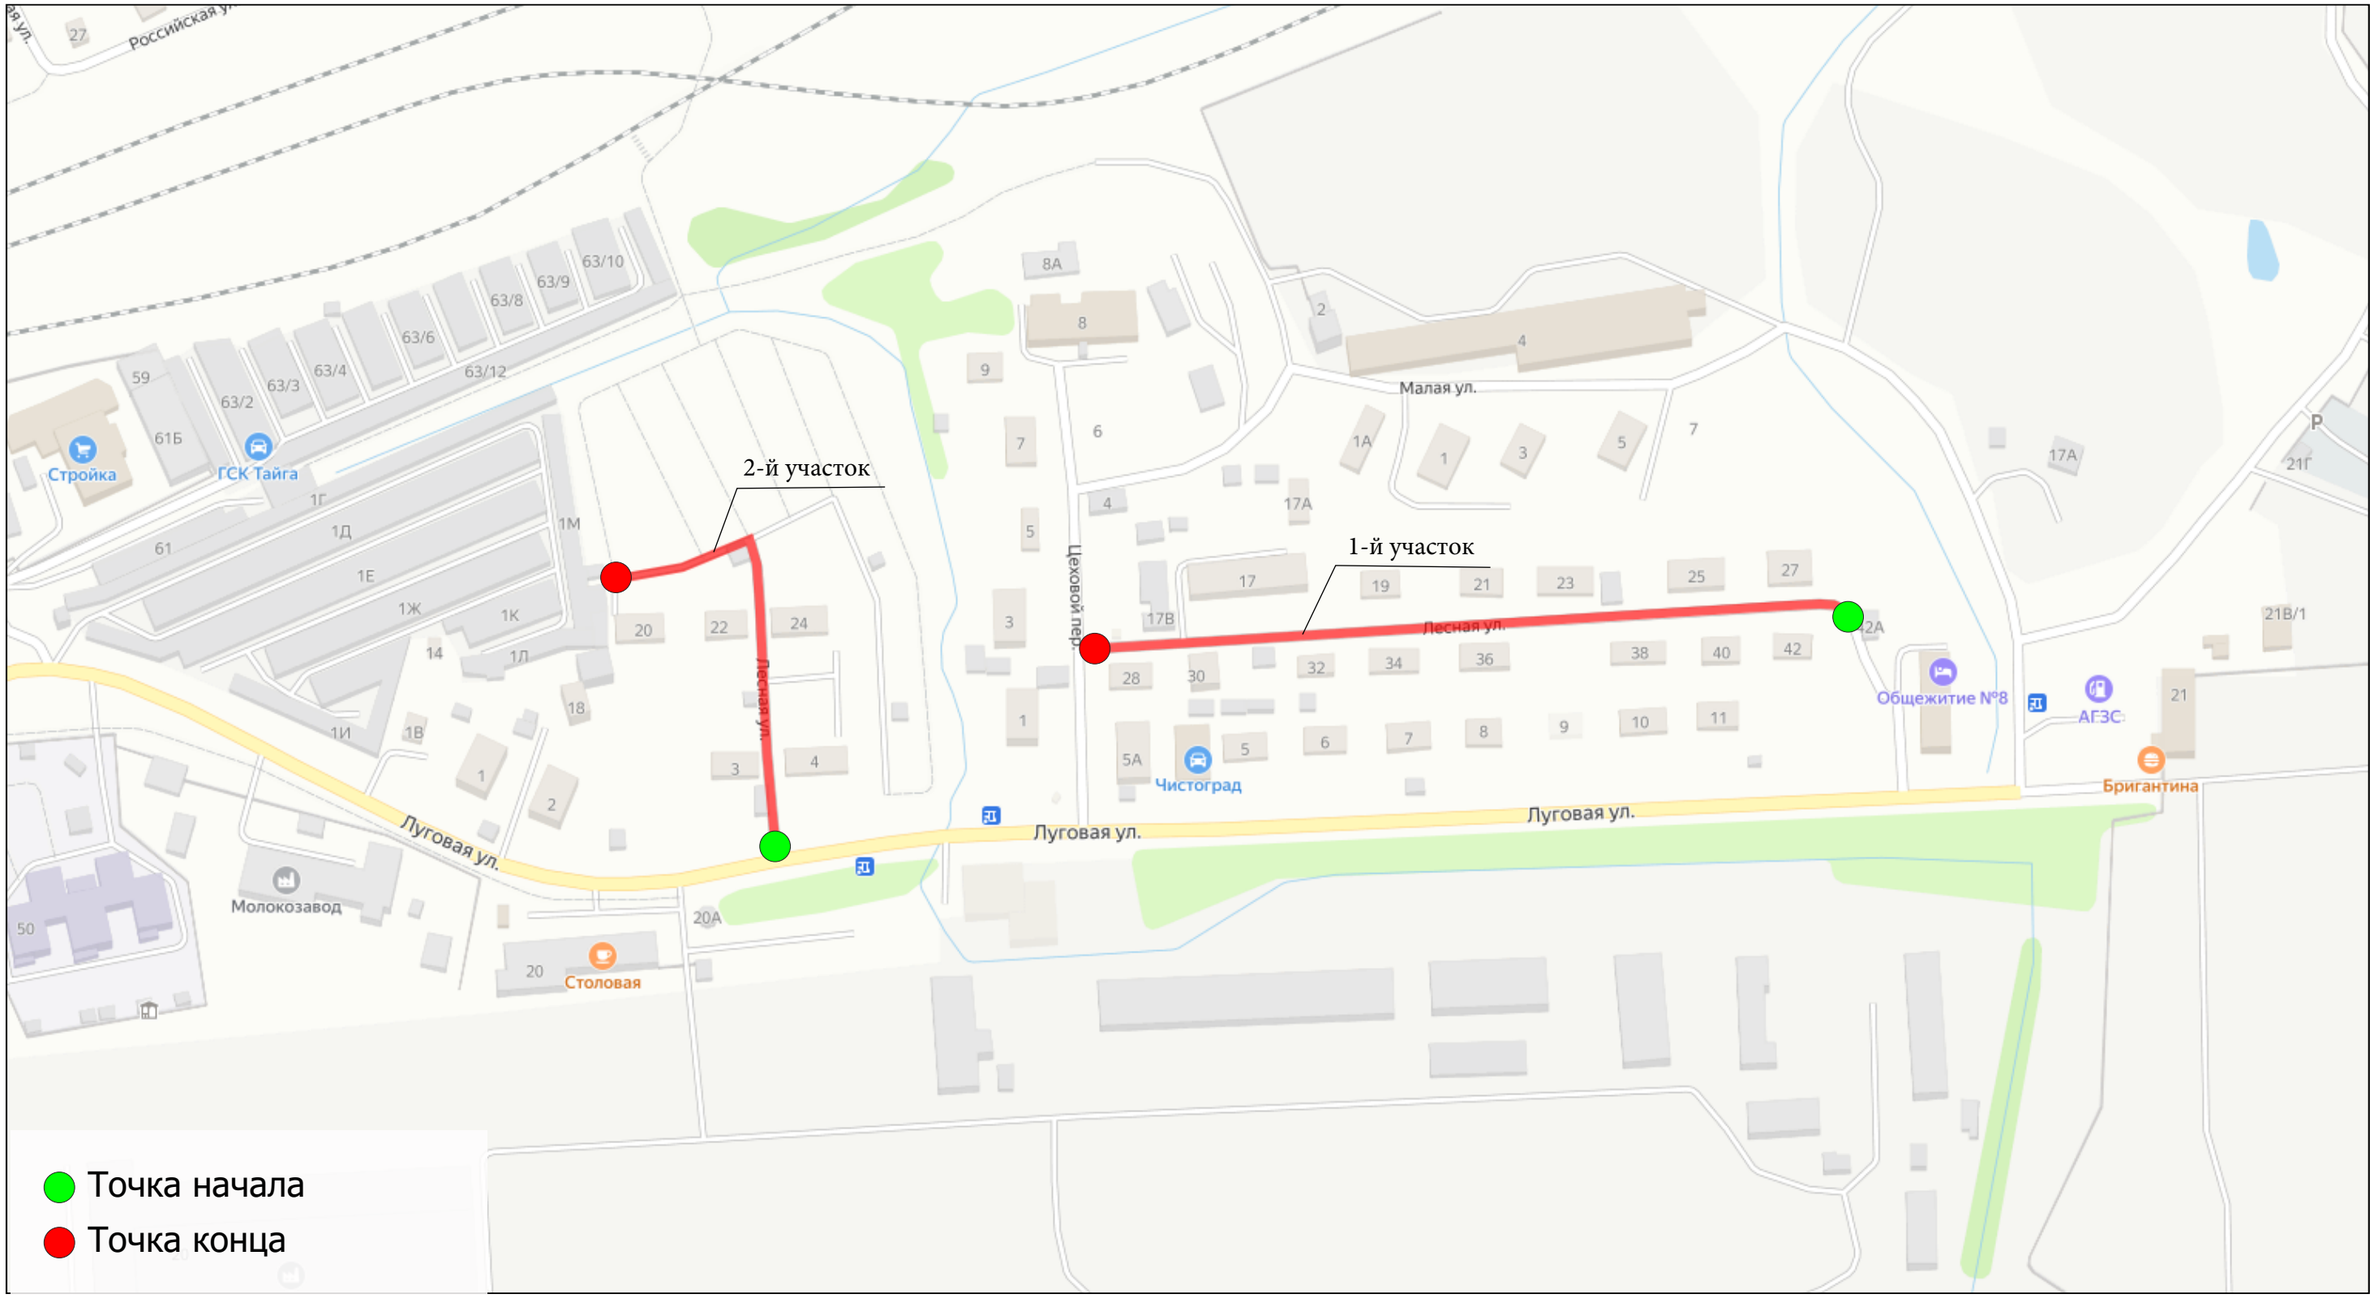

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	16
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

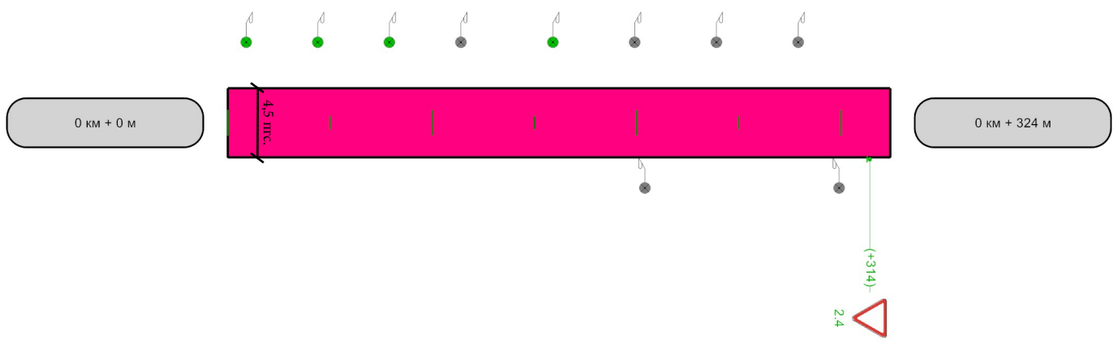

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+314	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+009	0+079	Населенный пункт	3/3	70	0	Слева
2	0+114	0+114	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+159	0+159	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+199	0+239	Населенный пункт	2/2	0	40	Слева
5	0+204	0+204	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
6	0+279	0+279	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+299	0+299	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
Итого:				**10/10**	**70**	**40**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	3 19 R=7567м 178 4
Кривые в плане	125 145 R=701м 155 180
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

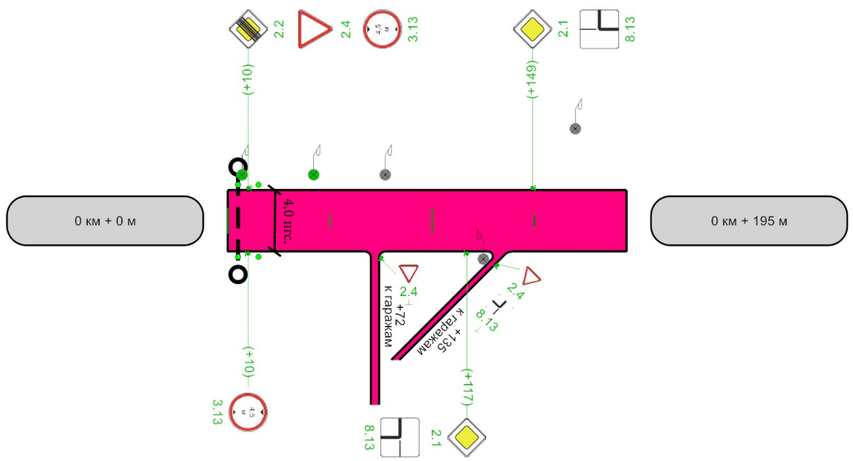

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+117	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+149	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Запрещающие знаки						
5	3.13	Ограничение высоты			0+010	Требуется установить	1	слева
6	3.13	Ограничение высоты			0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+117	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+149	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+005	0+015	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+005	0+015	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+007	0+042	Населенный пункт	2/2	35	0	Слева
2	0+077	0+077	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+125	0+125	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
4	0+170	0+170	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
Итого:				**5/5**	**35**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от здания по ул. Луговая, строение. 21 до производственной базы по ул. Луговая, участок №25а
км 0+000 - км 0+642

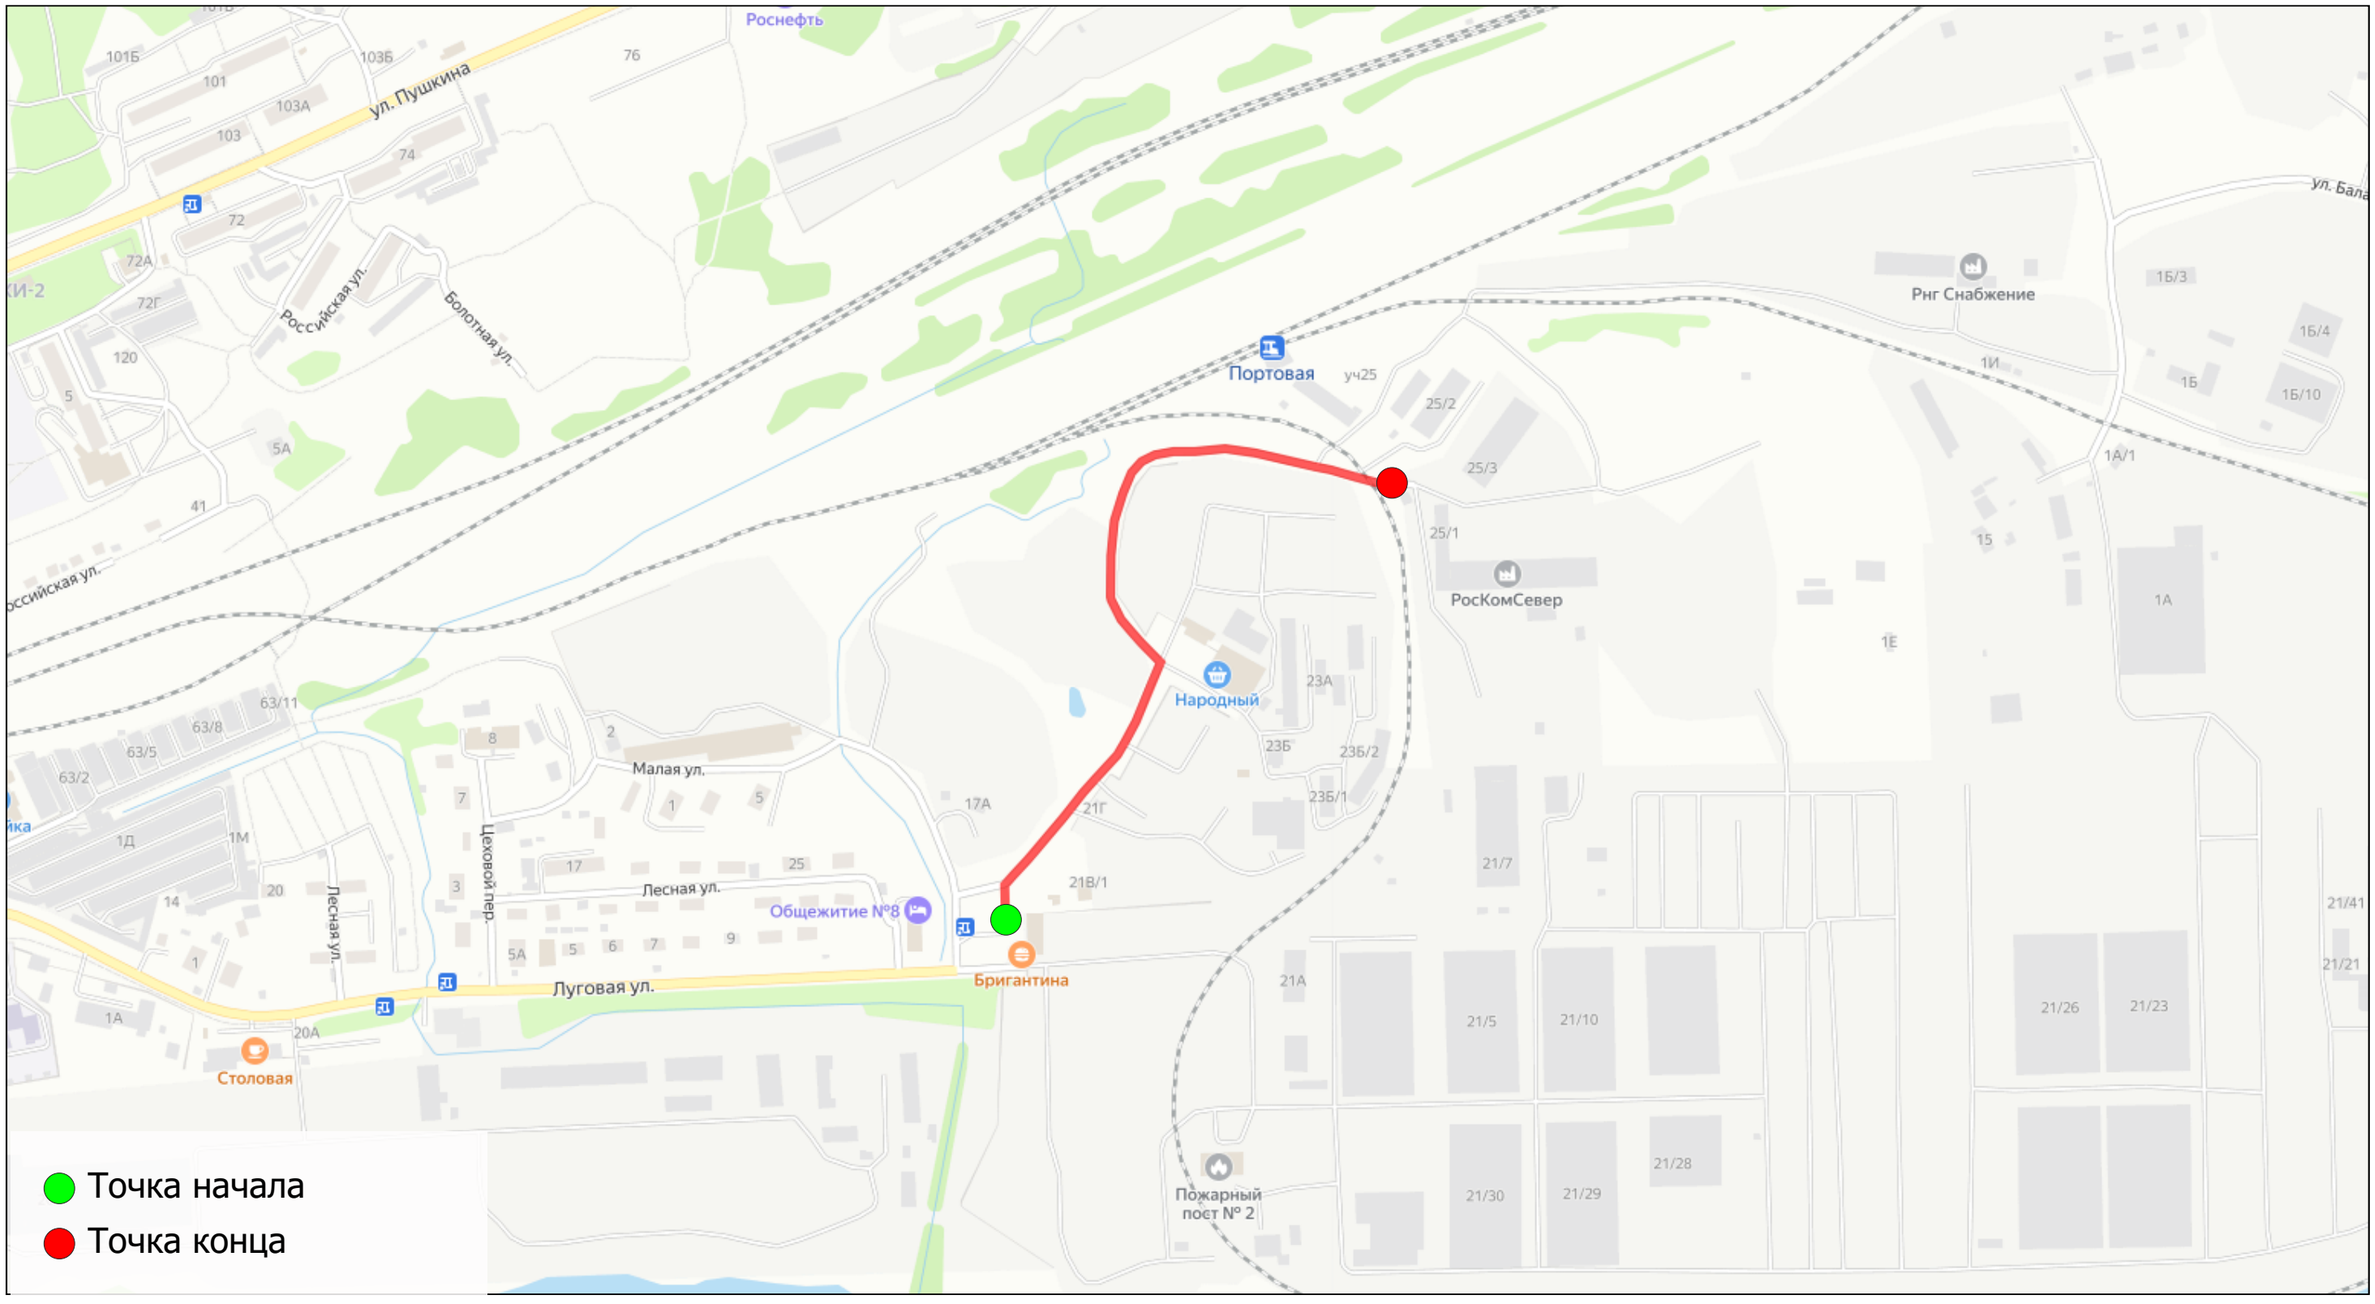

М 1:3000

| | | |

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.7(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	134,000	100,000	**18,400**
ИТОГО	**134,000**	**100,000**	**18,400**
ЛИН.КМ	**0,134**	**0,100**	
ПРИВЕД.КМ	**0,134**	**0,050**	
ПЛОЩАДЬ	**13,400**	**5,000**	**18,400**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+481	Требуется установить	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+481	Требуется установить	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+581	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+581	Требуется установить	1	справа
5	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+625	Установлено	1	справа
6	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+636	Установлено	1	слева
7	1.4.1	Приближение к железнодорожному переезду			0+481	Требуется установить	1	справа
8	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+531	Требуется установить	1	справа
9	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+581	Требуется установить	1	справа
10	1.4.4	Приближение к железнодорожному переезду			0+481	Требуется установить	1	слева
11	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+531	Требуется установить	1	слева
12	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+581	Требуется установить	1	слева
13	1.11.1	Опасный поворот			0+234	Требуется установить	1	слева
14	1.11.2	Опасный поворот			0+073	Требуется установить	1	справа
15	1.34.1	Направление поворота			0+168	Требуется установить	1	справа
16	1.34.2	Направление поворота			0+192	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**14**	
		Итого:					**16**	
		Знаки приоритета						
17	2.1	Главная дорога			0+044	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+234	Требуется установить	1	справа
19	2.1	Главная дорога			0+270	Требуется установить	1	слева
20	2.4	Уступите дорогу			0+008	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	2.5	Движение без остановки запрещено			0+625	Установлено	1	справа
22	2.5	Движение без остановки запрещено			0+636	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Запрещающие знаки						
23	3.13	Ограничение высоты			0+213	Требуется установить	1	слева
24	3.13	Ограничение высоты			0+213	Требуется установить	1	справа
25	3.20	Обгон запрещен			0+073	Требуется установить	1	слева
26	3.20	Обгон запрещен			0+073	Требуется установить	1	справа
27	3.20	Обгон запрещен			0+234	Требуется установить	1	слева
28	3.20	Обгон запрещен			0+234	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**6**	
		Итого:					**6**	
		Информационные знаки						
29	6.16	Стоп-линия			0+620	Требуется установить	1	справа
30	6.16	Стоп-линия			0+641	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
31	8.1.1	Расстояние до объекта			0+234	Требуется установить	1	слева
32	8.13	Направление главной дороги			0+234	Требуется установить	1	справа
33	8.13	Направление главной дороги			0+270	Требуется установить	1	слева
34	8.13	Направление главной дороги			0+044	Требуется установить	1	слева
35	8.13	Направление главной дороги			0+008	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**5**	
		Всего установлено:					**4**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**31**	
		Всего:					**35**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	0+616	0+625	9/7			Справа	Пластмасса	Ж/д переезд
2	0+626	0+629		3/3		Справа	Металл	Ж/д переезд
3	0+632	0+635		3/3		Слева	Металл	Ж/д переезд
4	0+632	0+641	9/7			Справа	Пластмасса	Ж/д переезд
5	0+636	0+642	6/5			Слева	Пластмасса	Ж/д переезд
Итого:			**24/19**	**6/6**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+632	Населенный пункт	19/19	622	0	Слева
Итого:				**19/19**	**622**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+010	Обочина	Справа	10	
2	0+073	0+105	Обочина	Справа	32	
3	0+111	0+136	Обочина	Справа		25
4	0+139	0+177	Обочина	Справа		38
5	0+182	0+235	Обочина	Справа		53
Итого:					**42**	**116**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Мельничный ручей от дороги общего пользования по ул. Новая до железнодорожных путей

км 0+000 - км 0+154

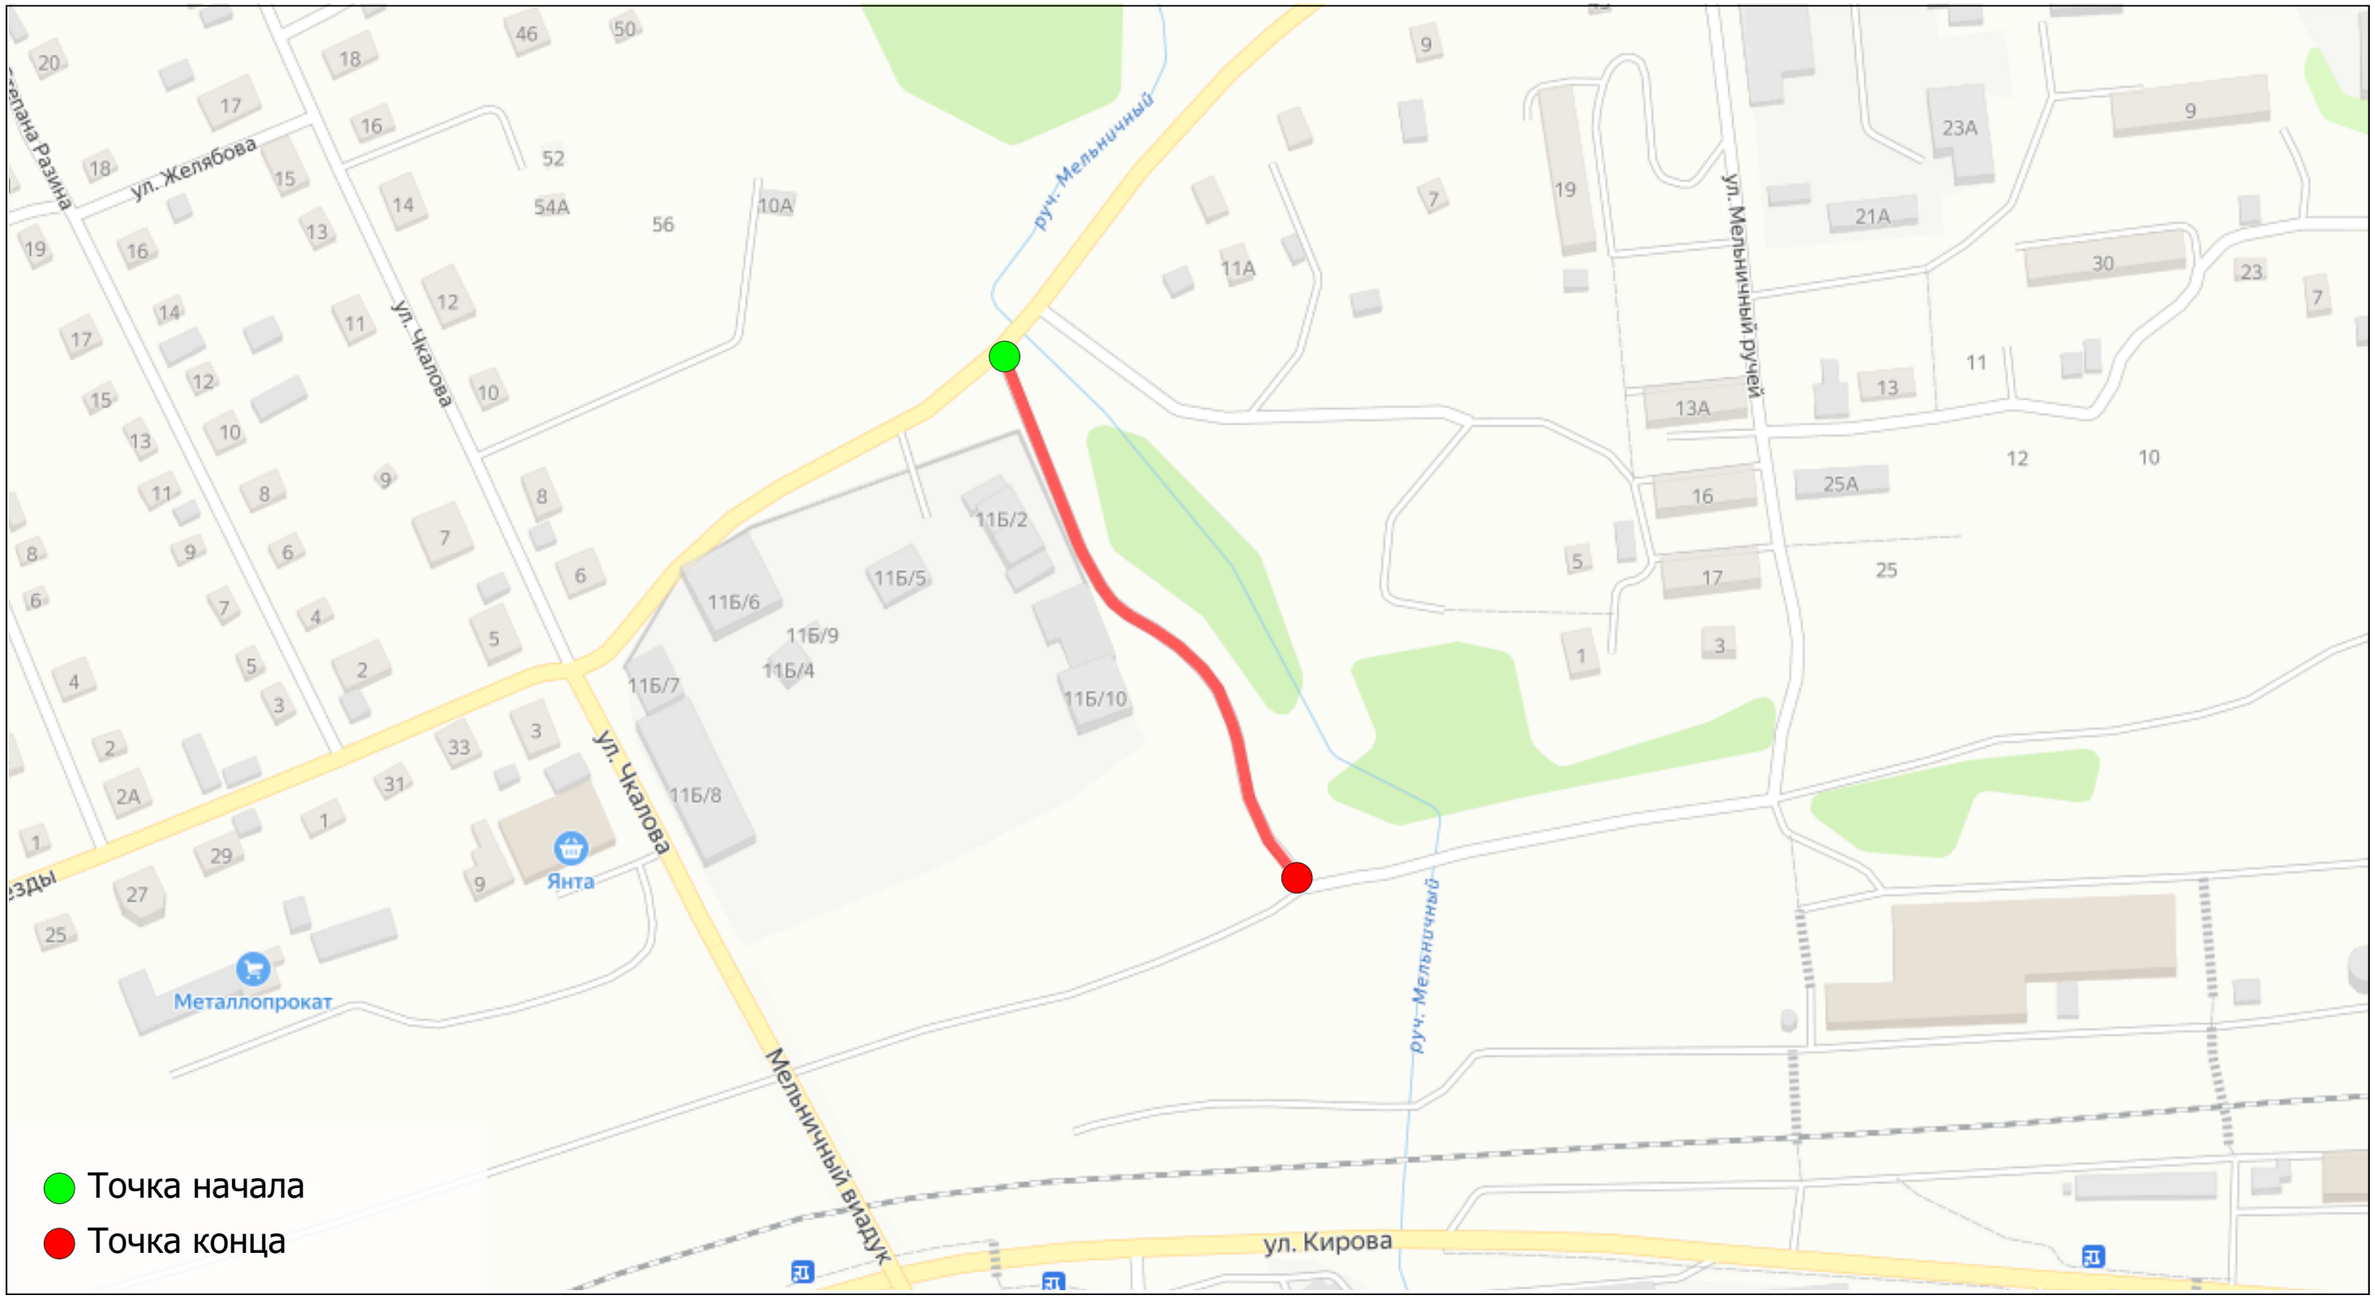

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	90 — 74 — 95 — R=2730м
Кривые в плане	50 — R=607м P=9; a=37° — 100 — R=610м P=10; a=36°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+150	Населенный пункт	3/3	140	0	Слева
Итого:				**3/3**	**140**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от многоквартирного дома по ул. Буровиков, д.1, по ул. Мира до жилого дома по ул. Мира, д. 7
км 0+000 - км 0+514

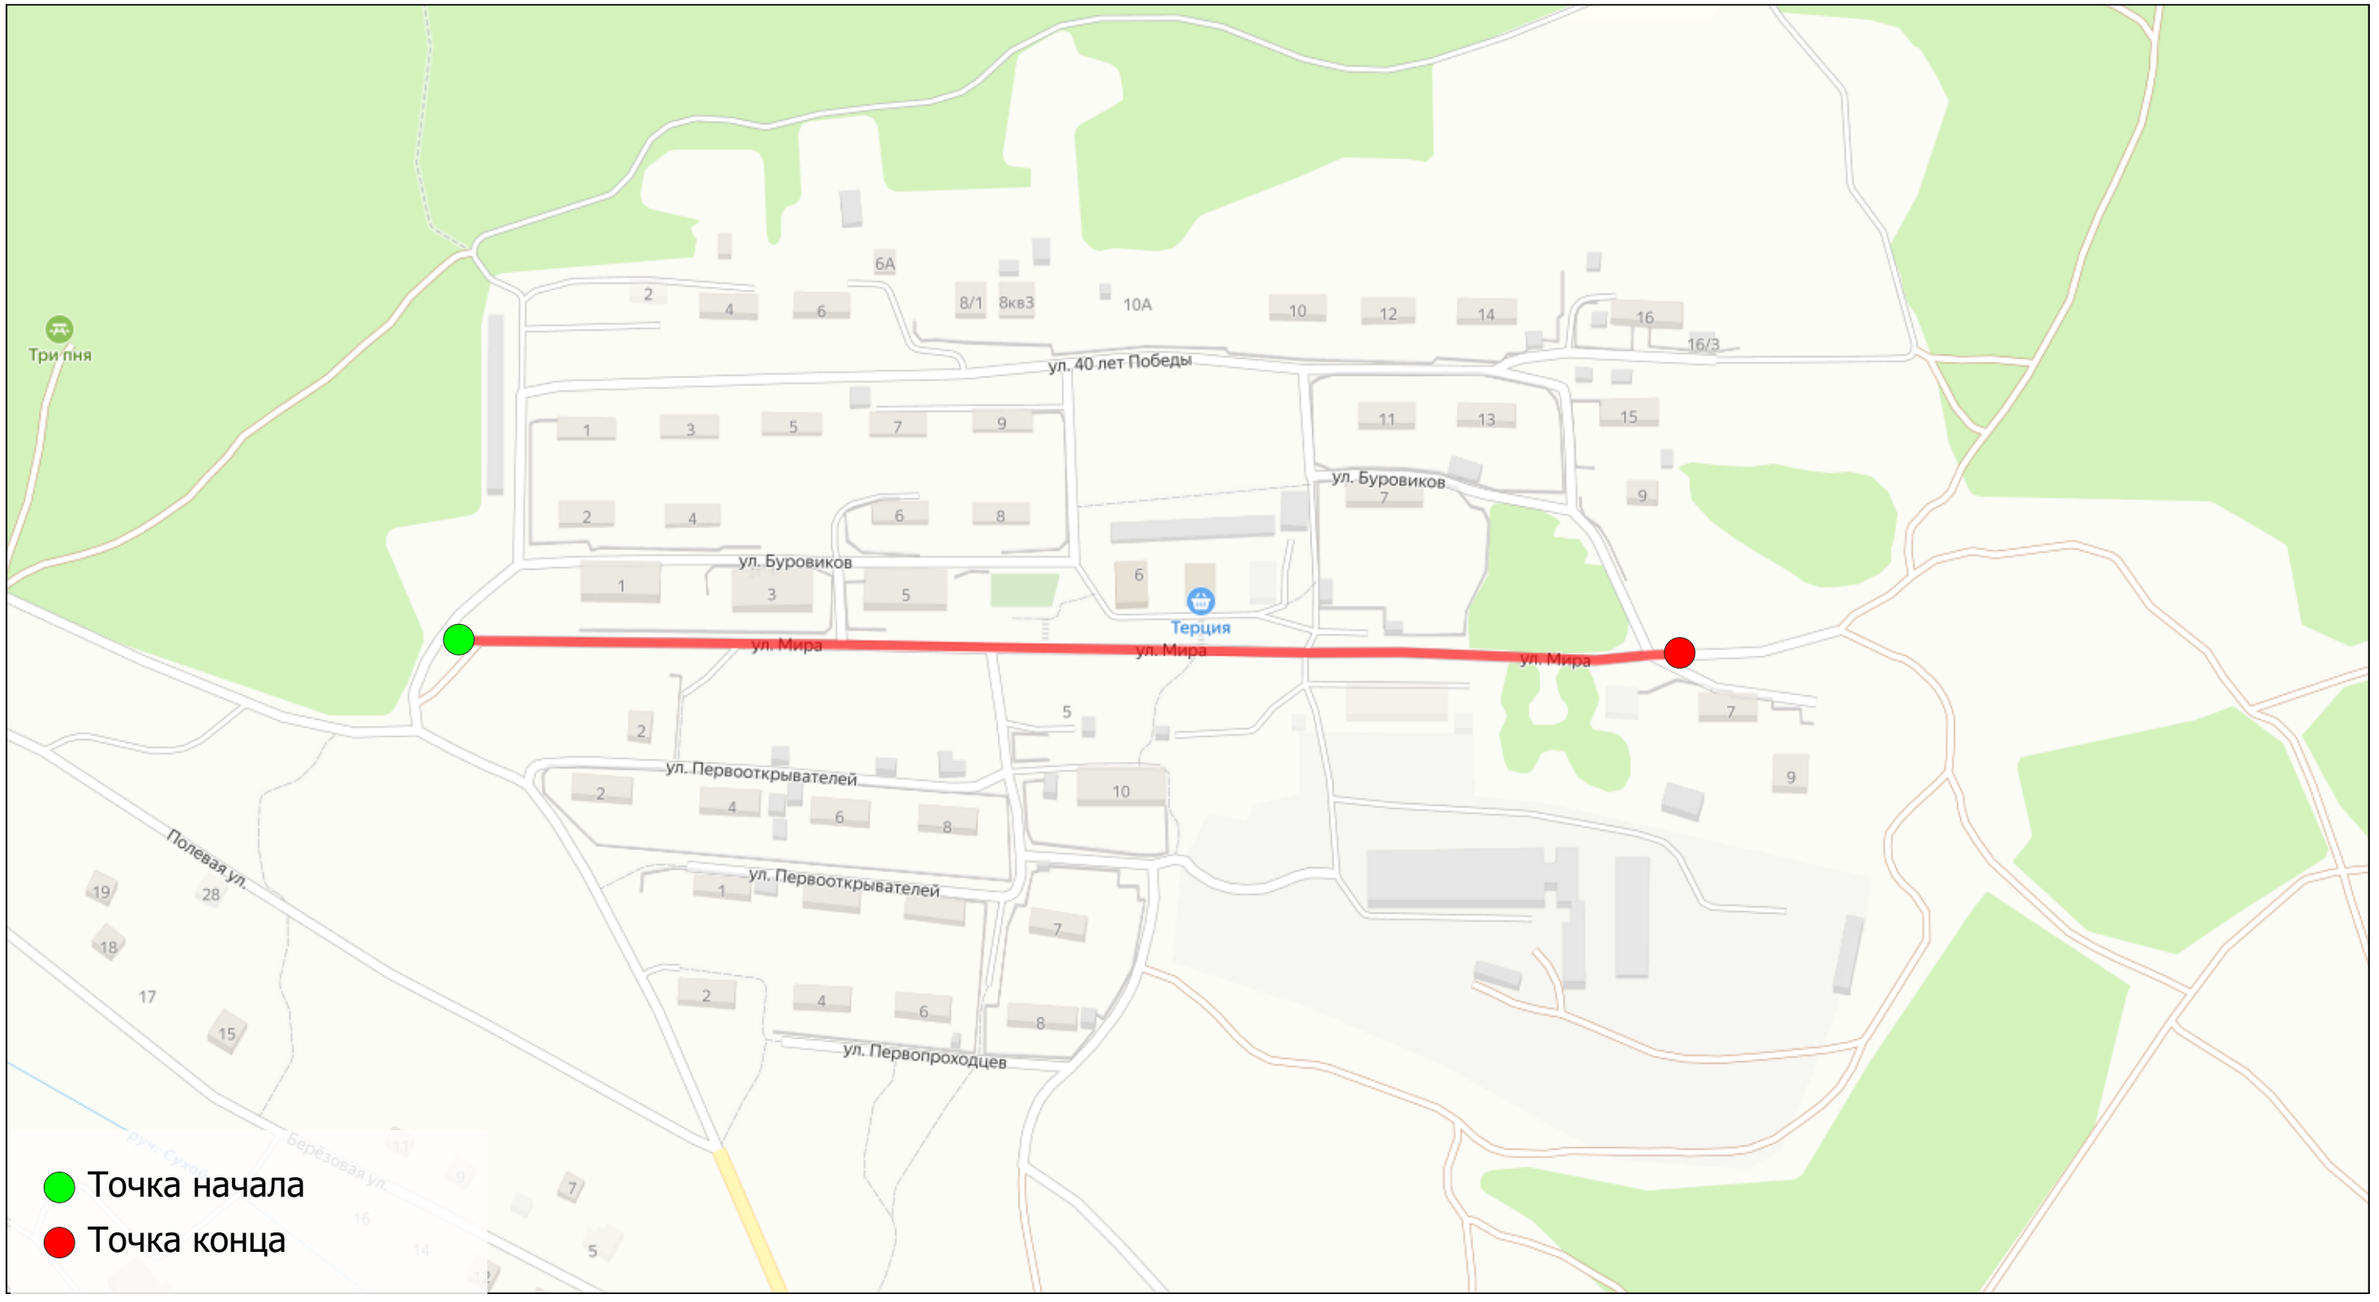

М 1:3000

Горизонтальная разметка и ее параметры	1-ая от осевой	1.2 0 - 157 | 1.7 157 - 167 | 1.2 167 - 364
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		24 | 30 (136) | R=3714м
Кривые в плане		
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		0 | 0,50-6,00-0,50 | 364 | 4,20 | 3,50

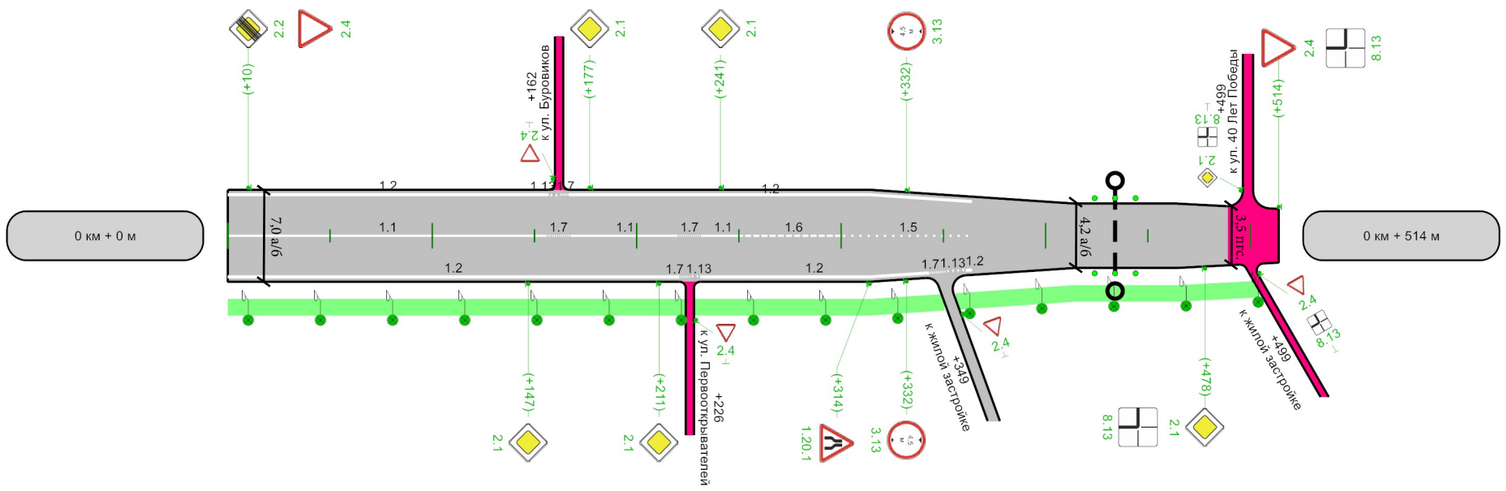

Горизонтальная разметка и ее параметры	осевая	1.1 0 - 156 | 1.7 156 - 168 | 1.1 168 - 220 | 1.7 220 - 232 | 1.1 232 - 252 | 1.6 252 - 302 | 1.5 302 - 364
	1-ая от осевой	1.2 0 - 221 | 1.7 221 - 231 | 1.2 231 - 342 | 1.7 342 - 361
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1,2м, бет, 0 - 224 | н/д: ширина 1,2м, бет, 228 - 350 | н/д: ширина 1,2м, бет, 356 - 504

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.13(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.250	0.750	0.500	0.250	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.60	
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 1	228,000	689,000	62,000	50,000	43,000	20,000	**99,650**
ИТОГО	**228,000**	**689,000**	**62,000**	**50,000**	**43,000**	**20,000**	**99,650**
ЛИН.КМ	**0,228**	**0,689**	**0,062**	**0,050**	**0,043**	**0,020**	
ПРИВЕД.КМ	**0,228**	**0,689**	**0,016**	**0,038**	**0,022**	**0,005**	
ПЛОЩАДЬ	**22,800**	**68,900**	**1,550**	**3,750**	**2,150**	**0,500**	**99,650**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.20.1	Сужение дороги			0+314	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога			0+147	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+177	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+211	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+241	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+478	Требуется установить	1	справа
7	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+514	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Запрещающие знаки						
10	3.13	Ограничение высоты			0+332	Требуется установить	1	слева
11	3.13	Ограничение высоты			0+332	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
12	8.13	Направление главной дороги			0+478	Требуется установить	1	справа
13	8.13	Направление главной дороги			0+514	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**13**	
		Всего:					**13**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+424	0+444	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+424	0+444	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**40/6**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+504	Населенный пункт	15/15	494	0	Справа
Итого:				**15/15**	**494**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+224	Обочина	Справа	224	
2	0+228	0+350	Обочина	Справа	122	
3	0+356	0+504	Обочина	Справа	148	
Итого:					**494**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до автодороги ул. Портовая
км 0+000 - км 2+083



М 1:3000

Автомобильная дорога от дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до автодороги ул. Портовая

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	10 — 11 (381) — R=10013м — 4 (532) — 4 (554) — R=3692м — 26 (660) — 25 (680) — R=4580м — 3 (781)
Кривые в плане	432 — R=680м P=37; a=10° — 481 — 598 — R=673м P=16; a=24° — 668 — R=670м P=55; a=7 — 953 — 985
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 673 — 4,50

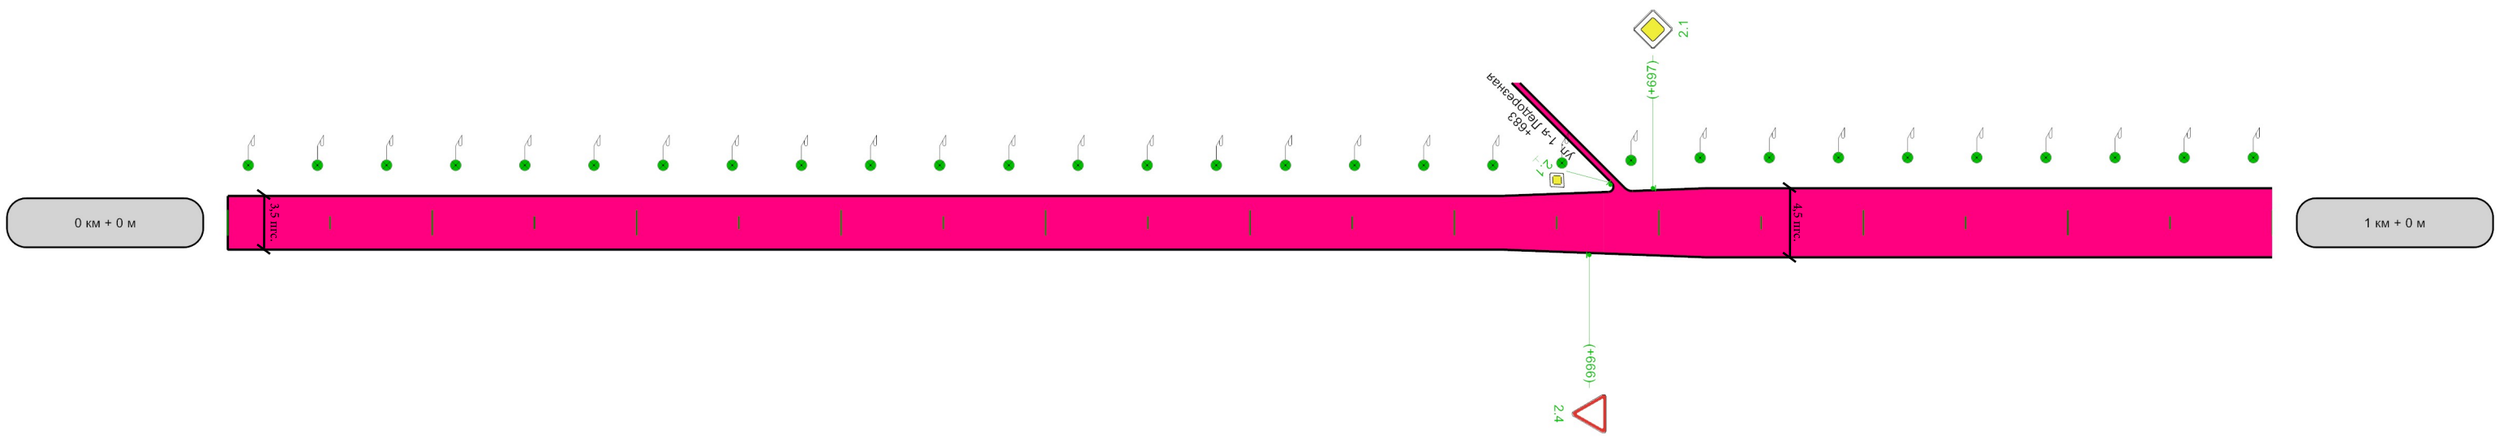


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Автомобильная дорога от дома по ул. Поконечный ручей, д.7 до автодороги ул. Портовая


Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	3 — 2 (298) — R=4985м — 18 (391) — 18 (412) — R=5217м — 4 (522)
Кривые в плане	R=647м P=16; a=24° (160 — 219); R=692м P=19; a=21° (415 — 448)
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50

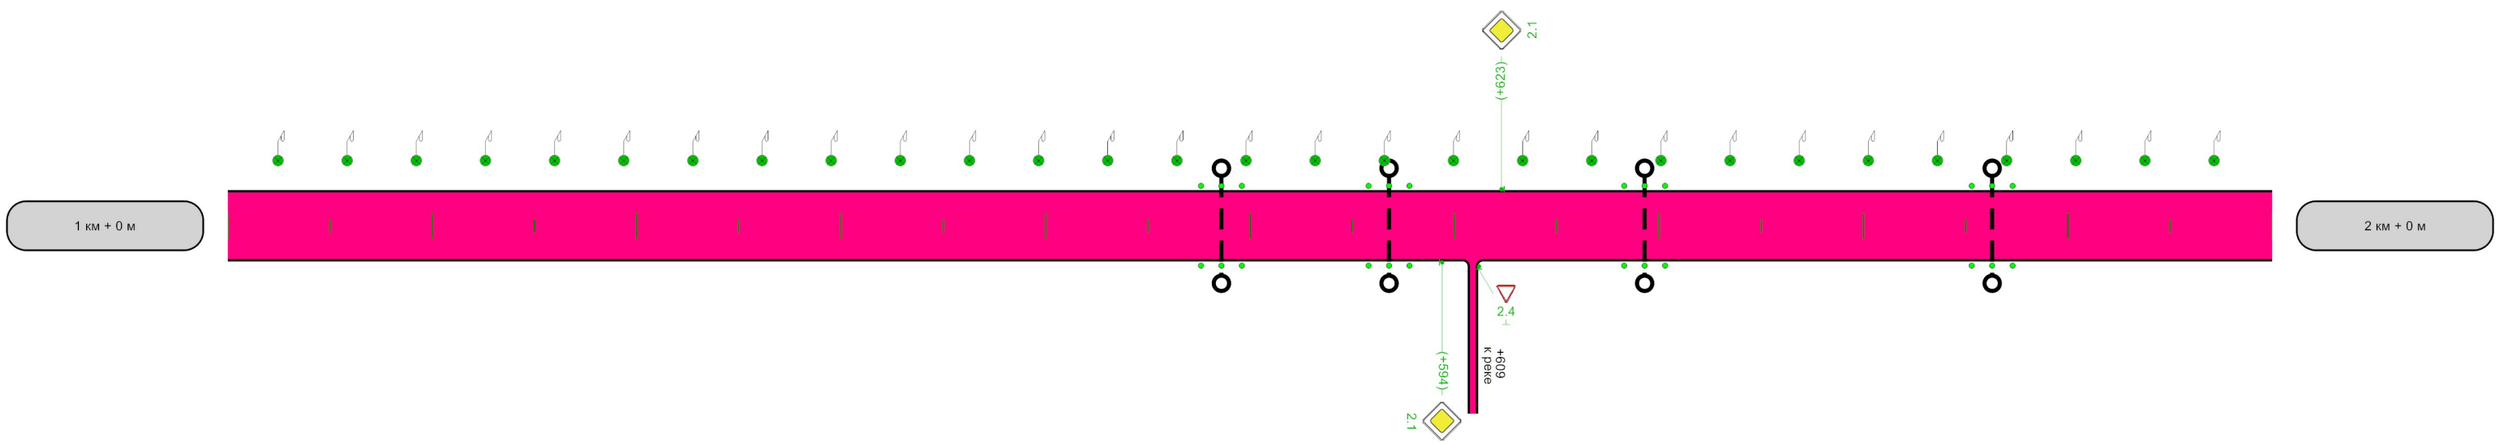

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4
Кривые в плане	28 R=694м 62 Р=19; а=21°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+697	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога			1+594	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога			1+623	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+666	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+476	1+496	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	1+476	1+496	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	1+558	1+578	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	1+558	1+578	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	1+683	1+703	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	1+683	1+703	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
7	1+853	1+873	20/3			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
8	1+853	1+873	20/3			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**160/24**					


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	2+073	Населенный пункт	62/62	2063	0	Слева
Итого:				**62/62**	**2063**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от жилого дома по ул. Пушкина 1 до жилого дома по ул. Пушкина 59


1-й участок: км 0+000 - км 0+991
2-й участок: км 0+000 - км 0+179

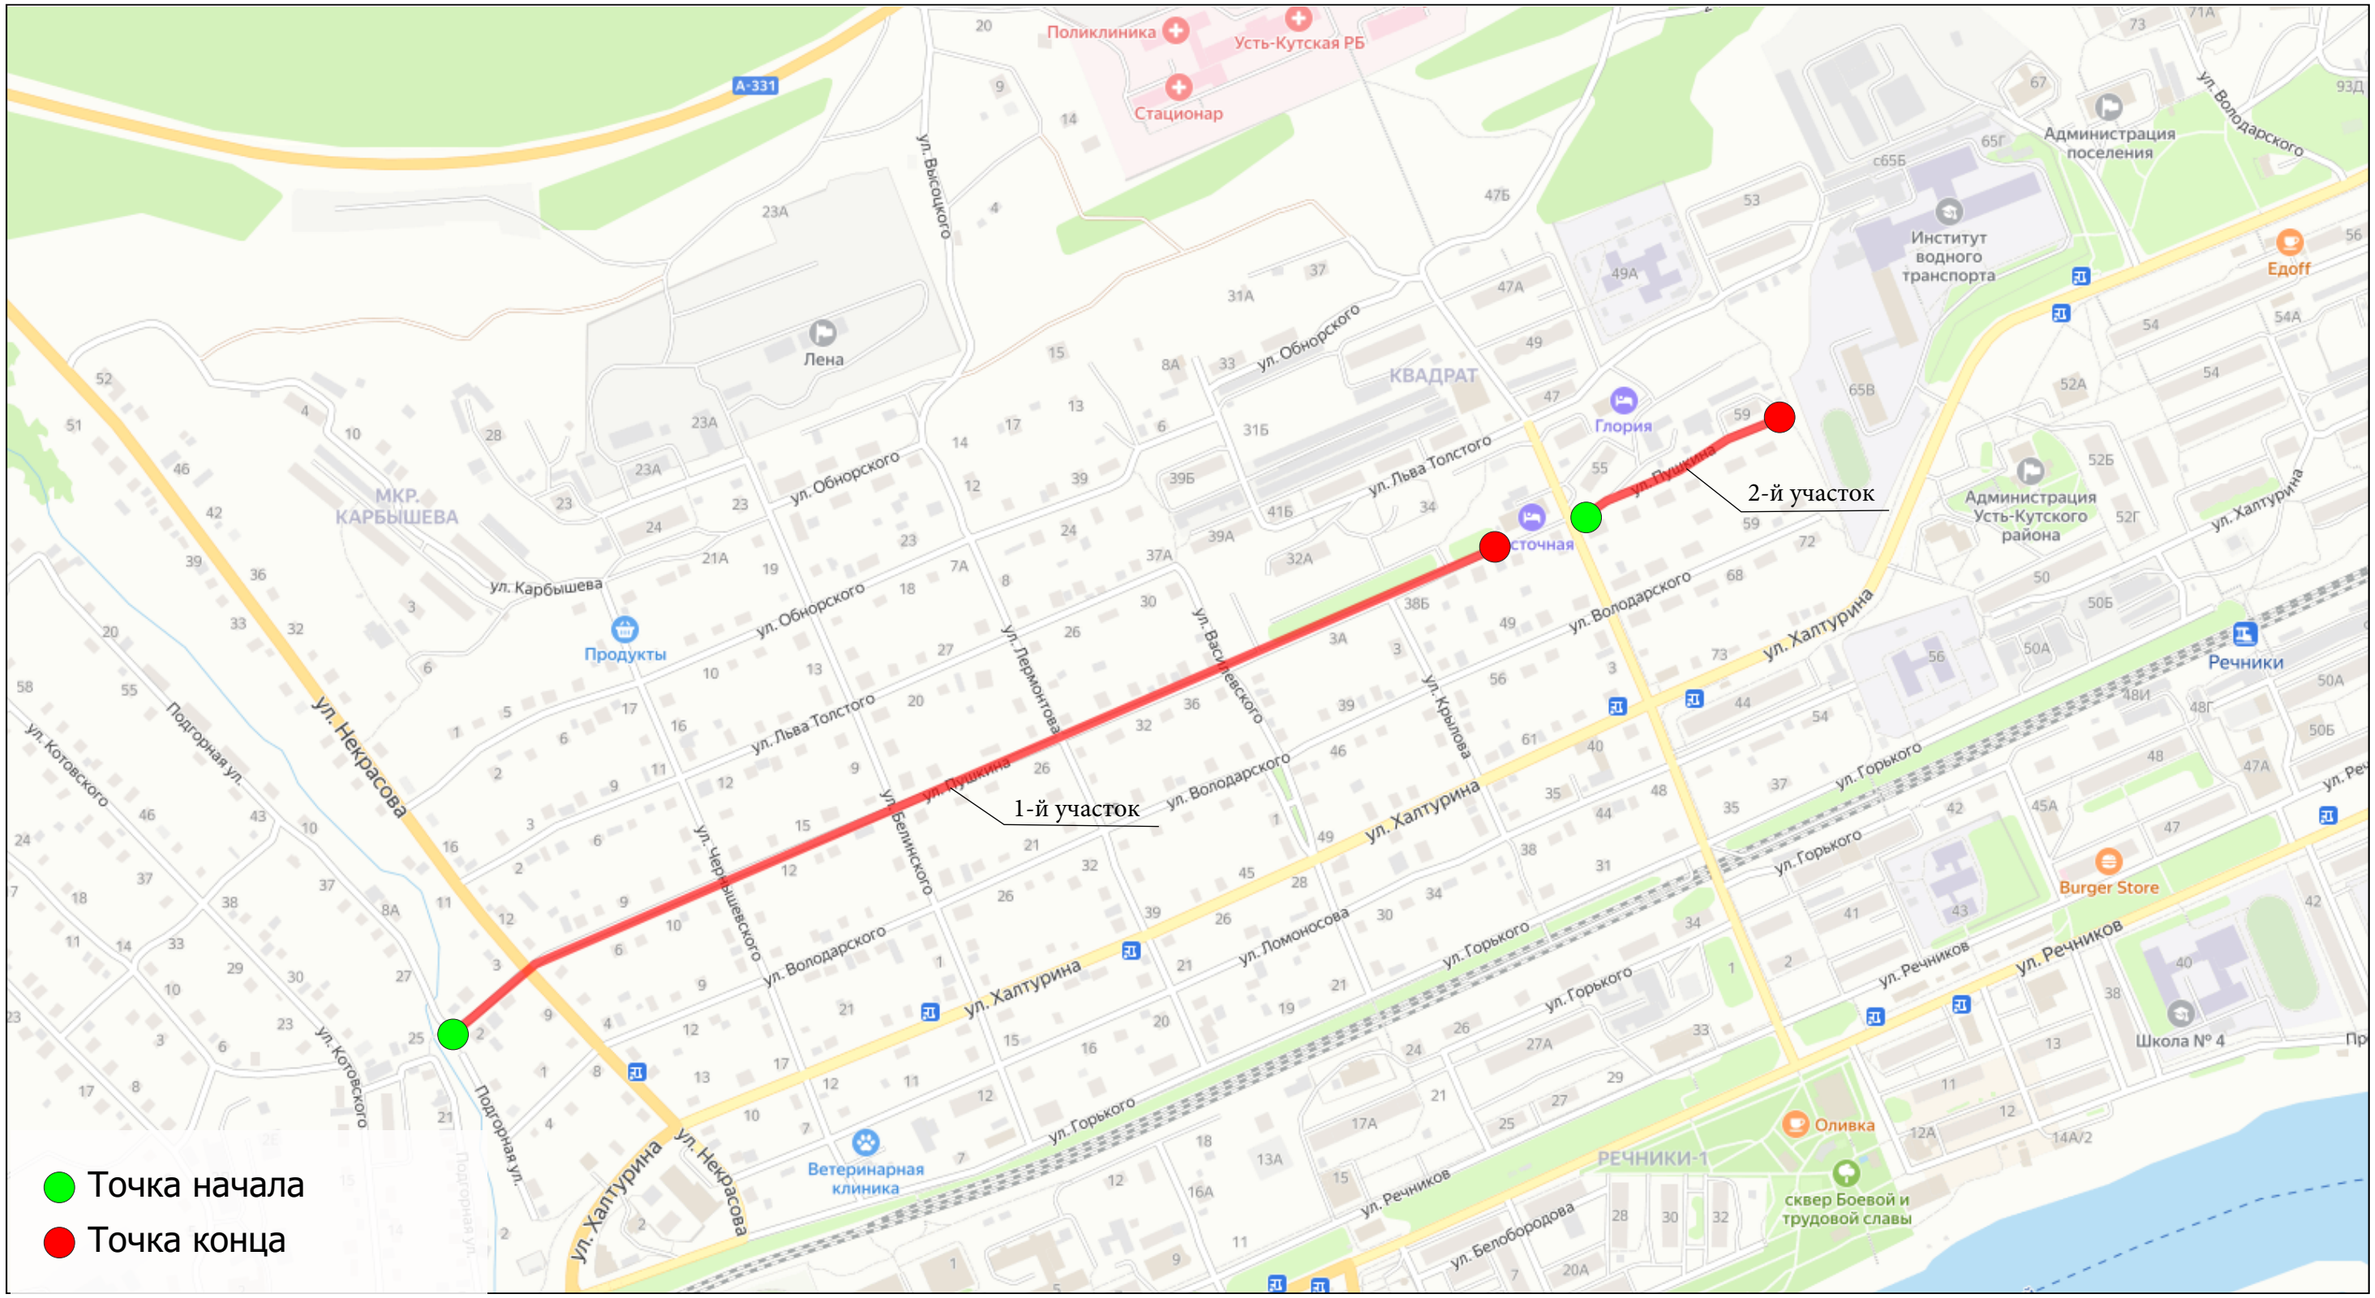

М 1:3000

Автомобильная дорога от жилого дома по ул. Пушкина 1 до жилого дома по ул. Пушкина 59 уч. №1

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 44 2 R=1575м 134 141 134 162 R=3133м 25 495 35 609 R=3550м 9 701
Кривые в плане	R=643м P=9; a=40° 29 R=63м P=2; a=9° 49 94 R=631м P=35; a=1° 118
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,50

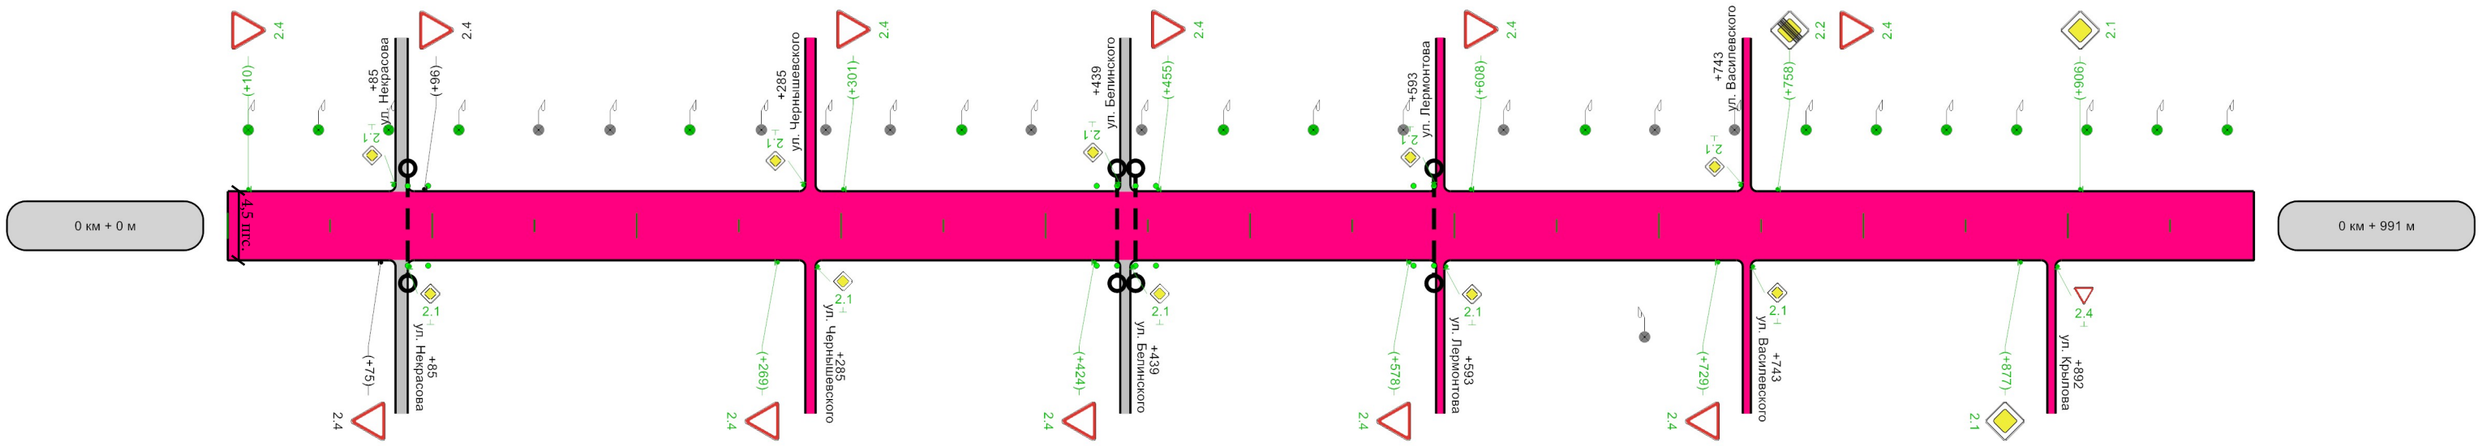

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+877	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+906	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+758	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу			0+075	Установлено	1	справа
6	2.4	Уступите дорогу			0+096	Установлено	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу			0+269	Требуется установить	1	справа
8	2.4	Уступите дорогу			0+301	Требуется установить	1	слева
9	2.4	Уступите дорогу			0+424	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу			0+455	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+578	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу			0+608	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу			0+729	Требуется установить	1	справа
14	2.4	Уступите дорогу			0+758	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**12**	
		Итого:					**14**	
		Всего установлено:					**2**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**12**	
		Всего:					**14**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+088	0+098	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+088	0+098	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
3	0+425	0+435	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
4	0+425	0+435	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
5	0+444	0+454	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
6	0+444	0+454	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
7	0+580	0+590	10/2			Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
8	0+580	0+590	10/2			Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**80/16**					

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+113	Населенный пункт	4/4	103	0	Слева
2	0+152	0+152	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
3	0+187	0+187	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
4	0+226	0+226	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
5	0+261	0+324	Населенный пункт	3/3	0	63	Слева
6	0+359	0+359	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+393	0+393	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
8	0+447	0+447	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
9	0+487	0+531	Населенный пункт	2/2	44	0	Слева
10	0+575	0+575	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
11	0+624	0+624	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
12	0+664	0+664	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
13	0+693	0+693	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
14	0+698	0+698	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
15	0+737	0+737	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
16	0+772	0+978	Населенный пункт	7/7	206	0	Слева
Итого:				**28/28**	**353**	**63**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Элементы дороги в продольном профиле			
Кривые в плане			
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 46		
Характеристики проезжей части	4,00	40	4,00

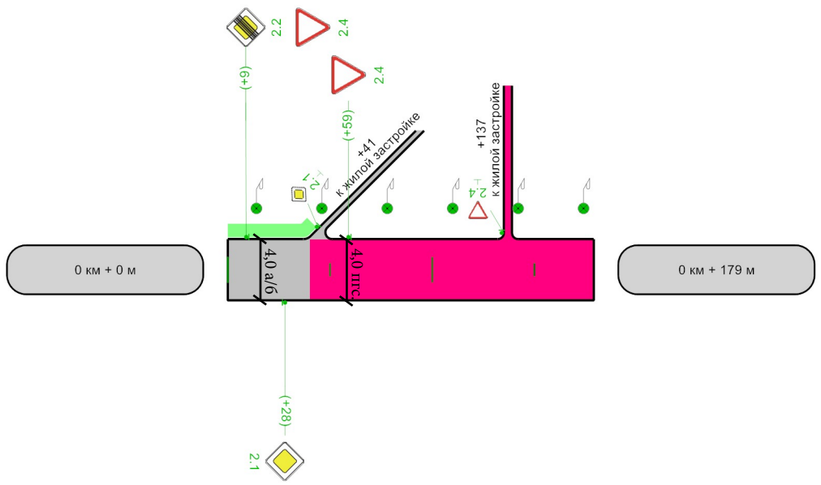

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+028	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги			0+009	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+009	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+059	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+014	0+174	Населенный пункт	6/6	160	0	Слева
Итого:				**6/6**	**160**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+046	Жилая застройка	Слева	46	
Итого:					**46**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Вишневая, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная

1-й участок: км 0+000 - км 0+590
2-й участок: км 0+000 - км 0+565



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	109
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00 — 500 — 6,00

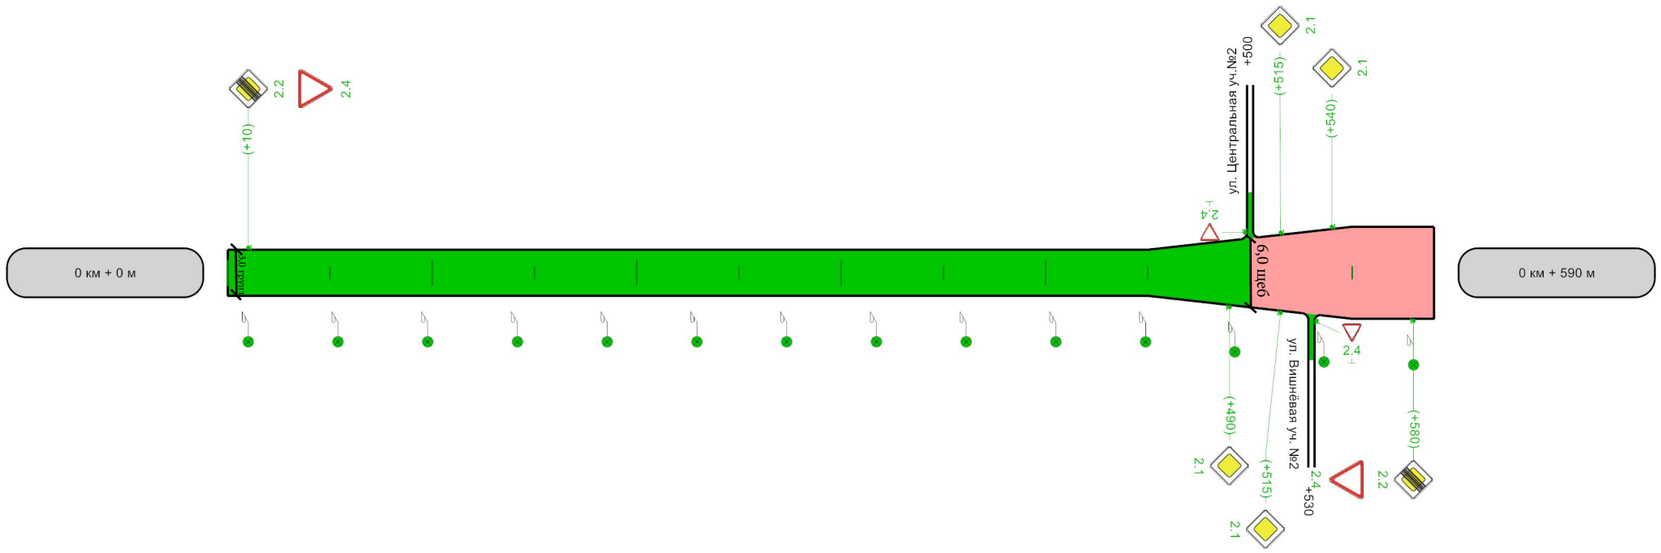

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+490	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+515	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога			0+515	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога			0+540	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги			0+580	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу			0+580	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**8**	
		Итого:					**8**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**8**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+580	Населенный пункт	14/14	570	0	Справа
Итого:				**14/14**	**570**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	2
Кривые в плане	525 R=350 545
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

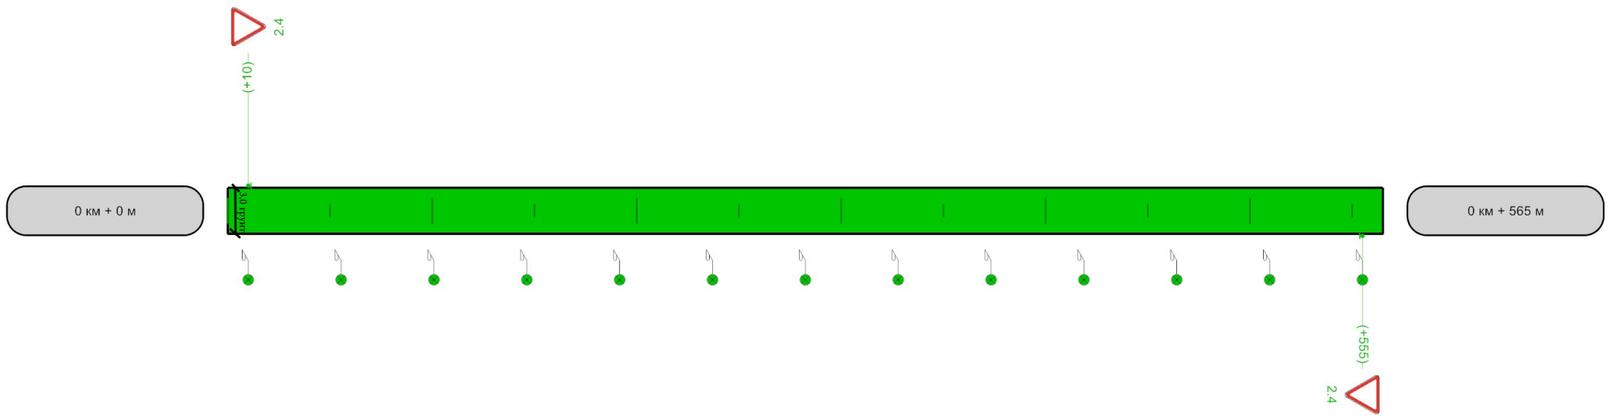

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+555	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+555	Населенный пункт	13/13	545	0	Справа
Итого:				**13/13**	**545**	**0**	


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от многоквартирного дома по ул. Речников, 16 до земельного участка по ул. Гайдара, 9
км 0+000 - км 0+087

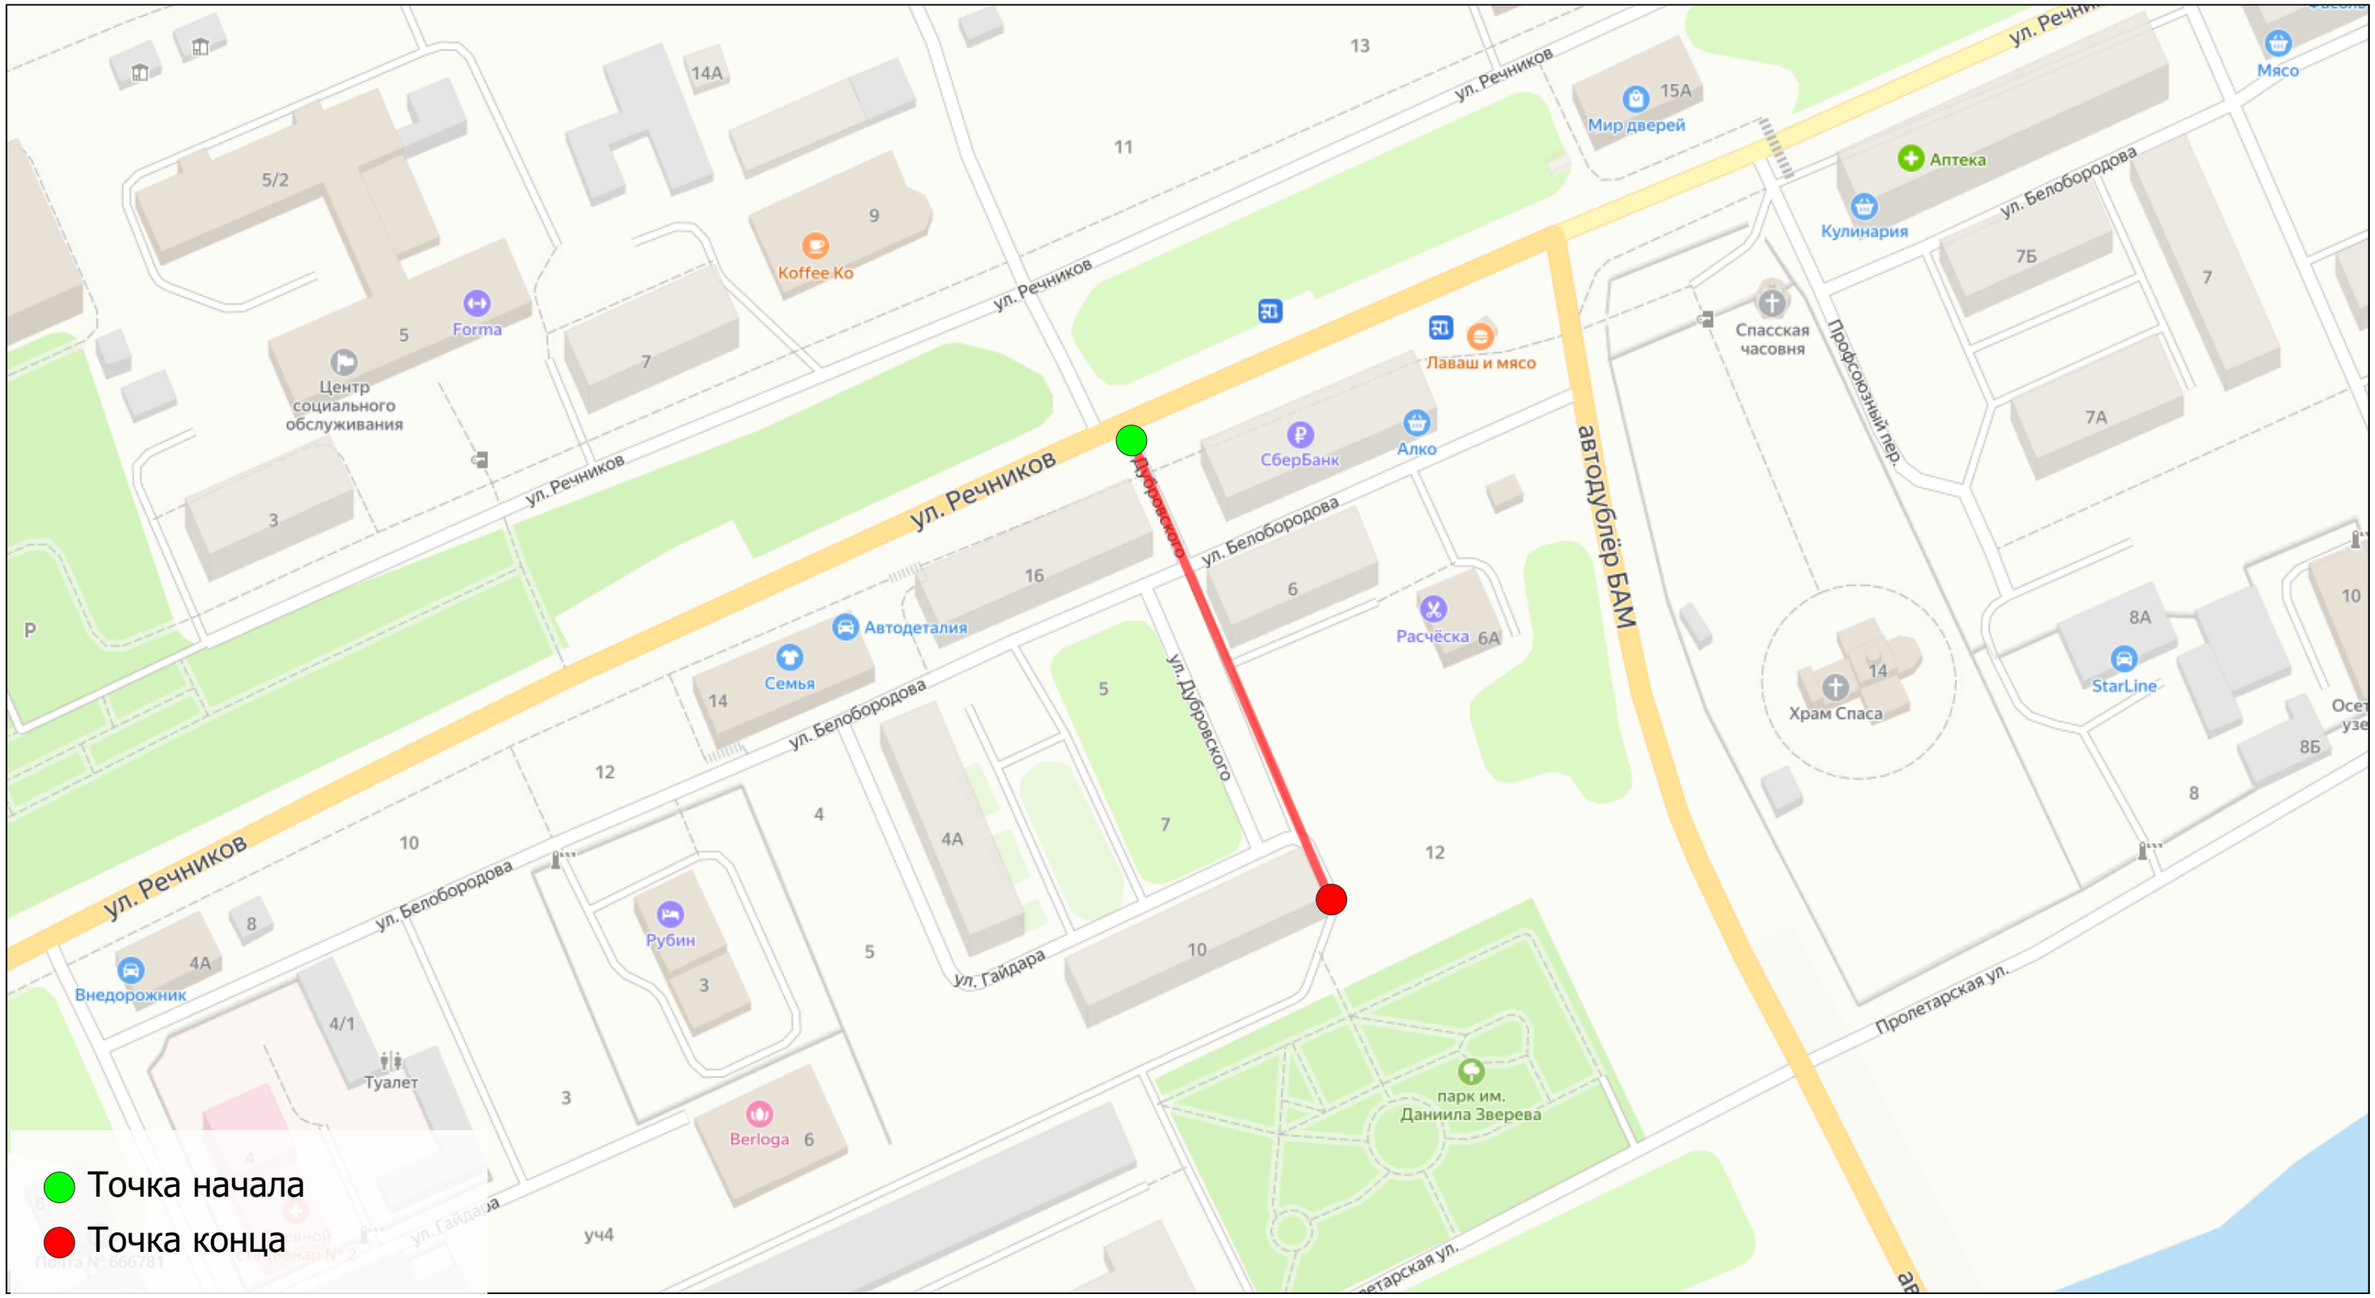

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	32
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 27 - 87
Характеристики проезжей части	3,80

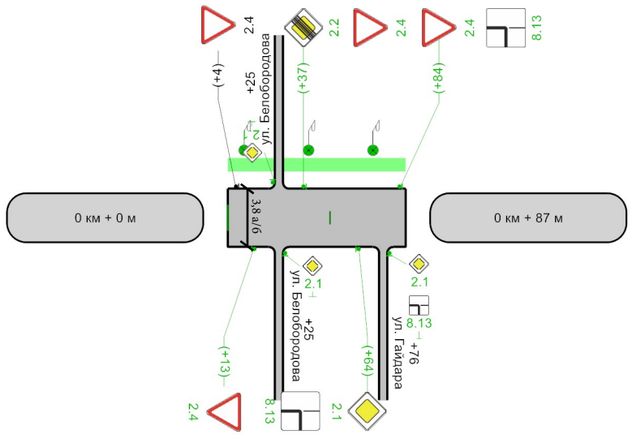

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+064	Требуется установить	1	справа
2	2.2	Конец главной дороги			0+037	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу			0+004	Установлено	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+013	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу			0+037	Требуется установить	1	слева
6	2.4	Уступите дорогу			0+084	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**5**	
		Итого:					**6**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
7	8.13	Направление главной дороги			0+064	Требуется установить	1	справа
8	8.13	Направление главной дороги			0+084	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**7**	
		Всего:					**8**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008	0+071	Населенный пункт	3/3	63	0	Слева
Итого:				**3/3**	**63**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+024	Жилая застройка	Слева	24	
2	0+027	0+087	Жилая застройка	Слева	60	
Итого:					**84**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по ул. Центральная, от примыкания ул. Солнечная до примыкания к ул. Грибная

1-й участок: км 0+000 - км 0+538
2-й участок: км 0+000 - км 0+050

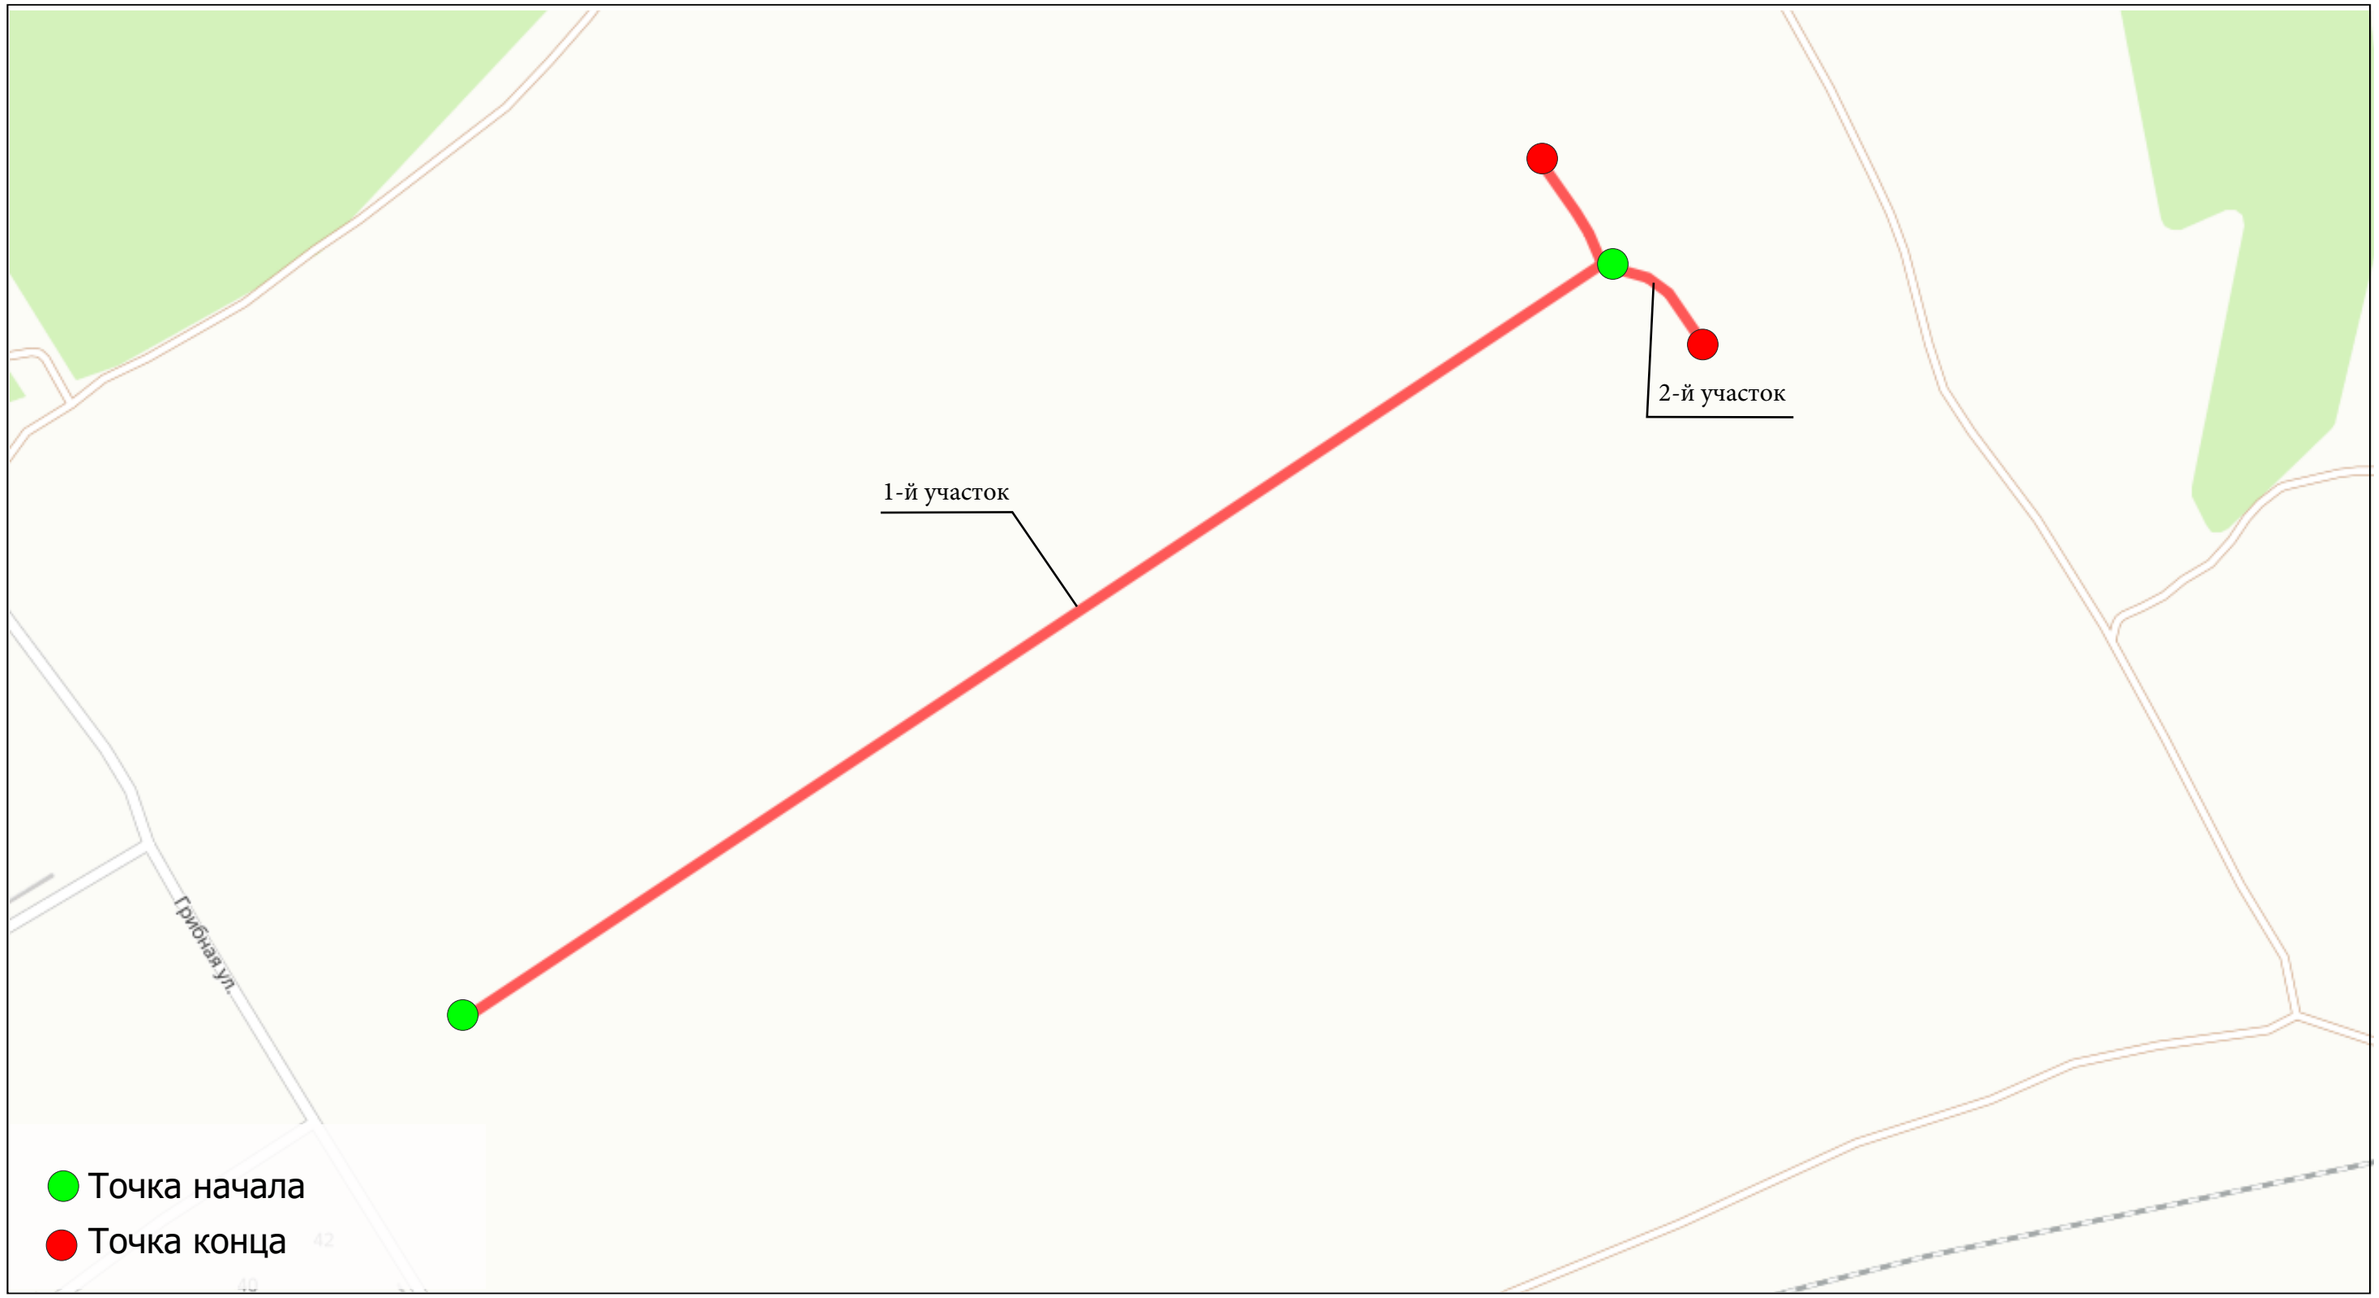

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	6 — 102 — 2 — R=9354м — 230 — 16
Кривые в плане	480 R=30м P=3; a=6° 510
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,00

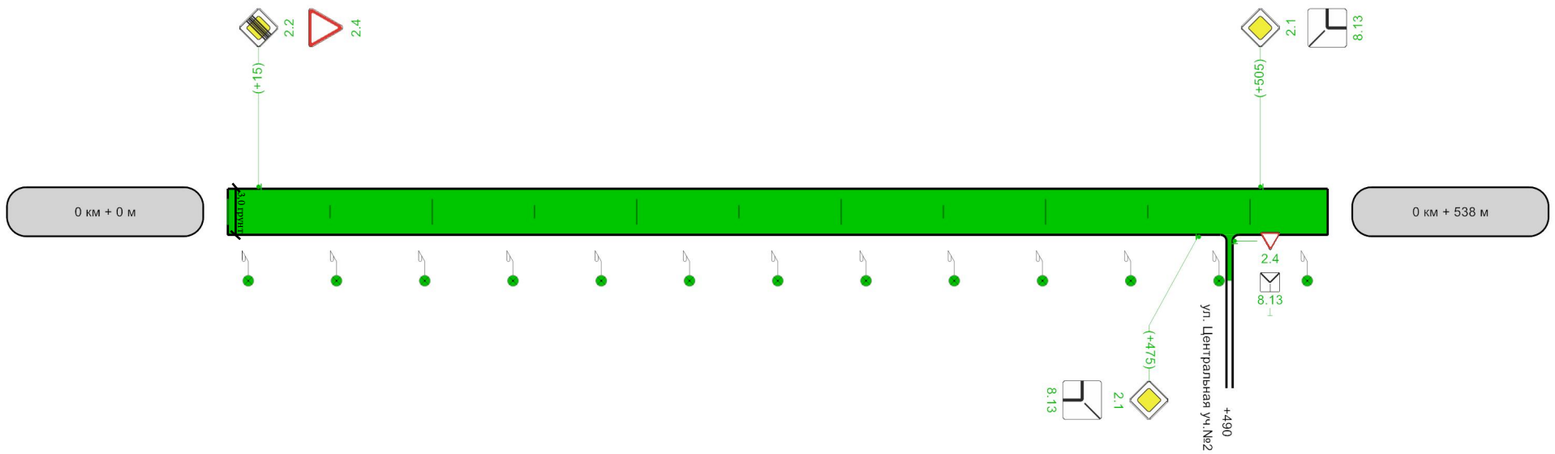

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+475	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+505	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+015	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**4**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
5	8.13	Направление главной дороги			0+475	Требуется установить	1	справа
6	8.13	Направление главной дороги			0+505	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**6**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+528	Населенный пункт	13/13	518	0	Справа
Итого:				**13/13**	**518**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	78
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00

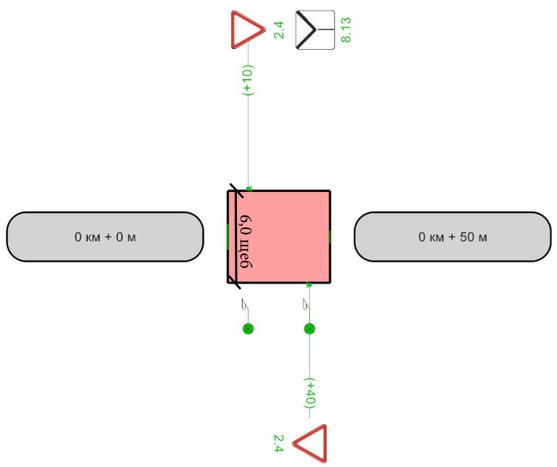

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+040	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+040	Населенный пункт	2/2	30	0	Справа
Итого:				**2/2**	**30**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома по ул. Фадеева, д.1 до жилого дома по ул. Фадеева, д.12

км 0+000 - км 0+372

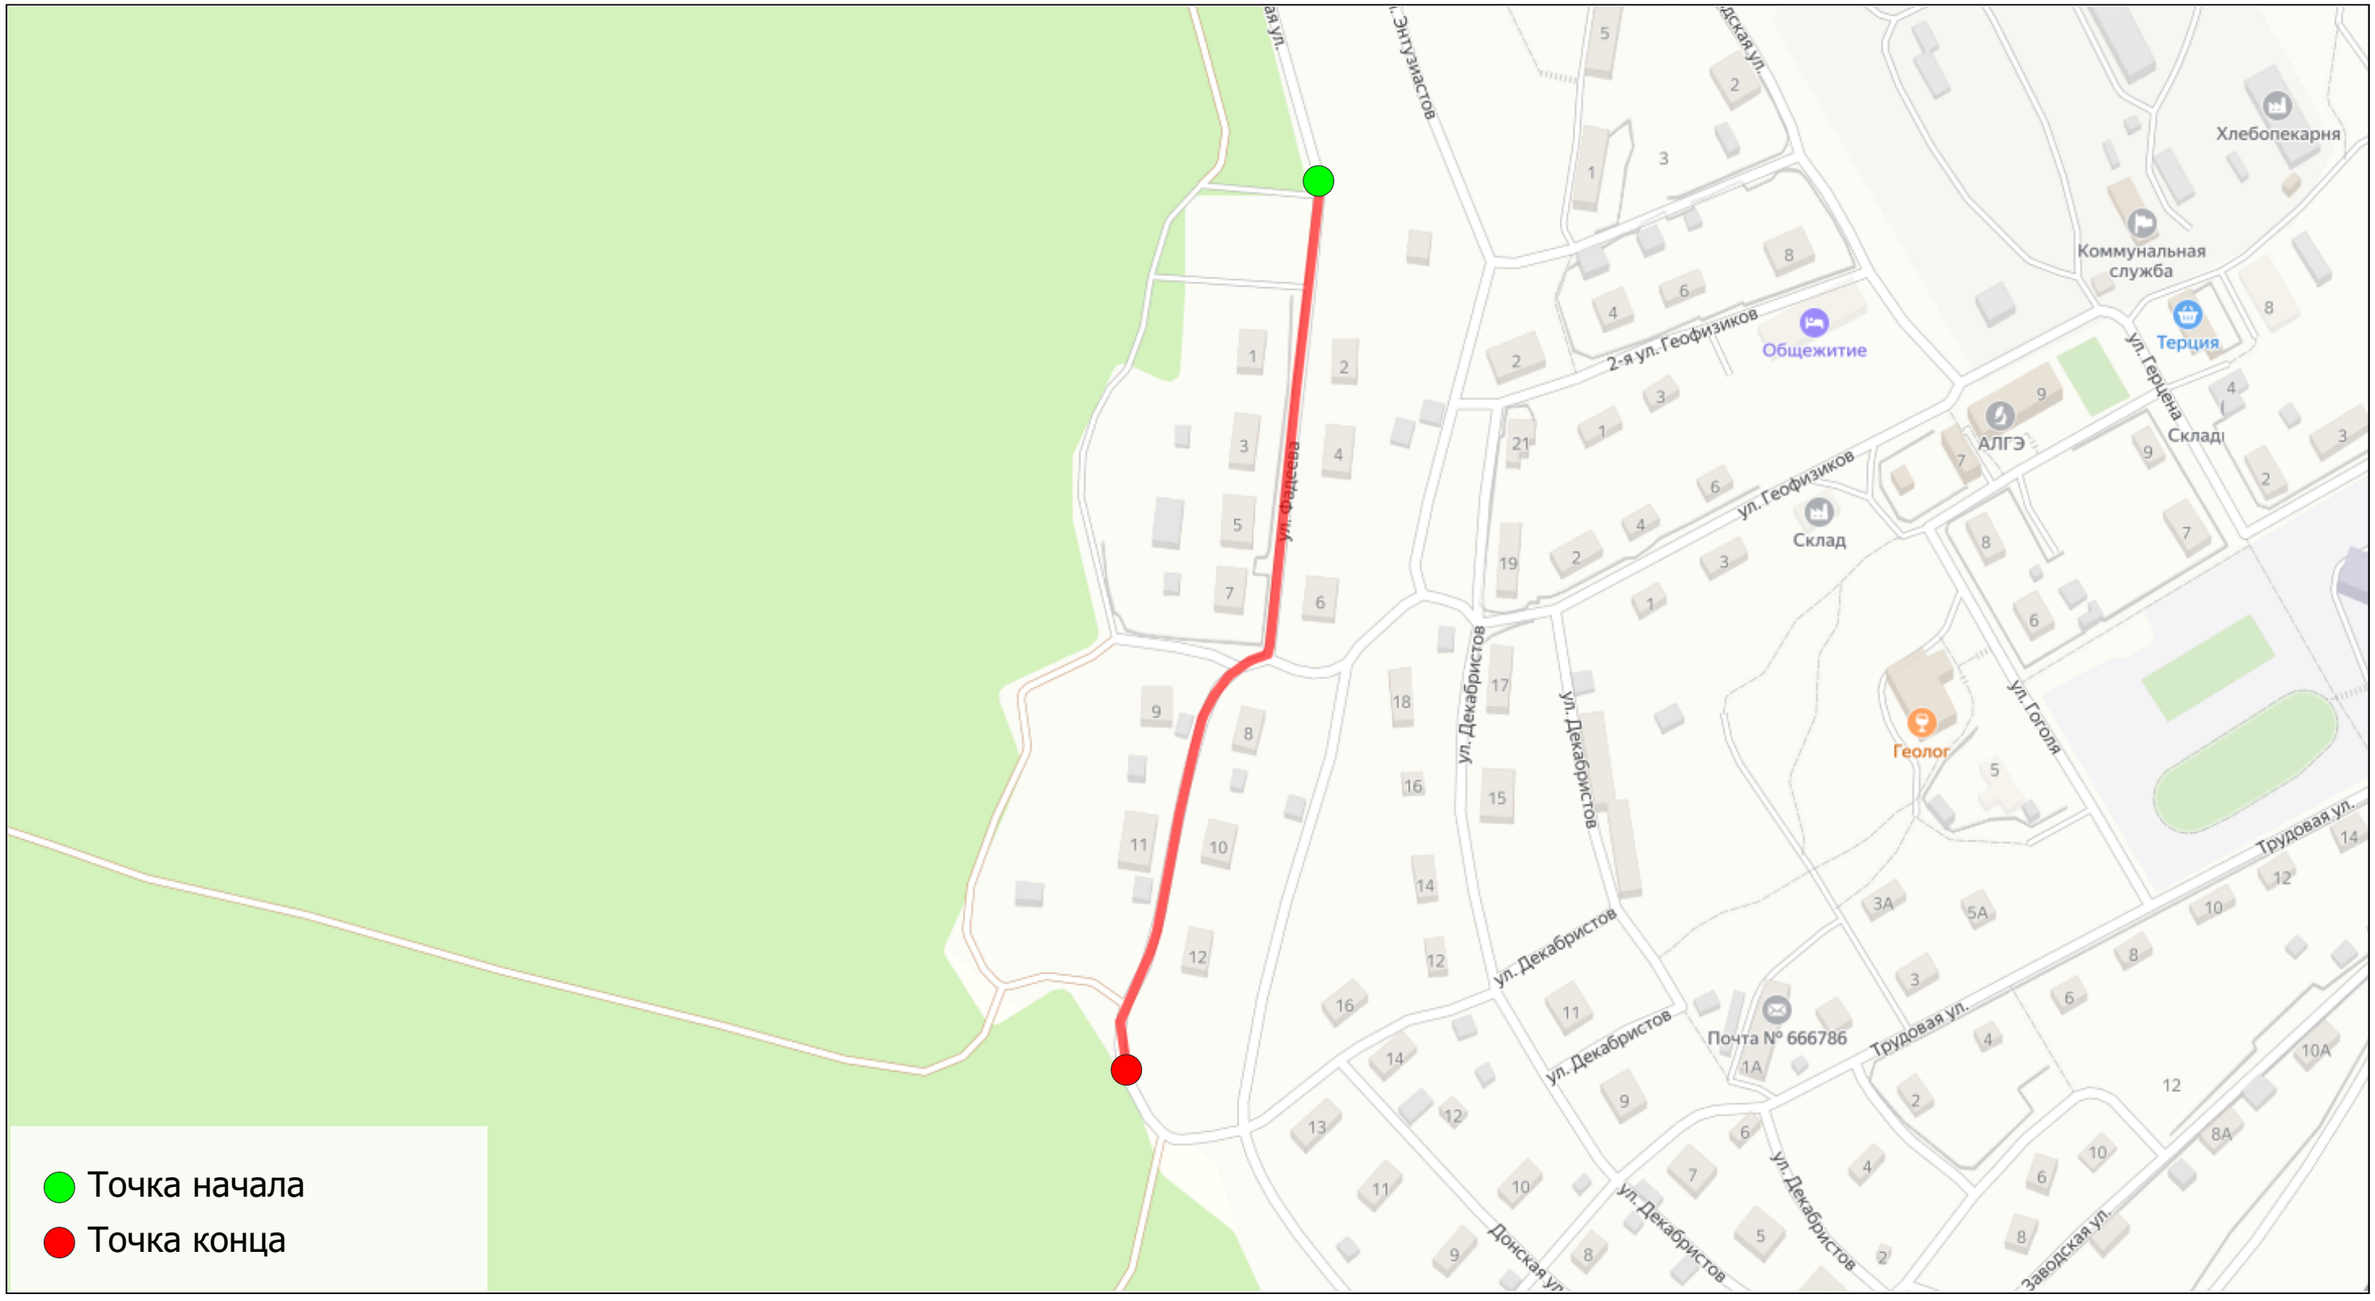

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	4 на 40
Кривые в плане	180 (135м, 45°); 195 R=245м P=6; a=23°; 230
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0: 3,00; 90: 4,00; 190: 3,00

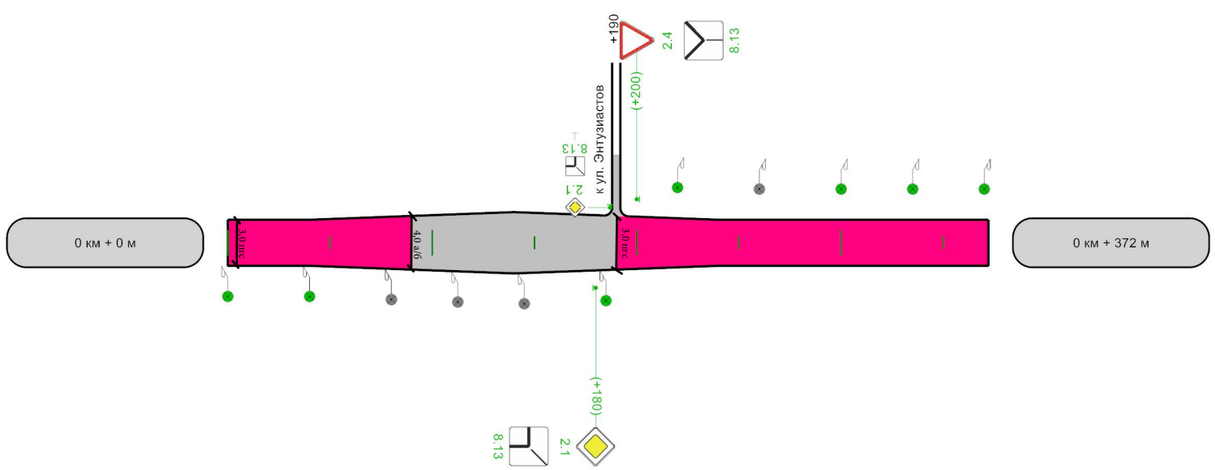

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+180	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
3	8.13	Направление главной дороги			0+180	Требуется установить	1	справа
4	8.13	Направление главной дороги			0+200	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**4**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+080	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
2	0+000	0+372	Населенный пункт	3/3	372	0	Справа
3	0+080	0+145	Населенный пункт	3/3	0	65	Справа
4	0+185	0+185	Населенный пункт	1/1	0	0	Справа
5	0+220	0+220	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
6	0+260	0+260	Населенный пункт	1/1	0	0	Слева
7	0+300	0+370	Населенный пункт	3/3	70	0	Слева
Итого:				**15/15**	**522**	**65**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от пересечения дороги вблизи дома № 2 по улице Спортивной до пересечения дороги вблизи дома №14 по улице Спортивная

км 0+000 - км 0+377

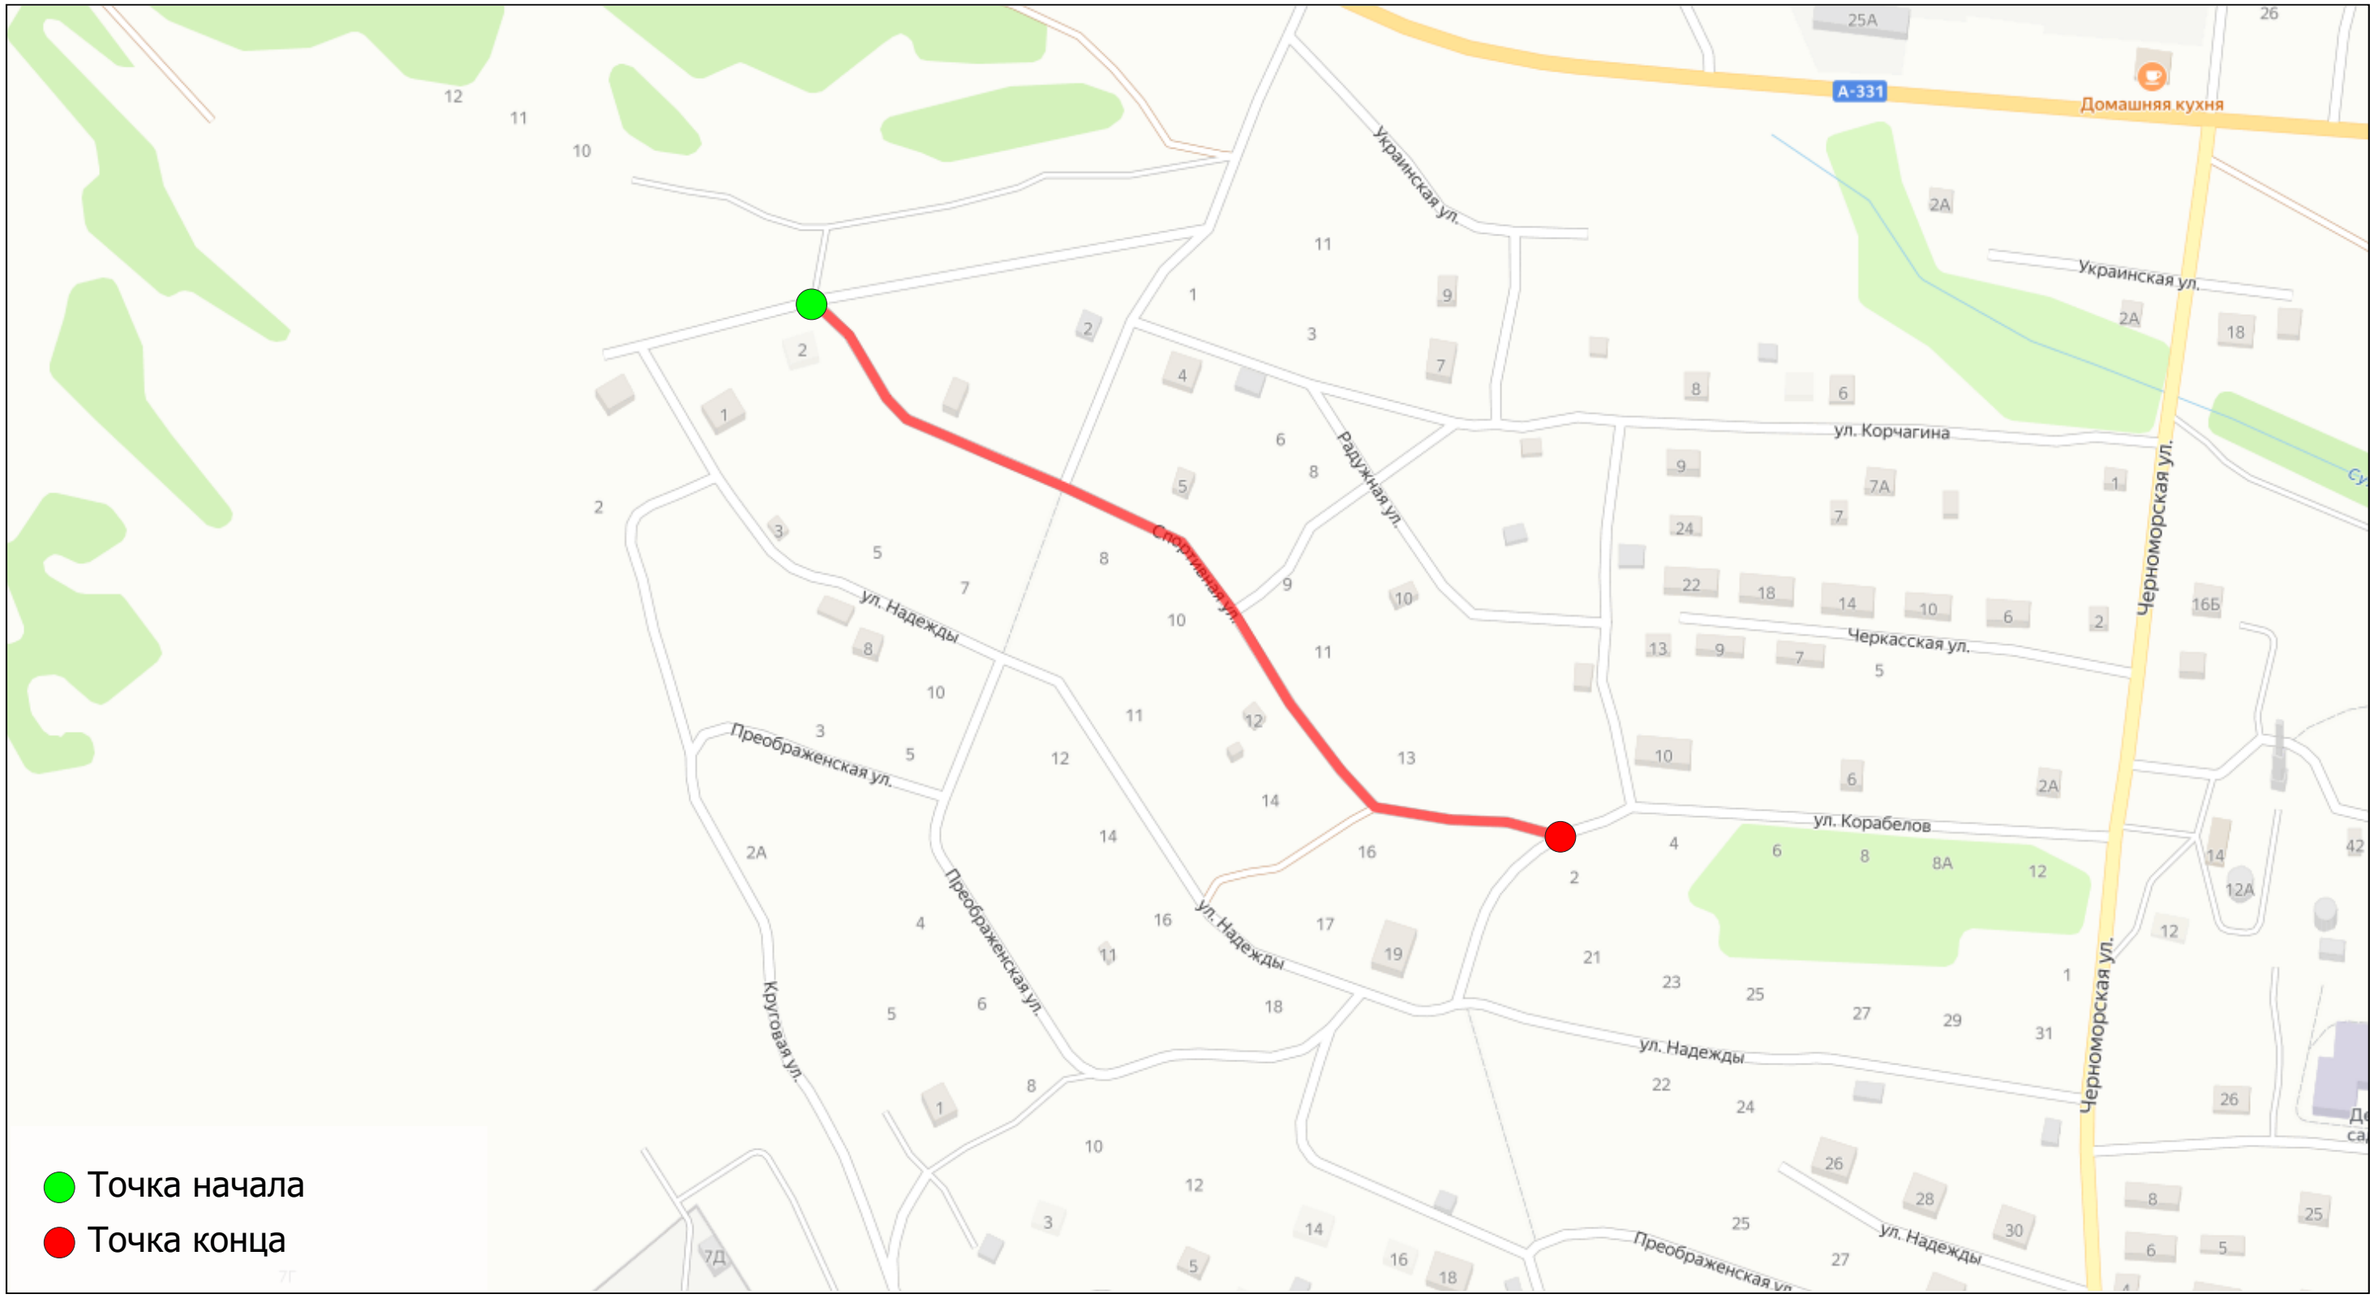

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	1 — 19 — 2 — R=3193м — 52 — 107 — 18 — 272 — R=2173м
Кривые в плане	2 — R=602м P=5; a=67° — 110 — 161 — R=622м P=8; a=45° — 257 — R=629м P=6; a=60°
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,00

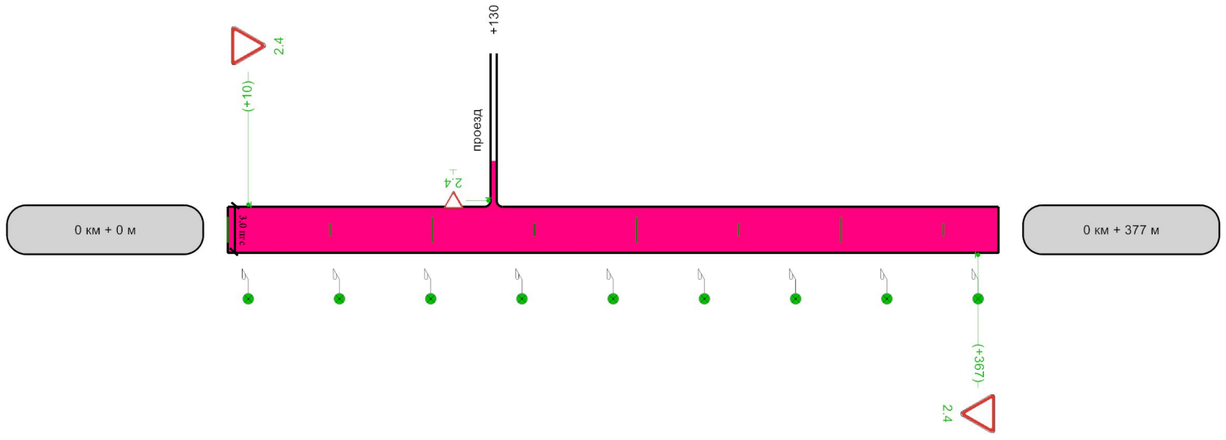

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+367	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+367	Населенный пункт	9/9	357	0	Справа
Итого:				**9/9**	**357**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от въезда с ул. Пушкина до жилого дома по ул. Пушкина, 103

км 0+000 -км 0+187

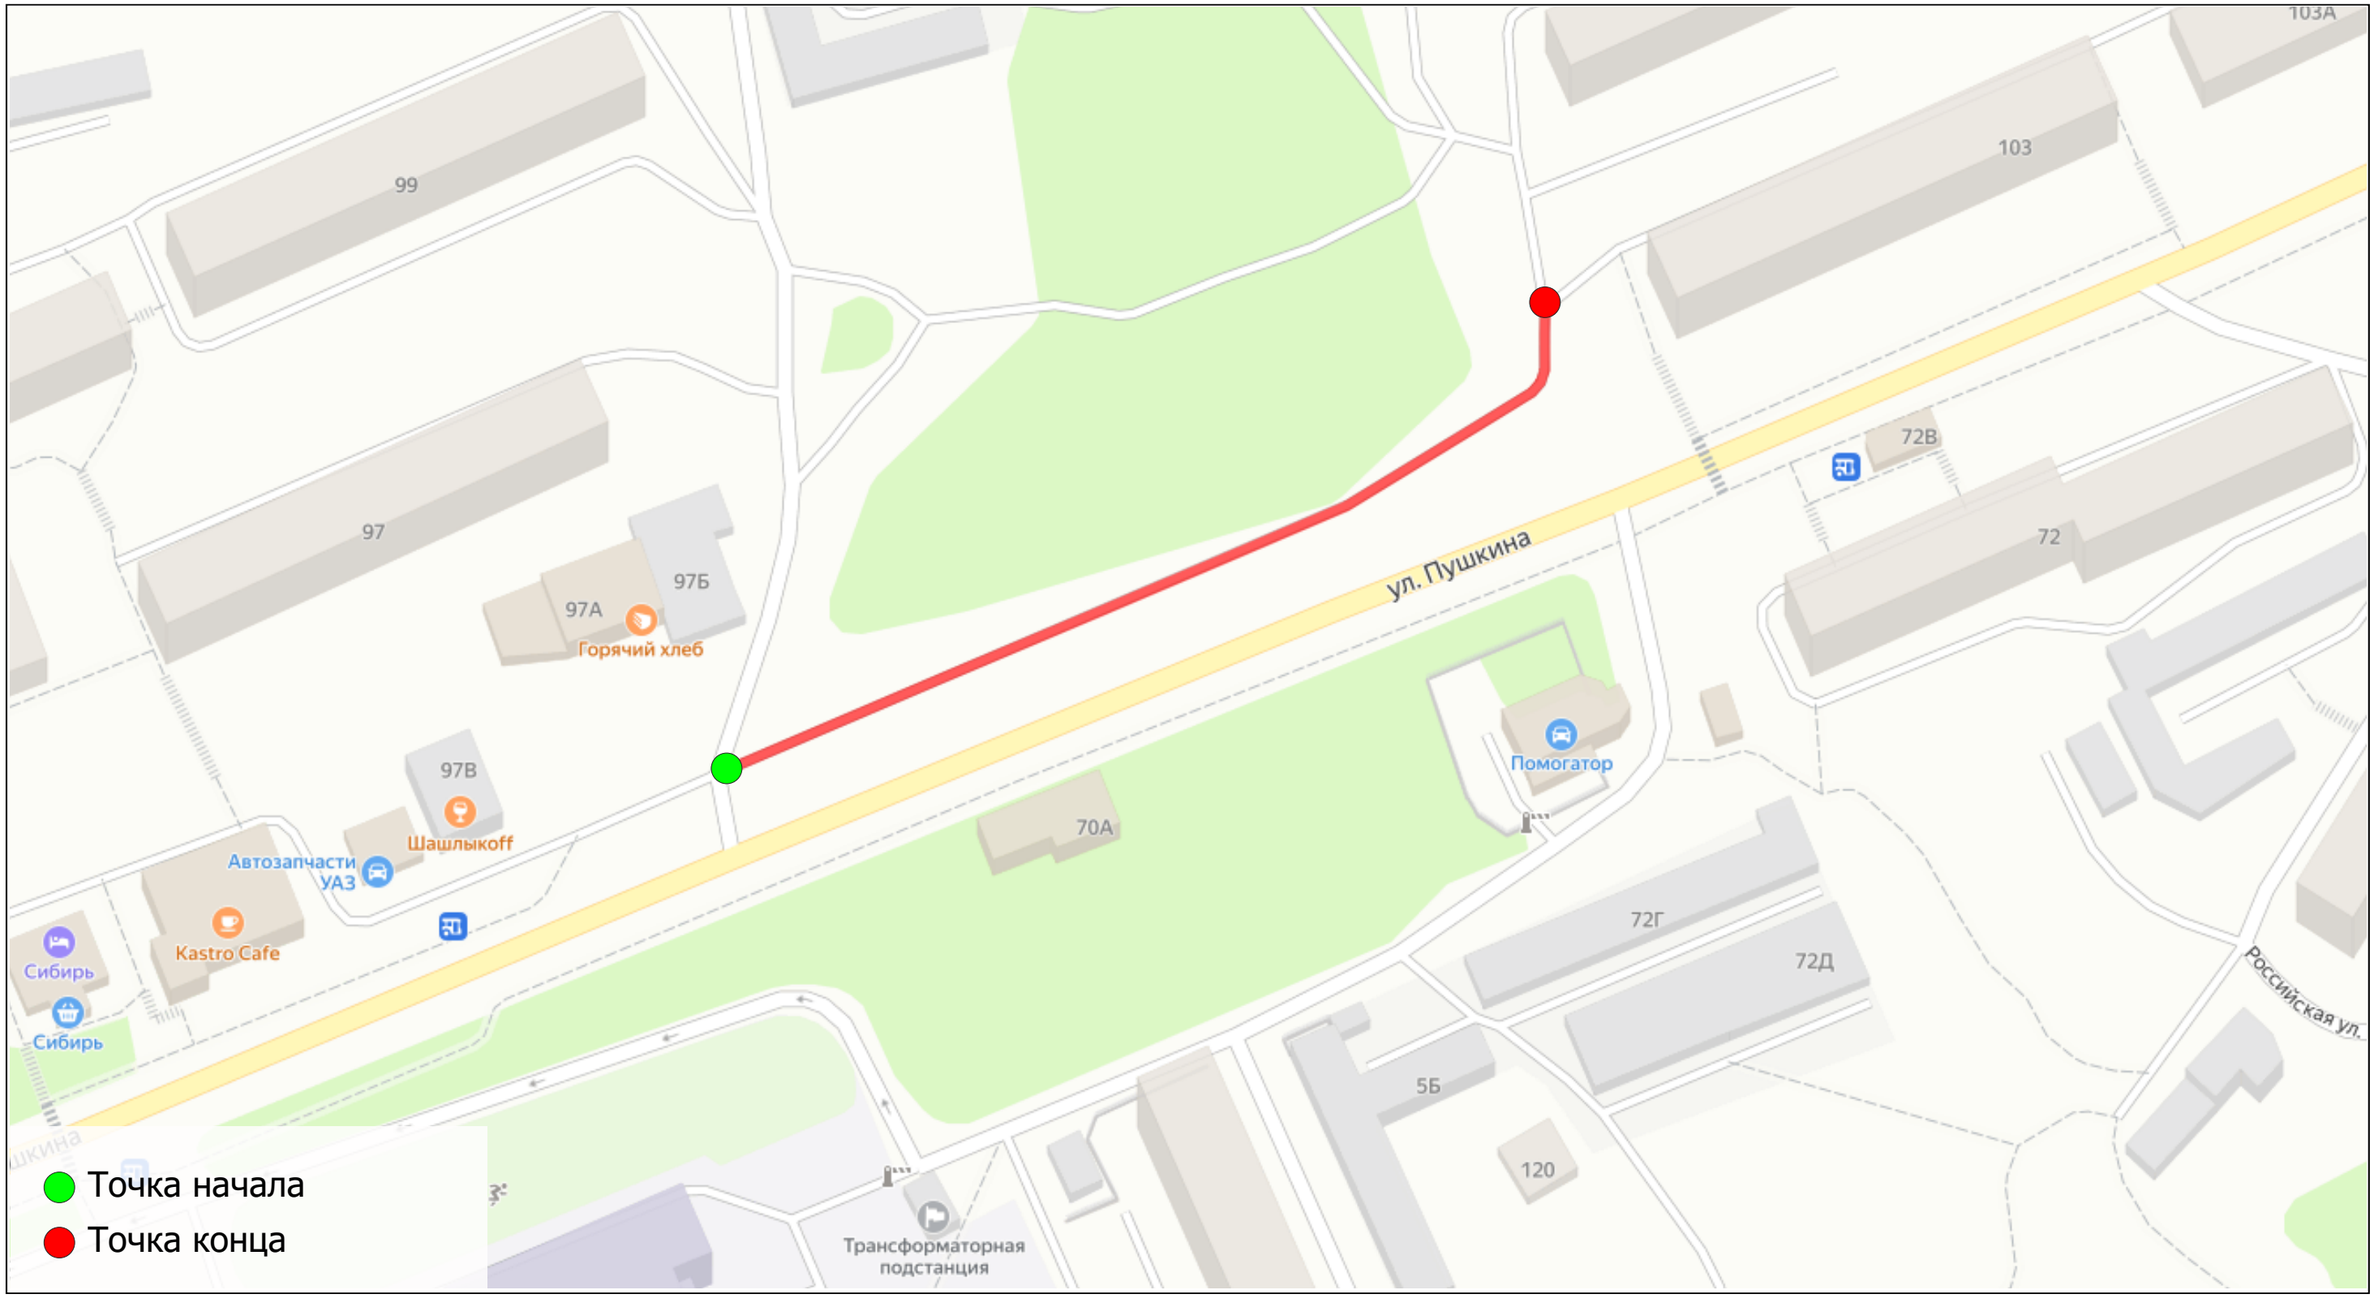

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 1м, бет, 0 - 187
Характеристики проезжей части	5,50

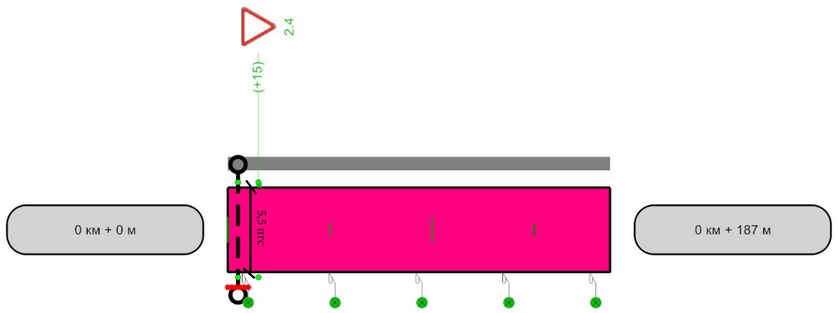

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+005	0+015	10/2		Слева	Пластмасса	Водопропускная труба
2	0+005	0+015	10/2		Справа	Пластмасса	Водопропускная труба
Итого:			**20/4**				

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+180	Населенный пункт	5/5	170	0	Справа
Итого:				**5/5**	**170**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+187	Жилая застройка	Слева		187
Итого:					**0**	**187**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от въезда с автодороги ул. Халтурина до жилого дома по ул. Халтурина, д.52б
км 0+000 - км 0+180



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	15 15 15 R=2316м
Кривые в плане	R=622м P=3; a=126° R=622м P=6; a=62 75 R=628м 95 P=6; a=9 115 125 R=664м P=17; a=22 150
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, 0 - 109 / н/д: ширина 1м, 114 - 180
Характеристики проезжей части	6,00 3,00 4,70 4,90

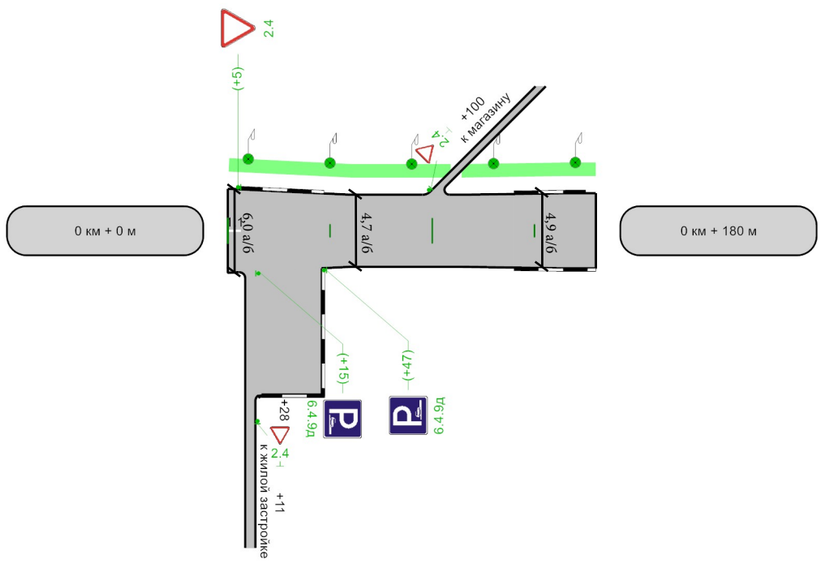

осевая	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	
Ширина, м	0.10	
1	2	3
0 - 1	6,000	**0,600**
ИТОГО	**6,000**	**0,600**
ЛИН.КМ	**0,006**	
ПРИВЕД.КМ	**0,006**	
ПЛОЩАДЬ	**0,600**	**0,600**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+005	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Информационные знаки						
2	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+015	Требуется установить	1	справа
3	6.4.9д	Парковка со способом постановки транспортного средства			0+047	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+170	Населенный пункт	5/5	160	0	Слева
Итого:				**5/5**	**160**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+109	Жилая застройка	Слева	109	
2	0+114	0+180	Жилая застройка	Слева	66	
Итого:					**175**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога по пер. Светлый от д. № 20 по ул. Гайдара, между домами № до примыкания к автодороге ул. Речников

км 0+000 - км 0+110

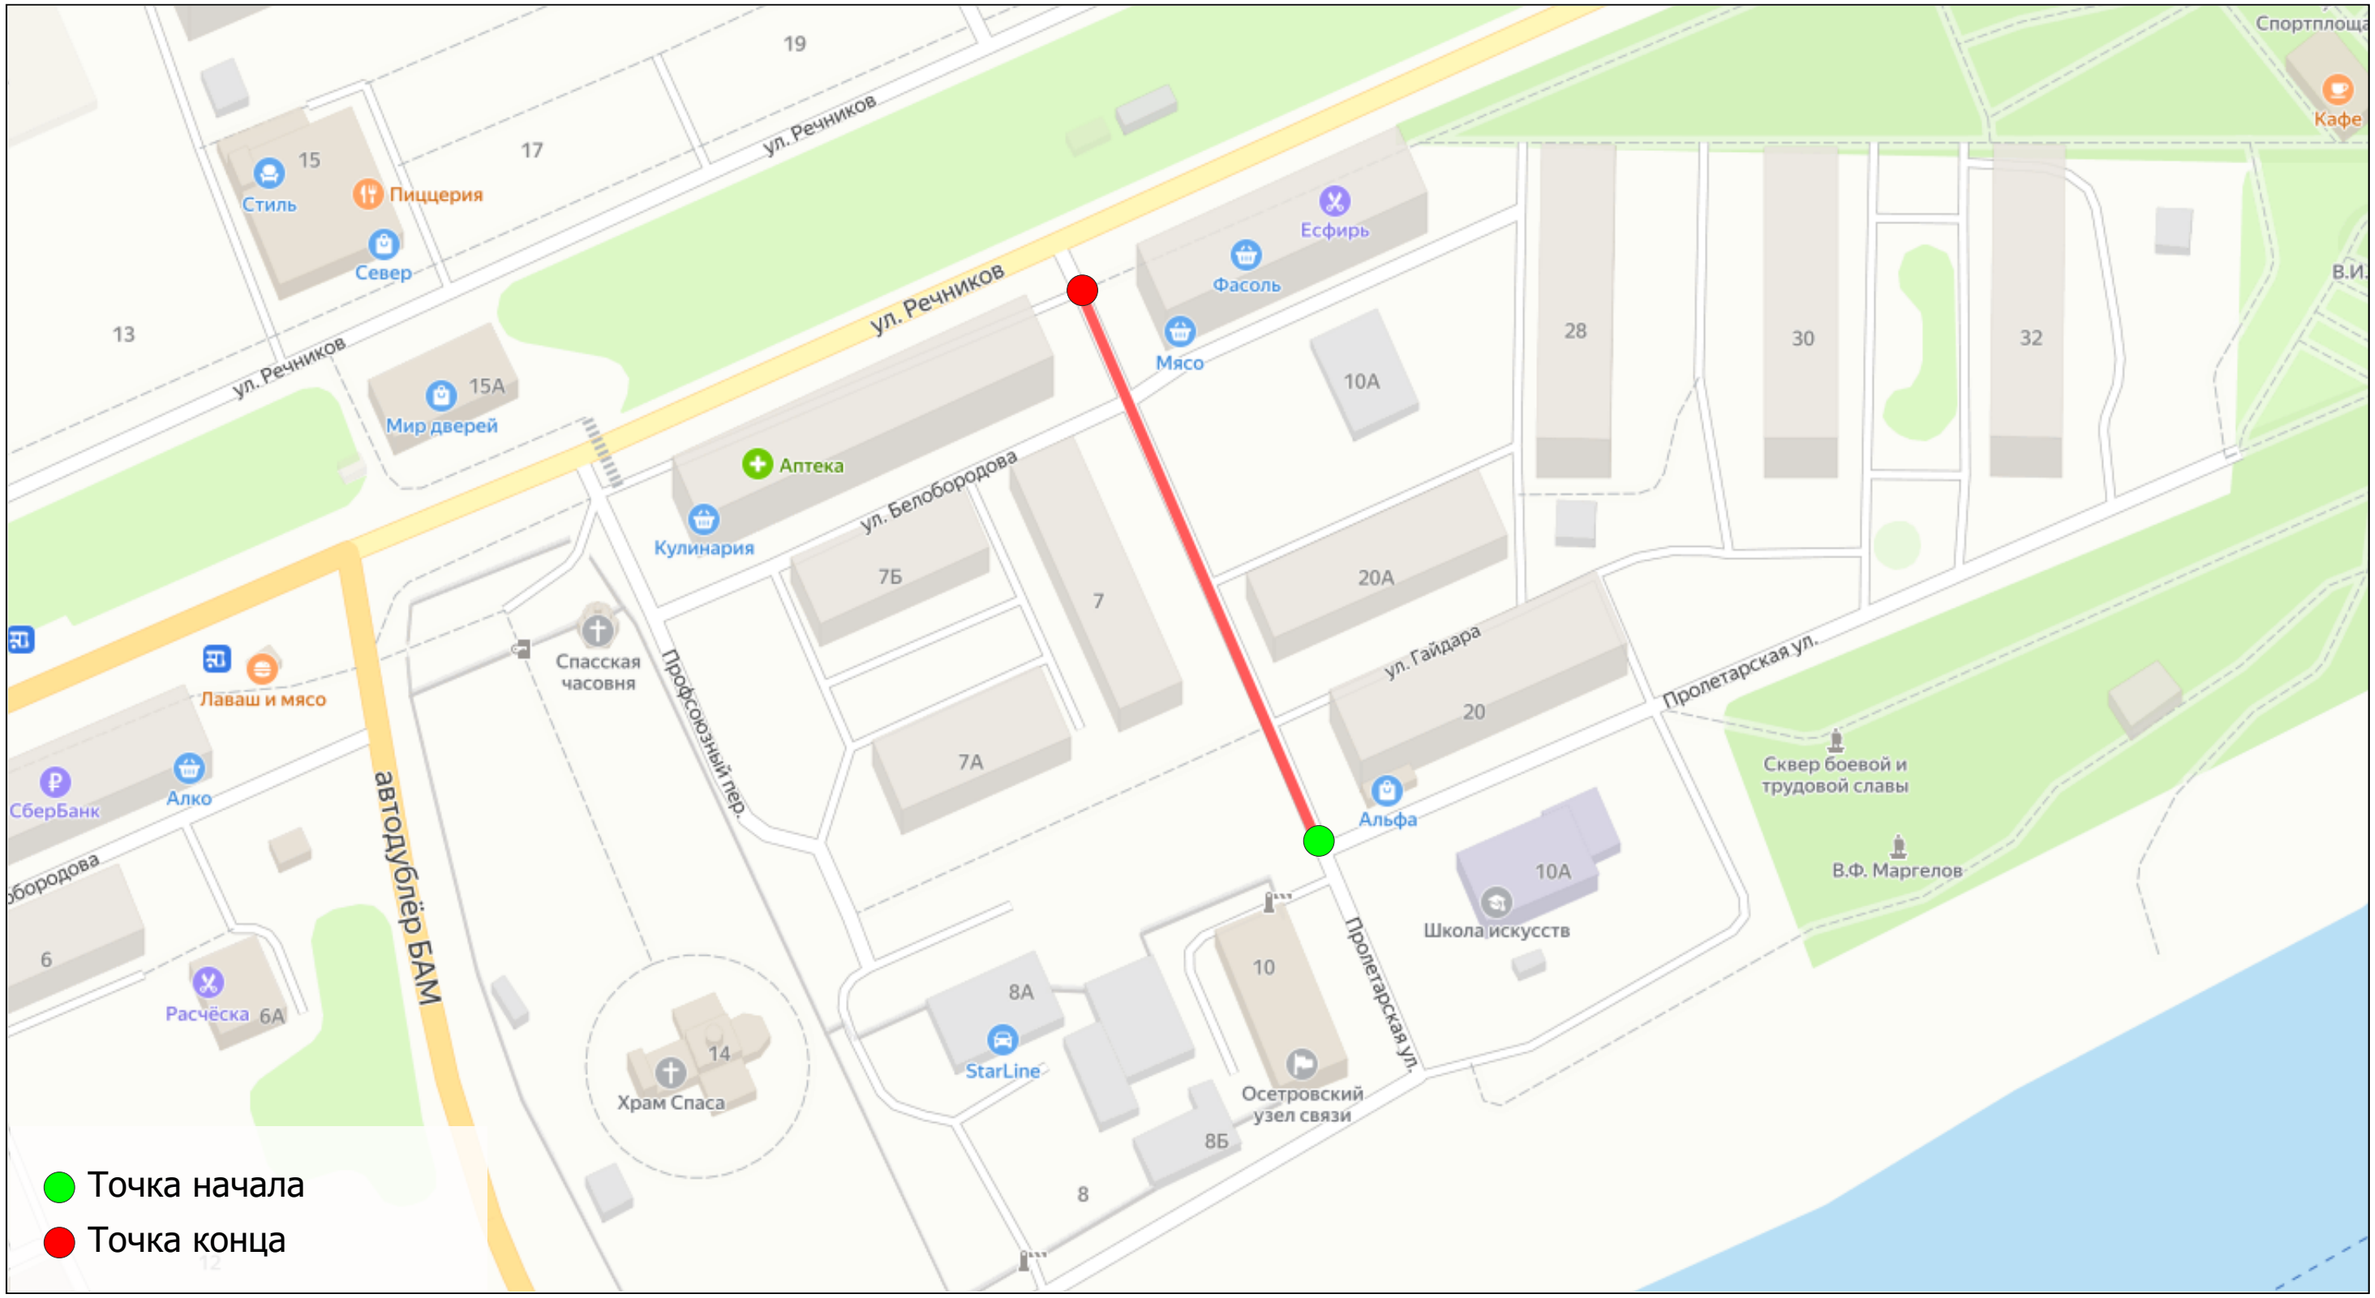

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	19
Кривые в плане	
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 110
Характеристики проезжей части	5,40

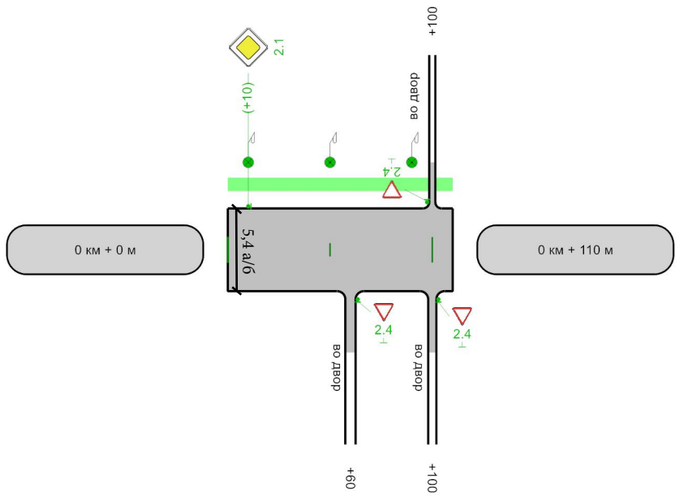

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+010	0+090	Населенный пункт	3/3	80	0	Слева
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+110	Жилая застройка	Слева	110	
Итого:					**110**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома № 115 по ул. Пушкина до примыкания к автомобильной дороге по ул. Пушкина

км 0+000 - км 0+167

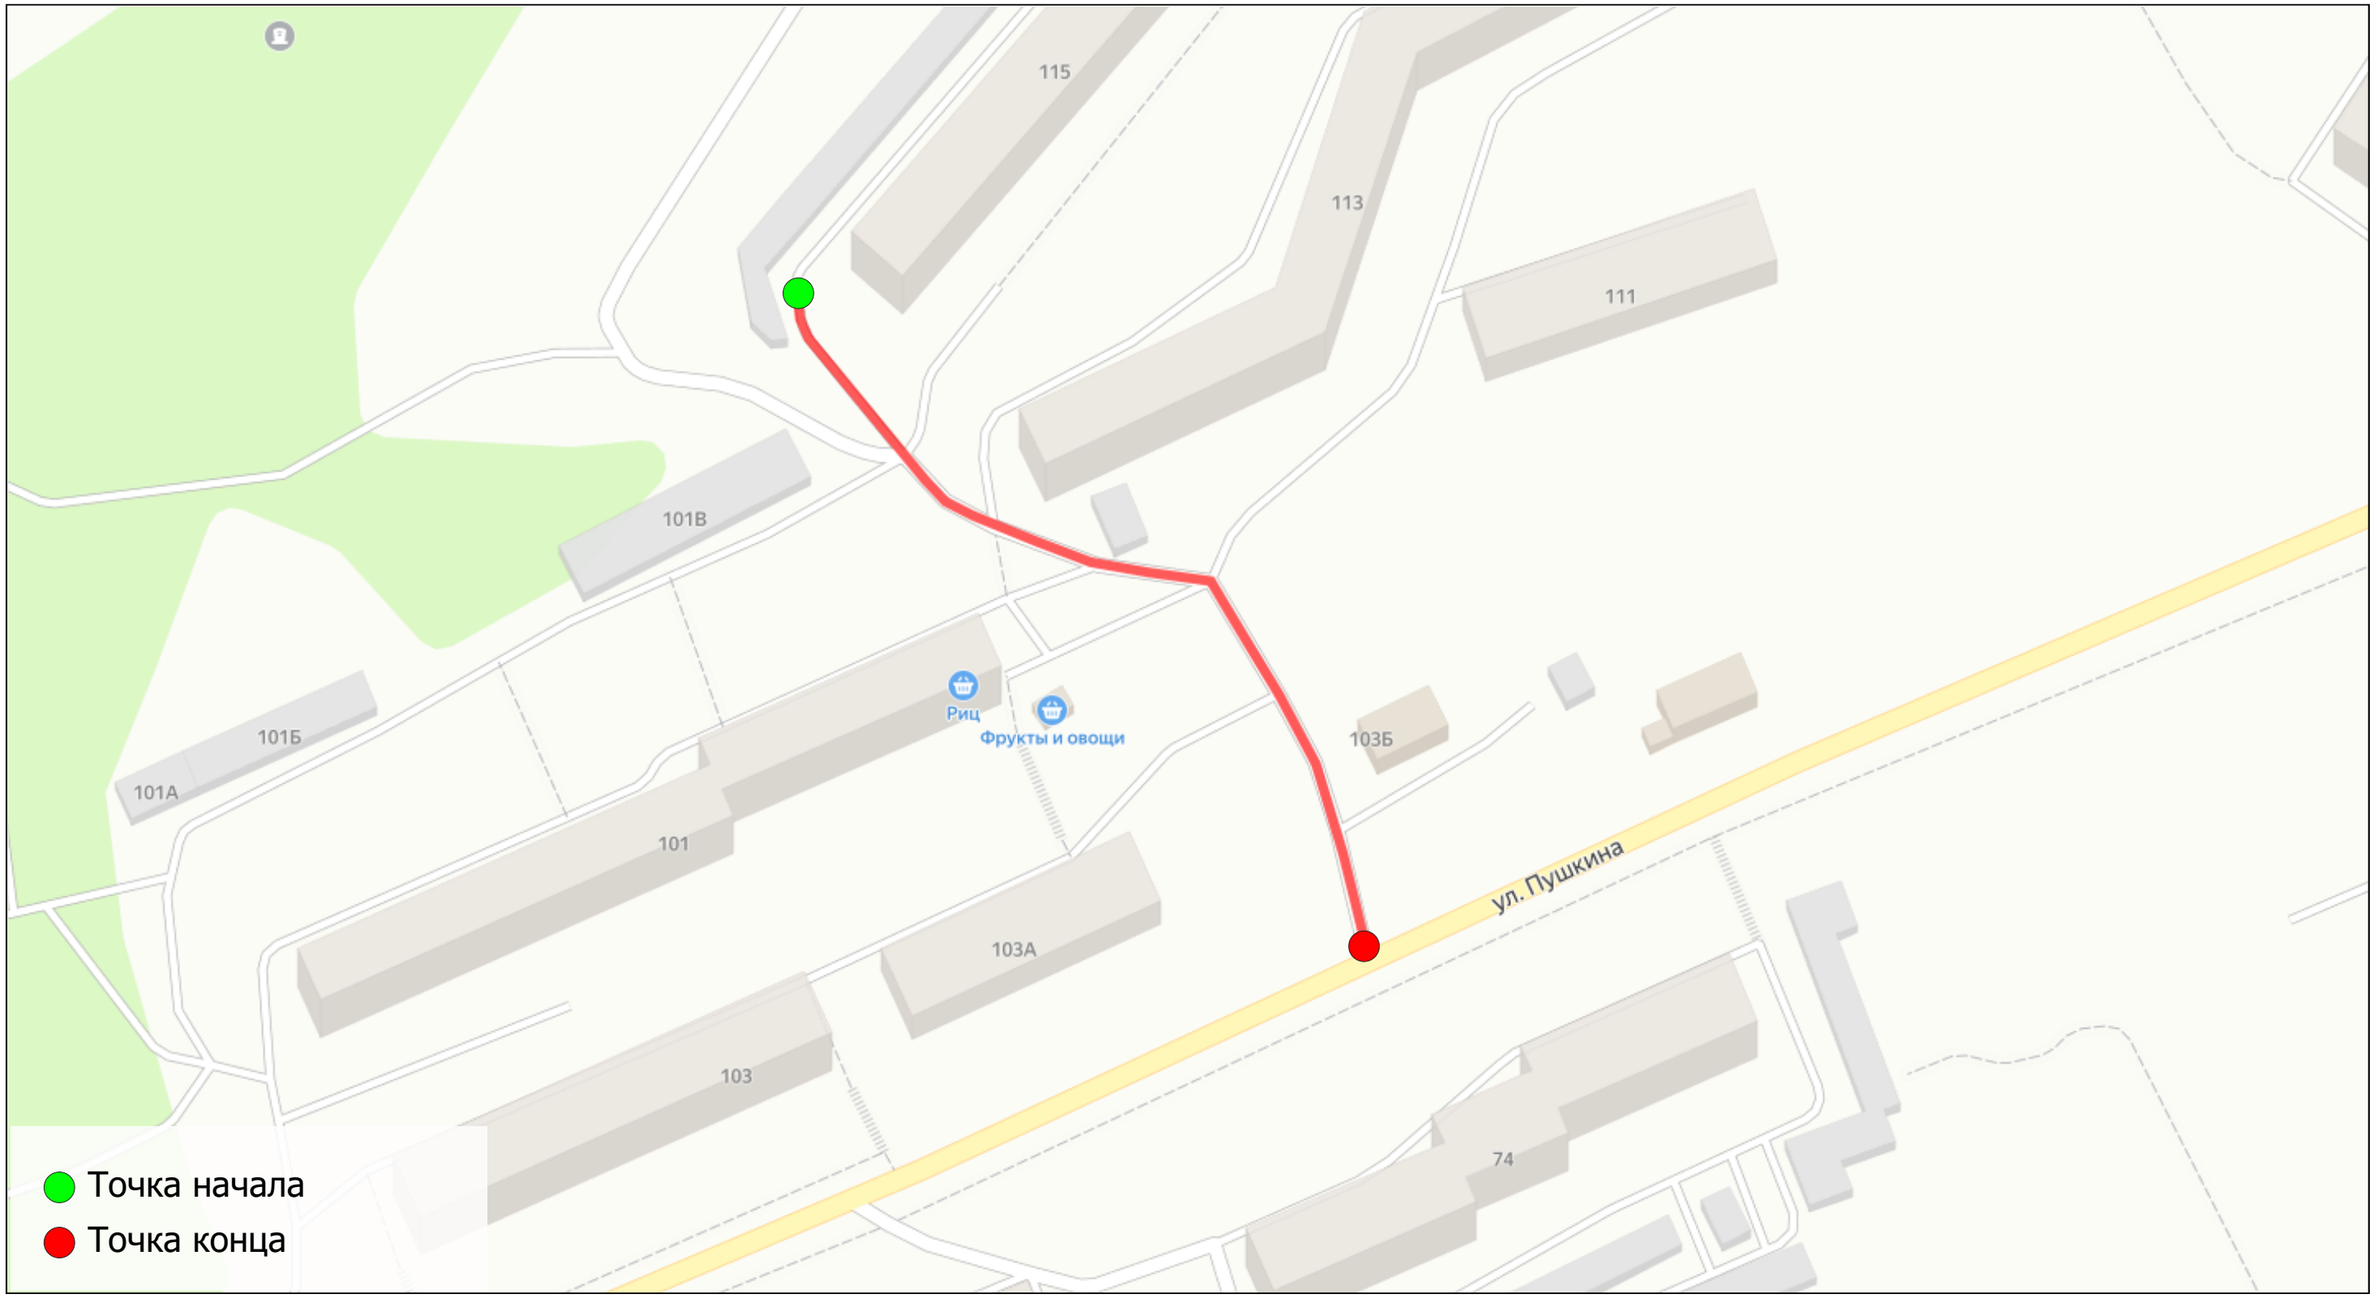

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	120
Кривые в плане	35 R=606м P=8; a=41° 90 R=602м P=7; a=47° 125
Тротуары слева	н/д: ширина 1м, а/б, 0 - 63 н/д: ширина 1м, а/б, 97 - 167
Характеристики проезжей части	4,00

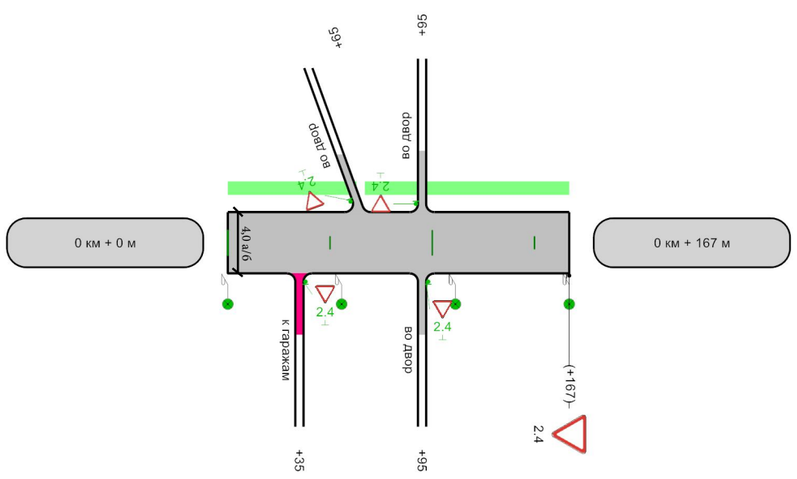

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+167	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+167	Населенный пункт	4/4	167	0	Справа
Итого:				**4/4**	**167**	**0**	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+063	Жилая застройка	Слева	63	
2	0+067	0+093	Жилая застройка	Слева	26	
3	0+097	0+167	Жилая застройка	Слева	70	
Итого:					**159**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от жилого дома № 1 по ул. Российская до примыкания к автомобильной дороге по ул. Пушкина

км 0+000 -км 0+137

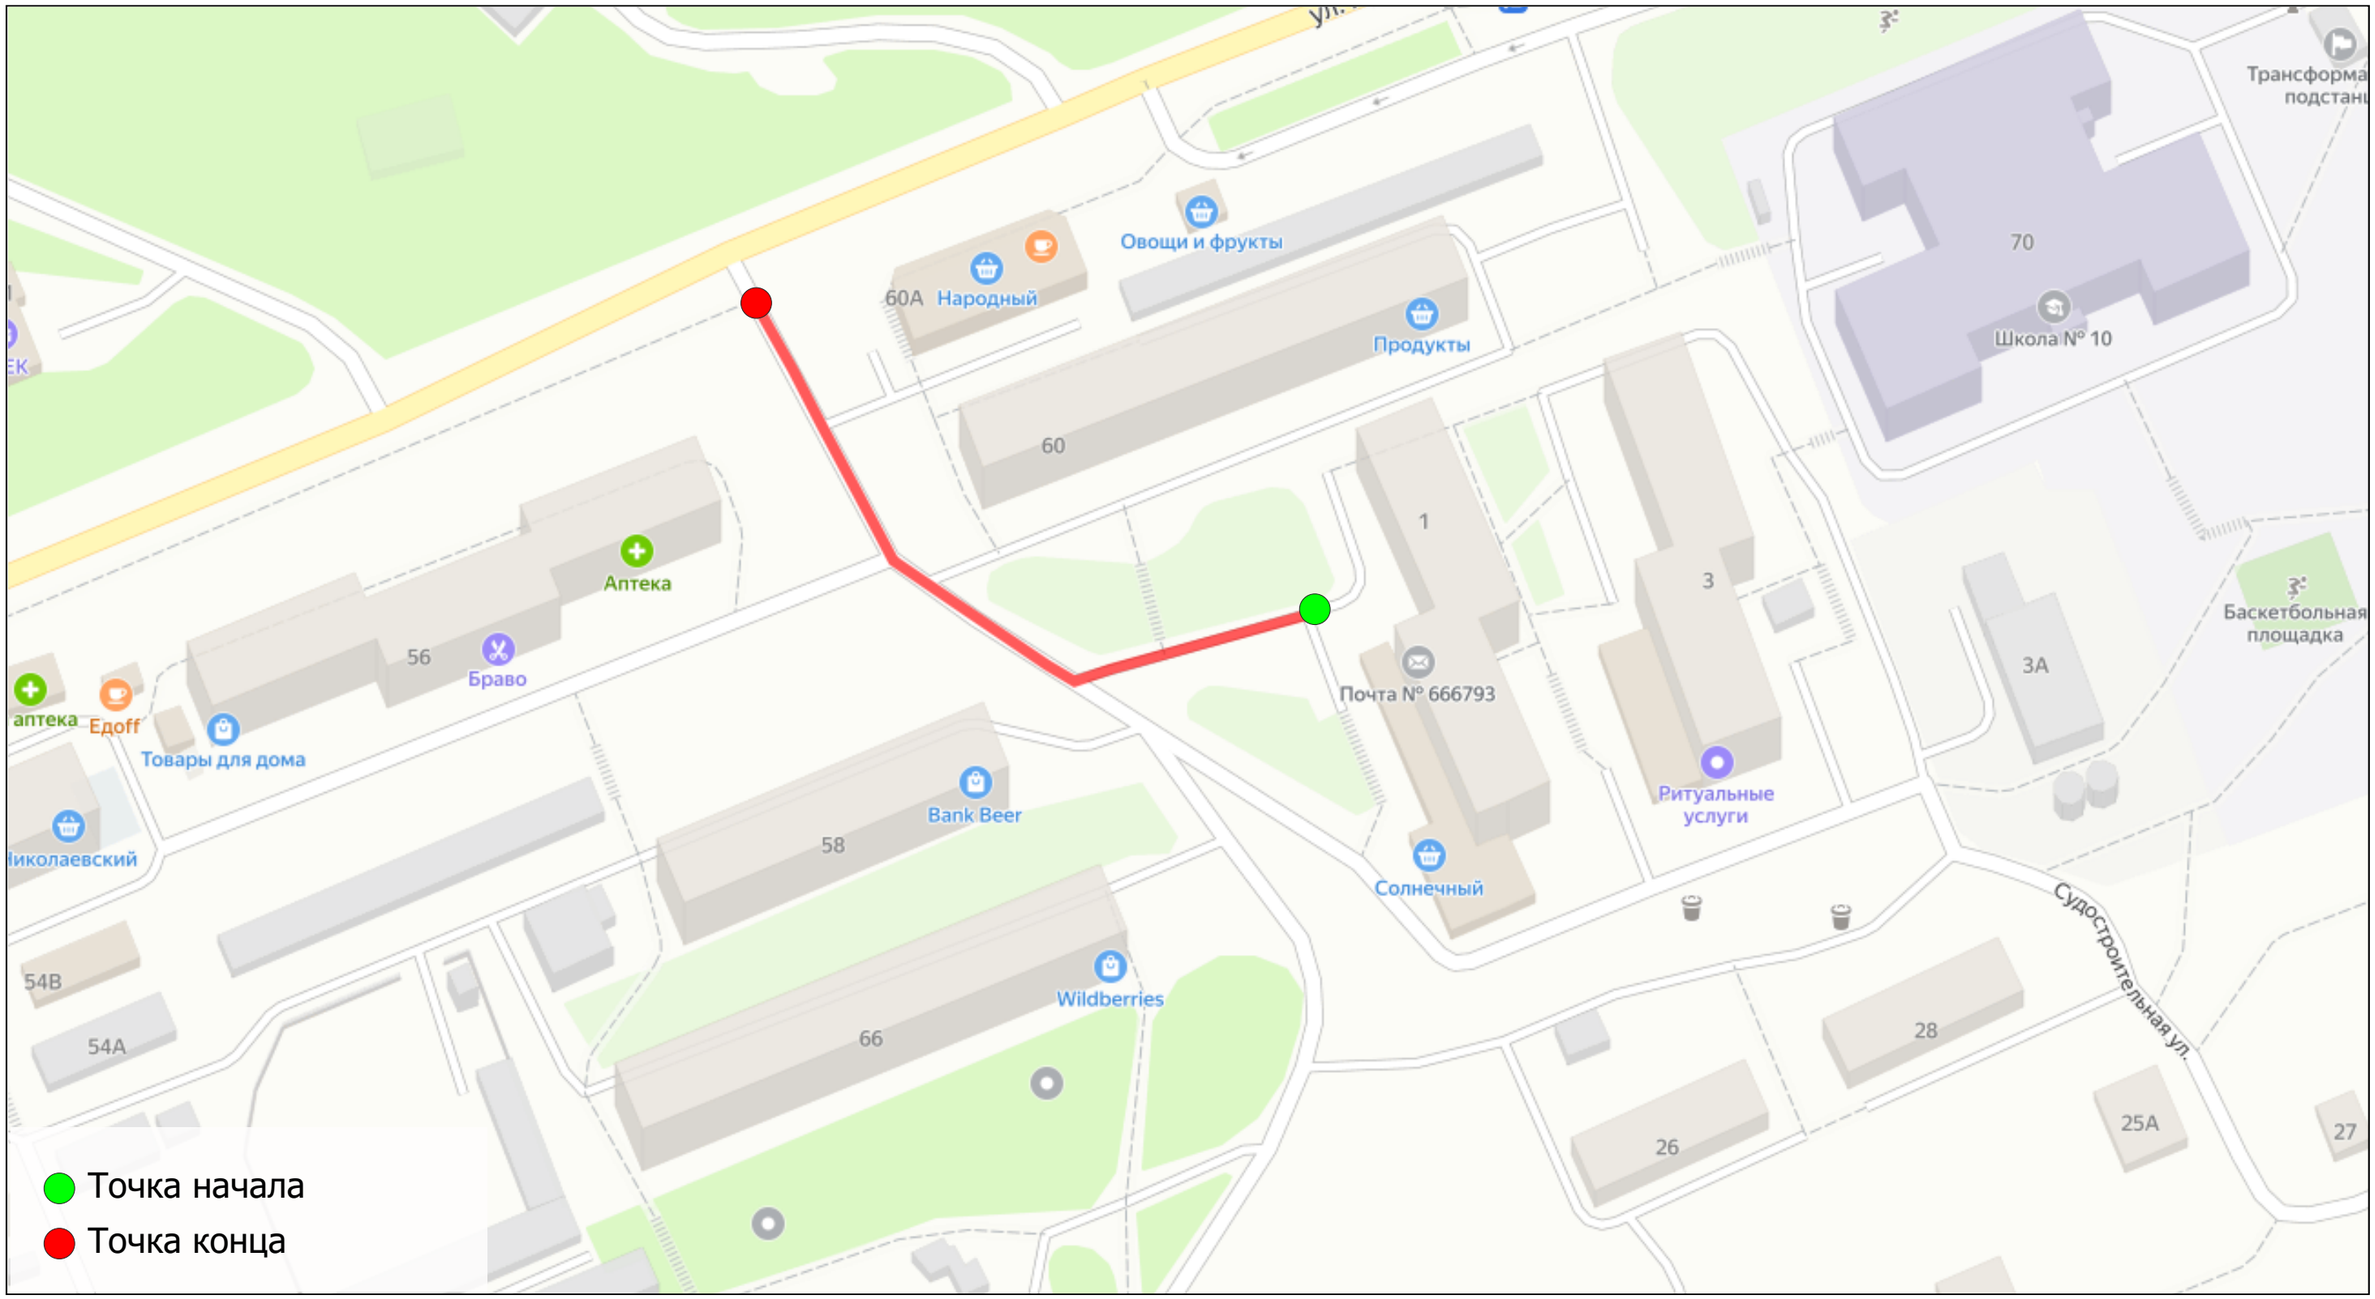

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	43
Кривые в плане	R=60м 35 P=1; a=42 65
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	6,00 / 50 / 5,00

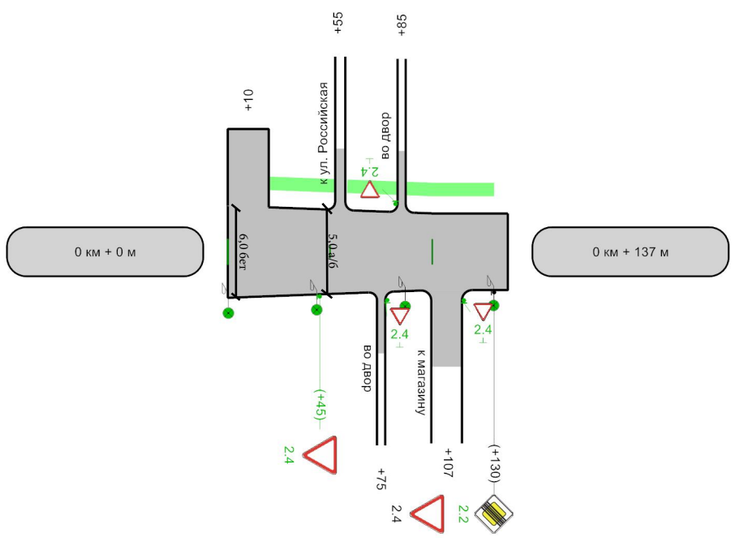

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.2	Конец главной дороги			0+130	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу			0+045	Требуется установить	1	справа
3	2.4	Уступите дорогу			0+130	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**3**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+130	Населенный пункт	4/4	130	0	Справа
Итого:				**4/4**	**130**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+020	0+053	Жилая застройка	Слева	33	
2	0+058	0+083	Жилая застройка	Слева	25	
3	0+087	0+130	Жилая застройка	Слева	43	
Итого:					**101**	**0**


Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»

Автодорога от автомобильной дороги федерального значения до восточной границы ГСК "Солнечный"
км 0+000 - км 0+252



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	0 2 110 R=1940м 112 182 141 181 R=3698м
Кривые в плане	R=637м P=35; a=10° 35 48 R=660м P=6; a=61° 100 197 R=639м P=5; a=78° 211
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 4,00

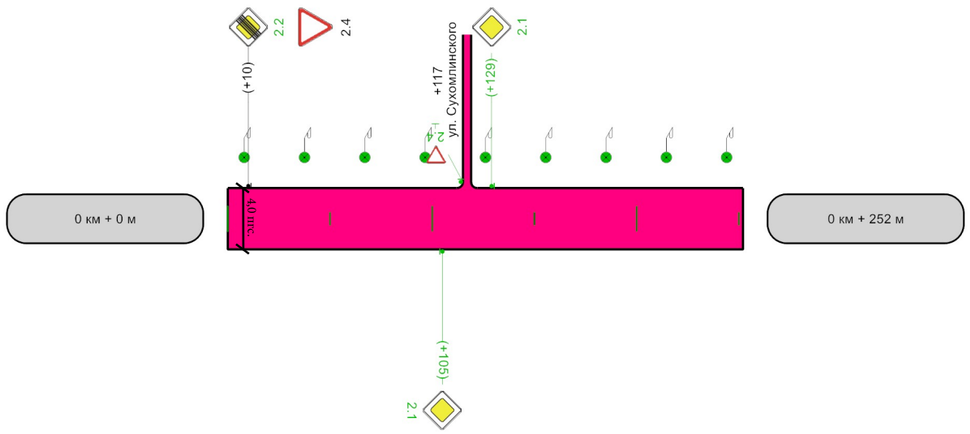

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+105	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+129	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги			0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу			0+010	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**3**	
		Итого:					**4**	
		Всего установлено:					**1**	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**3**	
		Всего:					**4**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+008	0+244	Населенный пункт	9/9	236	0	Слева
Итого:				**9/9**	**236**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от автомобильной дороги федерального значения до ул. 2-я Парковая

км 0+000 - км 0+440

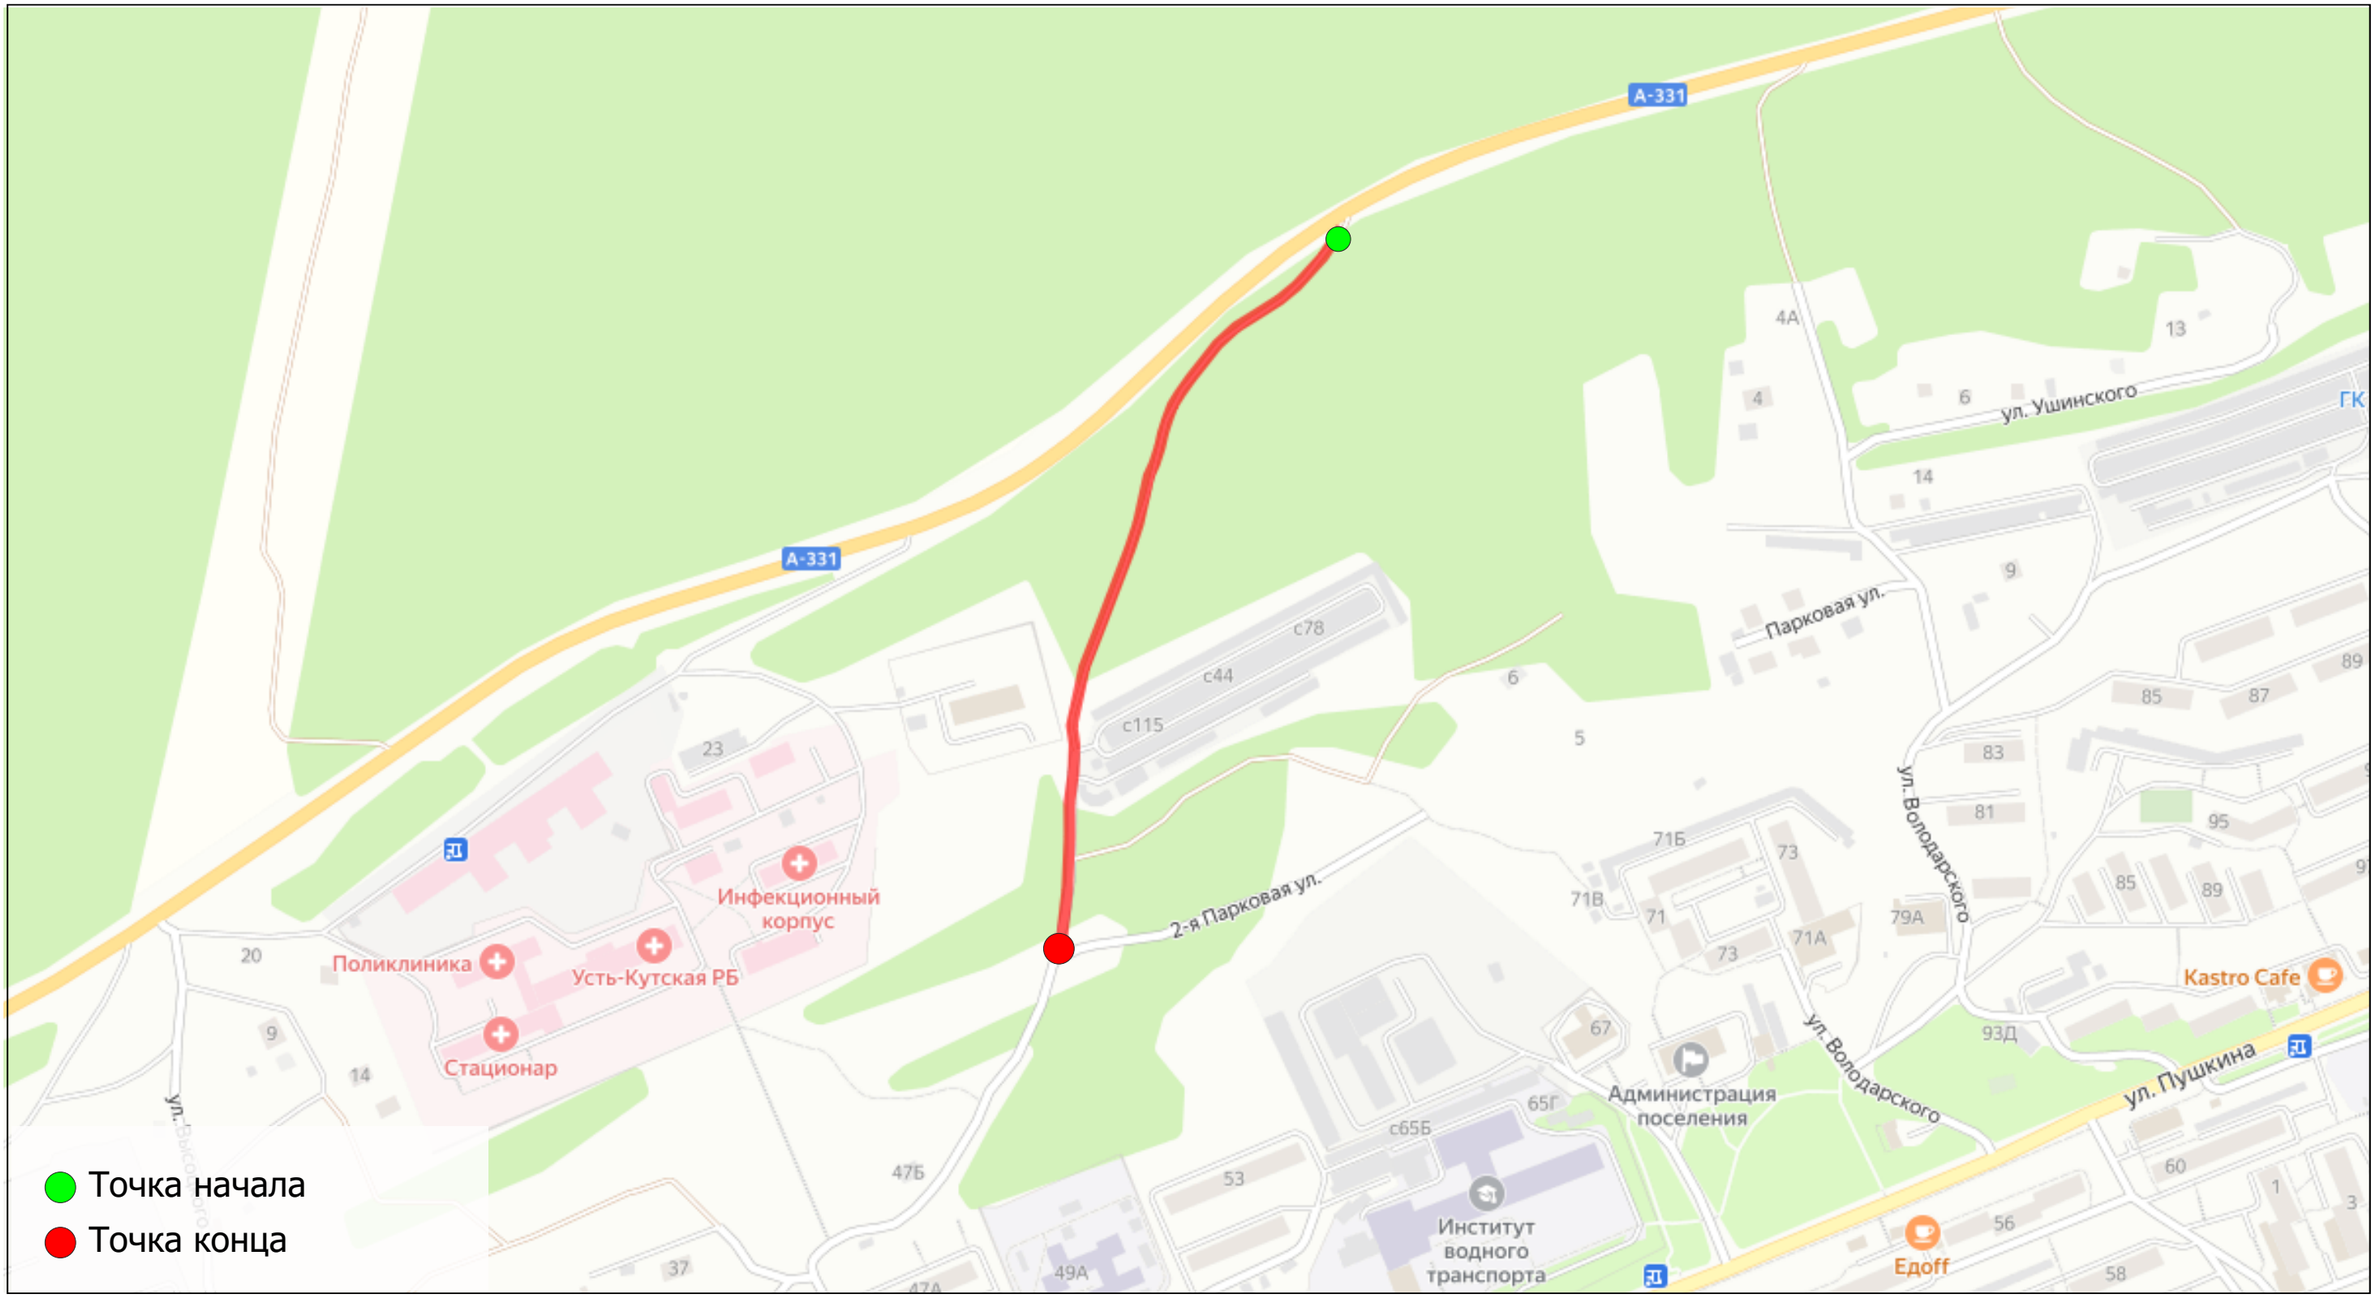

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	24 — 24 — R=1583м — 136 — 136 — R=5562м — 101 32 208 239 432
Кривые в плане	R=657м P=15; a=25° 89
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	0 — 3,50 — 300 — 6,50

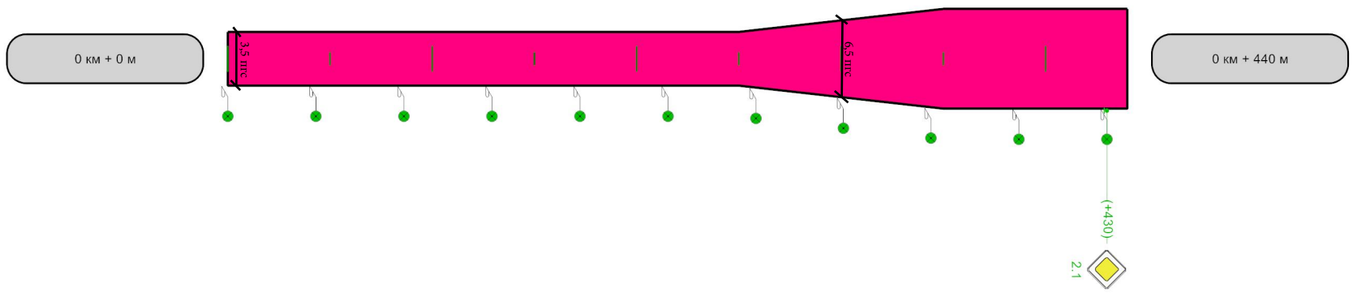

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+430	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	


Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+430	Населенный пункт	11/11	430	0	Справа
Итого:				**11/11**	**430**	**0**	

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от автодороги ул. Пушкина до въезда к административному зданию по ул. Володарского, 69

км 0+000 - км 0+081

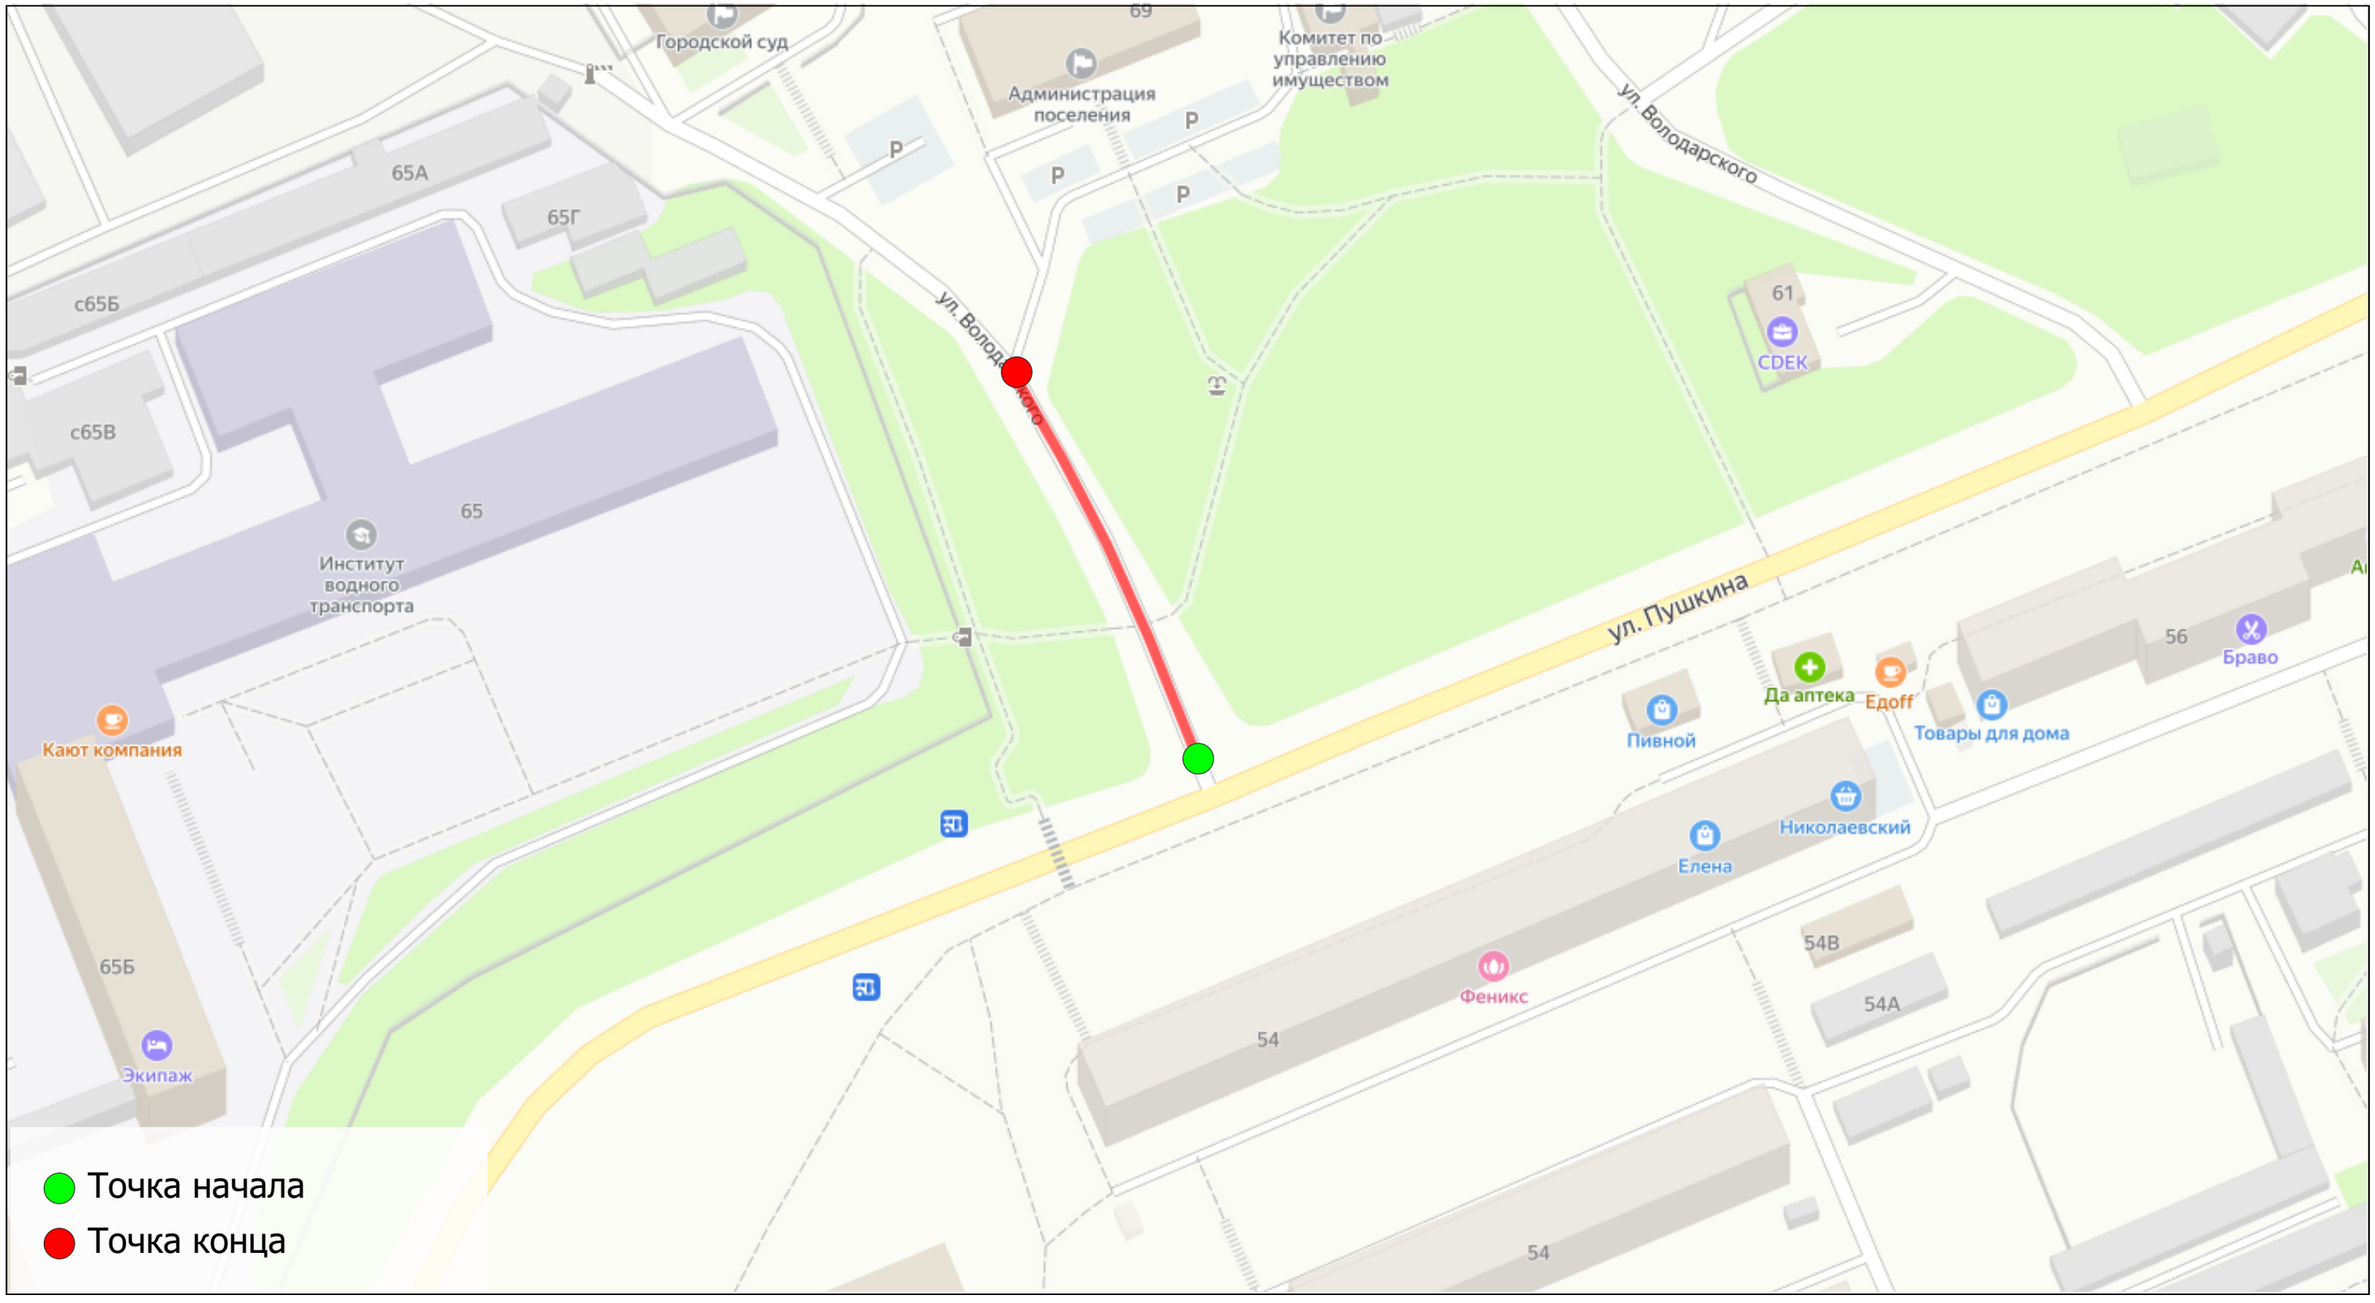

М 1:3000

1-ая от осевой	1.2 0 - 81
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	116
Кривые в плане	
Тротуары слева	ширина 2,5м, бет, 0 - 81
Характеристики проезжей части	7,60



Горизонтальная разметка справа			
	осевая	1.1 0 - 20	1.6 20 - 81
	1-ая от осевой	1.2 0 - 81	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа			

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	1.6(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	0.750	
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	
1	2	3	4	5
0 - 1	20,000	162,000	61,000	22,775
ИТОГО	20,000	162,000	61,000	22,775
ЛИН.КМ	0,020	0,162	0,061	
ПРИВЕД.КМ	0,020	0,162	0,046	
ПЛОЩАДЬ	2,000	16,200	4,575	22,775

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+081	Населенный пункт	3/3	81	0	Слева
Итого:				3/3	81	0	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+081	Жилая застройка	Слева		81
Итого:					0	81

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Автодорога от ж/д переезда в районе ЯГУ до автодороги ул. Геологическая

км 0+000 - км 0+080

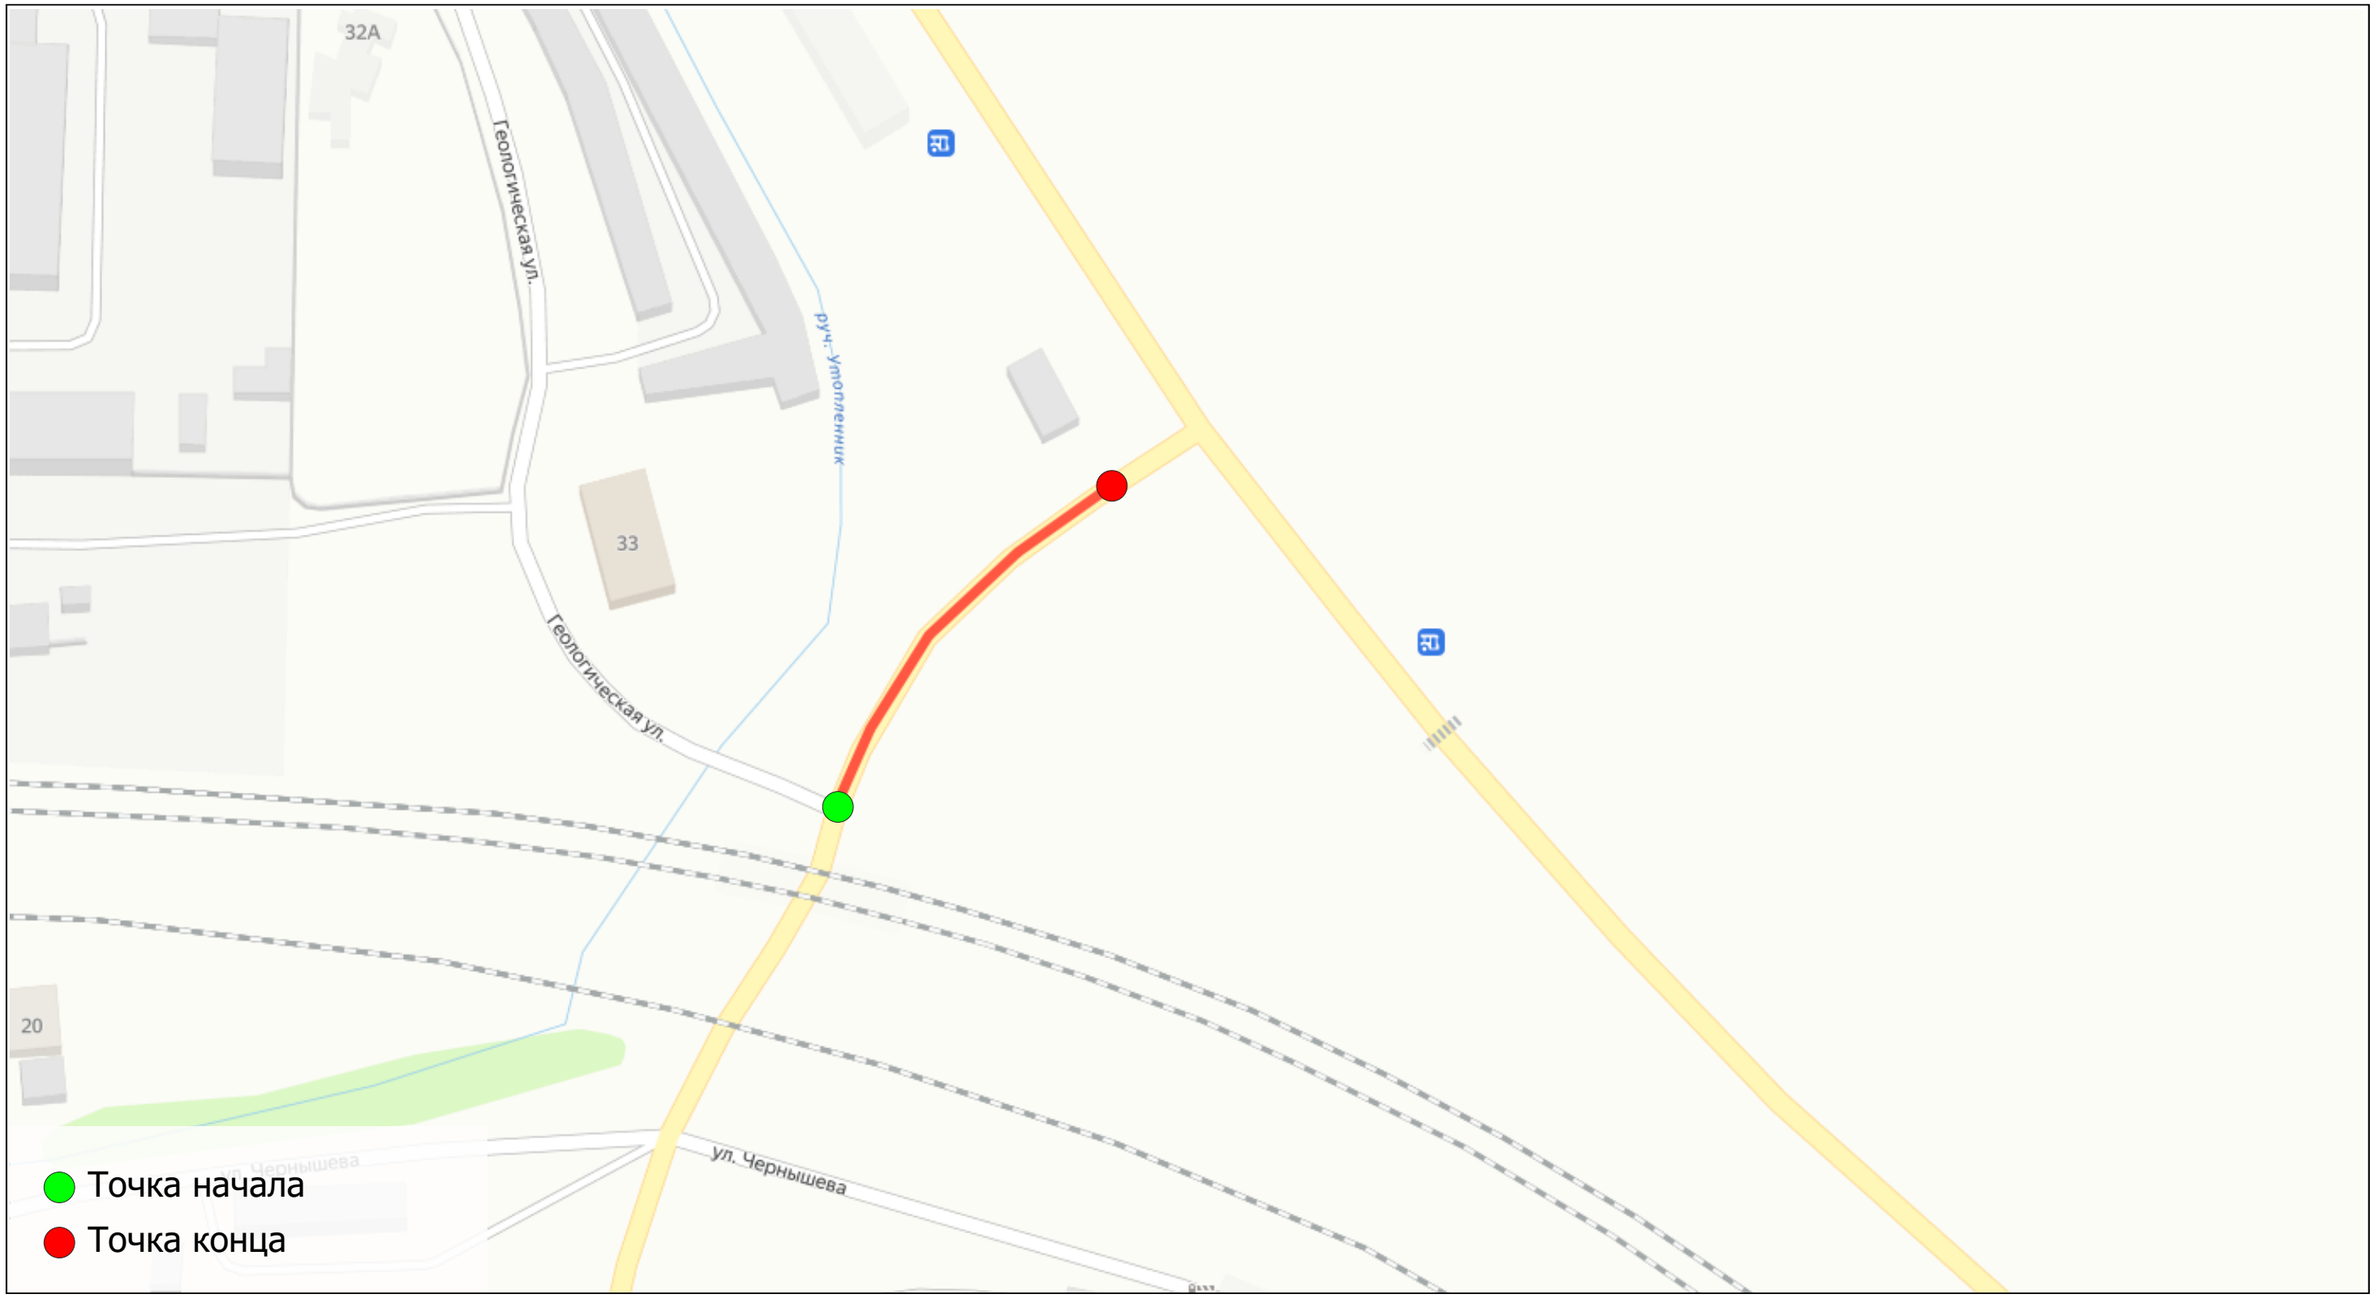

М 1:3000

Горизонтальная разметка справа	1-ая от осевой	1.2 0 - 80
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Элементы дороги в продольном профиле		43
Кривые в плане		
Тротуары слева		
Характеристики проезжей части		8,00

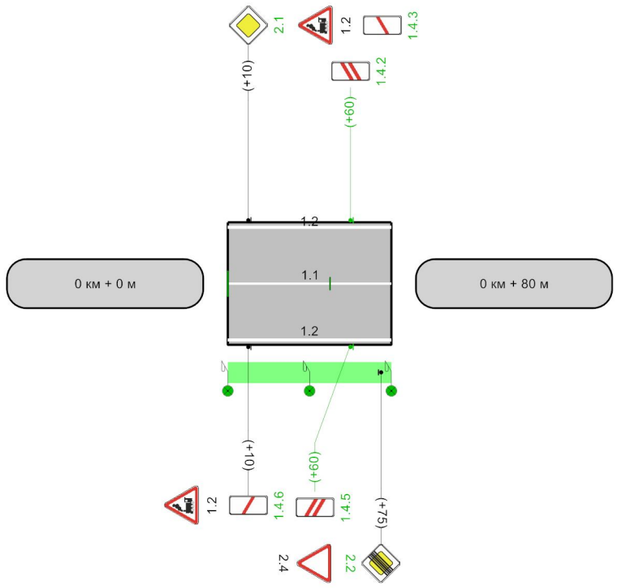

Горизонтальная разметка справа	осевая	1.1 0 - 80
	1-ая от осевой	1.2 0 - 80
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		н/д: ширина 1,5м, а/б, 0 - 80

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной)

№ км	1.1(м)	1.2(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	1.000	
Ширина, м	0.10	0.10	
1	2	3	4
0 - 1	80,000	160,000	**24,000**
ИТОГО	**80,000**	**160,000**	**24,000**
ЛИН.КМ	**0,080**	**0,160**	
ПРИВЕД.КМ	**0,080**	**0,160**	
ПЛОЩАДЬ	**8,000**	**16,000**	**24,000**

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+010	Установлено	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+010	Установлено	1	справа
3	1.4.2	Приближение к железнодорожному переезду			0+060	Требуется установить	1	слева
4	1.4.3	Приближение к железнодорожному переезду			0+010	Требуется установить	1	слева
5	1.4.5	Приближение к железнодорожному переезду			0+060	Требуется установить	1	справа
6	1.4.6	Приближение к железнодорожному переезду			0+010	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					**2**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**4**	
		Итого:					**6**	
		Знаки приоритета						
7	2.1	Главная дорога			0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.2	Конец главной дороги			0+075	Требуется установить	1	справа
9	2.4	Уступите дорогу			0+075	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					**1**	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**3**	
		Всего установлено:					**3**	
		Всего перенести:						

		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**6**	
		Всего:					**9**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	0+000	0+080	Населенный пункт	3/3	80	0	Справа
Итого:				**3/3**	**80**	**0**	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0+000	0+080	Жилая застройка	Справа	80	
Итого:					**80**	**0**

Автомобильная дорога общего пользования местного значения на территории городского округа «Усть-Кут»


Внутриквартальная дорога «Городское кладбище «Новое»

1-й участок: км 0+000 - км 0+377
2-й участок: км 0+000 - км 0+208
3-й участок: км 0+000 - км 0+095



М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

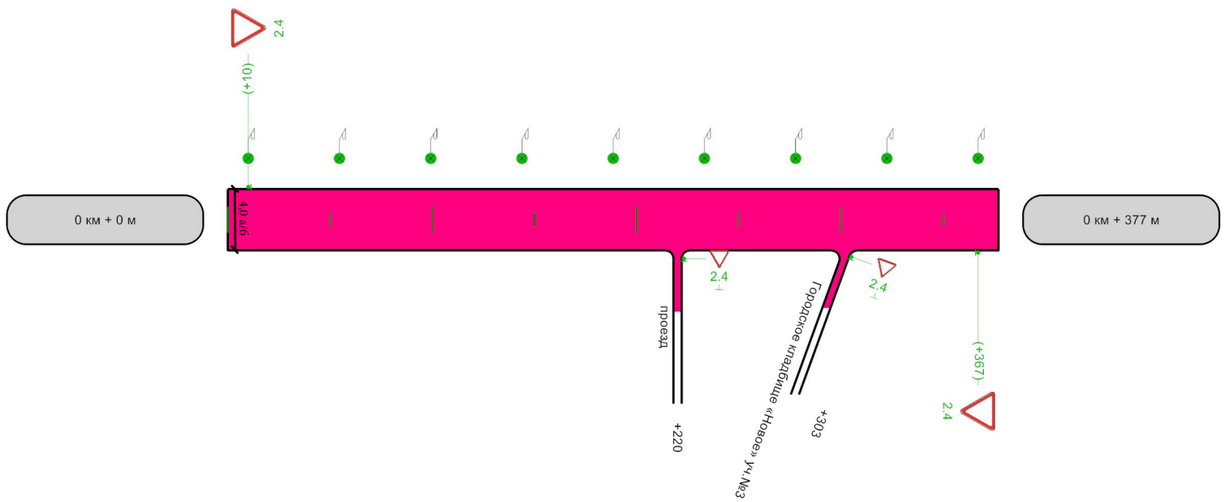

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+367	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+367	Населенный пункт	9/9	357	0	Слева
Итого:				**9/9**	**357**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	4,00

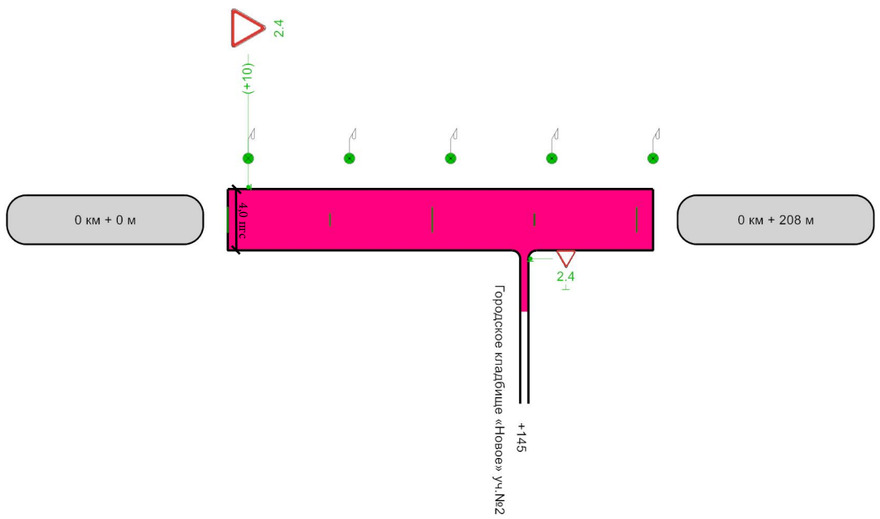

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков


№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**1**	
		Итого:					**1**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**1**	
		Всего:					**1**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+208	Населенный пункт	5/5	198	0	Слева
Итого:				**5/5**	**198**	**0**	

М 1:3000

Горизонтальная дорожная разметка слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Элементы дороги в продольном профиле	
Кривые в плане	
Тротуары слева	
Характеристики проезжей части	3,50

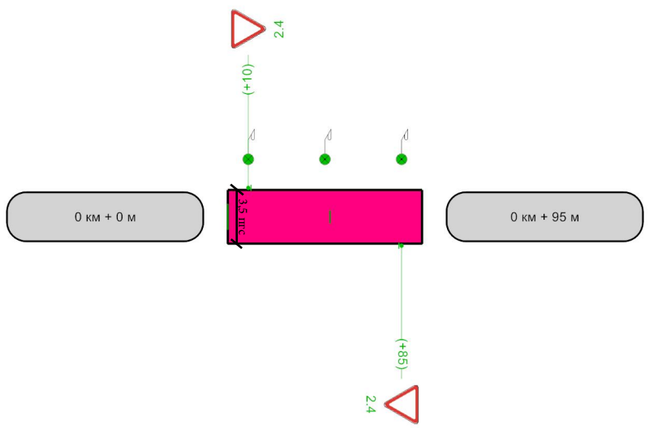

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу			0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу			0+085	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					**2**	
		Итого:					**2**	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					**2**	
		Всего:					**2**	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+085	Населенный пункт	3/3	75	0	Слева
Итого:				**3/3**	**75**	**0**	

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД.

Характеристика дорог, для которых разрабатывается ПОДД



Исследуемые участки автомобильных дорог общего пользования местного значения входят в состав улично-дорожной сети Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Усть-Кут — центр Осетрово-Ленского транспортного узла, крупнейшего в Восточной Сибири. Здесь пересекаются железнодорожные и водные пути сообщения. Имеется аэропорт, способный принимать магистральные самолёты. Обеспечен круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.

Дорожная сеть, связывающая Усть-Кут с другими населёнными пунктами, слабо развита.

На восток от Усть-Кута параллельно БАМу проходит автодорога до Звёздного и, формально, до Северобайкальска (фактически сквозное движение по автодороге крайне затруднено ввиду её плохого состояния).

Зимой из Усть-Кута на север в Мирный проходит автомобильный зимник, соединяющий с федеральной сетью автодорог труднодоступные районы Иркутской области и Якутии. Широко используются и другие зимники.

Центральные улицы города имеют асфальтовое покрытие, часть периферийных — бетонное. Остальные без покрытия. Имеется объездная автомобильная дорога для транспорта, следующего транзитом.

Детальная информация по характеристикам проезжих частей и других элементов обустройства автомобильных дорог, полученная по результатам натурных обследований, представлена на схемах ОДД.

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог.

По условиям технического задания оценка технического состояния автомобильных дорог не предусмотрена.

Результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Организация движения транспортных средств и пешеходов осуществляется на основе Правил дорожного движения с применением технических средств, регулирующих их порядок движения.

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории является обустройство наземных переходов и тротуаров соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и разметкой).

Результат анализ размещения и состояния существующих ТСОДД.

По результатам проведённого натурного обследования территории были получены сведения о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, ограждения и др. элементы обустройства автомобильных дорог).

Общее состояние существующих технических средств оценивается как удовлетворительное.

Результаты анализа основных параметров дорожного движения.

В результате анализа основных параметров дорожного движения было выявлено, что пропускной способности автомобильных дорог достаточно при текущей интенсивности движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП.

ДТП протекает очень быстро, иногда в течение нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале, в процессе нормального движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное).

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП технически невозможно. В такой обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, имеющиеся в его распоряжении.

Согласно данным Государственной автоинспекции основными причинами возникновения ДТП являются: несоблюдение очерёдности проезда, несоблюдение скоростного режима в конкретных дорожных условиях, несоблюдение условий для движения транспорта задним ходом. В ДТП, связанных с наездами на пешеходов, основными причинами являются: движение пешеходов по проезжей части в нарушении правил дорожного движения, непредоставление преимущества в движении при пересечении дороги пешеходами по пешеходному переходу.

Все ДТП подлежат тщательному изучению и внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных.

В результате произведённых исследований было выявлено: большинство ДТП происходит на регулируемых и нерегулируемых пересечениях транспортных и пешеходных потоков. ДТП происходят вследствие нарушения требований по установке знаков регулирования дорожного движения (установлены за 25-30м до регулируемого пересечения). На пересечениях отсутствует просматриваемая зона, что приводит к снижению разрешённой скорости движения, и затруднённому проезду. Несформированные зелёные насаждения (деревья, кустарники) имеют обширную зелёную крону, что приводит к ухудшению видимости технических средств ОДД (дорожные знаки, светофоры), и нарушению треугольников видимости транспорт-транспорт, пешеход-транспорт, вследствие чего увеличиваются показатели по ДТП.

Проектные решения по организации дорожного движения и обоснование утверждаемого варианта проектных решений представлены в утверждаемой части проекта организации дорожного движения.
